



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 669 / 2023

Data do Empenho: 20/07/2023

PROCESSO ADM: 172-2022

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **5422 - MP2 CONSTRUCOES LTDA**
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: Cidade: SALVADOR
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 CPF: RG: Estado: BA
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 004-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 260-2022	368.332,63	162.306,93	206.025,70
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENÍCIO VIANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 260-2022, LICITAÇÃO Nº004-2022TP, NFS-e.419. REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO DE 12/07/2023 A 18/07/2023.

Data do Empenho: 20/07/2023

Data do Liquidação: 20/07/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.434,60
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	4.869,21
		10.712,26
## Cento e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos ##		Valor Retido
		18.016,07
		Valor Líquido
		144.290,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/07/2023	419	UNIC			162.306,93

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	162.306,93

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/07/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/07/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3210753



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 172-2022

EMPENHO: 669 / 2023

Data do Empenho: 20/07/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **5422 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA**
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: Cidade: SALVADOR
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 CPF: RG: Estado: BA
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: EDIF COND.GEO SALVADOR SHOPF

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar Nº Lic.: 004-2022TP
 Convênio: Contrato: 260-2022
 Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
368.332,63	162.306,93	206.025,70

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENÍCIO VIANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 260-2022, LICITAÇÃO Nº004-2022TP.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	162.306,93	162.306,93

Cento e sessenta e dois mil e trezentos e seis reais e noventa e três centavos

162.306,93

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/07/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/07/2023

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3210753



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000419
 Data e Hora de Emissão:
19/07/2023 10:58:47
 Código de Verificação:
V9J2-AVQX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-521/BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
 Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE OBRA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, SITUADA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA
 N CONTRATO N 260/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 , PERÍODO 12/07/23 a 18/07/23
 VALOR TOTAL: R\$ 162.306,93
 Valor Material 40%: R\$ 64.922,77
 Base de cálculo do INSS 60%: 97.384,16 x 11% R\$: 10.712,26
 Valor do ISS 5%: R\$ 4.869,21
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 19/07/23 _____
 Assinatura

Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CRP 02830064-024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 162.306,93

CNAE:
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$): 64.922,77	Base de Cálculo (R\$): 97.384,16	Alíquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 4.869,21	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00
---	--	-------------------------------	--	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 10.712,26	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 4.869,21	Valor Líquido (R\$): 146.725,46
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	---

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

I.R.R.F

Nº DAM: 362199	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349		
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES		NÚMERO: 2539		
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 2.434,60	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.434,60	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.434,60
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 21/07/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 21/07/2023 08:54:55	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2023
Composição do Imposto/Lançamentos				
Valor do Tributo:	2.434,60	Vir. Devido sem Desconto (VD):	2.434,60	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.434,60
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo:	2.434,60	Vir. Devido com Desconto	2.434,60	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:				(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;				(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;				(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.434,60
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;				
4) NF Nº 0419 - Data de emissão: 19/07/2023.				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000024 . 2

34603906202 . 8

30731010100 . 0

00036219907 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000024 . 2

34603906202 . 8

30731010100 . 0

00036219907 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 362199	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 21/07/2023 08:54:56	DATA VENCIMENTO: 31/07/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.434,60
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.434,60



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 362200		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539		
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		
UF: BA						
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 97.384,16	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 4.869,21		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 4.869,21	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/07/2023		MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 21/07/2023 08:58:08	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2023	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 0419 - DATA DE EMISSÃO: 19/07/2023				(-) VALOR DEVIDO - R\$	4.869,21	
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(+) MULTA DE MORA - R\$		
				(+) JUROS DE MORA - R\$		
				(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.869,21	



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8175000048 . 1

69213906202 . 4

30731010500 . 1

00036220012 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000048 . 1

69213906202 . 4

30731010500 . 1

00036220012 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho		Nº DAM: 362200	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 21/07/2023 08:58:08	DATA VENCIMENTO: 31/07/2023
INSCRIÇÃO				(-) VALOR DEVIDO - R\$	4.869,21
MP2 CONSTRUÇOES LTDA				(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.869,21





ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO 07			ACUMULADO		EXECUTADO (%)
		UNID	QUANT	P. UNIT S/BDI	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	331,92	404,94	4.859,28				12,00	4.859,28	100,00%
1.2	Barreção para Obras de Médio Porte Resaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	216,31	263,89	7.916,70				30,00	7.916,70	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	48,89	45,92	56,02	2.722,01				48,89	2.722,01	100,00%
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	31,21	289,18	328,39	10.249,05				31,21	10.249,05	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	38,72	119,11	145,31	5.626,40				38,72	5.626,40	100,00%
1.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	159,45	20,26	24,71	3.940,00				159,45	3.940,00	100,00%
1.7	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	13,00	15,45	18,84	244,92				13,00	244,92	100,00%
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1280,90	4,73	5,77	7.990,79				1280,90	7.990,79	100,00%
1.9	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	15,00	83,66	102,06	1.530,90				15,00	1.530,90	100,00%
1.10	Tápupe de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	0,00	23,91	29,17	-				0,00	-	#DIV/0!
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1091,05	9,34	11,39	12.427,05				1091,05	12.427,05	100,00%
1.12	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m) sem reaproveitamento	un	12,00	29,30	35,74	428,88				12,00	428,88	100,00%
1.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,11	6,10	7,44	367,93				48,11	367,93	100,00%
1.14	Remoção de tela galvanizada	m2	195,52	2,72	3,31	647,17				195,52	647,17	100,00%
1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3567,94	1,00	1,22	4.352,88				3567,94	4.352,88	100,00%
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	2.549,28	3.110,12	3.110,12				1,00	3.110,12	100,00%
1.17	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.184,29	1.420,43	1.420,43				1,00	1.420,43	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		0,00							0,00		100,00%
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	110,40	134,68	6.464,64				48,00	6.464,64	100,00%
3	FORTE		0,00							0,00		100,00%
3.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)											
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	57,81	5,44	6,63	363,28				57,81	363,28	100,00%
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,72	9,94	12,12	105,68				8,72	105,68	100,00%
3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificada, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - RZ	m²	8,72	12,54	15,29	133,32				8,72	133,32	100,00%
3.5	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m2	49,09	41,92	51,14	2.510,46				49,09	2.510,46	100,00%
3.6	MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"	m	21,80	98,66	120,36	2.623,84				21,80	2.623,84	100,00%
4	QUIOSQUE	un	1,00	50.433,33	61.528,66	61.528,66				1,00	61.528,66	100,00%
4.1	MOVIMENTO DE TERRA		0,00							0,00		100,00%
4.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,05	84,34	102,89	4.943,86				48,05	4.943,86	100,00%
4.2	INFRA ESTRUTURA		0,00							0,00		100,00%

Túlio Araújo
Engenheiro Civil
CRE-BA 30004124

4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	18,13	81,50	99,43	1.802,66			18,13		1.802,66	100,00%
4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	3,72	106,86	130,36	484,93			3,72		484,93	100,00%
4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,99	16,47	20,09	220,78			10,99		220,78	100,00%
4.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	8,11	2.338,65	2.850,71	23.119,25			8,11		23.119,25	100,00%
4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMIÇOS AF_06/2018	m²	87,69	35,96	43,87	3.846,96			87,69		3.846,96	100,00%
4.3	SUPER ESTRUTURA		0,00						0,00			#DIV/0!
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	8,11	2.338,65	2.850,71	23.119,25			8,11		23.119,25	100,00%
4.4	PISOS		0,00						0,00			#DIV/0!
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	150,56	29,11	35,51	5.346,38			150,56		5.346,38	100,00%
4.4.2	Piso de alta resistência 12,mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusivo argamassa de regularização	m	107,22	63,69	77,94	8.356,72			107,22		8.356,72	100,00%
4.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	43,34	46,97	57,30	2.483,38			43,34		2.483,38	100,00%
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		0,00						0,00			#DIV/0!
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	226,27	48,06	59,63	13.266,21			226,27		13.266,21	100,00%
4.6	REVESTIMENTO		0,00						0,00			#DIV/0!
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	452,23	3,75	4,57	2.066,69			452,23		2.066,69	100,00%
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	452,23	21,70	26,47	11.970,52			452,23		11.970,52	100,00%
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	132,72	41,60	50,75	6.735,54			132,72		6.735,54	100,00%
4.6.4	Revestimento cerâmico, para piso ou parede, 30 x 80 cm, Pontobelco, linha celim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	14,12	133,25	162,56	2.295,34			14,12		2.295,34	100,00%
4.7	PINTURA		0,00						0,00			#DIV/0!
4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59	9,94	12,12	3.703,75			305,59		3.703,75	100,00%
4.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59	2,22	2,70	825,09			305,59		825,09	100,00%
4.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,59	12,54	15,29	4.672,47			305,59		4.672,47	100,00%
4.7.4	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Deiquard FS ou similar- RT	m2	107,22	14,71	17,94	1.923,52			107,22		1.923,52	100,00%
4.8	CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA		0,00						0,00			#DIV/0!
4.8.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	3,64	4,44	66,60			15,00		66,60	100,00%
4.8.2	Bucha de redução curta de pvc frígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	23,00	4,20	5,12	117,76			23,00		117,76	100,00%
4.8.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,83	16,87	67,48			4,00		67,48	100,00%
4.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,10	19,42	92,10			5,00		92,10	100,00%
4.8.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	10,42	12,71	50,84			4,00		50,84	100,00%
4.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	49,00	4,43	5,40	264,60			49,00		264,60	100,00%
4.8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	5,37	6,55	111,35			17,00		111,35	100,00%

Willia Vitorino
Engenheira Civil
CR-1043/2006/124

4.8.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,91	12,09	24,18	-	2,00	24,18	100,00%
4.8.9	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	6,32	7,71	77,10	-	10,00	77,10	100,00%
4.8.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	7,65	9,33	27,99	-	3,00	27,99	100,00%
4.9	CAIXAS E RALOS		0,00					0,00		#DIV/0!
4.9.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	12,25	14,84	164,34	-	11,00	164,34	100,00%
4.9.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	11,00	39,32	47,97	527,67	-	11,00	527,67	100,00%
4.9.3	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00	548,45	669,10	2.007,30	-	3,00	2.007,30	100,00%
4.9.4	PROLONGAMENTO P/CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, ESGOTO	un	11,00	2,41	2,94	32,34	-	11,00	32,34	100,00%
4.9.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00	26,94	32,86	98,58	-	3,00	98,58	100,00%
4.9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	310,73	379,09	758,18	2,00	2,00	758,18	100,00%
4.9.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	284,86	347,52	695,04	2,00	2,00	695,04	100,00%
4.9.8	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim: 1.60x0,80, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	6,00	817,82	897,74	5.986,44	6,00	6,00	5.986,44	100,00%
4.9.9	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	70,73	86,29	431,45	5,00	5,00	431,45	100,00%
4.9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,80x0,60, com 01 cuba de louça de empuflar, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	5,00	795,17	970,10	4.850,50	5,00	5,00	4.850,50	100,00%
4.9.11	TORNEIRA CROMADA TURO MÓVEL DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	91,56	111,70	670,20	6,00	6,00	670,20	100,00%
4.10	TUBOS RÍGIDOS		0,00					0,00		#DIV/0!
4.10.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	58,47	10,59	12,91	754,84	-	58,47	754,84	100,00%
4.10.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	102,10	12,54	15,29	1.581,10	-	102,10	1.581,10	100,00%
4.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO. AF_12/2014	M	29,65	22,84	27,86	826,04	-	29,65	826,04	100,00%
4.10.4	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	105,68	21,50	26,23	2.771,98	-	105,68	2.771,98	100,00%
4.10.5	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d= 75mm	m	15,27	38,08	46,45	709,29	-	15,27	709,29	100,00%
4.10.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	23,89	19,62	23,93	571,68	-	23,89	571,68	100,00%
4.10.7	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,15	13,73	16,75	253,76	-	15,15	253,76	100,00%
4.11	REGISTROS DE VALVULAS		0,00					0,00		#DIV/0!
4.11.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	17,86	21,78	65,34	-	3,00	65,34	100,00%
4.11.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	32,80	40,01	240,06	-	6,00	240,06	100,00%
4.11.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	27,94	34,08	272,64	-	8,00	272,64	100,00%
4.11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	5,66	6,78	108,48	-	16,00	108,48	100,00%
4.12	ELEMENTOS DE INSPEÇÃO		0,00					0,00		#DIV/0!
4.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	364,83	445,09	1.335,27	3,00	3,00	1.335,27	100,00%
4.12.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	291,29	355,37	355,37	1,00	1,00	355,37	100,00%
4.12.3	Miclório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4608180) e registro de pressão (deca linha c60 ref r1416) ou similares	un	4,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00%
4.12.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	130,02	156,62	2.855,16	-	18,00	2.855,16	100,00%
4.12.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos meaçãos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	13,00	130,02	156,62	2.062,06	-	13,00	2.062,06	100,00%
4.13	ESGOTO		0,00					0,00		#DIV/0!
4.13.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	10,84	13,22	13,22	-	1,00	13,22	100,00%

Julia Volpato
Engenheira Civil
CRF-BA 30004/24

4.13.2	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	4,00	7,20	8,78	35,12	-	4,00	35,12	100,00%
4.13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	10,33	12,60	63,00	-	5,00	63,00	100,00%
4.13.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	21,91	26,73	53,46	-	2,00	53,46	100,00%
4.13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	9,74	11,88	83,16	-	7,00	83,16	100,00%
4.13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	8,99	10,96	295,92	-	27,00	295,92	100,00%
4.13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	16,99	20,72	62,16	-	3,00	62,16	100,00%
4.13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	21,95	26,77	80,31	-	3,00	80,31	100,00%
4.13.9	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	8,10	9,88	158,08	-	16,00	158,08	100,00%
4.13.10	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	13,58	16,56	49,68	-	3,00	49,68	100,00%
4.13.11	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	16,89	20,60	103,00	-	5,00	103,00	100,00%
4.13.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,87	13,01	26,02	-	2,00	26,02	100,00%
4.13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	17,86	21,78	65,34	-	3,00	65,34	100,00%
4.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00					0,00		#DIV/0!
4.14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	72,00	2,58	3,14	226,08	-	72,00	226,08	100,00%
4.14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	233,54	3,78	4,61	1.076,61	-	233,54	1.076,61	100,00%
4.14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	123,20	8,45	10,30	1.288,96	-	123,20	1.288,96	100,00%
4.14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	325,20	13,94	17,00	5.528,40	-	325,20	5.528,40	100,00%
4.14.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,27	8,10	9,88	1.208,02	-	122,27	1.208,02	100,00%
4.14.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,04	12,81	15,62	2.312,38	-	148,04	2.312,38	100,00%
4.14.7	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embuíl, p/eletroduto - Rev.01	un	31,00	11,51	14,04	435,24	-	31,00	435,24	100,00%
4.14.8	CAIXA OTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	10,13	12,35	160,55	-	13,00	160,55	100,00%
4.14.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	41,27	50,94	402,72	-	8,00	402,72	100,00%
4.14.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	12,03	14,67	117,36	-	8,00	117,36	100,00%
4.14.11	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	5,36	6,53	104,48	-	16,00	104,48	100,00%
4.14.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	6,00	57,04	69,58	417,48	-	6,00	417,48	100,00%
4.14.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	52,93	64,57	774,84	-	12,00	774,84	100,00%
4.14.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	61,78	75,37	904,44	-	12,00	904,44	100,00%

4.14.15	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00	289,97	353,76	2.122,56			6,00	2.122,56	100,00%
4.14.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	14,62	17,83	231,79			13,00	231,79	100,00%
4.14.17	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref 5SM1 314-0MB, Siemens ou similar	un	6,00	159,07	194,06	1.164,36			6,00	1.164,36	100,00%
4.14.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	26,92	32,64	197,04			6,00	197,04	100,00%
4.14.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	28,50	34,77	417,24			12,00	417,24	100,00%
4.14.20	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	14,97	18,26	237,38	13,00	237,38	13,00	237,38	100,00%
4.14.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	85,31	104,07	624,42			6,00	624,42	100,00%
4.15	ESQUADRIAS		0,00						0,00		#DIV/0!
4.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	576,08	702,81	2.811,24			4,00	2.811,24	100,00%
4.15.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	582,48	710,62	4.283,72			6,00	4.283,72	100,00%
4.15.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,73	191,22	233,28	5.769,01			24,73	5.769,01	100,00%
4.15.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,91	224,96	274,45	524,19			1,91	524,19	100,00%
4.15.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	595,25	726,20	726,20			1,00	726,20	100,00%
4.15.6	Relevo em granito branco, siena, polido, c/largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	24,00	126,14	153,89	3.693,36			24,00	3.693,36	100,00%
4.16	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		0,00						0,00		#DIV/0!
4.16.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	151,93	185,35	2.038,65	4	741,40	11,00	2.038,65	100,00%
4.17	COBERTURA		0,00						0,00		#DIV/0!
4.17.1	Esutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 9,0 a 10,0m, pritado 1 d oxidio ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto fom. Telhas - Executada	m2	160,17	161,89	197,50	31.633,57			160,17	31.633,57	100,00%
4.17.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	160,17	77,00	93,94	15.046,36			160,17	15.046,36	100,00%
4.17.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	28,50	150,06	183,09	5.218,06			28,50	5.218,06	100,00%
4.18	LAJE		0,00						0,00		#DIV/0!
4.18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,88	2.336,65	2.850,71	2.509,62			0,88	2.509,62	100,00%
4.18.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	1,06	117,04	142,78	154,20			1,06	154,20	0,00%
5	PERGOLADO	un	6,00	27,08	33,03	193,18			6,00	193,18	0,00%
5.1	INFRA ESTRUTURA		0,00						0,00		#DIV/0!
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	15,30	81,50	99,43	1.521,27			15,30	1.521,27	100,00%
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	11,76	27,48	33,52	394,19			11,76	394,19	100,00%
5.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	3,54	2.336,65	2.850,71	10.091,51			3,54	10.091,51	100,00%
5.2	SUPER ESTRUTURA		0,00						0,00		#DIV/0!
5.2.1	Parafuso auto-arranchante p/ telha, c/ porca - 2 aruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	112,00	2,21	2,69	301,28			112,00	301,28	100,00%

5.2.2	Medeiramento em massarandubá para telhado, peça principal serrada 20cm x 20cm, com abertura de encaixes	m	84,00	313,29	382,21	32.105,64				84,00	32.105,64	100,00%
5.3	COBERTURA											
5.3.1	Medeiramento em massarandubá/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	131,64	166,64	203,30	26.762,41				131,64	26.762,41	100,00%
5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019	m²	187,50	87,13	81,89	15.354,37				187,50	15.354,37	100,00%
5.3.3	FORRO DE BAMBUI PARA PERGOLADO, GAZEBO, RESTAURANTE -	m²	187,50	90,60	110,53	20.724,37	77,50			8.566,07	20.724,37	100,00%
5.4	PINTURA											
5.4.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	146,24	17,12	20,88	3.053,49				146,24	3.053,49	100,00%
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	246,90	2,58	3,14	775,26	246,90			775,26	775,26	100,00%
5.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	70,00	13,99	17,06	1.194,20	70,00			1.194,20	1.194,20	100,00%
5.5.3	Soclete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MIT-2233, marca Decorlux ou similar	un	70,00	8,41	10,26	718,20	70,00			718,20	718,20	100,00%
6	CANTEIROS E BANCOS											
6.1	INFRA ESTRUTURA											
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	20,25	106,86	130,36	2.639,79				20,25	2.639,79	100,00%
6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_09/2017	m²	67,58	16,47	20,09	1.357,68				67,58	1.357,68	100,00%
6.2	ALVENARIA											
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	265,37	48,06	58,63	15.558,64				265,37	15.558,64	100,00%
6.3	REVESTIMENTO											
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	570,55	3,75	4,57	2.607,41				570,55	2.607,41	100,00%
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	570,55	21,70	26,47	15.102,45				570,55	15.102,45	100,00%
6.4	PINTURA											
6.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	570,55	12,54	15,29	8.723,70				570,55	8.723,70	100,00%
6.4.2	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	18,00	98,68	120,36	2.166,48				18,00	2.166,48	100,00%
6.5	ELETRICA											
6.5.1	Manqueira 2F LED BR 13MM 12TV G-Light ou similar	m	76,50	19,25	23,48	1.796,22	76,50			1.796,22	1.796,22	100,00%
6.6	PINTURA											
6.6.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	63,40	17,12	20,88	1.323,79				63,40	1.323,79	100,00%
6.7	MADEIRA											
6.7.1	Medeiramento em massarandubá/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ feita ondulada emit 8 mm	m²	31,70	44,91	54,79	1.736,84				31,70	1.736,84	100,00%
6.8	BANCO TIPO PETRICOR DE CONCRETO											
6.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	0,70	2.336,65	2.850,71	1.995,49				0,70	1.995,49	100,00%
6.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	m²	51,38	9,94	12,12	622,72				51,38	622,72	100,00%
6.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	51,38	2,22	2,70	136,72				51,38	136,72	100,00%
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	51,38	12,54	15,29	785,60	51,38			785,60	785,60	100,00%
6.8.5	Medeiramento em massarandubá/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e rtpa 5 x 1,5cm	m²	17,22	126,70	154,57	2.661,69				17,22	2.661,69	100,00%
6.8.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	34,44	17,12	20,88	719,10				34,44	719,10	100,00%
7	PISO PRINCIPAL											
7.1	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	m²	325,59	61,80	75,39	24.546,23				325,59	24.546,23	100,00%
7.2	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	m²	2257,81	57,63	70,30	158.724,04				2257,81	158.724,04	100,00%

7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 60X60X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	203,95	35,29	43,05	8.790,04	-	203,95	8.790,04	100,00%
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	594,50	39,65	48,37	28.755,96	-	594,50	28.755,96	100,00%
7.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,00	139,50	170,19	-	-	0,00	-	#DIV/0!
7.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	62,88	74,82	91,28	5.739,68	-	62,88	5.739,68	100,00%
7.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M. AF_06/2018	UN	20,00	114,14	139,25	2.765,00	-	0,00	-	0,00%
7.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	52,00	60,40	73,68	3.831,36	-	0,00	-	0,00%
7.9	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	626,60	17,88	21,81	13.666,14	-	626,60	13.666,14	100,00%
7.10	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	un	4,00	796,14	871,29	3.865,16	-	4,00	3.865,16	100,00%
7.11	SEIXO BRANCO	kg	975,00	1,17	1,42	1.384,50	-	975,00	1.384,50	100,00%
8	ESTACIONAMENTO		0,00					0,00		#DIV/0!
8.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	105,00	22,90	27,93	2.932,65	105,00	105,00	2.932,65	100,00%
9	ACADEMIA		0,00					0,00		#DIV/0!
9.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.764,94	4.593,22	4.593,22	1,00	1,00	4.593,22	100,00%
9.3	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.539,41	3.098,08	3.098,08	1,00	1,00	3.098,08	100,00%
9.3	INSTALAÇÃO DE ROTACÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1.	UN	2,00	2.210,88	2.897,27	5.394,54	2,00	2,00	5.394,54	100,00%
9.4	INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021									
9.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.539,41	3.098,08	6.196,16	2,00	2,00	6.196,16	100,00%
9.5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.009,77	2.451,91	2.451,91	1,00	1,00	2.451,91	100,00%
9.6	Briquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	10.810,09	13.188,30	13.188,30	1,00	1,00	13.188,30	100,00%
10	ILUMINAÇÃO		0,00					0,00		#DIV/0!
10.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	4,00	2.621,62	3.198,37	12.793,48	-	4,00	12.793,48	100,00%
10.2	Luminária em LED para iluminação pública 50W/bivolt, Seio A Imetro corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	16,00	896,13	1.083,27	17.492,32	-	16,00	17.492,32	100,00%
10.3	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Compost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	42,00	1.454,42	1.774,39	74.524,38	-	42,00	74.524,38	100,00%
10.4	Luminária em LED para iluminação pública 30W/bivolt, Seio A Imetro corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w, gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	84,00	530,96	647,77	54.412,68	-	84,00	54.412,68	100,00%
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,00	12,81	15,62	4.764,10	-	305,00	4.764,10	100,00%
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	848,00	8,45	10,30	8.734,40	-	848,00	8.734,40	100,00%
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	21,32	26,01	520,20	-	20,00	520,20	100,00%
10.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	46,00	111,49	136,01	6.256,46	-	46,00	6.256,46	100,00%
10.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	56,56	71,44	142,88	-	2,00	142,88	100,00%
10.11	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	289,97	353,76	707,52	-	2,00	707,52	100,00%
10.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	1,00	57,04	69,58	69,58	-	1,00	69,58	100,00%
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/6 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	85,31	104,07	208,14	-	2,00	208,14	100,00%
10.14	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00	122,27	149,16	149,16	-	1,00	149,16	100,00%



Jéssica Wajido
 Engenharia Civil
 CREA: 104.300/1-13A

10.15	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T. RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	689,44	816,71	816,71	816,71	-	1,00	816,71	100,00%
10.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.465,40	1.812,18	1.812,18	1.812,18	-	1,00	1.812,18	100,00%
10.17	FORTE										
10.17.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	3,78	4,81	483,27	483,27	-	0,00	483,27	#DIV/0!
10.17.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,50	12,81	15,62	835,67	835,67	-	53,50	835,67	100,00%
10.17.3	ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THÖLZ	un	8,00	448,13	547,93	4.363,44	4.363,44	6,00	6,00	3.287,88	75,00%
11	PLACA DE INAUGURAÇÃO										
11.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	15,00	449,67	548,59	8.228,85	8.228,85	-	3,36	1.843,26	22,40%
11.2	Mangueira 2F LED BR 13MM 12TV G-Light ou similar	m	11,20	19,25	23,48	262,97	262,97	-	0,00	-	0,00%
12	AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO										
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00						0,00		#DIV/0!
12.1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1813,08	9,34	11,39	20.650,98	20.650,98	-	1813,08	20.650,98	100,00%
12.3	PAVIMENTAÇÃO E CANTEIRO										
12.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1813,08	70,41	85,90	155.743,57	155.743,57	-	0,00	-	#DIV/0!
12.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,86	43,31	52,83	5.328,43	5.328,43	-	100,86	5.328,43	100,00%
12.3.3	Grama esmeralada em placas, fornecimento e plantio	m²	15,40	17,88	21,81	335,87	335,87	-	15,40	335,87	100,00%
12.3.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_06/2018	UN	9,00	303,20	369,90	3.329,10	3.329,10	9	9,00	3.329,10	100,00%
12.3.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	4,79	74,82	91,28	437,23	437,23	4,79	4,79	437,23	100,00%
12.9	SINALIZAÇÃO										
12.9.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	4,10	599,14	730,95	2.996,89	2.996,89	4,10	4,10	2.996,89	100,00%
12.11	SERVIÇOS FINAIS										
12.11.1	Limpeza geral	m²	0,00	1,92	2,34	12.591,58	12.591,58	5381,02	5381,02	12.591,58	100,00%
	SERVIÇOS NOVOS										
13	SERVIÇOS PRELIMINARES										
13.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	544,00	119,79	146,14	79.500,16	79.500,16	-	544,00	79.500,16	100,00%
13.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016	m³	711,86	84,34	102,89	73.243,27	73.243,27	-	711,86	73.243,27	100,00%
14	PISO DO PASSOÍ										
14.1	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,45	61,77	75,36	28.746,07	28.746,07	-	0,00	-	#DIV/0!
14.2	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	381,45	27,75	33,86	12.915,89	12.915,89	-	381,45	12.915,89	100,00%
14.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	381,45	2,11	2,57	980,32	980,32	-	381,45	980,32	100,00%
14.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	381,45	30,87	37,66	14.365,40	14.365,40	-	381,45	14.365,40	100,00%
15	PARQUE INFANTIL										
15.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusive cola, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	93,01	55,08	67,20	6.250,27	6.250,27	93,01	93,01	6.250,27	100,00%
15.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	93,01	61,77	75,36	7.009,23	7.009,23	-	93,01	7.009,23	100,00%
15.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	93,01	27,75	33,86	3.149,31	3.149,31	-	93,01	3.149,31	100,00%
15.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	93,01	2,11	2,57	239,03	239,03	-	93,01	239,03	100,00%
15.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,40	27,56	33,62	1.358,24	1.358,24	-	40,40	1.358,24	100,00%
15.6	Piso (lã) direcional e de alergia, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-r, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	80,01	82,89	101,13	8.091,41	8.091,41	-	80,01	8.091,41	100,00%

15.7	M	40,40	299,29	365,13	14.751,25	-	40,40	14.751,25	-	-	-	-	104,55	139,19	169,81	17.753,63	17.753,63	100,00%														
15	MP	104,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%														
15.8	MP	104,55	139,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%														
TOTAL MEDICÃO 06:															R\$	162.306,93	R\$	1.519.890,13	R\$	17.753,63	R\$	14.751,25	R\$	17.753,63	R\$	104,55	R\$	139,19	R\$	169,81	R\$	100,00%
TOTAL ACUMULADO:															R\$	1.506.173,53	R\$	162.306,93	R\$	17.753,63	R\$	14.751,25	R\$	17.753,63	R\$	104,55	R\$	139,19	R\$	169,81	R\$	99,03%

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 07: R\$ 162.306,93 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e seis reais e noventa e três centavos.)

Júlia Patrícia
 Engenharia Civil
 CREA-SP 104177-3/2014

Carroll
 Engenharia
 Rua ...
 CEP: ...

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070604063153135539

Informação obtida em 17/07/2023 15:46:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 13832444/2023

Expedição: 03/04/2023, às 08:49:04

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:15:43 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **9BA6.59EA.5E4D.06E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20233878133**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 163473

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 11:14:55 horas do dia 04/07/2023.

Válida até dia 03/08/2023.

Código de controle da certidão: **3E89.0FBC.411A.8477.1807.4042.6DC2.E190**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/06/2023 13:41:07.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ga8gPU31BrQ00000.SFP é:

29490251-d53f-46dd-ba27-c3eb736d8b0f

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 06/2023

NRA: Ga8gPU31BrQ00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ0000-0
 COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° CONTROLE: DlaiJdgOm810000-4 INSCRIÇÃO: 900045580171
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	301,54	0,00	0,00	0,00	301,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	750,92	0,00	0,00	0,00	750,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	112,63	0,00	0,00	0,00	112,63
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.165,09	0,00	0,00	0,00	1.165,09
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	217,76	0,00	0,00	0,00	217,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	217,76	0,00	0,00	0,00	217,76
TOTAL A RECOLHER	217,76	0,00	0,00	0,00	217,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/06/2023
HORA: 13:39:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE INSCRIÇÃO: 900045580171

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	31.089,31	1.165,09	29.924,22

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 815,57

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 8580000000038 003601802300 7076782000825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 N° ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ00000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 06/2023
 N° CONTROLE: IcrrQnpH8ac00000-2
 TOMADOR/OBRA : TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO INSCRIÇÃO: 900045580171 N° CONTROLE: DlaiJdgOm810000-4
 LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
 DOUTOR CELINO GOMES DA SILVA OURO NEGRO CANDEIAS 43805190 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 3.754,61	REM SEM 13° SALÁRIO 3.754,61
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 300,36
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 3.754,61	REM SEM 13° SALÁRIO 3.754,61	REM SEM 13° SALÁRIO 3.754,61
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 301,54	301,54	DEPÓSITO 300,36
VAL DEVIDO PREV SOC 217,76	217,76	ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
8580000000038 003601802300 707678200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 06/2023
N° ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ00000-0
N° CONTROLE: IcrfQnpH8ac00000-2

TOTAIS DA EMPRESA	
VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 3.754,61	REM SEM 13° SALÁRIO 3.754,61
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 301,54	DEPÓSITO 300,36
VAL DEVIDO PREV SOC 217,76	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 2
	TOTAL A RECOLHER 300,36

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 003601802300 707678200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA	COD GPS: 2216	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98					
COMP: 06/2023	COD REC: 155	TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00					
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE						INSCRIÇÃO: 900045580171					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELISEU PEREIRA COSTA	0,00	0,00	124.80425.44-6		16/03/2022	01				07170	
1.400,22			0,00		107,83				112,01	0,00	
GEOVANE DOS SANTOS PINTO	0,00	0,00	200.52036.03-5		08/12/2020	01				07155	
2.354,39			0,00		193,71				188,35	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR											
3.754,61	0,00	0,00	0,00		301,54				300,36	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 003601802300 707678200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 06/2023 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: DiaJggOm810000-4
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171

CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.754,61	0,00	3.754,61	0,00
TOTAIS:	2	3.754,61	0,00	3.754,61	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: DiaJdgOm810000-4
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 217,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 301,54
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 31.089,31
VALOR ABATIDO: 1.165,09 VALOR A COMPENSAR: 29.924,22 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 815,57

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000038 003601802300 707678200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: IcrfQnpH8ac0000-2 N° ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ0000-0
COMP: 06/2023 COD REC: 155 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.754,61	0,00	3.754,61	0,00
TOTALS:	2	3.754,61	0,00	3.754,61	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 003601802300 707678200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: IcrRQnpH8ac0000-2 N° ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ0000-0
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.754,61
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
300,36	0,00	0,00	0,00	300,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GFS: 202
TOMADOR/OBRA: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
UF: BA CEP: 41820-021
Nº DE CONTROLE: IcrRQnpH8ac0000-2
FAZ: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: Ga8gPU31BrQ0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
CIDADE: SALVADOR
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 217,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 301,54
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 31.089,31
VALOR ABATIDO: 1.165,09 VALOR A COMPENSAR: 29.924,22 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 815,57

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	54101492 / Reinf CP 20762774665 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.275,79	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 23.493,50	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.791,30	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 137,41	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 37.698,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/07/2023 12:12:16
Nº do recibo de entrega	0000050000147485796

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MP2 CONSTRUCOES LTDA	900045580171	0,00	0,00	0,00	2216	507
		0,00	0,00	0,00	217,76	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98						
VALOR COMPENSADO: R\$ 1.165,09 - 05/2021 A 05/2021						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 30/06/2023

HORA: 13:39:09

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.754,61

DEPÓSITO

300,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

300,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO – REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benicio Viana

**FOTO 01 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014**



FOTO 02 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benicio Viana

FOTO 03 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMÍNIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR - R2



FOTO 04 - MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benicio Viana


FOTO 05 - MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"



FOTO 06 - MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3090041424


CAMILA FERREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
Nº 02.012.100/2018
CNPJ: 24.597.344/0001-02

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benicio Viana

FOTO 07 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



FOTO 08 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
C.R.C. 14.700/041424

CAMILA
CRISTINA
MPO CONSULTORIA E OBRAS
CNPJ: 24.097.344/0001-05

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 09 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.



FOTO 10 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424


CAMILA P. S. S. S.
CREA-BA 3000041424
M.T. 2 00000000000000000000
CNPJ 24 507 9440001-06

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benicio Viana

FOTO 11 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.



FOTO 12 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

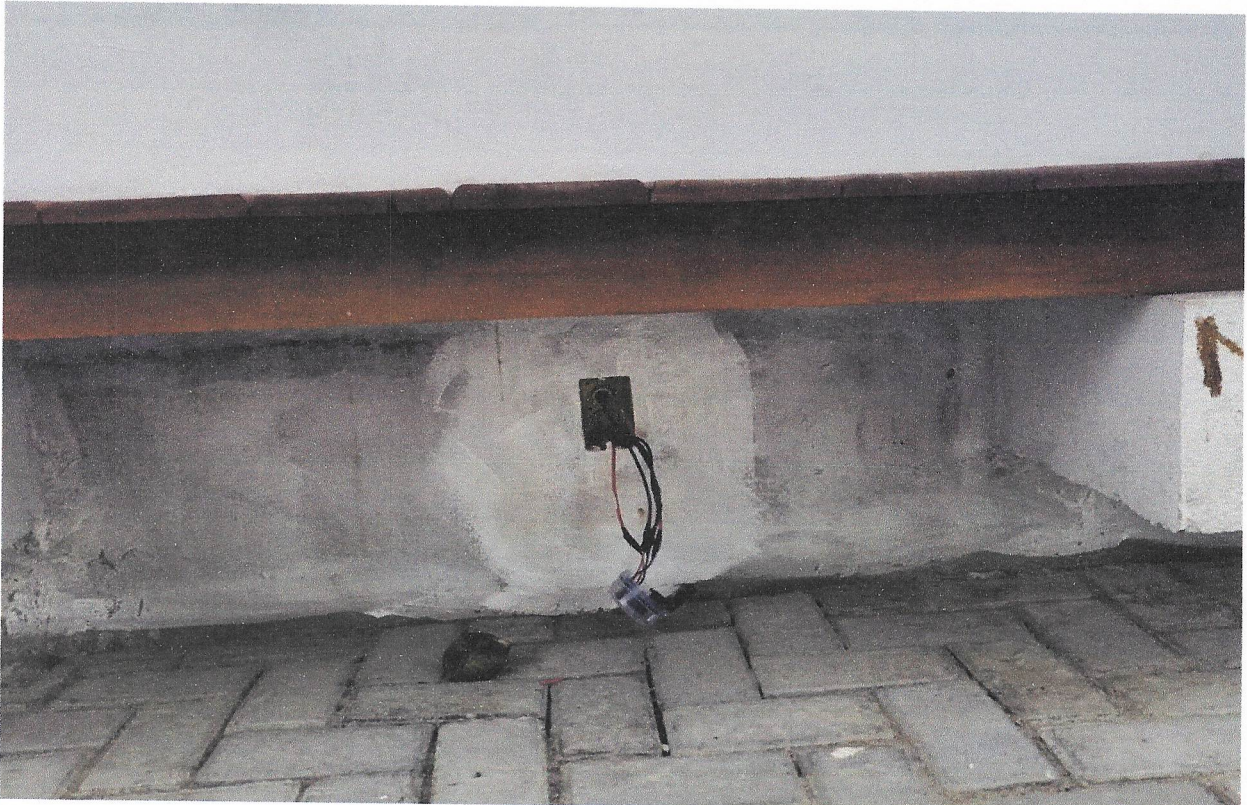

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 13 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020



FOTO 14 - SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

CAMILA A. S. SILVA
CREA-BA 3000041424
MPE CONSULTORIA E ENR
CNPJ 24.507.544/0001-85

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 15 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

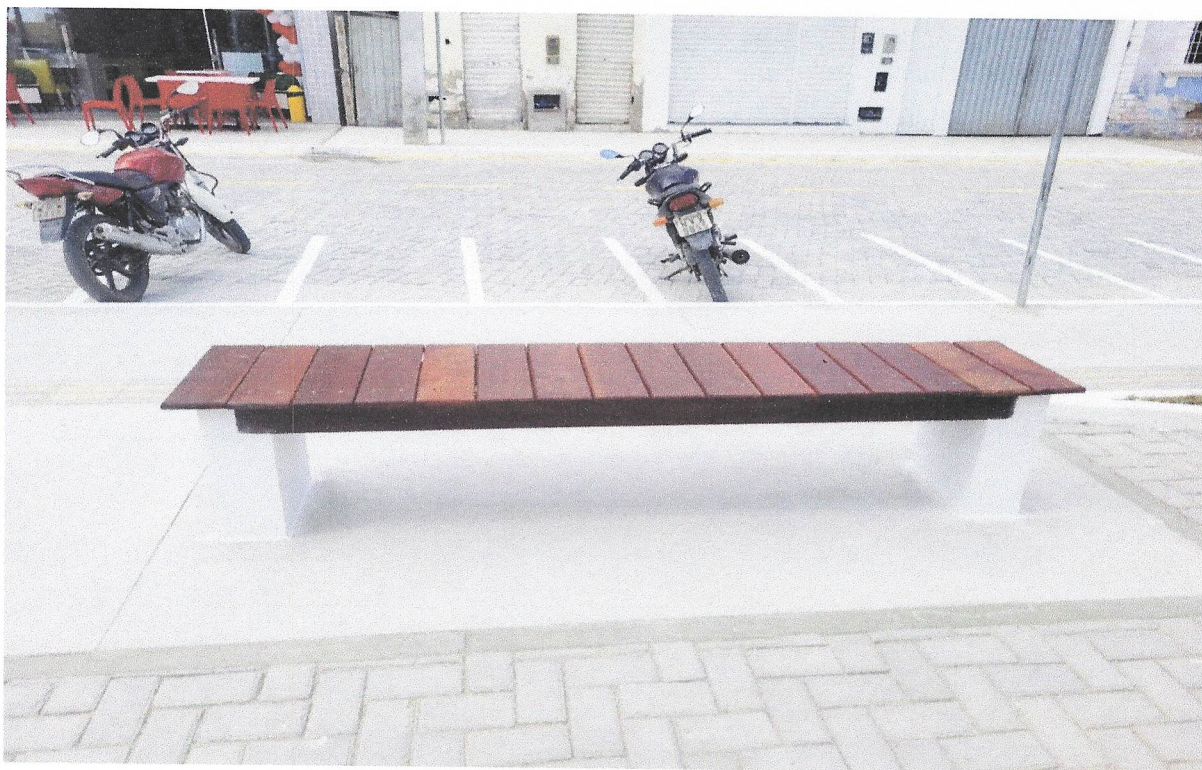


FOTO 16 - SEIXO BRANCO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 17 - PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021



FOTO 18 - PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 19 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01



FOTO 20 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 21 - INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

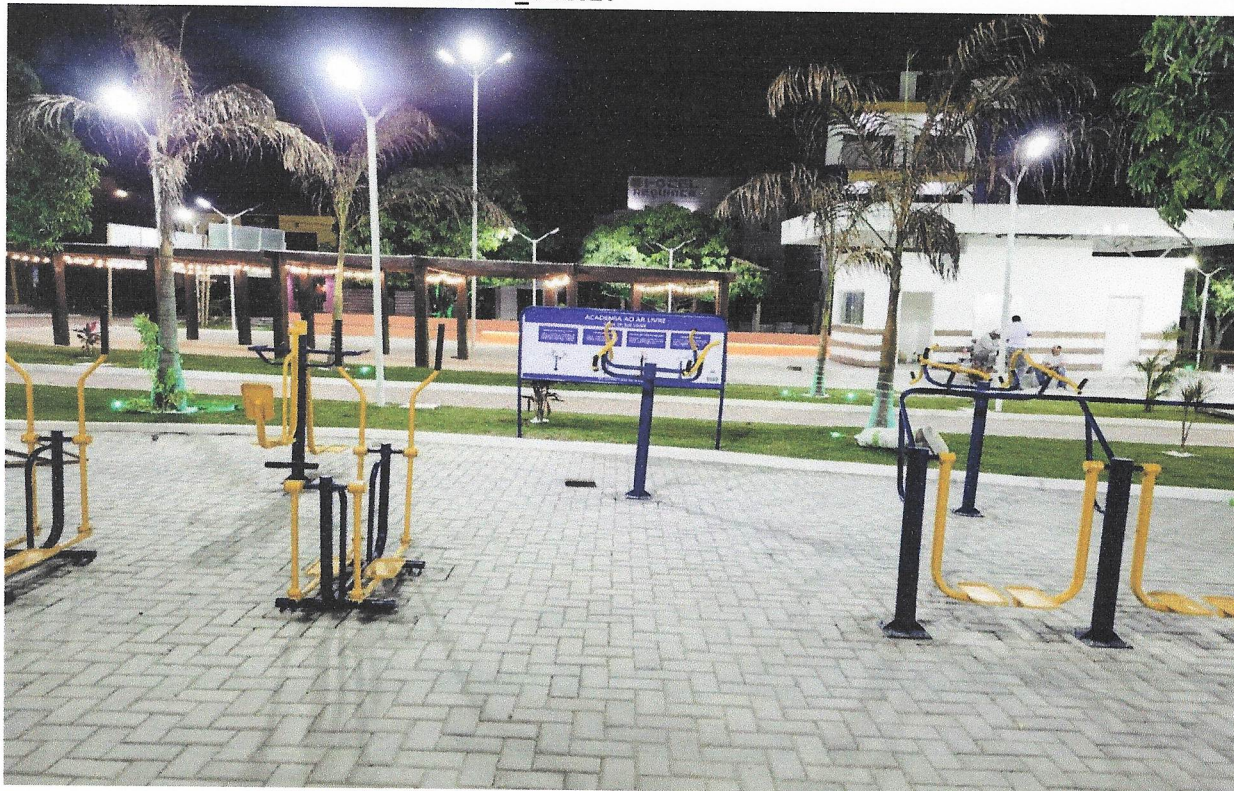


FOTO 22 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 23 - INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021



FOTO 24 - BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benicio Viana

FOTO 25 - ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THOLZ



FOTO 26 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 27 - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA



FOTO 28 - LIMPEZA GERAL

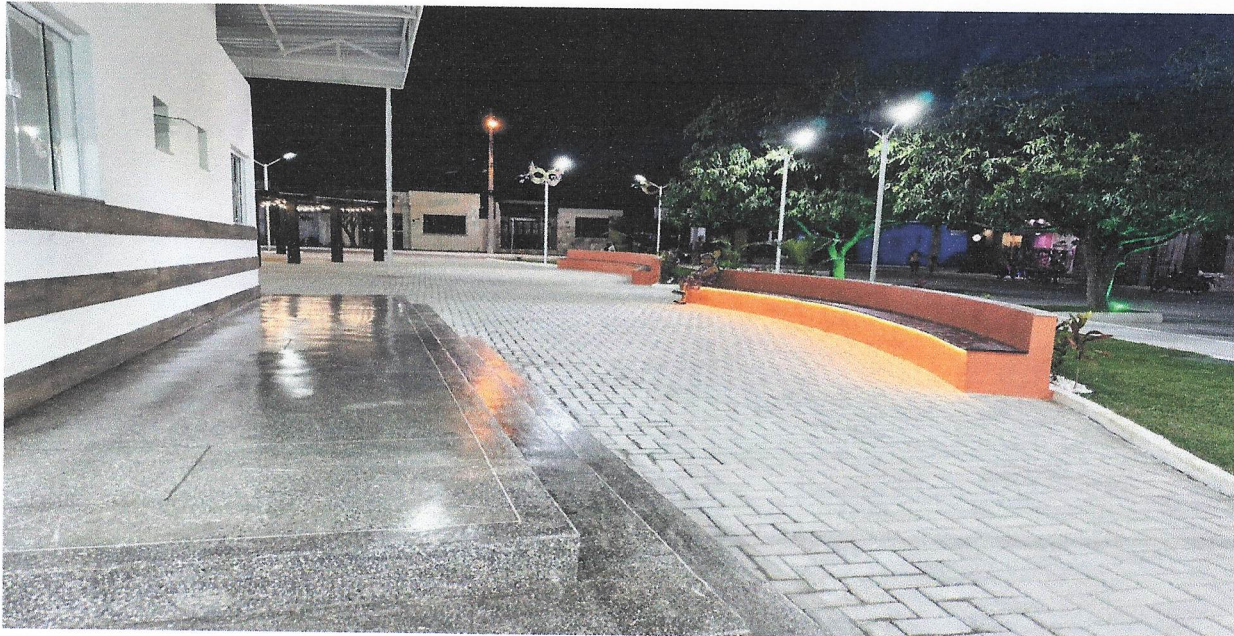

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
C.R.C. Nº 3000041424

CAMILLA
C.R.C. Nº 3000041424
M.P. Nº 24.537.3440001-98

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benicio Viana

FOTO 29 - LIMPEZA GERAL



FOTO 30 - LIMPEZA GERAL



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
C.R.C. Nº 3000041424

CAMILLA
C.R.C. Nº 3000041424
M.B. L. Nº 24.527-344/0001-08
CNPJ Nº 24.527-344/0001-08


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
18/07/2023	Santaluz	Reforma Da Praça Major Benício Viana

FOTO 31 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA




FOTO 32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				12/07/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL		S T Q Q S S D						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÉNICIO		EFETIVO PESSOAL		S T Q Q S S D						
CONTRATO N° 260-2022		LICITAÇÃO N° 004-2022		RDO: 1		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
PINTURA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA INSTALAÇÃO DE JANELA INSTALAÇÃO DE CALHA INSTALAÇÃO TELHA DE FIBRA DE VIDRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO INSTALAÇÃO DO CERCADO EUCALIPTO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra 1						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 10						
				Calceteiro 5						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
Montador										
Montador/Eletricista 1										
Eletricista 1										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data: 12/07/2023						
Data: 12/07/2023		Data: 12/07/2023		Data: 12/07/2023						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

CAMILLA...
 CREA-BA...
 CPF: 24.597.549/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO				13/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 260-2022 LICITAÇÃO N° 004-2022 RDO: 2				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: 1 3) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA INSTALAÇÃO DE JANELA INSTALAÇÃO DE CALHA INSTALAÇÃO TELHA DE FIBRA DE VIDRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO INSTALAÇÃO DO CERCADO EUCALIPTO				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				10			
				Calçeteiro				5			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista				1			
				Eletricista				1			
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/07/2023				Data: 13/07/2023							



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

CAMILLA...
 CREA-BA 3000041424
 MP2...
 CNPJ: 24.597.349/0001-06


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO				14/07/2023	S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						CATEGORIA		QTDE
CONTRATO N° 260-2022 LICITAÇÃO N° 004-2022 RDO: 3				MÃO DE OBRA INDIRETA								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
PINTURA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA INSTALAÇÃO DE JANELA INSTALAÇÃO DE CALHA INSTALAÇÃO TELHA DE FIBRA DE VIDRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO INSTALAÇÃO DO CERCADO EUCALIPTO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 10 Calceteiro 5 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista 1 Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE.								
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/07/2023				Data: 14/07/2023								



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

CAMILLA...
 CREA-BA...
 MP2...
 CNPJ: 24.537.344/0001-96

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						15/07/2023							S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO				EFETIVO PESSOAL								
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 004-2022		RDO: 4		CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
						Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro 2								
						Ajudante Geral 10								
						Calceteiro 5								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista 1								
						Eletricista 1								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Serralheiro								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						QTDE.								
						Veiculo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 15/07/2023		Data: 15/07/2023												



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 CAVILLA ENGENHARIA
 CREA-BA 3000041424
 Nº 24.697.344/0001-98

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						16/07/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO		CONTRATO N° 260-2022 LICITAÇÃO N° 004-2022 RDO: 5				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calçeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 16/07/2023		Data: 16/07/2023											



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

CAMILA...
 CREA-BA 3000041424
 MP2 CONSTRUTORA S/A
 CNPJ: 24.597.344/0001-38


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				x							
				17/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO											
CONTRATO Nº 260-2022		LICITAÇÃO Nº 004-2022		RDO: 6		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
PINTURA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA INSTALAÇÃO DE JANELA INSTALAÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO DA ESTÁTUA " GARIMPEIRO"				Aux Adm							
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				10			
				Caleiteiro				5			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista				1			
				Eletricista				1			
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/07/2023				Data: 17/07/2023							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300041424

CARILLA DE
 CREA-BA
 Nº 300041424
 CNPJ 24.557.944/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MAJOR BÊNICO				18/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 260-2022 LICITAÇÃO Nº 004-2022 RDO: 7				CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA INSTALAÇÃO FONTE LUMINOSA INSTALAÇÃO ELÉTRICA				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra		1					
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		2					
				Ajudante Geral		10					
				Calceteiro		5					
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista		1					
				Eletricista		1					
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/07/2023				Data: 18/07/2023							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 CAMILLA
 CREA-BA
 MP2 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE)
 CNPJ 24.597.344/0001-98
