



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 179-2022

EMPENHO: 341 / 2023

Nº SUB-EMPENHO: 2226 Data do Sub-Empenho: 21/06/2023

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5422 - MP2 CONSTRUCOES LTDA
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673
 Cidade: SALVADOR
 CPF:
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 Tipo Pessoa: Jurídica
 Complemento: EDIF COND.GEO SALVADOR SHOPP
 Estado: BA
 RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
 Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)
 Data do Empenho: 10/03/2023

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar
 Convênio:
 Patrimônio: -
 Nº Lic.: 005-2022TP
 Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
105.792,43	92.738,17	13.054,26

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DA PRAÇA NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 282-2022, LICITAÇÃO Nº 005-2022TP. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/06/2023 A 19/06/2023. NFS-e.409.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
84.168,91	84.168,91	0,00

Data do Empenho: 10/03/2023

Data do Liquidação: 21/06/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM FONTE 90	1.262,53
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	2.525,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	5.555,15
## Setenta e quatro mil e oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos ##		9.342,75
Valor Retido		9.342,75
Valor Líquido		74.826,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/06/2023	409	U			84.168,91

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	84.168,91

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em
21/06/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em
21/06/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Contador(a)
 Matrícula: 6408

3197322



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO
CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 179-2022

EMPENHO: 341 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 2226 Data do Sub-Empenho: 21/06/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5422 - MP2 CONSTRUCOES LTDA**
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: Cidade: SALVADOR
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 CPF: Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
 Estado: BA
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. RG:

Tipo Pessoa: Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 10/03/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 005-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	105.792,43	92.738,17	13.054,26
Patrimônio: -				

HISTÓRICO


EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA PRAÇA NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº282-2022, LICITAÇÃO Nº005-2022TP.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
84.168,91	84.168,91	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	84.168,91	84.168,91


Oitenta e quatro mil e cento e sessenta e oito reais e noventa e um centavos ## 84.168,91

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/06/2023.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/06/2023



NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000409
 Data e Hora de Emissão:
19/06/2023 11:34:47
 Código de Verificação:
RU6B-LRMK

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021
BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19

Inscrição Municipal:

Endereço:
PRA CÔRONEI JOSÉ LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO POVOADO DA SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA
 OBRA Nº: 052/2022 TOMADA DE PREÇO Nº: 005/2022
 Nº DO CONTRATO: 282/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 179/2022
 BM: 04 PERÍODO: 01/06/23 a 19/06/23
 VALOR TOTAL: R\$ 84.168,91
 Valor Material 40%: R\$ 33.667,56
 VALOR DA MÃO DE OBRA: 60%: 50.501,35x 11% R\$: 5.555,15
 Valor do ISS 5%: R\$ 2.525,07
 Dados Bancários Bradesco Ag: 3673/ C/c: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$84.168,91

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$): 33.667,56	Base de Cálculo (R\$): 50.501,35	Alíquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 2.525,07	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00
---	--	-------------------------------	--	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 5.555,15	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 2.525,07	Valor Líquido (R\$): 76.088,69
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 06/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

FM 21/06/23

Assinatura



I.R.R.F

Nº DAM: 361568	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349			
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 1.262,53	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.262,53	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.262,53
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 21/06/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 21/06/2023 03:24:16	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.262,53	
Valor do Tributo: 1.262,53	Vir. Devido sem Desconto (VD):	1.262,53	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente:	Vir. do Desconto:	0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 1.262,53	Vir. Devido com Desconto:	1.262,53	(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF Nº 0409 - Data de emissão: 19/06/2023.			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.262,53	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000012 . 0 62533906202 . 2 30630010100 . 4 00036156807 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000012 . 0 62533906202 . 2 30630010100 . 4 00036156807 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 361568	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 21/06/2023 03:24:16	DATA VENCIMENTO: 30/06/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.262,53
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.262,53





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 361567	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES			NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 50.501,35	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.525,07	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.525,07
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 10/06/2023	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 21/06/2023 03:26:02	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 0409 - DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.525,07
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.525,07



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81780000025 . 6 25073906202 . 5 30630010500 . 5 00036156712 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

VIA CONTRIBUINTE



81780000025 . 6 25073906202 . 5 30630010500 . 5 00036156712 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 361567	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 21/06/2023 03:26:02	DATA VENCIMENTO: 30/06/2023
INSCRIÇÃO MP2 CONSTRUÇÕES LTDA			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.525,07
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.525,07



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão

MP2 CONSTRUCOES LTDA

Social:

Endereço:

AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/05/2023 a 27/06/2023

Certificação Número: 2023052901510580405635

Informação obtida em 01/06/2023 13:59:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20232523631**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 561.323/001-97

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 08:37:49 horas do dia 03/04/2023.
Válida até dia 02/07/2023.

Código de controle da certidão: **8C41.6DA6.EDEA.9D3B.27F7.4A3B.0917.1A84**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 13832444/2023
Expedição: 03/04/2023, às 08:49:04
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:15:43 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **9BA6.59EA.5E4D.06E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/05/2023 15:13:52.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FqmaUv50BVA00009.SFP é:

74fcdffc-4453-42f6-91b0-75fa962023b8

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 05/2023

NRA: FqmaUv50BVA00009

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	53040114 / Reinf CP 20332407204 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.037,28	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 20.073,60	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.951,06	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 154,05	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.215,99	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/06/2023 08:48:18
Nº do recibo de entrega	0000050000141127705

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FqmaUv50BVA0000-9
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: J7VJhbFBKbn0000-9
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023
 LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: JmVjA26dRvn0000-5
 TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO CIDADE CEP UF
 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 72.990,97
 REM BASE CALC 13° SAL 1.922,77

TOTAL TRABALHADORES 47

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 70.145,73
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.611,65
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 43

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 72.990,97
 REM BASE CALC 13° SAL 1.922,77
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.023,65
 VAL DEVIDO PREV SOC 1.761,82

TOTAL TRABALHADORES 47

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 70.145,73
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.611,65
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 43

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FqmaUv50BVA0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: J7VJhbFBKbn0000-9
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: OVD1Qn1ziXe0000-8
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS CEP 43815360 UF BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 7.929,33
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 7.929,33
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 682,88
VAL DEVIDO PREV SOC 2.966,51

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.929,33
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.929,33
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858600000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023
N° ARQUIVO: FqmaUv50BVA0000-9
N° CONTROLE: J7VJhbFBKbn0000-9
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	80.920,30	REM SEM 13° SALÁRIO	78.075,06
REM BASE CALC 13° SAL	1.922,77	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.706,53	DEPÓSITO	5.611,65
VAL DEVIDO PREV SOC	4.728,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	50	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	46
		TOTAL A RECOLHER	5.611,65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2023
HORA: 15:07:19
PÁG: 0001/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8586000000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
NOME TRABALHADOR ----- PIS/PASEP/CI ----- ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO ----- CEO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	313,57	3.229,78	137.52159.27-7	04/06/2020	01	05/05/2023	I1	03542
ELIAS DE JESUS SOUZA	650,09	1.983,65	783,93	82,30		0,00		0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	561,58	1.888,39	160.04546.60-8	22/09/2022	01	12/05/2023	I1	07170
			583,43	92,50		0,00		0,00
			200.27016.77-8	19/09/2022	01	12/05/2023	I1	07170
			555,41	83,76		0,00		0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	RAT: 3,0		DEFÓSITO		CBO	
COMP: 05/2023 COD REC: 150	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00				JAM	
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13° SAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA				
REM 13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	
	BASE CÁL	PREV SOCIAL			FPAS: 507		
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	122.81157.24-7	0,00	0,00	15/09/2022	01	188,36	07152
2.354,39	0,00	0,00	193,71				0,00
FERNANDO GOMES PEDRA JUNIOR	162.07685.54-8	0,00	0,00	28/03/2023	01	178,65	07152
2.233,11	0,00	0,00	182,79				0,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	161.75862.38-5	0,00	0,00	23/05/2023	01	53,51	07155
668,87	0,00	0,00	50,16				0,00
GILEAN ALMEIDA SANTOS	206.32672.44-1	0,00	0,00	23/05/2023	01	53,50	07152
668,87	0,00	0,00	50,16				0,00
ISAIAS OLIVEIRA	122.04298.88-5	0,00	0,00	23/05/2023	01	53,51	07152
668,87	0,00	0,00	50,16				0,00
JEFERSON XAVIER FALCAO	149.71075.27-1	0,00	0,00	05/10/2022	01	53,51	07152
1.363,96	0,00	0,00	104,57				0,00
JOAO VITOR SILVA DOS SANTOS	212.89944.32-8	0,00	0,00	20/03/2023	01	109,12	07170
1.332,98	0,00	0,00	101,78				0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	161.88428.27-1	0,00	0,00	13/09/2022	01	106,63	07170
1.363,96	0,00	0,00	104,57				0,00
JOSE MARTINS DE CARVALHO	122.81299.75-0	0,00	0,00	20/03/2023	01	109,12	07170
1.332,98	0,00	0,00	101,78				0,00
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	161.90124.62-4	0,00	0,00	09/02/2023	01	106,64	07170
2.337,75	0,00	0,00	192,21				0,00
JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	200.12766.02-4	0,00	0,00	09/02/2023	01	187,03	07152
2.337,75	0,00	0,00	192,21				0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	126.17799.06-0	0,00	0,00	08/09/2022	01	187,02	07152
2.354,39	0,00	0,00	193,71				0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	206.81087.27-1	0,00	0,00	16/11/2022	01	188,36	07170
1.363,96	0,00	0,00	104,57				0,00
MANOEL REIS DOS ANJOS	114.35968.94-2	0,00	0,00	16/11/2022	01	109,11	07170
2.354,39	0,00	0,00	193,71				0,00
MARCELO FERREIRA DA PAZ	129.64314.44-8	0,00	0,00	08/09/2022	01	188,36	07152
1.490,22	0,00	0,00	115,93				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 05/2023 COD REG: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/UU01-98

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEFÓSITO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEFÓSITO	JAM
MARCIO PIRES XAVIER	0,00	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01				188,35	07152
2.354,39	0,00	0,00	0,00	193,71					0,00	0,00
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	0,00	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01				150,51	04110
1.881,42	0,00	0,00	0,00	151,14					0,00	0,00
NEI PIMENTA LEAL	0,00	114.43175.20-4	0,00	15/05/2023	01				155,55	07102
1.944,27	0,00	0,00	0,00	156,80					0,00	0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES	0,00	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01				119,22	07170
1.490,22	0,00	0,00	0,00	115,93					0,00	0,00
RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	0,00	201.94832.61-3	0,00	23/05/2023	01				53,50	07152
668,87	0,00	0,00	0,00	50,16					0,00	0,00
RAFAEL DA SILVA	0,00	130.72866.04-9	0,00	21/03/2023	01				106,64	07170
1.332,98	0,00	0,00	0,00	101,78					0,00	0,00
REINAN DE JESUS SANTOS	0,00	166.03551.62-5	0,00	09/02/2023	01				108,78	07170
1.359,83	0,00	0,00	0,00	104,20					0,00	0,00
ROBSON RIBEIRO DE JESUS	0,00	165.51599.53-3	0,00	23/05/2023	01				31,99	07170
399,89	0,00	0,00	0,00	29,99					0,00	0,00
ROBSON SANTOS VILELA	0,00	126.27464.06-1	0,00	20/03/2023	01				106,64	07170
1.332,98	0,00	0,00	0,00	101,78					0,00	0,00
ROMERIO DO CARMO NASCIMENTO	0,00	165.92566.36-2	0,00	23/03/2023	01				106,63	07170
1.332,98	0,00	0,00	0,00	101,78					0,00	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	0,00	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01				109,11	07170
1.363,96	0,00	0,00	0,00	104,57					0,00	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	0,00	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01				109,12	07170
1.363,96	0,00	0,00	0,00	104,57					0,00	0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	0,00	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01				109,12	07170
1.363,96	0,00	0,00	0,00	104,57					0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEFÓSITO JAM
 REM SEM 13° SAL 0,00 BASE CÁL PREV SOCIAL 0,00

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA 0,00 131.17567.06-1 01/07/2020 11 145,20 0,00 02521
 1.320,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 72.990,97

7.101,82

1.922,77

6.023,65

5.611,65

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000560 116501802307 607677180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: JmVjA26dRvn0000-5
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	70.145,73	0,00	71.670,97	1.922,77
11	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAIS:	47	71.465,73	0,00	72.990,97	1.922,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° DE CONTROLE: JmVJA26drvn0000-5

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: FqmaUv50BVA0000-9
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.761,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.023,65
SALÁRIO FAMÍLIA: 685,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 26.152,12
VALOR ABATIDO: 25.034,87 VALOR A COMPENSAR: 1.117,25 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 17.318,63

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98								
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00			
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS	INSCRIÇÃO: 9000/US28179								
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO			
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO			
		BASE CÁL PREV SOCIAL					CBO		
							JAM		
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.354,39	0,00	161.09316.11-4	11/08/2022	01	0,00	07152		
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	3.220,55	0,00	142.27586.27-1	11/08/2022	01	0,00	07102		
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.354,39	0,00	165.87470.26-3	11/08/2022	01	0,00	07152		
			0,00	193,71		0,00	0,00		
				295,46		0,00	0,00		
				193,71		0,00	0,00		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.929,33

0,00 0,00 682,88 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETRELI
 COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: OVDIqn1ziXe0000-8
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.929,33	0,00	7.929,33	0,00
TOTAIS:	3	7.929,33	0,00	7.929,33	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: OVDI0n1ziXe0000-8
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 N° ARQUIVO: FqmaUv50BVA0000-9
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 2.966,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 682,88
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 COMPENSAÇÃO VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL:
 VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO:
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° DE CONTROLE: J7VJhbFEKbn0000-9 N° ARQUIVO: FqmaUy50BVA0000-9
 COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	49	79.600,30	7.101,82	79.600,30	1.922,77
11	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTALS:	50	80.920,30	7.101,82	80.920,30	1.922,77

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° DE CONTROLE: J7VJhbFBkn0000-9 N° ARQUIVO: FqmaUv50BVA0000-9
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 INSCRIÇÃO:
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 70.145,73
QUANTIDADE TRABALHADORES 43

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.929,33
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.611,65	0,00	0,00	0,00	5.611,65

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° DE CONTROLE: J7VJhbFEkbn0000-9 N° ARQUIVO: FqmaUv50BVA0000-9
 COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 CEP: 41820-021 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.728,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.706,53
 SALÁRIO FAMÍLIA: 685,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 25.034,87 VALOR A COMPENSAR: 26.152,12
 PERÍODO FINAL: 1.117,25 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 17.318,63
 VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 26/05/2023
HORA: 15:07:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 05/2023

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150 FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

43

REMUNERAÇÃO

70.145,73

DEPÓSITO

5.611,65

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.611,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000593 241101802307 619677183827 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 19/06/2023**Competência:** 05/2023**Valor recolhido:** 5.924,11**Identificação da operação:** PG FGTS**Data / hora:** 19/06/2023 20:02:30**Data de Débito:** 19/06/2023**Código da operação:** 00586380**Chave de segurança:** 3U3Q06JR9594GZYG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2023 - 10:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.145,73	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.611,65	14-ENCARGOS 312,46	15-TOTAL A RECOLHER 5.924,11
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/06/2023

858000000593 241101802307 619677183827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2023 - 10:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.145,73	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.611,65	14-ENCARGOS 312,46	15-TOTAL A RECOLHER 5.924,11
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/06/2023

858000000593 241101802307 619677183827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2023 - 10:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.145,73	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.611,65	14-ENCARGOS 312,46	15-TOTAL A RECOLHER 5.924,11
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/06/2023

858000000593 241101802307 619677183827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2023 - 10:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.145,73	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.611,65	14-ENCARGOS 312,46	15-TOTAL A RECOLHER 5.924,11
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/06/2023

858000000593 241101802307 619677183827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	26.152,12	25.034,87	1.117,25

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 17.318,63

COMPETÊNCIA: 05/2023
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	MP2 CONSTRUCOES EIRELI	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
685,94	0,00	4.728,33	24.597.344/0001-98	685,94	0,00	0079	0,00	2119	507	0,00
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 25.034,87										

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FgmaUv50BVA0000-9
 COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 6.561,33 0,00 0,00 0,00 6.561,33
 Contribuintes Individuais 145,20 0,00 0,00 0,00 145,20
 EMPRESA

Empregados/Avulsos 16.304,60 0,00 0,00 0,00 16.304,60
 Contribuintes Individuais 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00
 RAT 2.445,68 0,00 0,00 0,00 2.445,68

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 685,94 0,00 0,00 0,00 685,94
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 25.034,87 0,00 0,00 0,00 25.034,87
 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 4.728,33 0,00 0,00 0,00 4.728,33
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 4.728,33 0,00 0,00 0,00 4.728,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEJA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO POVOADO DA SISALÂNDIA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/06/2023 a 19/06/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO POVOADO DA SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO: R\$ 84.168,91

OBRA Nº 052/2022
TOMADA DE PREÇO: 005/2022
Nº DO CONTRATO: 282/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 179/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 417,67	R\$ 2.506,02	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.506,02	R\$ 0,00	0,00%
1.2	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	271,36	R\$ 30,08	R\$ 8.182,51	0,00	R\$ 0,00	207,28	R\$ 6.234,88	R\$ 1.927,53	0,24%
	sub total				R\$ 10.668,53						
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	R\$ 134,68	R\$ 17.239,04	28,00	R\$ 3.771,04	128,00	R\$ 17.239,04	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 17.239,04						
3.0	MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	302,59	R\$ 106,12	R\$ 32.110,85	0,00	R\$ 0,00	302,59	R\$ 32.110,85	R\$ 0,00	0,00%
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3025,86	R\$ 1,25	R\$ 3.782,33	0,00	R\$ 0,00	3.025,86	R\$ 3.782,33	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 35.893,18						
4.0	PISO PRINCIPAL										
4.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	787,90	R\$ 56,52	R\$ 44.532,11	475,44	R\$ 26.871,70	475,44	R\$ 26.871,70	R\$ 17.660,41	2,20%
4.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	464,94	R\$ 63,07	R\$ 29.323,77	300,00	R\$ 18.921,00	300,00	R\$ 18.921,00	R\$ 10.402,77	1,30%
4.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	69,82	R\$ 94,14	R\$ 6.572,85	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.572,85	0,82%
4.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	698,17	R\$ 22,49	R\$ 15.701,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.701,84	1,96%

Bruno de Matos Santos


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAVALARI
CREA-BA Nº 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98


4.5	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	312,60	R\$ 49,89	R\$ 15.595,61	0,00	R\$ 0,00	312,60	R\$ 15.595,61	R\$ 0,00	0,00%
4.6	Melão-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	723,31	R\$ 35,62	R\$ 25.764,30	100,00	R\$ 3.562,00	523,31	R\$ 18.640,30	R\$ 0,00	0,89%
4.7	Rampa pedrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerla/direcional.	un	3,00	R\$ 391,97	R\$ 1.175,91	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,91	0,15%
4.8	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO,	m²	302,40	R\$ 27,99	R\$ 8.464,18	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.464,18	R\$ 0,00	1,06%
4.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	793,97	R\$ 104,67	R\$ 83.104,64	0,00	R\$ 0,00	667,81	R\$ 69.899,67	R\$ 13.205,17	1,65%
4.10	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	342,74	R\$ 72,51	R\$ 24.852,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.852,08	3,10%
5.1	sub total				R\$ 255.087,49						
BRINQUEDOTECA											
5.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.280,25	R\$ 2.280,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280,25	0,28%
5.2	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.971,12	0,25%
5.3	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 4.346,28	R\$ 4.346,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.346,28	0,54%
5.4	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 13.603,21	R\$ 13.603,21	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.603,21	1,70%
6.0	sub total				R\$ 22.200,86						
ACADEMIA											
6.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 4.737,73	R\$ 4.737,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.737,73	0,59%
6.2	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,55	0,40%
6.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.782,13	R\$ 2.782,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.782,13	0,35%
6.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,55	0,40%
6.5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.529,06	R\$ 2.529,06	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.529,06	0,32%
6.6	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	R\$ 2.775,58	R\$ 2.775,58	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.775,58	0,35%
6.7	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. $\phi=1 1/2"$, Sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 941,60	R\$ 941,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 941,60	0,12%
6.8	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.967,67	R\$ 2.967,67	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.967,67	0,37%

Bruno de Matos Santos

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188958-0




	sub total																					
7.0	ILUMINAÇÃO																					
7.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO , ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	6,00																			
7.2	Luminária em LED para iluminação pública, 30W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	6,00																			
7.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos meçoços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	35,00																			
7.4	Poste decorativo 2 braços, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	29,00																			
7.5	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	325,00																			
7.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	2,00																			
7.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	26,00																			
7.8	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00																			
7.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	35,00																			
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	705,00																			
8.0	sub total																					
	BANGOS E CANTEIRO																					
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,50																			
8.2	Madeiramento em massarandubá/madeira de lei, serrada 5 cm x 5 cm	m	24,75																			
8.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	64,86																			
8.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	129,72																			
8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014	m²	129,72																			
8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	129,72																			
8.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	129,72																			
8.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	129,72																			


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


CARVALHO
 CONSULTORIA E PROJETOS
 EMPRESAS DE ENGENHARIA
 CNPJ: 24.597.541/0001-96

8.9	Mesa c/ tempo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	12,00	R\$ 772,38	R\$ 9.268,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.268,56	1,16%
8.10	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	12,00	R\$ 1.469,07	R\$ 17.628,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.628,84	2,20%
8.11	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 277,37	R\$ 1.664,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,22	0,21%
8.12	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 21,39	R\$ 128,34	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,34	0,02%
8.13	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 19,10	R\$ 114,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,60	0,01%
8.14	Planta - Ixora pink (Ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 19,10	R\$ 114,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,60	0,01%
8.15	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	10,00	R\$ 370,45	R\$ 3.704,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.704,50	0,46%
	sub total				R\$ 52.088,58						
9.0	QUIOSQUE										
	INFRA E SUPERESTRUTURA										
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	2,20	R\$ 134,46	R\$ 295,81	0,00	R\$ 0,00	2,20	R\$ 295,81	R\$ 0,00	0,00%
9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	19,58	R\$ 102,56	R\$ 2.008,12	0,00	R\$ 0,00	19,58	R\$ 2.008,12	R\$ 0,00	0,00%
9.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	7,80	R\$ 59,71	R\$ 465,74	0,00	R\$ 0,00	7,80	R\$ 465,74	R\$ 0,00	0,00%
9.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	20,06	R\$ 20,72	R\$ 415,64	0,00	R\$ 0,00	20,06	R\$ 415,64	R\$ 0,00	0,00%
9.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	12,60	R\$ 77,98	R\$ 982,55	0,00	R\$ 0,00	12,60	R\$ 982,55	R\$ 0,00	0,00%
9.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	8,28	R\$ 2.940,39	R\$ 24.346,43	0,00	R\$ 0,00	8,28	R\$ 24.346,43	R\$ 0,00	0,00%
9.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	7,80	R\$ 61,06	R\$ 476,27	0,00	R\$ 0,00	7,80	R\$ 476,27	R\$ 0,00	0,00%
9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	77,72	R\$ 45,24	R\$ 3.516,05	0,00	R\$ 0,00	77,72	R\$ 3.516,05	R\$ 0,00	0,00%
9.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	5,06	R\$ 2.940,39	R\$ 14.878,37	0,00	R\$ 0,00	5,06	R\$ 14.878,37	R\$ 0,00	0,00%
9.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	7,84	R\$ 45,17	R\$ 354,13	0,00	R\$ 0,00	7,84	R\$ 354,13	R\$ 0,00	0,00%
	sub total				R\$ 47.738,12						
10.0	PISOS										
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	106,78	R\$ 36,62	R\$ 3.910,28	56,78	R\$ 2.078,28	106,78	R\$ 3.910,28	R\$ 0,00	0,00%


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARIMBO
 BRUNO DE MATOS SANTOS
 CREA-BA nº 051888958-0

10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	29,82	R\$ 59,10	R\$ 1.762,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.762,36	0,22%
10.3	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	76,96	R\$ 80,39	R\$ 6.186,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.186,81	0,77%
11.0	sub total				R\$ 11.859,46						
11.1	Alvenaria de Vedação										
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	142,12	R\$ 59,04	R\$ 8.390,76	42,12	R\$ 2.486,76	137,70	R\$ 8.126,81	R\$ 260,96	0,03%
11.2	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios; polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	1,40	R\$ 561,27	R\$ 785,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 785,78	0,10%
12.0	sub total				R\$ 9.176,54						
12.0	Revestimento										
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	284,38	R\$ 4,72	R\$ 1.342,27	0,00	R\$ 0,00	284,38	R\$ 1.342,27	R\$ 0,00	0,00%
12.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	284,38	R\$ 27,31	R\$ 7.766,42	0,00	R\$ 0,00	284,38	R\$ 7.766,42	R\$ 0,00	0,00%
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	87,36	R\$ 69,23	R\$ 6.047,93	43,68	R\$ 3.023,97	43,68	R\$ 3.023,97	R\$ 3.023,97	0,38%
13.0	sub total				R\$ 15.156,62						
13.0	Conexões para água fria										
13.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO; PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 4,57	R\$ 36,56	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 36,56	R\$ 0,00	0,00%
13.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 5,57	R\$ 144,82	0,00	R\$ 0,00	26,00	R\$ 144,82	R\$ 0,00	0,00%
13.3	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 12,46	R\$ 49,84	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 49,84	R\$ 0,00	0,00%
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 6,75	R\$ 81,00	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 81,00	R\$ 0,00	0,00%
13.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 7,95	R\$ 63,60	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 63,60	R\$ 0,00	0,00%
14.0	sub total				R\$ 375,92						
14.0	Tubos Rígidos										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAVILLA
 CREA-BA nº 051888958-0
 Nº 24.537.34.00031-3E
 CNPJ: 24.537.34.00031-3E

14.1	TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 20mm (1/2")	M	78,00	R\$ 6,58	R\$ 513,24	0,00	R\$ 0,00	78,00	R\$ 513,24	R\$ 0,00	0,00%
14.2	TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (3/4")	M	50,00	R\$ 8,93	R\$ 446,50	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 446,50	R\$ 0,00	0,00%
14.3	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	60,00	R\$ 39,32	R\$ 2.359,20	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 2.359,20	R\$ 0,00	0,00%
14.4	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	32,00	R\$ 35,05	R\$ 1.121,60	0,00	R\$ 0,00	32,00	R\$ 1.121,60	R\$ 0,00	0,00%
14.5	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	40,00	R\$ 16,09	R\$ 643,60	0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 643,60	R\$ 0,00	0,00%
14.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	33,00	R\$ 22,24	R\$ 733,92	0,00	R\$ 0,00	33,00	R\$ 733,92	R\$ 0,00	0,00%
15.0	sub total				R\$ 5.818,06						
Caixas e Ralos											
15.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 15,42	R\$ 123,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,36	0,02%
15.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	8,00	R\$ 49,47	R\$ 395,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,76	0,05%
15.3	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	2,00	R\$ 690,15	R\$ 1.380,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,30	0,17%
15.4	Tomleira de bóia p/caixa d	un	2,00	R\$ 39,41	R\$ 78,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,82	0,01%
15.5	Micrômetro de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	6,00	R\$ 635,29	R\$ 3.811,74	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.811,74	0,48%
15.6	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	4,00	R\$ 1.029,13	R\$ 4.116,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.116,52	0,51%
15.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 459,09	R\$ 3.672,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.672,72	0,46%
15.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 150,25	R\$ 601,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,04	0,07%
15.9	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 50,11	R\$ 200,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,44	0,03%
15.10	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 358,46	R\$ 716,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,92	0,09%
15.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 391,02	R\$ 1.564,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,08	0,20%
16.0	sub total				R\$ 16.561,70						
Registro de Válvulas											
16.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 22,47	R\$ 44,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,94	0,01%
16.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 35,16	R\$ 210,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,96	0,03%
16.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 41,27	R\$ 82,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,54	0,01%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAVALLA - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS
RUA JOSÉ CASTRILHO, S. SÉRIE
CIVIL, 24-307-3440201-0E

19.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 12,20	R\$ 1.220,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	0,00%
19.5	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 12,74	R\$ 127,40	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 127,40	R\$ 0,00	0,00%
19.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 51,93	R\$ 207,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 207,72	R\$ 0,00	0,03%
19.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 15,14	R\$ 151,40	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 151,40	R\$ 0,00	0,00%
19.8	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 6,74	R\$ 134,80	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 67,40	R\$ 67,40	0,01%
19.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 73,88	R\$ 589,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 589,44	R\$ 0,00	0,07%
19.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 66,61	R\$ 532,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 532,88	R\$ 0,00	0,07%
19.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 18,39	R\$ 183,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 183,90	R\$ 0,00	0,02%
19.12	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	22,00	R\$ 14,48	R\$ 318,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 318,56	R\$ 0,00	0,04%
19.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	8,00	R\$ 71,77	R\$ 574,16	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 574,16	R\$ 0,00	0,00%
19.14	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	R\$ 431,59	R\$ 863,18	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 863,18	R\$ 0,00	0,11%
19.15	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	12,00	R\$ 30,12	R\$ 361,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 361,44	R\$ 0,00	0,05%
19.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 33,86	R\$ 270,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 270,88	R\$ 0,00	0,03%
19.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 35,86	R\$ 286,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 286,88	R\$ 0,00	0,04%
19.18	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 107,34	R\$ 214,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 214,68	R\$ 0,00	0,03%
20.00	sub total				R\$ 9.437,22						
	Esquadrias										
20.01	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 732,98	R\$ 5.863,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.863,84	R\$ 0,00	0,73%
20.02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,06	R\$ 283,08	R\$ 5.961,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.961,66	R\$ 0,00	0,74%
20.03	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,84	R\$ 106,53	R\$ 1.687,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.687,44	R\$ 0,00	0,21%
	sub total				R\$ 13.512,84						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILLA T...
CREA-B...
M...
CNPJ 24.507.244/0001-98

21.00	Ferragens e Acessórios																	
21.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 191,18		R\$ 1.529,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.529,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.529,44	0,19%
	sub total					R\$ 1.529,44												
22.00	Cobertura																	
22.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/ Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m2	106,78	R\$ 203,72		R\$ 21.753,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.753,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 21.753,22	2,71%
22.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m2	106,38	R\$ 96,89		R\$ 10.307,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.307,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 10.307,16	1,29%
22.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	19,00	R\$ 188,85		R\$ 3.588,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.588,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.588,15	0,45%
	sub total					R\$ 35.648,53												
23.00	PINTURA																	
23.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	284,38	R\$ 2,79		R\$ 793,42	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793,42		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 793,42	0,10%
23.02	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	284,38	R\$ 12,50		R\$ 3.554,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.554,75		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.554,75	0,44%
23.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	284,38	R\$ 15,78		R\$ 4.487,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,52		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4.487,52	0,56%
23.04	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Deiquard FS ou similar- R1	m2	77,90	R\$ 18,50		R\$ 1.441,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.441,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.441,15	0,18%
	sub total					R\$ 10.276,84												
24.00	Laje																	
24.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interseixão 38cm, h=12cm, ei, enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	8,32	R\$ 176,88		R\$ 1.471,64	0,00	R\$ 0,00	8,32	R\$ 0,00	R\$ 1.471,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.471,64	0,00%
24.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	0,72	R\$ 147,27		R\$ 106,03	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,03		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 106,03	0,01%
24.3	Dobraçã de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	4,00	R\$ 34,07		R\$ 136,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 136,28	0,02%
24.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m2	8,32	R\$ 45,24		R\$ 376,40	0,00	R\$ 0,00	7,80	R\$ 0,00	R\$ 352,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 23,52	R\$ 352,87	0,00%
	SUB TOTAL					R\$ 2.090,36												
25.00	Pergolado																	
	Infraestrutura																	
25.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m3	7,69	R\$ 134,46		R\$ 1.034,00	3,85	R\$ 517,67	7,69	R\$ 1.034,00		R\$ 1.034,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.034,00	0,00%
25.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	7,67	R\$ 20,72		R\$ 158,92	7,27	R\$ 150,63	7,67	R\$ 158,92		R\$ 158,92		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 158,92	0,00%
25.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m3	1,77	R\$ 2.940,39		R\$ 5.204,49	1,37	R\$ 4.028,33	1,77	R\$ 5.204,49		R\$ 5.204,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 5.204,49	0,00%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



CAVALLA
OBRAS CIVIS
RUA DO ARAUJO, 125
CANA 24.597.344/2001-90

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO POVOADO DA SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2023	Santaluz	Construção da Praça Sisalândia



Foto 01 – ATERRO E COMPACTAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO.



Foto 02 – ATERRO E COMPACTAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO.

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILA...
CREA-BA...
EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
CNPJ: 24.507.344/0001-05

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2023	Santaluz	Construção da Praça Sisalândia



Foto 03 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015



Foto 04 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA RIBEIRO DE O.
CREA-BA nº 051888958-0
EMPRESA CONSTRUTORA SEMP
CNPJ: 24.597.344/0001-09

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2023	Santaluz	Construção da Praça Sisalândia



Foto 05 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015



Foto 06 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CAMILA MENDES COSTA
DIRETORA DE OBRAS
MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
CNPJ nº 24.597.344/001-88

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
19/06/2023	Santaluz	Construção da Praça Sisalândia



Foto 07 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015



Foto 08 – EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA DE OLIVEIRA CRUZ
CREA-BA nº 051888958-0
EMPRESA CONSTRUTORA EIREL
CNPJ: 24.937.344/0001-08

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/06/2023	Santaluz	Construção da Praça Sisalândia




Foto 09 – Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m



Foto 10 – Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CAMILIA A. F. DE JESUS
DRA. EM ENGENHARIA DE
MATERIAIS
CNPJ 24.591.344/0001-55

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/05/2023	Santaluz	Construção da Praça Sisalândia



Foto 11 – Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m



Foto 12 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.



Foto 13 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



Foto 14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA F. DE S.
CREA-BA nº 051888958-0
CPF nº 24.537.344/030-1-98

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Foto 15 – CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

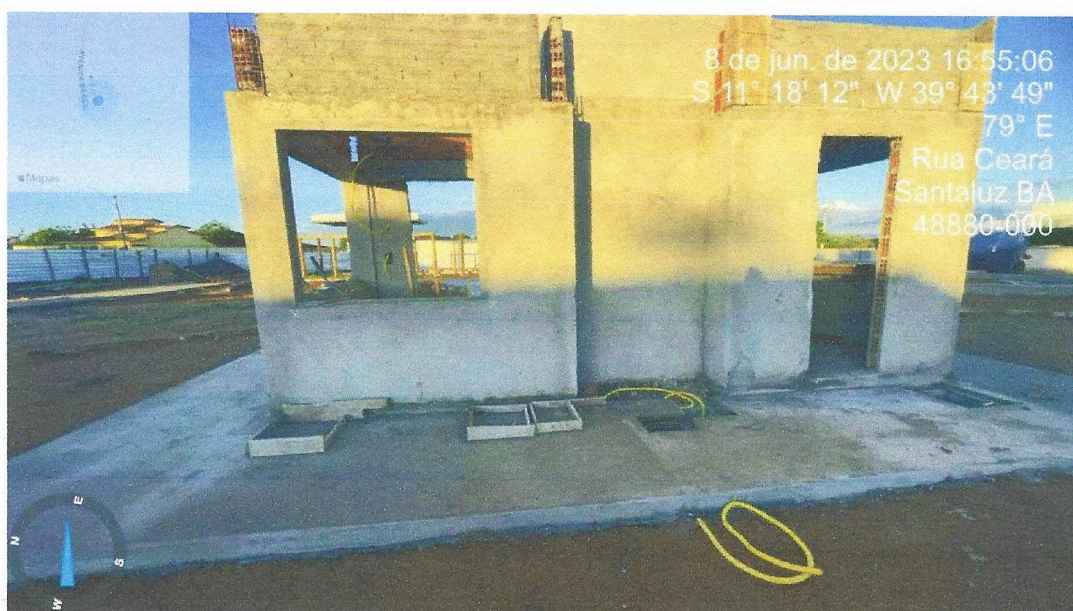


Foto 16 – CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILA DE SOUZA
CREA-BA
MP2 0140120-1/2013-0002
CNPJ 24.697.344/0001-97



Foto 17 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



Foto 18 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CAMILIA FERREIRA S. S.
CREA-BA nº 051888958-0
MP2 SANTALUZ-BA
DNPJ 24.597.344/0001-09

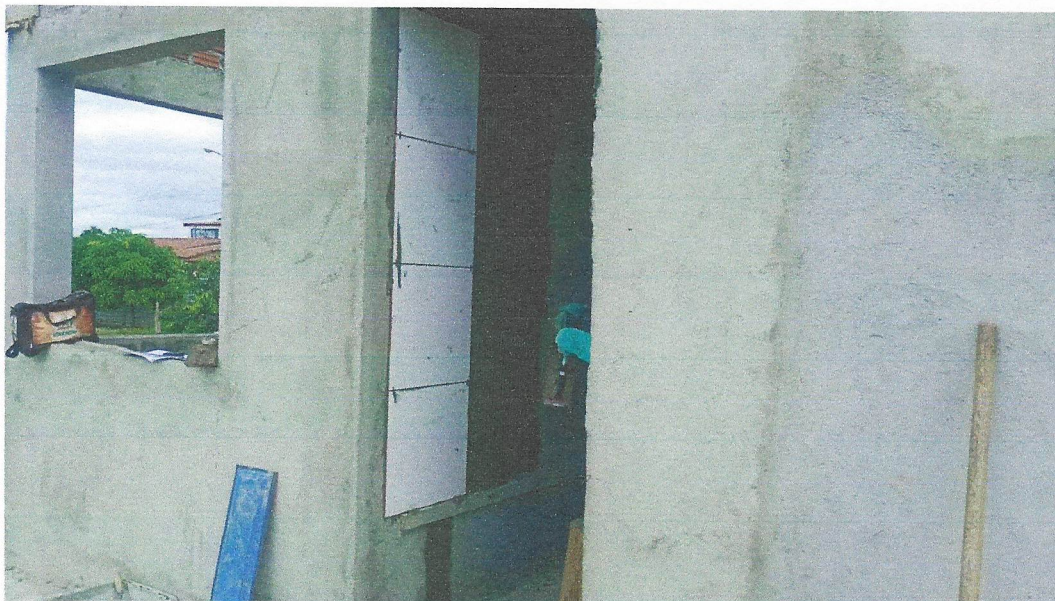


Foto 19 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



Foto 20 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA ROSELY
CREA-BA nº 051888958-0
MFR nº 43700/2014
CNPJ nº 24.597.344/0001-05



Foto 21 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_06/2014



Foto 22 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Foto 23 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016



Foto 24 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0

CAMILLA RIBEIRO
CREA-BA nº 051838958-0
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ nº 24.597.344/0001-99




Foto 25 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016



Foto 26 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


DAMILLA
CREA-BA nº 051888958-0
MPZ CONSTRUÇÕES EBTEL
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

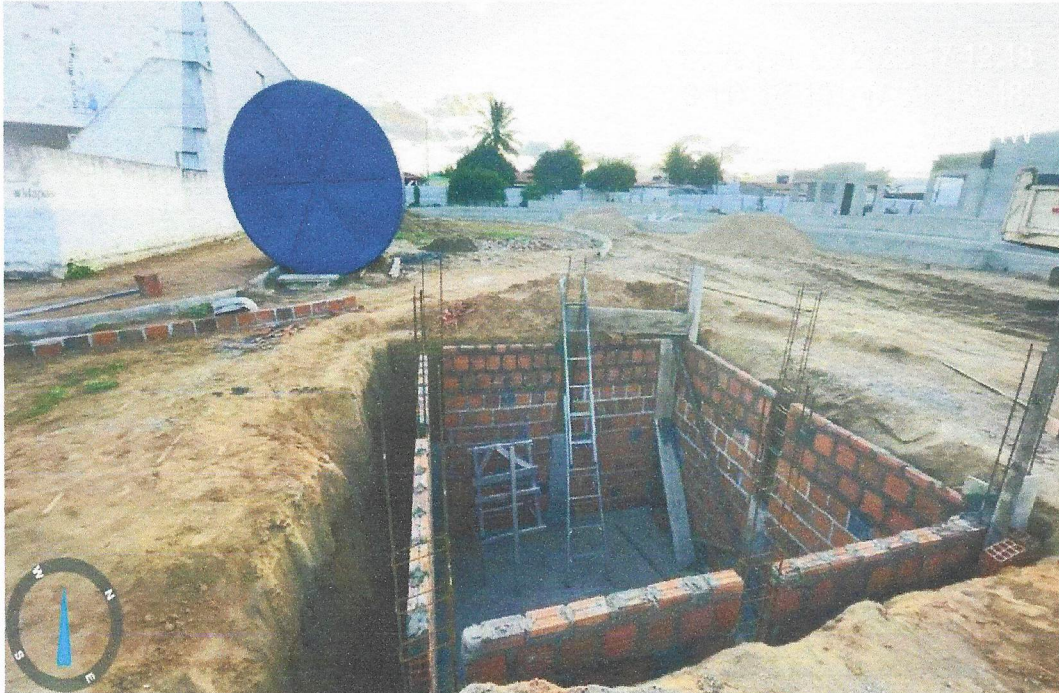


Foto 27 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016



Foto 28 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CAMILA R. F. S. S. S.
ENGENHEIRA DE ENFERMAGEM
MPQ 01/2012 Nº 5.438/2012
CNPJ: 24.591.344/0001-88

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Foto 29 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016



Foto 30 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA DE OLIVEIRA
CREA-BA nº 051888958-0
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
CNPJ: 24.597.344/0001-05

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

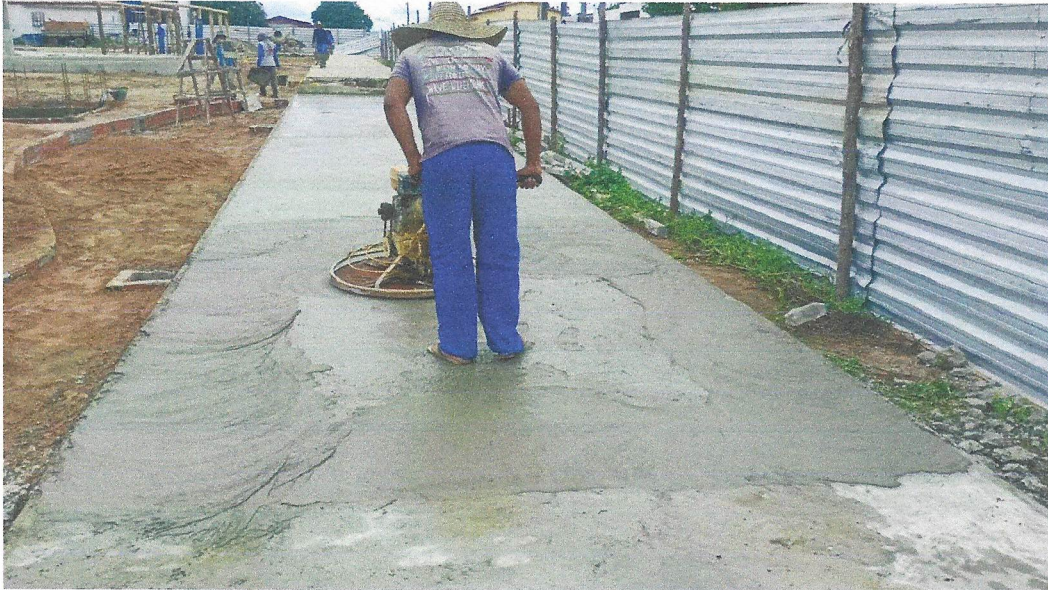


Foto 31 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016



Foto 32– EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILA PIRES
CREA-BA nº 051888958-0
DNP nº 24.037.544/0001-06



Foto 33 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016



Foto 34 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA
CREA-BA nº 051888958-0
EMPRESA CONSTRUTORA S.P.A.
CNPJ nº 24.597.344/0001-98

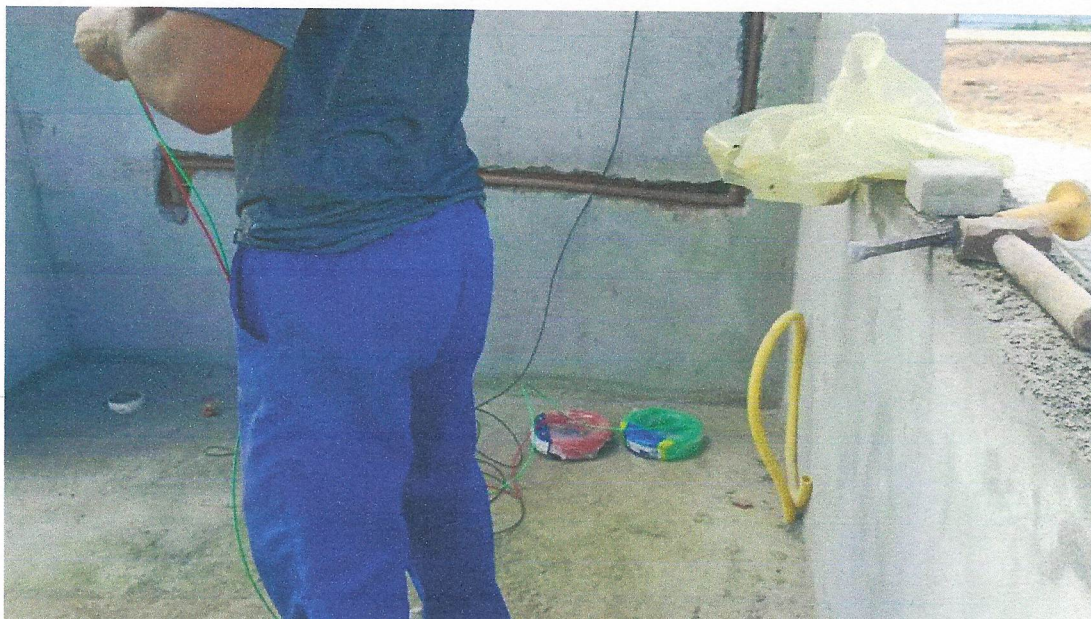



Foto 35 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.



Foto 36 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DAMILLA
CREA-BA nº 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES E REFIN
CNPJ nº 24.537.344/0001-99

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 161				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
Condições Climáticas:		Manhã (1)		Tarde (2)		Noite ()		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros Torneira de bóia p/caixa d RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		Gerente de Obra												
		Engenheiro									1			
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral									1			
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topógrafo												
		Auxiliar de topografia												
Pedreiro									4					
Ajudante Geral									5					
Calçeteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA							11					
		JORNADA DE TRABALHO							3,00					
		Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO							QTDE.					
		Veículo Leve							2					
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco							1					
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 25/05/2023		Data: 25/05/2023												



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CAMILLA...
CREA-BA nº...
MP2 CONSTRUÇÕES...
CNPJ: 24.597.344/0001-08


MP2 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA							EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 905-2022		RDO: 162		CATEGORIA							QTDE	
Condições Climáticas		Manhã (2)		Tarde (1)		Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Engenheiro						
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA								Tec. de Segurança						
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM								Aux Adm						
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM								Mestre de obra						
Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar								Encarregado geral						
Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 600 litros														
Torneira de bóia p/caixa d														
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.														
								Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topógrafo						
								Auxiliar de topografia						
								Pedreiro						
								Ajudante Geral						
								Calçateiro						
								Carpinteiro						
								Operador de Motosserra						
								Motorista						
								Montador						
								Montador/Eletricista						
								Eletricista						
								Operador de Patrol						
								Operador de Escavadeira						
								Operador de Pá carregadeira						
								Motorista de caçamba						
								Pintor						
								Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
								JORNADA DE TRABALHO						
								Hh DO DIA						
								Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO						
								Veículo Leve						
								Caminhão Muncck						
								Caminhão Toco						
								Escavadeira						
								Pá carregadeira						
								Caçamba						
								Patrol						
								PC 200						
								Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:								FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/5/2023								Data: 26/5/2023						



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188958-0


CAMILLA...
CREA-BA nº 05188958-0
MP2 CONSTRUÇÕES
CNPJ: 24.597.344/0001-06


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 163				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (2) Tarde (4) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA: MÁO DE OBRA INOIRETA QTDE:							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topógrafo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro								4			
Ajudante Geral								5			
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							11
				JORNADA DE TRABALHO							3,00
				Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA: Data: 27/05/2023				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							2
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							1
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
FISCALIZAÇÃO: Data: 27/05/2023											


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAVILLA P...
 CREA-B...
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 24.597.344/0001-08

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº: 282/2022 LICITAÇÃO Nº: 005-2022 RDO: 165				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 29/05/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 29/05/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CAMILLA
 CREA-BA
 MP2 CONSTRUTORA S/A
 CNPJ: 24.097.341/0001-08

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X										
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				S	T	Q	Q	S	S	D					
CONTRATO Nº 282/2022				LICITAÇÃO Nº 005-2022				RDO: 166							
Condições Climáticas				Madrugada (1)				Tarde (2)				Noite ()			
SIMBOLOGIA				1 - Tempo Bom				2 - Chuva s/ cond. Trab.				3 - Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE							
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				Gerente de Obra											
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM				Engenheiro				1							
				Tec. de Segurança											
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM				Aux Adm											
				Mestre de obra											
Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				Encarregado geral				1							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA															
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES															
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.															
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
OBSERVAÇÕES				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro				4							
GERENTE DE OBRA:				Ajudante Geral				5							
				Calçeteiro											
Data: 30/5/2023				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
Data: 30/5/2023				Mototista											
				Montador											
FISCALIZAÇÃO:				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Mototista de caçamba											
				Pintor											
RESUMO DO EFETIVO				Hh DO DIA											
				EFETIVO DO DIA				11							
EFETIVO EQUIPAMENTOS				JORNADA DE TRABALHO				3,00							
				Hh DO DIA											
VEÍCULO LEVE				Hh ACUMULADO											
				TIPO				QTDE.							
CAMINHÃO MUNCK				Veículo Leve				2							
				Caminhão Munck											
CAMINHÃO TOCO				Caminhão Toco				1							
				Escavadeira											
PÁ CARREGADEIRA				Pá carregadeira											
				Caçamba											
PATROL				Patrol											
				PC 200											
PLACA VIBRATÓRIA				Placa Vibratória											

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILIA DE OLIVEIRA
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
MP2 2019/000177798/0001
CNPJ 24.507.444/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	X	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 167		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas		Manhã: (2)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
<p>EXECUÇÃO DE PASSIEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM</p> <p>Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA</p> <p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES</p> <p>RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.</p>				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							4
				Ajudante Geral							5
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pil carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
Hh DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							11
				JORNADA DE TRABALHO							3,00
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							2
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							1
				Escavadeira							
				Pil carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/5/2023				Data: 31/5/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAVILAN...
 CREA-BA nº 051888958-0
 CNPJ: 24.097.344/0001-04

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D			
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 282/2022				LICITAÇÃO Nº 005-2022			RDO: 168						
Condições Climáticas				Manhã (1)			Tarde (1)			Noite ()			
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom			2- Chuva s/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTDE						
<p>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM</p> <p>Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA</p> <p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES</p> <p>RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.</p>				Gerente de Obra									
				Engenheiro			1						
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral			1						
Hh DO DIA													
MÃO DE OBRA DIRETA													
Topógrafo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro				4									
Ajudante Geral				5									
Calceteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO													
EFETIVO DO DIA				11									
JORNADA DE TRABALHO				3,00									
Hh DO DIA													
Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES													
EFETIVO EQUIPAMENTOS													
TIPO				QTDE.									
Veículo Leve				2									
Caminhão Munck													
Caminhão Toco				1									
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
RC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 1/6/2023				Data: 1/6/2023									


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

CAVALLA
 CREA-BA nº 051886958-0
 MPE CONSTRUÇÕES E REE
 CNPJ: 24.537.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA							EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 189 Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()							CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X28 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.							Gerente de Obra						
							Engenheiro 1						
							Tec. de Segurança						
							Aux Adm						
							Mestre de obra						
							Encarregado geral 1						
							Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES							MÃO DE OBRA DIRETA						
							Topografo						
							Auxiliar de topografia						
							Pedreiro 4						
							Ajudante Geral 6						
							Calceteiro						
							Carpinteiro						
							Operador de Motosserra						
							Motorista						
							Montador						
OBSERVAÇÕES							Montador/Eletricista						
							Eletricista						
							Operador de Patrol						
							Operador de Escavadeira						
							Operador de Pá carregadeira						
							Motorista de caçamba						
							Pintor						
							Hh DO DIA						
							RESUMO DO EFETIVO						
							EFETIVO DO DIA 11						
							JORNADA DE TRABALHO 3,00						
							Hh DO DIA						
							Hh ACUMULADO						
							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							TIPO QTDE.						
							Veículo Leve 2						
							Caminhão Munck						
							Caminhão Toco 1						
							Escavadeira						
							Pá carregadeira						
							Caçamba						
							Patrol						
							PC 200						
							Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 2/8/2023		Data: 2/8/2023											


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
 CRSA...
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 24.537.348/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 170		CATEGORIA		QTDE
SIMBOLOGIA		Manhã: (2)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
		1- Tempo Bom		2- Chuva s/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		
								Engenheiro		
								Tec. de Segurança		
								Aux Adm		
								Mestre de obra		
								Encarregado geral		
								Hh DO DIA		
								MÃO DE OBRA DIRETA		
								Topografo		
								Auxiliar de topografia		
								Pedreiro		
								Ajudante Geral		
								Calçeteiro		
								Carpinteiro		
								Operador de Motosserra		
								Motorista		
								Montador		
								Montador/Eletricista		
								Eletricista		
								Operador de Patrol		
								Operador de Escavadeira		
								Operador de Pá carregadeira		
								Motorista de caçamba		
								Pintor		
								Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO		
								EFETIVO DO DIA		
								JORNADA DE TRABALHO		
								Hh DO DIA		
								Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS		
								TIPO		
								QTDE.		
								Veículo Leve		
								Caminhão Muncck		
								Caminhão Toco		
								Escavadeira		
								Pá carregadeira		
								Caçamba		
								Patrol		
								PC 200		
								Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 3/6/2023				Data: 3/6/2023						


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA
CREA-BA nº 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
CNPJ: 24.507.345/0001-82

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X							
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO Nº 282/2022				LICITAÇÃO Nº 085-2022				RDO: 172			
Condições Climáticas: Manhã (2) Tarde (2) Noite ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA				Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM				Aux Adm							
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM				Mestre de obra							
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO				Encarregado geral				1			
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m											
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")											
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO											
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				5			
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pé carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				11			
				JORNADA DE TRABALHO				3,00			
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve				2			
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco				1			
				Escavadeira							
				Pé carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 5/6/2023				Data: 5/6/2023							

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CAMILLA...
MPO CONSTRUÇÕES E RE...
CNPJ: 24.037.344/0001-98

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data													
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 173				S	T	Q	Q	S	S	D							
Condições Climáticas		Manhã (2)		Tarde (1)		Noite ()		EFETIVO PESSOAL				QTDE							
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								Gerente de Obra											
								Engenheiro										1	
								Tec. de Segurança											
								Aux Adm											
								Mestre de obra											
								Encarregado geral										1	
								Hh DO DIA											
								MÃO DE OBRA DIRETA											
								Topógrafo											
								Auxiliar de topografia											
Pedreiro										4									
Ajudante Geral										5									
Calceiteiro																			
Carpinteiro																			
Operador de Motosserra																			
Motorista																			
Montador																			
Montador/Eletricista																			
Eletricista																			
Operador de Patrol																			
Operador de Escavadeira																			
Operador de PA carregadeira																			
Motorista de caçamba																			
Pintor																			
Hh DO DIA																			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO											
								EFETIVO DO DIA		11									
								JORNADA DE TRABALHO		3,00									
								Hh DO DIA											
								Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS											
								TIPO		QTDE.									
								Veículo Leve		2									
								Caminhão Munck											
								Caminhão Toco		1									
								Escavadeira											
								Pá carregadeira											
								Caçamba											
								Patrol											
PC 200																			
Placa Vibratória																			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:															
Data: 6/6/2023				Data: 6/6/2023															



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAVALLARI
CREA-BA nº 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES EIRE
CNPJ nº 24.537.344/0001-02

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 174									EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (2) Nota: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									CATEGORIA		
SIMBOLOGIA									MÃO DE OBRA DIRETA		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									Gerente de Obra		
									Engenheiro		
									Tec. de Segurança		
									Aux Adm		
									Mestre de obra		
									Encarregado geral		
									Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES									MÃO DE OBRA DIRETA		
									Topografo		
									Auxiliar de topografia		
									Pedreiro		
									Ajudante Geral		
									Calçeteiro		
									Carpinteiro		
									Operador de Motosserra		
									Motorista		
									Montador		
OBSERVAÇÕES									Montador/Eletricista		
									Eletricista		
									Operador de Petrol		
									Operador de Escavadeira		
									Operador de Pá carregadeira		
									Motorista de caçamba		
									Pintor		
									Hh DO DIA		
									RESUMO DO EFETIVO		
									EFETIVO DO DIA		
									JORNADA DE TRABALHO		
									Hh DO DIA		
									Hh ACUMULADO		
									EFETIVO EQUIPAMENTOS		
									TIPO		
									QTDE.		
									Veículo Leve		
									Caminhão Munck		
									Caminhão Toco		
									Escavadeira		
									Pá carregadeira		
									Caçamba		
									Patrol		
									PC 200		
									Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 7/8/2023		Data: 7/8/2023									



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA P...
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 24.637.344/0001-38

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 175		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas		Madrã: (1)		Terde: (2)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom		2 - Chuva s/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra		Engenheiro		1		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA				Téc. de Segurança		Aux Adm				
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM				Mestre de obra		Encarregado geral		1		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO										
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m										
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")										
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO										
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo				
						Auxiliar de topografia				
						Pedreiro		4		
						Ajudante Geral		5		
						Calceiteiro				
						Carpinteiro				
						Operador de Motosserra				
						Motorista				
						Montador				
						Montador/Eletricista				
						Eletricista				
						Operador de Petrol				
						Operador de Escavadeira				
						Operador de Pá carregadeira				
						Motorista de caçamba				
						Pintor				
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		11		
						JORNADA DE TRABALHO		3,00		
						Hh DO DIA				
						Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.		
						Veículo Leve		2		
						Caminhão Munck				
						Caminhão Toco		1		
						Escavadeira				
						Pá carregadeira				
						Caçamba				
						Patrol				
						PC 200				
						Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 8/8/2023				Data: 8/8/2023						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
CREA-BA...
MP2...
CNPJ: 24.237.344/0001-06

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 176		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva e/cond. Trab. 3- Chuva s/cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE							
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		Gerente de Obra									
		Engenheiro		1							
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral		1							
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
		Auxiliar de topografia									
		Pedreiro		4							
		Ajudante Geral		5							
		Calceiteiro									
		Carpinteiro									
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
		Montador/Eletricista									
		Eletricista									
		Operador de Patrol									
		Operador de Escavadeira									
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba									
		Pintor									
		Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA		11							
		JORNADA DE TRABALHO		3,00							
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO		QTDE.							
		Veículo Leve		2							
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco		1							
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 9/6/2023		Data: 9/6/2023									



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILAN
CREA-BA nº 051888958-0
MP2 CONSTRUTORA S/A
CNPJ nº 24.587.344/0001-92

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	X	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 177		CATEGORIA		QTDE		
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva e/cond. Tráb. 3- Chuva e/cond. Tráb.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
Data: 10/6/2023				FISCALIZAÇÃO:						
				Data: 10/6/2023						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Mitsub						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA
 CREA-BA
 MP2 CONSTRUÇÕES CIRE
 CNPJ: 24.587.344/0001-52

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				x								
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 283/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 179				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã (2) Tarde (2) Noite ()				CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
<p>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO</p> <p>Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m</p> <p>Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")</p> <p>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE</p> <p>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</p> <p>LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.</p> <p>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA</p>				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				4				
Ajudante Geral				5								
Calçeteiro												
Carpinteiro				1								
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de capangia												
Pintor												
Hh DO DIA												
RESUMO DO EFETIVO												
EFETIVO DO DIA				11								
JORNADA DE TRABALHO				3,00								
Hh DO DIA												
Hh ACUMULADO												
EFETIVO EQUIPAMENTOS												
TIPO				QTDE.								
Veículo Leve				2								
Caminhão Munck												
Caminhão Toco				1								
Escavadeira												
Pá carregadeira												
Capangia												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 12/8/2023				Data: 12/8/2023								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA DE OLIVEIRA
 CREA-BA Nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUTORA S/A
 CNPJ: 24.997.844/0001-98

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 180		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas		Manhã (2)		Tarde (1)		Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom		2 - Chuva cf cond. Trab.		3- Chuva sf cond. Trab.		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra		Engenheiro		1		
<p>EXECUÇÃO DE PÁSSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁSSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO</p> <p>Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m</p> <p>Eletroduto de pvc rígido rescável, diâm = 25mm (3/4")</p> <p>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE</p> <p>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</p> <p>LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.</p> <p>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA</p>				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		4				
				Ajudante Geral		5				
Calceiteiro										
Carpinteiro		1								
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA		11				
				JORNADA DE TRABALHO		3,00				
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve		2				
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco		1				
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/8/2023				Data: 13/8/2023						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILA FERREIRA
CREA-BA nº 051888958-0
MPE SANTALUZ 2023 0001
CNPJ: 24.537.344/0001-08

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL								
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		CONTRATO Nº 282/2022	LICITAÇÃO Nº 005-2022	RDO: 181	CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA		Manhã: (2)	Tarde: (2)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
		1 - Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3 - Chuva sf cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIENA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA				Engenheiro							1	
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							4	
				Ajudante Geral							5	
				Calçateiro								
				Carpinteiro							1	
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA							11	
				JORNADA DE TRABALHO							3,00	
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve							2	
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco							1	
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/8/2023				Data: 14/8/2023								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
 CREA-BA...
 MP2 CONSTRUÇÕES E ENR...
 CNPJ: 24.507.344/0001-55



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA

CONTRATO Nº 282/2022

LICITAÇÃO Nº 005-2022

RDO: 183

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

Condições Climáticas:

Manhã: (2)

Tarde: (2)

Noite: ()

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hh DO DIA	

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	5
Caldeiro	
Carpinteiro	1
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Hh DO DIA	

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m

Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	11
JORNADA DE TRABALHO	3,00
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão Muncie	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:


Data: 16/6/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 16/6/2023


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CAMILLA R. DE S. SILVA
 CREA-BA nº 051888958-0
 Nº 20143747474747474747
 CNAL 24 507 3440001 05

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	X	D		
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA			EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 282/2022			LICITAÇÃO N° 005-2022			RDO: 184		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas:			Manhã: (2)			Tarde: (2)			Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra	
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro							1
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							4
						Ajudante Geral							5
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
OBSERVAÇÕES						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA							11
						JORNADA DE TRABALHO							3,00
						Hh DO DIA							
EFETIVO EQUIPAMENTOS						Hh ACUMULADO							
						TIPO							QTDE.
						Veículo Leve							2
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:			Caminhão Muncck							
						Caminhão Toco							1
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
Placa Vibratória													
Data: 17/6/2023			Data: 17/6/2023										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAVILA
 CREA-BA
 Nº 24.597.34/0001-02

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		S	T	Q	Q	S	S	D	FETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 186		Manhã: (2) Tarde: (2) Noite: ()											
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra							
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS EM POLIETILENO ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.						Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
						RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 19/6/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 19/6/2023											


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
 CREA-BA nº 051888958-0
 Nº 24 597 344/001-05
