



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 247-2022

EMPENHO: 682 / 2023

Nº SUB-EMPENHO: 2612

Data do Sub-Empenho: 28/07/2023

TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

Endereço: AL SALVADOR, 001057

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:

Conta Corrente: 78377-3

Agência: 3673

Cidade:

CPF:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Estado:

RG:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 28/07/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC Nº Lic.: 012-2022RDC

Convênio: - Contrato: 013-2023

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

207.892,67

80.025,48

127.867,19

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MORRO DOS LOPES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 012-2022, CONTRATO Nº 013-2023, NFS-e-31. REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 01/07/2023 A 25/07/2023.

#### Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

80.025,48

80.025,48

0,00

Data do Empenho: 28/07/2023

Data do Liquidação: 28/07/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.400,76
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	5.281,68

## Setenta e dois mil e trezentos e quarenta e três reais e quatro centavos ##

Valor Retido

7.682,44

Valor Líquido

72.343,04

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/07/2023	31	UNIC			80.025,48

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	80.025,48

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/07/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/07/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3211896





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 247-2022

EMPENHO: 682 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 2612 Data do Sub-Empenho: 28/07/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA  
 Endereço: AL SALVADOR, 001057  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES  
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:  
 Conta Corrente: 78377-3 Agência: 3673  
 Cidade: Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE  
 CPF: RG:  
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Pessoa: Jurídica  
Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/07/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 012-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 013-2023	207.892,67	80.025,48	127.867,19
Patrimônio: -			

**HISTÓRICO**


EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MORRO DOS LOPES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº012-2022, CONTRATO Nº013-2023.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
80.025,48	80.025,48	0,00

Nº Ordem	Especificação ( Ítem )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	80.025,48	80.025,48


## Oitenta mil e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos ## 80.025,48

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/07/2023.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/07/2023



NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Diretor Contábil  
 Matrícula: 6408





**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:  
00000031  
Data e Hora de Emissão:  
26/07/2023 11:14:13  
Código de Verificação:  
CMRR-KUJB

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
23.694.541/0001-62  
Nome/Razão Social:  
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA  
Endereço:  
Ala Salvador 001057, ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP:  
41820-790 - BA

Inscrição Municipal:  
547.986/001-66



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
MUNICÍPIO DE SANTALUZ  
CPF/CNPJ:  
13.807.870/0001-19  
Endereço:  
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA  
E-mail:

Inscrição Municipal:  
---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MORRO DOS LOPES, MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.  
RDC N° 012/2022 - CONTRATO N° 013/2023 -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 247/2022  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2023 a 25/07/2023 - BM 02

VALOR TOTAL: 80.025,48  
VALOR DE MATERIAL: 40.012,74

BC DE INSS 50%: 40.012,74 x 11%: 4.401,40  
BC DE ISS 50%: 40.012,74 x 5,00%: 2.000,64

DADOS BANCARIO: BANCO BRADESCO AG 3673 C/C 0078377-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$80.025,48**

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00		*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,64	73.623,44

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 26/07/23

Assinatura

*Julia Varjão*  
Engenheira Civil  
CREA-BA-5000841424



# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 362307	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 48.015,28	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.400,76	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.400,76	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 31/08/2023	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 31/07/2023 11:17:43	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2023	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 031 - DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.400,76	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.400,76	



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8171000024 . 6

00763906202 . 0

30831010500 . 9

00036230712 . 6

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000024 . 6

00763906202 . 0

30831010500 . 9

00036230712 . 6

## ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 362307	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 31/07/2023 11:17:43	DATA VENCIMENTO: 31/08/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.400,76
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.400,76





Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 23.694.541/0001-62  
Nome empresarial: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 18/11/2015  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 23694541202306001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**  
Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional****2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.168.443,52	0,00	2.168.443,52
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.756.443,52	0,00	1.756.443,52
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	412.000,00	0,00	412.000,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)****2.2.1) Mercado Interno**

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	82.000,00	08/2022	180.000,00
09/2022	50.000,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	100.000,00
01/2023	1.359.364,66	02/2023	0,00	03/2023	188.930,14	04/2023	108.148,72
05/2023	100.000,00						

**2.2.2) Mercado Externo**

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00						

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica





Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



MODALIDADE: RDC Nº 012/2022  
Nº DO CONTRATO: 013/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 247/2022  
Nº DA OBRA: 059/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2023 a 25/07/2023  
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MIBRO DOS LOPES, MUNICÍPIO DE SANTALUZ, CONFORME CONTRATO Nº 013-2023  
EMPRESA: GLOBAL MATERIAS, SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ: 23.694.541/0001-62  
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 80.025,48 (Oitenta mil, vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos.)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PUNIT	Total	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO		CONCLUIDO (%)
						QUANT.	VALOR(R\$)	QUANT.	VALOR(R\$)	QUANT.	VALOR(R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 397,58	R\$ 2.385,48			6,00	2.385,48	0,00		100,00%
1.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	106,19	R\$ 16,01	R\$ 1.700,10			106,19	1.700,10	0,00		100,00%
1.3	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CABRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	106,19	R\$ 20,45	R\$ 2.171,58			106,19	2.171,58	0,00		100,00%
1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	79,87	R\$ 105,89	R\$ 8.457,43	25,00	2.627,25	94,84	6.875,96	14,94	1.561,46	81,30%
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	34,50	R\$ 51,67	R\$ 1.782,61			34,50	1.782,61	0,00		100,00%
1.6	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	R\$ 120,73	R\$ 724,38			6,00	724,38	0,00		100,00%
1.7	DEMOLIÇÃO DE LADRES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,63	R\$ 255,39	R\$ 927,06			3,63	927,06	0,00		100,00%
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,00	R\$ 21,16	R\$ 359,72			17,00	359,72	0,00		100,00%
1.9	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	278,30	R\$ 16,81	R\$ 4.678,22			139,15	2.339,11	139,15	2.339,11	50,00%
1.10	Desmontagem e ré-montagem de peças constituintes de peças serradas 7m x 12cm	m	106,19	R\$ 23,44	R\$ 2.489,09			106,19	2.489,09	0,00		100,00%
1.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,70	R\$ 8,70	R\$ 127,89			14,70	127,89	0,00		100,00%
1.12	Remoção de calha de zinco	m	29,60	R\$ 9,27	R\$ 274,39			29,60	274,39	0,00		100,00%
1.13	Demolição de piso de alta resistência	m²	4,14	R\$ 17,82	R\$ 73,77			4,14	73,77	0,00		100,00%
1.14	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	60,00	R\$ 10,63	R\$ 640,80			0,00	-	60,00	640,80	0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							0,00	-	0,00	-	0,00%
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 152,17	R\$ 12.173,60	20,00	3.043,40	40,00	6.086,80	40,00	6.086,80	50,00%
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							0,00	-	0,00	-	0,00%
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VIZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 10X) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM FREIARO MANUAL. AF_05/2014	m²	378,48	R\$ 58,49	R\$ 22.137,29	113,54	6.641,18	362,76	17.709,83	75,70	4.427,45	80,00%
3.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-F, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	11,62	R\$ 560,13	R\$ 6.508,71			0,00	-	11,62	6.508,71	0,00%

Julia Araújo  
Engenheira Civil  
CREA-BA.3000811424

Tomás Roberto Ferreira de Almeida  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



3.3	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE L = 1500. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	36,80	R\$ 99,51	R\$ 3.661,96	-	0,00	-	36,80	3.661,96	0,00%
3.4	plandieira de concreto pré-moldado	m	93,91	R\$ 57,29	R\$ 5.380,10	23,91	23,91	1.389,80	70,00	4.010,30	23,46%
3.5	Soleira em granito branco, fôrtila, l = 15 cm, e = 2 cm	m	25,50	R\$ 97,46	R\$ 2.485,23	-	0,00	-	25,50	2.485,23	0,00%
4.0	ESQUADRIAS										
4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 873,24	R\$ 6.112,68	-	0,00	-	7,00	6.112,68	0,00%
4.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR-TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,89	R\$ 632,68	R\$ 4.359,16	-	0,00	-	6,89	4.359,16	0,00%
4.3	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,96x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1,00	R\$ 1.288,47	R\$ 1.288,47	-	0,00	-	1,00	1.288,47	0,00%
4.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 787,34	R\$ 3.149,36	-	0,00	-	4,00	3.149,36	0,00%
4.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 761,56	R\$ 761,56	-	0,00	-	1,00	761,56	0,00%
5	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	R\$ 99,25	R\$ 1.290,25	-	0,00	-	13,00	1.290,25	0,00%
5.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	23,33	R\$ 698,89	R\$ 20.498,44	-	0,00	-	23,33	20.498,44	0,00%
5.3	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8" inclusive ferroliho e dobradiças conforme desenho	m²	17,00	R\$ 450,46	R\$ 7.657,82	-	0,00	-	17,00	7.657,82	0,00%
5.4	Letras em aço esmaltado 40 x 40 cm	un	28,00	R\$ 185,02	R\$ 5.200,56	-	0,00	-	28,00	5.200,56	0,00%
5.5	Portão de ferro da abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroliho	m²	3,50	R\$ 457,59	R\$ 1.601,56	-	0,00	-	3,50	1.601,56	0,00%
6.0	VIDROS										
6.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,62	R\$ 269,84	R\$ 7.722,82	-	0,00	-	28,62	7.722,82	0,00%
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,16	R\$ 229,83	R\$ 36,77	-	0,00	-	0,16	36,77	0,00%
6.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 486,67	R\$ 1.051,20	-	0,00	-	2,16	1.051,20	0,00%
6.4	JOGO DE FERRAGENS COM BARRAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA DE CORTA-VENTO DE COBRANÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CABEÇOTE SEM MOLDE E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	R\$ 227,58	R\$ 455,16	-	0,00	-	2,00	455,16	0,00%
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	10,44	R\$ 479,47	R\$ 5.005,66	-	0,00	-	10,44	5.005,66	0,00%
6.6	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva puxador - Rev 01_10/2021	m²	6,30	R\$ 662,14	R\$ 4.171,48	-	0,00	-	6,30	4.171,48	0,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
7.1	PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ESSOTO	m²	548,09	R\$ 14,92	R\$ 8.177,50	-	548,09	8.177,50	0,00	-	100,00%
7.2	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2,00	R\$ 1.058,67	R\$ 2.117,34	1,00	2,00	1.058,67	0,00	-	100,00%
7.3	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 39,53	R\$ 118,59	2,00	3,00	118,59	0,00	-	100,00%



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

**Julia Barjão**  
 Engenharia Civil  
 CREA-BA 3000641424

Item	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Qtd	Valor Total	Valor Unit	Qtd	Valor Total	Porcentagem
7.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	4,00	R\$ 224,75	R\$ 898,99	148,84	6,00	898,99	224,76	0,00	0,00	100,00%
7.5	BOMBA CENTRÍFUGA, HONGKONGFASHA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HW 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 747,88	R\$ 747,88	747,88	1,00	747,88	747,88	0,00	0,00	100,00%
7.6	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	60,00	R\$ 14,72	R\$ 883,20	588,90	60,00	883,20	883,20	0,00	0,00	100,00%
7.7	Flange pvc rígido para caiva de água 25mm (adaptador c/ flange e anel)	un	3,00	R\$ 20,74	R\$ 62,22	41,48	3,00	62,22	62,22	0,00	0,00	100,00%
7.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	28,00	R\$ 11,46	R\$ 320,88	206,26	28,00	320,88	320,88	0,00	0,00	100,00%
7.9	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 2,5, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA (RECRIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_06/2015	UN	19,00	R\$ 5,75	R\$ 109,25	63,25	19,00	109,25	109,25	0,00	0,00	100,00%
7.10	T8 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	8,00	R\$ 9,99	R\$ 79,92	19,99	8,00	79,92	79,92	2,00	19,99	75,00%
7.11	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	12,00	R\$ 6,34	R\$ 76,08	12,69	8,00	50,72	50,72	4,00	25,36	66,87%
7.12	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	22,00	R\$ 118,21	R\$ 2.600,62	1.182,10	16,00	1.891,36	1.891,36	6,00	709,26	72,73%
8	ESGOTO						0,00					
8.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (velatórios, mictrórios, raios sifonados, etc...)	un	14,00	R\$ 78,26	R\$ 1.095,64	-	14,00	1.095,64	1.095,64	0,00	0,00	100,00%
8.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 15,77	R\$ 220,78	-	0,00	-	-	14,00	220,78	0,00%
8.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8,00	R\$ 119,14	R\$ 953,12	-	8,00	953,12	953,12	0,00	0,00	0,00%
8.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RÓTULO DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 69,08	R\$ 2.072,40	690,00	30,00	2.072,40	2.072,40	0,00	0,00	100,00%
8.5	JOELHO 45 GRAUS PARA PRÉ DE COLUNA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 34,72	R\$ 173,60	-	5,00	173,60	173,60	0,00	0,00	100,00%
8.6	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 51,55	R\$ 257,75	-	5,00	257,75	257,75	0,00	0,00	100,00%
9	METAS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS						0,00					
9.1	CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 169,54	R\$ 339,08	-	0,00	-	-	2,00	339,08	0,00%
9.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 367,54	R\$ 367,54	-	0,00	-	-	1,00	367,54	0,00%
9.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 336,46	R\$ 672,92	-	0,00	-	-	2,00	672,92	0,00%
9.4	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravens P9, DECA ou similar, c/ox. descarga de sobrep. AROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	R\$ 396,93	R\$ 396,93	-	0,00	-	-	1,00	396,93	0,00%
9.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 471,87	R\$ 3.303,09	-	0,00	-	-	7,00	3.303,09	0,00%
9.6	Pla de cozinha com bancada em aço inox, diâmetro 1.800x60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	R\$ 1.392,23	R\$ 1.392,23	-	0,00	-	-	1,00	1.392,23	0,00%
9.7	BANCADEIRA GRANITO CINZA - 50 X 75 X 10 CM - CUBA DE EMBUTIRAR LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 90 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 583,24	R\$ 1.166,48	-	0,00	-	-	2,00	1.166,48	0,00%
9.8	Lavatório com bancada em granito cinza ardente, e = 2cm, diâmetro 2.600x60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável finalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapé 10 cm, assentada	un	2,00	R\$ 2.219,55	R\$ 4.439,10	-	0,00	-	-	2,00	4.439,10	0,00%



9.9	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"BARRA TÂNQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 83,67	R\$ 1.171,36					0,00	14,00	1.171,36	0,00%
9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cucas de emitir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada	un	3,00	R\$ 1.593,36	R\$ 4.768,08					0,00	3,00	4.768,08	0,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
10.1	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	546,09	R\$ 5,70	R\$ 3.124,11					546,09	0,00	3.124,11	100,00%
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R\$ 15,96	R\$ 638,40					0,00	40,00	638,40	0,00%
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.275,00	R\$ 2,79	R\$ 3.557,25					0,00	1.275,00	3.557,25	0,00%
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,00	R\$ 5,25	R\$ 1.863,75					0,00	355,00	1.863,75	0,00%
10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	R\$ 10,36	R\$ 2.486,40	60,00				60,00	180,00	1.864,80	25,00%
10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSSÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 10,83	R\$ 324,90					0,00	30,00	324,90	0,00%
10.7	TOMADA BAIXA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	R\$ 23,47	R\$ 1.056,15					0,00	45,00	1.056,15	0,00%
10.8	TOMADA ALTA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 37,74	R\$ 377,40					0,00	10,00	377,40	0,00%
10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 35,17	R\$ 562,72					0,00	16,00	562,72	0,00%
10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 22,33	R\$ 111,65					0,00	5,00	111,65	0,00%
10.11	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 774,74	R\$ 774,74					0,00	1,00	774,74	0,00%
10.12	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 44,53	R\$ 89,06					0,00	2,00	89,06	0,00%
10.13	Luminária sobrepõe quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	56,00	R\$ 97,51	R\$ 5.460,56					0,00	56,00	5.460,56	0,00%
10.14	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/peu	un	4,00	R\$ 28,51	R\$ 114,04					0,00	4,00	114,04	0,00%
10.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/200A - 175v Classe II	un	18,00	R\$ 78,21	R\$ 1.407,78					0,00	18,00	1.407,78	0,00%
10.16	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30kVA	un	2,00	R\$ 206,57	R\$ 413,14					0,00	2,00	413,14	0,00%
10.17	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5kA	un	1,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00					0,00	1,00	159,00	0,00%
10.18	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	6,00	R\$ 260,78	R\$ 1.564,68					0,00	6,00	1.564,68	0,00%
10.19	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	un	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					0,00	4,00	-	0,00%
10.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 55,93	R\$ 279,65					0,00	5,00	279,65	0,00%
10.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 57,13	R\$ 114,26					0,00	2,00	114,26	0,00%
10.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 59,43	R\$ 594,30					0,00	10,00	594,30	0,00%
11	INFRA ESTRUTURA												
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBORTAMENTO OU SAPATA, (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	4,32	R\$ 92,90	R\$ 401,32					4,32	0,00	401,32	100,00%
11.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	4,69	R\$ 121,63	R\$ 570,44					4,69	0,00	570,44	100,00%
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBORTAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	15,75	R\$ 20,23	R\$ 318,62					15,75	0,00	318,62	100,00%
11.4	ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,53	R\$ 3.503,96	R\$ 15.872,93					4,53	0,00	15.872,93	100,00%



11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,69	R\$ 3.503,96	R\$ 16.433,57					4,68	16.433,57	0,00	100,00%
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEBRIÇOS AF_06/2018	m²	132,53	R\$ 45,33	R\$ 6.007,56					132,53	6.007,56	0,00	100,00%
12	<b>SUPERESTRUTURA</b>									0,00			
12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,95	R\$ 3.503,96	R\$ 17.344,60		3,47			4,95	17.344,60	0,00	100,00%
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,69	R\$ 3.503,96	R\$ 16.433,57		3,28			4,69	16.433,57	0,00	100,00%
12.3	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, itreixo 38cm, h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=8cm, inclusive escoamento em madeira e capesamento 4cm.	m²	21,76	R\$ 162,43	R\$ 3.534,47		3,76		610,73	21,76	3.534,47	0,00	100,00%
12.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,20	R\$ 115,13	R\$ 483,54		2,94		338,48	4,20	483,54	0,00	100,00%
12.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,16	R\$ 53,93	R\$ 332,20		4,31		252,54	6,16	332,20	0,00	100,00%
12.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,58	R\$ 114,03	R\$ 4.741,36		14,11		1.608,96	26,58	3.031,37	15,00	63,93%
12.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,00	R\$ 39,84	R\$ 756,96		6,30		211,15	11,00	438,24	8,00	57,89%
12.8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,58	R\$ 52,81	R\$ 2.195,83		20,00		1.056,20	32,47	1.714,95	9,11	78,10%
12.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEBRIÇOS AF_06/2018	m²	21,76	R\$ 45,33	R\$ 996,58		10,00		453,30	21,76	996,58	0,00	100,00%
13	<b>PAREDES INTERNAS EXTERNAS</b>									0,00			
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	820,72	R\$ 4,58	R\$ 3.758,89		246,22		1.127,66	482,43	2.255,33	328,29	60,00%
13.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DETALHADAS. AF_06/2014	m²	890,72	R\$ 26,05	R\$ 23.203,25		482,44		12.828,06	482,44	12.828,06	388,28	56,29%
13.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 300 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	92,26	R\$ 495,09	R\$ 45.677,00					0,00		92,26	0,00%
13.4	Cobogó de ornento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	18,44	R\$ 71,97	R\$ 1.327,12					0,00		18,44	0,00%
14	<b>PISOS INTERNOS</b>												
14.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antirruído, portobelo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1 rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	340,93	R\$ 71,73	R\$ 24.454,90					0,00		340,93	0,00%
14.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha rivera, cor branca mate, ou similar, PE-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	326,24	R\$ 42,41	R\$ 13.835,83					0,00		326,24	0,00%
14.3	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x15CM. AF_06/2014	M	62,32	R\$ 8,09	R\$ 504,16					0,00		62,32	0,00%

*Júlia Araújo*  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

**Júlia Araújo**  
Engenharia Civil  
CREA-BA 300041/2024







**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PERDCOMP 8.2**

CNPJ 23.694.541/0001-62

14415.98213.260723.1.3.15-8096

**DADOS INICIAIS**

<b>Nome Empresarial</b>	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
<b>Data de Criação</b>	26/07/2023
<b>Data de Transmissão</b>	26/07/2023
<b>Tipo de Documento</b>	Declaração de Compensação
<b>Tipo de Crédito</b>	Retenção - Lei nº 9.711/98
<b>PER/DCOMP Retificador</b>	Não
<b>Crédito Oriundo de Ação Judicial</b>	Não
<b>Qualificação do Contribuinte</b>	Outra Qualificação
<b>Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária</b>	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**





**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PERDCOMP 8.2**

CNPJ 23.694.541/0001-62

14415.98213.260723.1.3.15-8096

**DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA**

**Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB**

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone Fixo	(71) 91032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

Nome	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF	013.598.325-80
CRC	043222
UF	BA
Telefone Fixo	(71) 91032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com



# Receita Federal do Brasil

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 23.694.541/0001-62

14415.98213.260723.1.3.15-8096

### RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Janeiro de 2023
Selic Acumulada	5,28%
Crédito Passível de Restituição	54.600,47
Crédito Original na Data da Entrega	54.600,47
Crédito Atualizado	57.483,37
Total dos Débitos deste Documento	1.268,18
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	1.204,58
Saldo do Crédito Original	53.395,89

### DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	01/2023
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	4502859-01-2099-2301-4502859
Data de Fechamento EFD-REINF	04/04/2023
Valor das Retenções	55.587,09
Deduções em DCTFWeb	986,62

### DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000123883354
Data da Transmissão DCTFWeb	04/04/2023
Valor Total das Deduções DCTFWeb	986,62
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°	0,00





**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 23.694.541/0001-62

14415.98213.260723.1.3.15-8096

**CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF**

<b>0001. CNPJ do Tomador</b>	13.807.870
Valor da Retenção	55.587,09
<b>VALOR TOTAL DA RETENÇÃO</b>	55.587,09



**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PERDCOMP 8.2**

CNPJ 23.694.541/0001-62

14415.98213.260723.1.3.15-8096

**001. Débito CP Patronal**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucedida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Patronal
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	Junho de 2023
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	20/07/2023
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000144964069
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	04/07/2023
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	06/2023
<b>Principal</b>	408,78
<b>Multa</b>	8,09
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	416,87

**002. Débito CP Patronal**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucedida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Patronal
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	Junho de 2023
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	20/07/2023





**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PERDCOMP 8.2**

CNPJ 23.694.541/0001-62

14415.98213.260723.1.3.15-8096

<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000144964069
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	04/07/2023
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	06/2023
<b>Principal</b>	400,00
<b>Multa</b>	7,92
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	407,92

**003. Débito CP Patronal**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucedia</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Patronal
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	Junho de 2023
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	20/07/2023
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000144964069
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	04/07/2023
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	06/2023
<b>Principal</b>	61,31
<b>Multa</b>	1,21
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	62,52

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	<b>CNPJ</b>	23.694.541/0001-62
<b>Período apuração</b>	06/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000144964069
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	04/07/2023 12:45:20	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	20558398806 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SALVADOR	<b>Número</b>	001057
<b>Complemento</b>	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINESS	<b>Bairro/Distrito</b>	CAMINHO DAS ARVORES
<b>Município</b>	Salvador	<b>UF</b>	BA
<b>CEP</b>	41820790	<b>Telefone</b>	7133795599
<b>Correio Eletrônico</b>	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	<b>CPF</b>	03920017560
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2023		
<b>Débito Apurado</b>	400,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	400,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2023		
<b>Débito Apurado</b>	61,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	61,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2023		
<b>Débito Apurado</b>	408,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	408,78		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2023		
<b>Débito Apurado</b>	153,47		
<b>Saldo a Pagar</b>	153,47		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2023		
<b>Débito Apurado</b>	220,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	220,00		





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2023 12:23:17.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P8Rh3R1cMZP00007.SFP é:

84396ee7-8e4b-49d0-8254-778451530536

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 06/2023

NRA: P8Rh3R1cMZP00007

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 23.694.541/0001-62

14415.98213.260723.1.3.15-8096

**004. Débito CP Segurados**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000144964069
Data de Transmissão DCTFWeb	04/07/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	153,47
Multa	3,04
Juros	0,00
Total	156,51

**005. Débito CP Segurados**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023





**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 23.694.541/0001-62 14415.98213.260723.1.3.15-8096

<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000144964069	
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	04/07/2023	
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral	
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não	
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal	
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	06/2023	
<b>Principal</b>		220,00
<b>Multa</b>		4,36
<b>Juros</b>		0,00
<b>Total</b>		224,36
<b>TOTAL</b>		<b>1.268,18</b>

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858400000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 06/2023  
TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: DG4dBooXALJ0000-3 UF  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE  
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.377,41	REM SEM 13° SALÁRIO	2.665,96
REM BASE CALC 13° SAL	666,49	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	213,27
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.377,41	REM SEM 13° SALÁRIO	2.665,96		
REM BASE CALC 13° SAL	666,49	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	375,09	DEPÓSITO	213,27		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.363,72	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	2		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: P8Rr3R1cMzP0000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 06/2023  
N° CONTROLE: AEV7ZUSizIJ0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.377,41	REM SEM 13° SALÁRIO	2.665,96
REM BASE CALC 13° SAL	666,49	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	375,09	DEPÓSITO	213,27
VAL DEVIDO PREV SOC	1.363,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAL A RECOLHER 213,27





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 0002/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL  
REM 13ºSAL  
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

REGIVAN CONCEICAO SILVA  
44,43  
666,49  
166.77488.94-3  
666,49  
09/01/2023  
53,31  
01  
07/06/2023  
11  
07170  
0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 0003/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

EPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÂL 13º SAL PREV SOC  
BASE CÂL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT

OCOR DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO  
1.332,98

0,00

166.48600.14-5  
0,00

01/12/2022  
101,78

01

106,63

07170  
0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL  
REM 13ºSAL  
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA  
2.000,00 0,00 129.37258,04-4 01/05/2023 11 0,00 01414  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 666,49 375,09 213,27 0,00  
4.710,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: P8R3R1CMZP0000-7  
COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 Nº DE CONTROLE: DG4DBOXALJ0000-3 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	3	2.665,96	0,00	1.377,41	666,49
11	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	4	4.665,96	0,00	3.377,41	666,49



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: P8Rh3R1CMZP00000-7  
 COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: DG4DBOXALJ0000-3 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.363.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0.00  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES /		CÓDIGOS							
H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	1 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 T1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	1 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENÇÃO LTDA N° DE CONTROLE: AEV7ZUSIZIJ0000-0 N° ARQUIVO: P8Rh3R1cMZE0000-7  
COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.710,39	666,49	1.377,41	666,49
11	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	4	4.710,39	666,49	3.377,41	666,49



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GEIIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400000027 132701802302 707678180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: AEV7ZUSIZIJ0000-0  
COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: P8Rh3R1cM2P0000-7  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.665,96  
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023				
DEPÓSITO FGTS 213,27	0,00	0,00	0,00	213,27

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: AEV7ZUSI21J0000-0  
 COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAB PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAB: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.363.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 375.09  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 04/07/2023  
HORA: 12:21:29  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
SIMPLES: 1

---

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	2.665,96
DEPÓSITO	213,27
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	213,27

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO			
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			23.694.541/0001-62	0079	2100	507
375,09	870,09	118,54	0,00	0,00	1.363,72	0,00



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº ARQUIVO: P8Rn3R1cMZP0000-7  
 COME: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: P8Rn3R1cMZP0000-7  
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CEP: 41820-790 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155,09
Empregados/Avulsos	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,09
Contribuintes Individuais	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,78
Contribuintes Individuais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
RAT	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,18
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,54
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,54
TOTAL A RECOLHER	1.363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,72

(\*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62  
**Razão Social:** GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME  
**Endereço:** AL SALVADOR 1057 S/1303 SHOP BUSINES / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/07/2023 a 01/08/2023

**Certificação Número:** 2023070300480301945447

Informação obtida em 04/07/2023 11:46:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 32390862/2023

Expedição: 04/07/2023, às 11:42:12

Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA**  
**CNPJ: 23.694.541/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:16:31 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2023.

Código de controle da certidão: **BE86.D245.4E0A.6D63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20233878353

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



## Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ  
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA  
CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Endereço: ALAMEDA SALVADOR Nº 001057 - CAMINHO DAS ARVORES,  
SALVADOR/BA - CEP: 41820790 - EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINESS  
TORRE EUROPA SALA 1303

Número da Certidão: 163760

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 12:09:51 horas do dia 04/07/2023.

Válida até dia 03/08/2023.

Código de controle da certidão: **8F8D.D9A8.F7E5.3791.98F3.BAD2.FE79.5E27**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



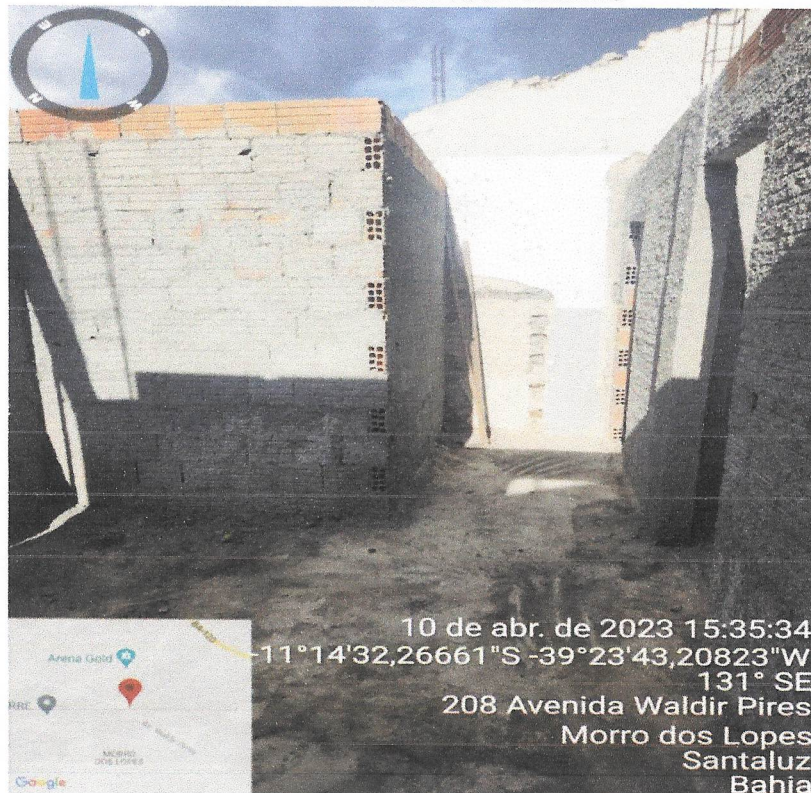
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – Obra de Reforma e ampliação da escola municipal morro dos lopes, Conforme Processo licitatório RDC nº 012/2022 e CONTRATO nº 013-2023 com o Município de SANTALUZ - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

**Foto 01 – CHAPISCO DAS PAREDES**



**Foto 02 – CHAPISCO DAS PAREDES**





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 03 – CHAPISCO DAS PAREDES.



Foto 04 – LEVANTE DE ALVENARIA.



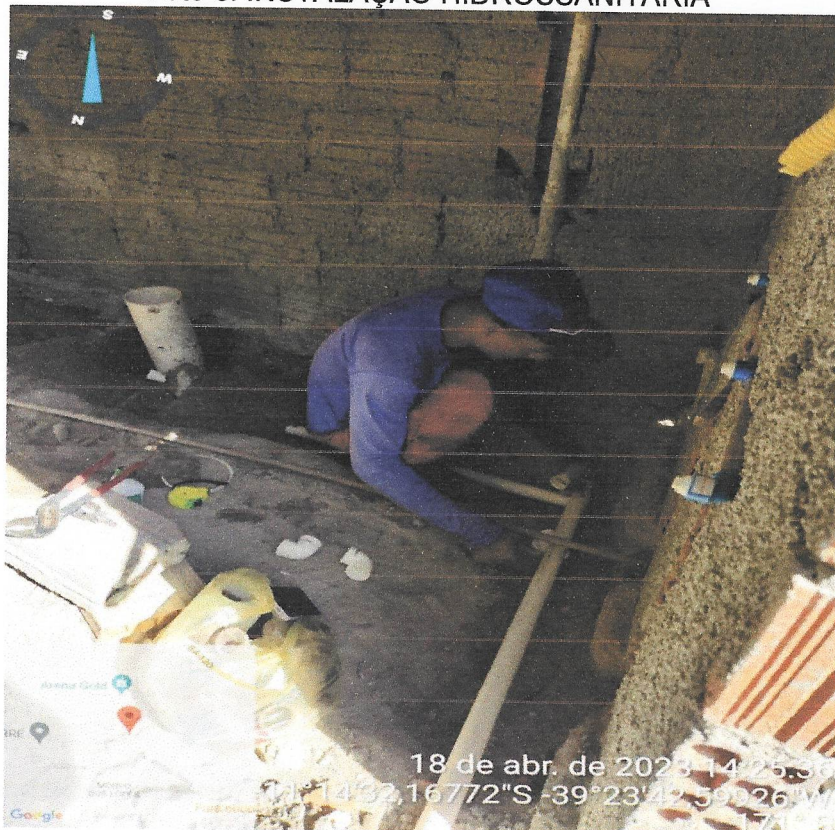


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 5: ARMAÇÃO DAS VIGAS DO TELHADO



Foto 6: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA



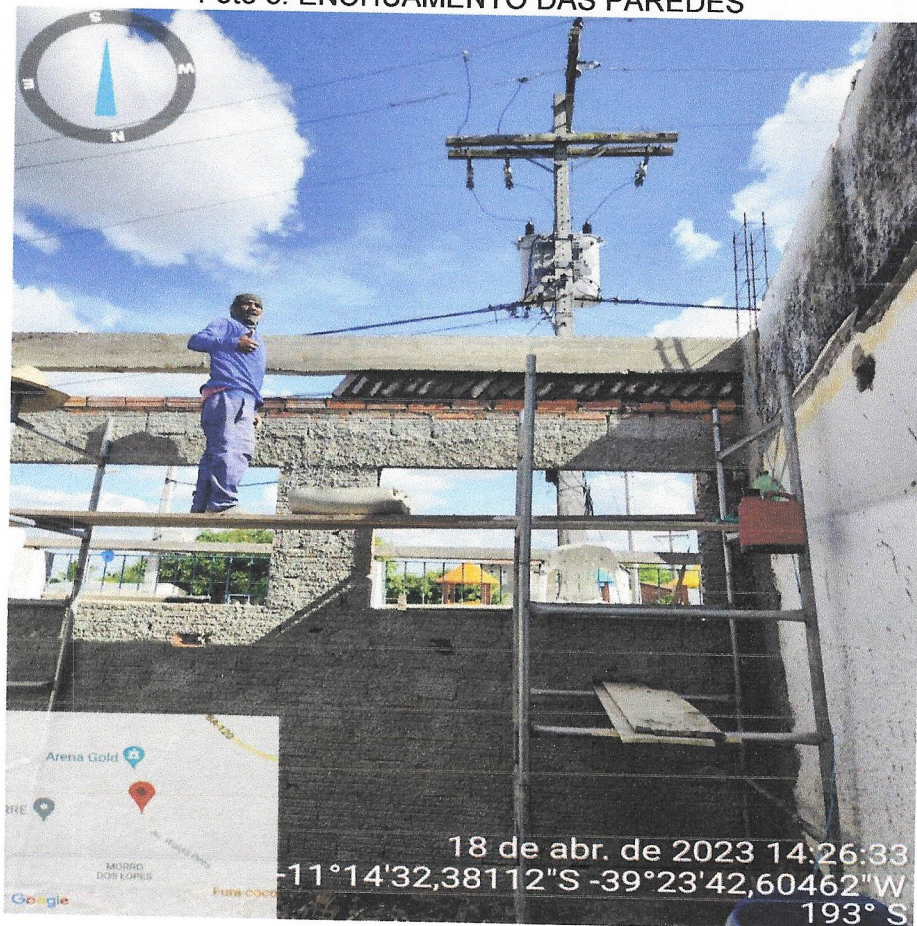


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 7: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



Foto 8: ENCHUAMENTO DAS PAREDES





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 09- LEVANTE DE ALVENARIA



Foto 10- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 11- LIMPEZA DA DEMOLIAÇÃO E CHAPISCO.



Foto 12- LEVANTE DE ALVENARIA.





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 13- REBOCO DA ALVENARIA.

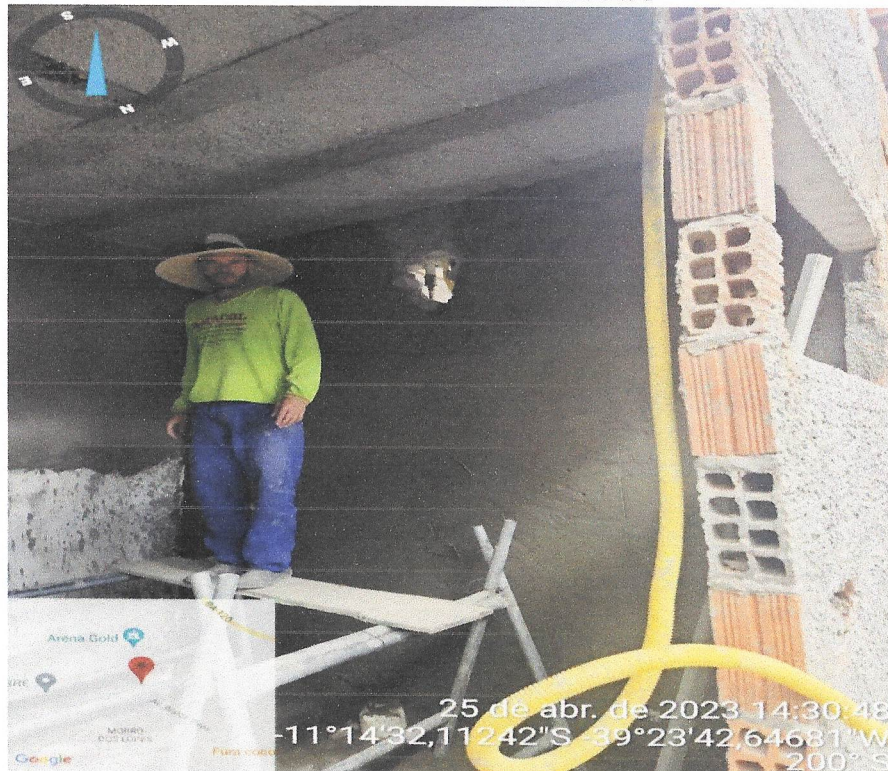


Foto 14- REBOCO DA ALVENARIA.





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 15- EXECUÇÃO DO CONTRAPISO.



Foto 16- ARMAÇÃO DA VIGA.





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 17-CONCRETAGEM DA VERGA.



Foto 18- REBOCO DA ALVENARIA.



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPRENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

**Foto 19- ARAMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO**



**Foto 20- CONCRETAGEM DO RESERVATÓRIO**





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 21- EXECUÇÃO DO MEIO-FIO.



Foto 22- EXECUÇÃO DO TELHADO.





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 23- ARAMAÇÃO DAS FERRAGENS DA PAREDE LATERAL DO RESERVATÓRIO



Foto 24- EXECUÇÃO DA CONTRAVERGA





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

**Foto 24- ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO RESERVATÓRIO**



**Foto 25- ARMAÇÃO DAS FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM**



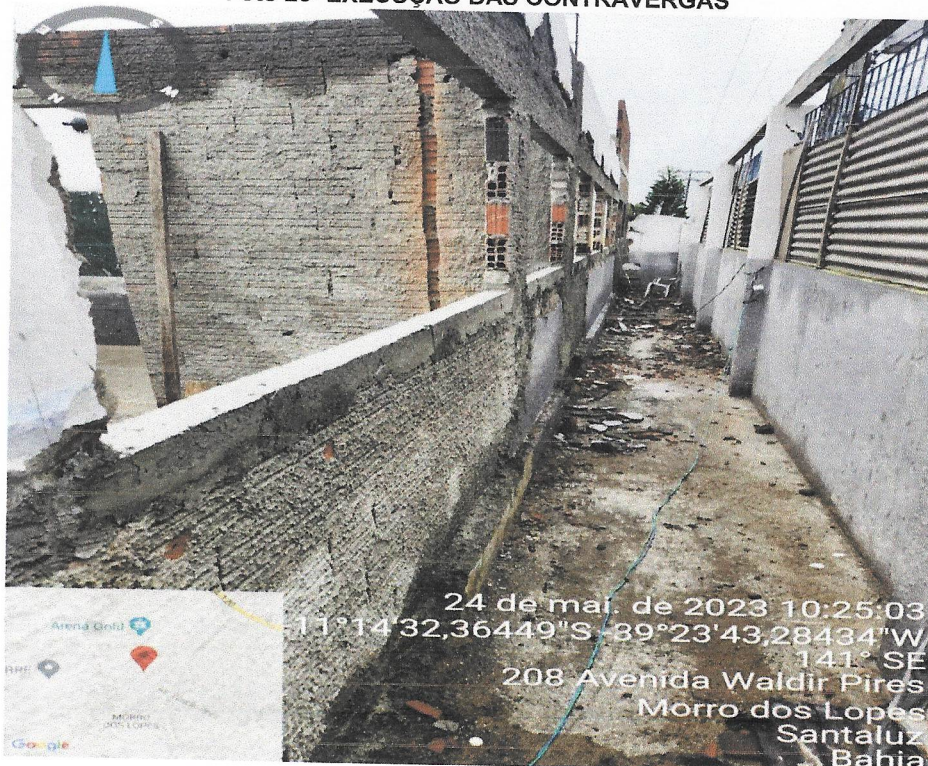


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 26- DESFORMA DAS VIGAS E CONTRAVERGA



Foto 26- EXECUÇÃO DAS CONTRAVERGAS





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 27- CONCRETAGEM DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO



Foto 28- ARMAÇÃO DA FERRAGEM E DA FORMA DO RESERVATÓRIO



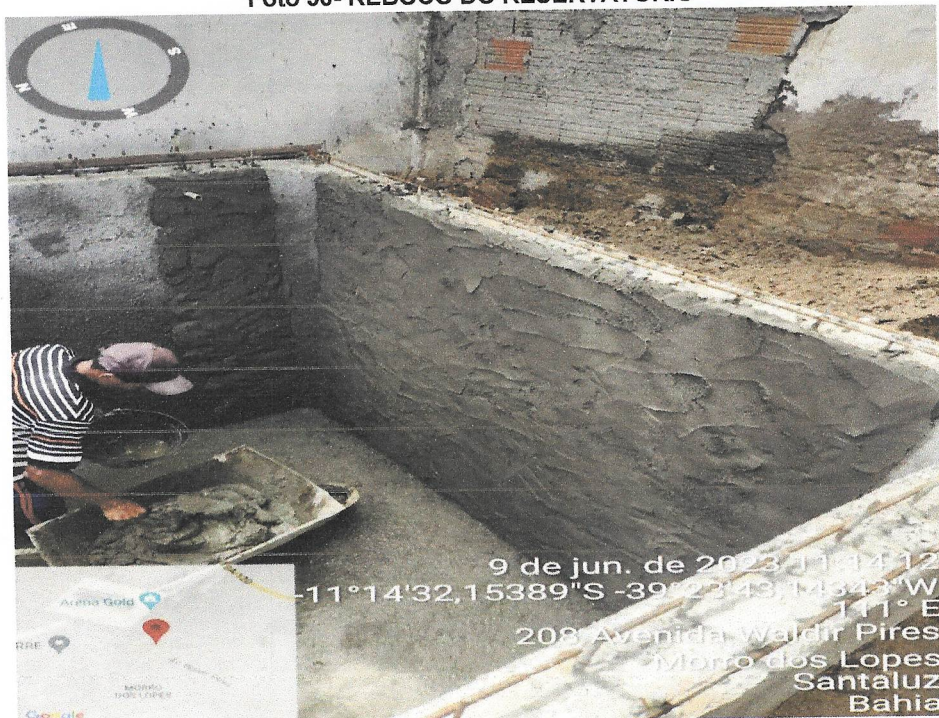


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 29- CONCRETAGEM DA TAMPA DO RESERVATÓRIO



Foto 30- REBOCO DO RESERVATÓRIO



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA

Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

**Foto 31- REBOCO DA ALVENARIA**



**Foto 32- REBOCO DA ALVENARIA E DESFORMA DA LAJE DA COZINHA**





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 33- EXECUÇÃO DE MESTRAS



Foto 34- REBOCO DA ALVENARIA



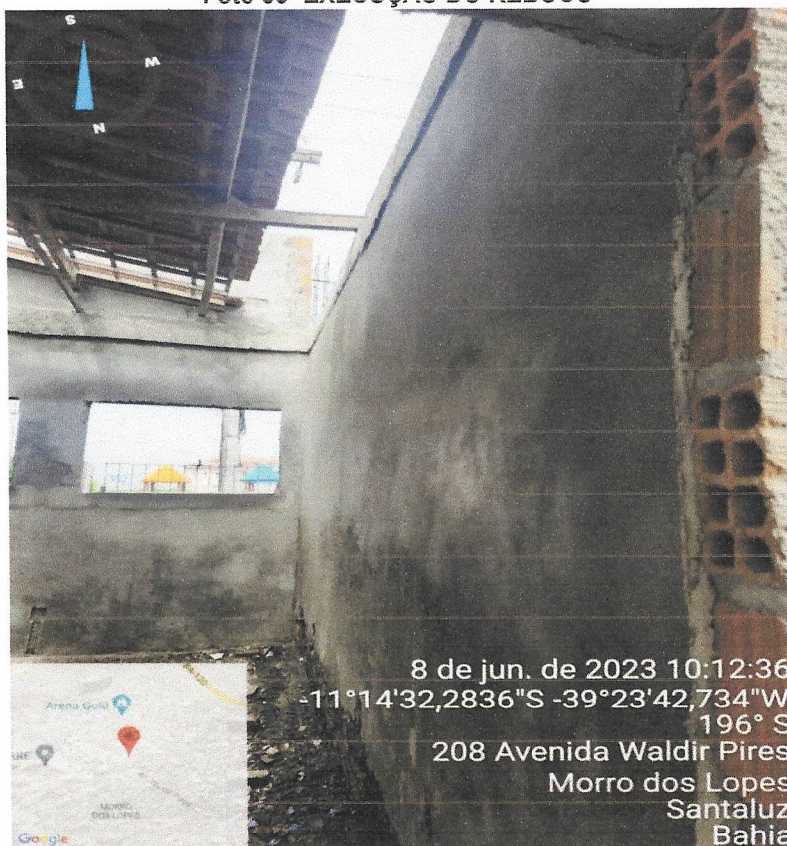


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 35- EXECUÇÃO DO REBOCO



Foto 36- EXECUÇÃO DO REBOCO



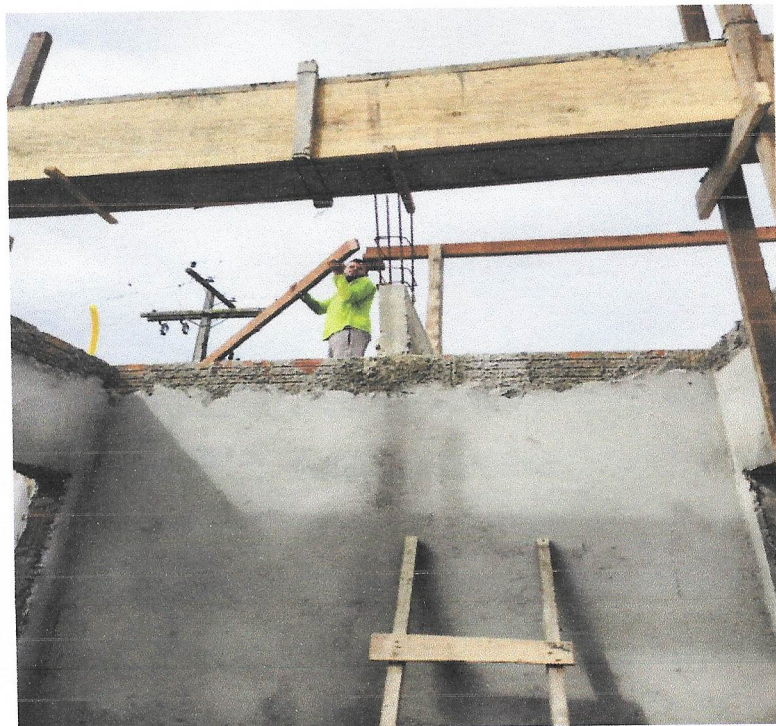


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 37- EXECUÇÃO DO REBOCO



Foto 37- EXECUÇÃO DO TELHADO





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 38- EXECUÇÃO DO TELHADO



Foto 39- EXECUÇÃO DO TELHADO





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/07/2023	SANTALUZ	Reforma Da Escola

Foto 40- EXECUÇÃO DA PINGADEIRA



Foto 41- EXECUÇÃO DA PINGADEIRA



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO RDC Nº 812/2022 RDO: 63				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva ej cond. Trab. 3- Chuva ej cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LEVANTE DE ALVENARIA ATERRO DA AREA DE CIRCULAÇÃO CONCRETAGEM DE PILARES ARMAÇÃO DA CAIXA DA VIGA				MÃO DE OBRA INDRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hº DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçembe Plator Serralheiro Hº DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hº DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hº ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/04/2023				Data: 04/04/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	X	Q	Q	S	S	D
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES</p> <p>CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 64</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>					<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA QTDE</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 4</p> <p>Ajudante Geral 8</p> <p>Calçeteiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motociclista</p> <p>Montador</p> <p>Montador-Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Petrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motociclista de caçamba</p> <p>Pinor</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO QTDE.</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Munck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p> <p>GERENTE DE OBRA: Data: 06/04/2023</p> <p>FISCALIZAÇÃO: Data: 06/04/2023</p>							
<p>CONCRETAGEM DAS VIGAS</p> <p>LEVANTE DE ALVENARIA</p> <p>ATERRO DA AREA DA COZINHA</p> <p>EXECUÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO</p> <p>ARMAÇÃO DAS CAIXAS DA VIGA</p> <p>ARMAÇÃO DAS FERRAGEM DA VIGA E DO PILAR</p>												
<p>CONSIDERAÇÕES</p>												
<p>OBSERVAÇÕES</p>												

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
<p style="font-size: small;">CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  CONTRATO Nº 013-2023  LICITAÇÃO RDC Nº 012 2022  RDC: 65</p>				S	T	Q	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Obratórias		Materiais		Fases		RDC		CATEGORIA			QTDE
SIMBOLOGIA		( 1 )		( 1 )		( 65 )					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								MÃO DE OBRA INDIRETA			
SEM SERVIÇO								Gerente de Obra			
								Engenheiro		1	
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Maestre de obra			
								Encarregado geral		1	
MÃO DE OBRA DIRETA											
								Topógrafo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								Calçeteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motociclista			
								Montador			
								Montador Elétrico			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
Pinheiro											
Serralheiro											
RESUMO DO EFETIVO											
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hs DO DIA			
								Hs ACUMULADO			
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
								TIPO		QTDE.	
								Veículo Leve			
								Canhão Muncie			
								Canhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
Placa Vibratória											

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES				EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 013-2023				CATEGORIA											
LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022				MÃO DE OBRA INDIRETA											
RDO: 66				QTDE											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA DIRETA											
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra											
				Engenheiro								1			
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Téc. de obra											
				Encarregado geral								1			
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO															
Hrs DO DIA															
				Hrs ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO								QTDE.			
				Veículo Leve											
				Caminhão Muncie											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
Caçamba															
Patrol															
PC 300															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 07/04/2023				Data: 07/04/2023											

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	X	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 019-2023				LICITAÇÃO / RDC Nº 012/2022 RDO: 67										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÁO DE OBRA INDRETA QTDE										
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
				MÁO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Pneu PC 200 Placa Vibratória										
				CONSIDERAÇÕES										
				OBSERVAÇÕES										
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
				Data: 08/04/2023				Data: 08/04/2023						


*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO NORRO DOS LOPES CONTRATO Nº: 013-2023 LICITAÇÃO / RDO Nº: 012 2022 RDO: 68				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond, Trab. 3- Chuva al cond, Trab.				CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
				Gerente de Obra								1	
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									
				Ajudante Geral									
				Calçateiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador/Eletricista									
Eletricista													
Operador de Petrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTDE.	
				Veículo Leve									
				Comissão Munic									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Petrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 09/04/2023				Data: 09/04/2023									

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDO: 69						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA						
LEVANTE DE ALVENARIA ATERRO DA ÁREA DA COZINHA EXECUÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS CHAPISCO DAS PAREDES				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hº DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eltricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hº DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hº DO DIA Hº ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Mueck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/04/2023				Data: 10/04/2023						

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				a	x	q	q	s	s	d
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				EFETIVO PESSOAL						
LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022				CATEGORIA						
RDO: 70				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva of. cond. Trab. 3- Chuva of. cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DAS LONGARINAS DAS LAJES LEVANTE DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS CHAPISCO				Hrs DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hrs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Municipal Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol P2 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/04/2023				Data: 11/04/2023						

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
<b>GRUPO GLOBAL</b> CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDO: 73							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA:				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Almoço da obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DAS LONGARINAS DAS LAJES LEVANTE DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS CHAPISCO				Hrs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hrs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/04/2023				Data: 14/04/2023							

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES										
CONTRATO Nº 013-2023		LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022		CATEGORIA							
RDO: 75		Noto: ( )									
Mão de obra ( 1 )		Térço: ( 1 )		MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Base 2- Choveu af. cond. Tráb. 3- Choveu af. cond. Tráb.											
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1  Hr DO DIA  MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hr DO DIA  RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO  EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Carpimba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/04/2023				Data: 16/04/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424


*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDO: 77				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1				
EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA ARMAÇÃO DAS VIGAS LEVANTE DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS CHAFISCO				Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxiliar de topografia 4 Pedreiro 6 Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caixa Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA								
						RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caixa Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/04/2023				Data: 18/04/2023								


  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES <b>CONTRATO Nº:</b> 013-2023 <b>LICITAÇÃO F RDC Nº:</b> 012.2022 <b>RDO:</b> 78				<b>EFETIVO PESSOAL</b> CATEGORIA      QTDE						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBIOLOGIA:</b> 1- Tempo Item    2- Chave de cond. Tralh.    3- Chave al cond. Tralh.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA ARMAÇÃO DAS VIGAS LEVANTE DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS CHAPISCO				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia      4 Pedreiro      8 Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pintol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veículo Leve Câmbio Manç Câmbio Toco Escavadeira Pa carregadeira Capamba Pintol Pc 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 19/04/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 19/04/2023						

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Matenas, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 012/2023				LICITAÇÃO / RDC Nº 012/2022							
RDO: 00				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of. coord. Tráb. 3- Chuva of. coord. Tráb.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SEM SERVIÇO				Hs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/04/2023				Data: 21/04/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MONRO DOS LOPES CONTRATO Nº: 013-2023				LICITAÇÃO / RDC Nº: 012-2022 RDO: 02							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva of cond. Trab. 3 - Chuva of cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hr DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 23/04/2023				Data: 23/04/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA














RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023      LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022      RDO: 87				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1  Hi DO DIA  MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro  Hi DO DIA  RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hi DO DIA Hi ACUMULADO						
REBOCO DAS PAREDES DO BANHEIRO ARMAÇÃO DAS VIGAS LEVANTE DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS CONTRAPISO NOS BANHEIROS				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncil Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/04/2023				Data: 28/04/2023						


*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.				CATEGORIA			QTD				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA ARMAÇÃO DAS VIGAS LEVANTE DE ALVENARIA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS GUARISCO				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							4
				Ajudante Geral							8
				Calefeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTD				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá-carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/04/2023				Data: 28/04/2023							

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				LICITAÇÃO / RDO Nº 012 2022 RDO: 88							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/04/2023				Data: 30/04/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3009041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA










RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEIS <b>CONTRATO Nº:</b> 013-2023 <b>LICITAÇÃO / RDC Nº:</b> 012 2022 <b>RDC:</b> 02 <b>Manhã:</b> (      ) <b>Tarde:</b> (      ) <b>Noite:</b> (      )				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bate      2 - Chavea c/ cond. Trab.      3- Chavea s/ cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra      1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Maestros de obra Encarregado geral      1  Hr DO DIA  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      4 Ajudante Geral      8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hr DO DIA						
<b>EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA</b> <b>CONCRETO MAGRO DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b> <b>LEVANTE DE ALVENARIA</b> <b>EXECUÇÃO DO TELHADO</b> <b>REBOCO DO BANHEIRO PCD</b>										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Velcudo Leve Caminhão Muncid Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Escavadeira Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>						
Data: 03/05/2023				Data: 03/05/2023						

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	Q	X	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES										
CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022			CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab.			Gerente de Obra							
EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA CONCRETO MAGRO DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO TELHADO REBOCO DO BANHEIRO PCD			Engenheiro							
			Téc. de Segurança							1
			Aux. Adm.							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral							1
			Hi DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topógrafo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							4
			Ajudante Geral							8
			Cajoteiro							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de capamba							
Pintor										
Serralheiro										
Hi DO DIA										
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES			Hi DO DIA							
			Hi ACUMULADO							
			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO							QTDE.
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Capamba							
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/05/2023			Data: 04/05/2023							

**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424


**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES <b>CONTRATO Nº:</b> 013-2023 <b>LICITAÇÃO / RDC Nº:</b> 012 2022 <b>RDO:</b> 04					<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )					<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva al. com. Trab.    3- Chuva al. com. Trab.					<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  CORTE E DOBRA DO FERRO DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA CONCRETO MAGRO DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO TELHADO REBOCO DO BANHEIRO PCD CHAPISCO DA SALA PCD					<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>					<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
					TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 05/05/2023					<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 05/05/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424


*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	X	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012/2022 RDO: 95 Companhia Construtora: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )	ELETIVO PESSOAL								
	CATEGORIA							QTD	
	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SÍMBOLO/OBRA			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
CORTE E OBRA DE FERRO DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA CONCRETO MAGRO DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO TELHADO REBOCO DO BANHEIRO PCO CHAFISCOS DA SALA PCO			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Maistro de obra Encarregado geral 1						
			HÔ DIÁ						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Elétricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
			HÔ DIÁ						
			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HÔ DIÁ HÔ ACUMULADO						
			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munic. Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
			GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:			
Data: 06/08/2023			Data: 06/08/2023						

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041474

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES										
CONTRATO Nº 013-2023		LICITAÇÃO / RDC Nº 012-2022		RDC: 06		CATEGORIA			QTDE		
Mão-de-obra: ( 1 )		Tubo: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA					
1- Tempo Bom 2 - Chuvia e/ou cond. Trab. 3- Chuvia e/ou cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1  Hrs DO DIA  MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hrs DO DIA  RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
SEM SERVIÇO											
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/05/2023				Data: 07/05/2023							

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

*Júlia Varjão*  
 Júlia Varjão  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				X			Q	Q	S	S	D		
				S	T								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO T RDO Nº 012 2022 RDO: 07				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva q/ cond. Tralh. 3- Chuva af cond. Tralh.				CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA									
ARMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO CORTE E DOBRA DE FERRO DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA CONCRETO MADRO DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO TELHADO REBOCO DO BANHEIRO PCD CHAPISCO DA SALA PCD				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA					
				Topógrafo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro								4	
				Ajudante Geral								8	
				Calceiteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motosista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motosista de caçamba									
Pintor													
Serralheiro													
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hrs DO DIA									
				Hrs ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veículo Leve									
				Caminhão Manfr									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/05/2023				Data: 08/05/2023									


*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				EFETIVO PESSOAL						
LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 08				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hi DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ARMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO CORTE E DOBRA DE FERRO DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA CONCRETO MAGRO DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO TELHADO REBOCO DO BANHEIRO PCD CHAPISCO DA SALA PCD				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eltricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hi DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hi DO DIA Hi ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/05/2023				Data: 09/05/2023						

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 09				EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE:										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 H/D DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro H/D DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO H/D DO DIA H/D ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
ARMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO CORTE E DOBRA DE FERRO DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA LEVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO TELHADO REBOCO DO BANHEIRO PGD										
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/05/2023				Data: 10/05/2023						


  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				X				X			
				S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2-Chuva c/ cond. Trab. 3-Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ARMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO CORTE E DOBRA DE FERRO DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA LERVANTE DE ALVENARIA EXECUÇÃO DO TELHADO REBOCO DO BANHEIRO PCD				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hrs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Municipal Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol RC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/05/2023				Data: 11/05/2023							

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES <b>CONTRATO Nº:</b> 019-2023 <b>LICITAÇÃO / RDC Nº:</b> 012 2022 <b>RDO:</b> 101				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL								
<b>Condições Climáticas:</b>		<b>Tarso:</b>		<b>Noite:</b>								
Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )								
		1 - Tempo Bore		2 - Chovia c/ conid. Trabl.		3 - Chovia af' conid. Trabl.						
<b>SIMBOLÓGIA</b>												
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  ARMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO CORTE E OBRA DE FERRO DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DA FERRAGENS DA MGA				<b>Gerente de Obra</b>								
				Engenheiro							1	
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Alunos de obra								
				Encarregado geral							1	
				<b>Hs DO DIA</b>								
								<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>				
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							4	
				Ajudante Geral							8	
				Calçoteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Petrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de PA carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				<b>Hs DO DIA</b>								
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>								
				EFETIVO DO DIA								
				FORMADA DE TRABALHO								
				Hs DO DIA								
				Hs ACUMULADO								
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>								
											<b>TIPO</b>	<b>QTD.</b>
											Veículo Leve	
											Caminhão Munck	
											Caminhão Toco	
											Escavadeira	
											PA carregadeira	
											Caçamba	
											Petrol	
											PC 200	
							Placa Vibratória					
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>								
Data: 12/05/2023				Data: 12/05/2023								

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000841424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA










RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES <b>CONTRATO N°:</b> 013-2023 <b>LICITAÇÃO / RDC N°:</b> 012-2022 <b>RDO:</b> 104				<b>EFETIVO PESSOAL</b>								
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <small>1- Tempo bom    2- Chuva of. cond. Trab.    3- Chuva of. cond. Trab.</small>				<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>					
<b>SEMIOLOGIA</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>								
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  ARMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA CRAVEJAMENTO DO TELHADO				Gerente de Obra			1					
				Engenheiro			1					
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral			1					
<b>HR DO DIA</b>												
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro			4					
				Ajudante Geral			8					
				Caldeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Plator								
				Serralheiro								
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HR DO DIA								
				HR ACUMULADO								
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>								
				<b>TIPO</b>			<b>QTDE.</b>					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>								
Data: 16/05/2023				Data: 16/05/2023								

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES		CONTRATO Nº 013-2023		LICITAÇÃO / RDC Nº 012/2022		RDO: 106																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		1 - Tempo Bom 2 - Chuva e/ou vent. 3 - Chuva e/ou vent. e Tráf.																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SIMBOLOGIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<p>ARMAÇÃO DA FERRAGEM DO RESERVATÓRIO                      EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO                      EXECUÇÃO DO TELHADO                      ARMAÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA                      REBOCO DA SALA PCO</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th colspan="10">EFETIVO PESSOAL</th> </tr> <tr> <th colspan="5">CATEGORIA</th> <th colspan="5">QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">MÃO DE OBRA INDIRECTA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Gerente de Obra</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Engenheiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Tec. de Segurança</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Aux Adm</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Mestre de obra</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Encarregado geral</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Topógrafo</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Auxiliar de topografia</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Pedreiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Ajudante Geral</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Calceiteiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Carpinteiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Motosserra</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Motorista</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Montador</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Montador/Eletricista</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Eletricista</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Patel</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Escavadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Pá carregadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Motorista de caçamba</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Pintor</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Serralheiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Hh DO DIA</td> </tr> </tbody> </table>										EFETIVO PESSOAL										CATEGORIA					QTDE					MÃO DE OBRA INDIRECTA										Gerente de Obra										Engenheiro										Tec. de Segurança										Aux Adm										Mestre de obra										Encarregado geral										Hh DO DIA										MÃO DE OBRA DIRETA										Topógrafo										Auxiliar de topografia										Pedreiro										Ajudante Geral										Calceiteiro										Carpinteiro										Operador de Motosserra										Motorista										Montador										Montador/Eletricista										Eletricista										Operador de Patel										Operador de Escavadeira										Operador de Pá carregadeira										Motorista de caçamba										Pintor										Serralheiro										Hh DO DIA									
EFETIVO PESSOAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CATEGORIA					QTDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MÃO DE OBRA INDIRECTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Gerente de Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Engenheiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tec. de Segurança																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aux Adm																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mestre de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encarregado geral																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Topógrafo																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Auxiliar de topografia																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pedreiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ajudante Geral																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Calceiteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Carpinteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Motosserra																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador/Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Patel																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista de caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pintor																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Serralheiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONSIDERAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EFETIVO DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
QTDE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Veículo Leve																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caminhão Mundi																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caminhão Toco																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PC 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Placa Vibratória																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 16/05/2023				Data: 16/05/2023			


*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO 1 RDC Nº 912.2022 RDO: 106					s	t	q	q	s	s	d
					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Tralh. 3- Chuva sf. cond. Tralh.					MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMADAÇÃO DAS FERRAGENS DA VIGA REBOCO DA SALA PCD EXECUÇÃO DE MEIO FIO					Gerente de Obra						
					Engenheiro						
					Téc. de Segurança						
					Aux. Adm.						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hr DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					Caleteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Serralheiro						
					Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hr DO DIA						
					Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/05/2023					Data: 17/05/2023						

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDC: 107				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTDE			
EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DA FERRAGENS DA VIGA REBOCO DA SALA PCD EXECUÇÃO DE MEIO FIO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncic Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/05/2023				Data: 18/05/2023						

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MONRO DOS LOPES <b>CONTRATO N°:</b> 013-2023 <b>LICITAÇÃO / RDC N°:</b> 012/2022 <b>RDO:</b> 108				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra      1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra      1 Encarregado geral  HI DO DIA  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia      4 Pedreiro      8 Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro  HI DO DIA  <b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HI DO DIA HI ACUMULADO							
<b>EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO</b> <b>EXECUÇÃO DO TELhado</b> <b>ARAMAÇÃO DA FERRAGENS DA VIGA</b> <b>REBOCO DA SALA PCD</b> <b>EXECUÇÃO DE MEIO FIO</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Petrol PCD 200 Placa Vibratória							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>OBSERVAÇÕES</b>							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 19/05/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 19/05/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 108										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO JORNADA DA FERRAGENS DA VIGA REBOCO DA SALA PCO EXECUÇÃO DE MEIO FIO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1  Hrs DO DIA  MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro  Hrs DO DIA  RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Municipal Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/05/2023				Data: 20/05/2023						


*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº: 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº: 012 2022 RDC: 110				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo bom 2- Chuva al. com. Trub. 3- Chuva al. com. Trub.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SEM SERVIÇO				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				8			
				Cabeceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Montista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Petrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
				HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTD.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/05/2023				Data: 21/05/2023							

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data															
				X															
				S	T	Q	Q	S	S	D									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				LICITAÇÃO/RDO Nº 012 2022								RDO: 111							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al. conv. Trab. 3- Chuva al. conv. Trab.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELhado ADAPTAÇÃO DA FERRELAGENS DA VIGA REFORÇO DA SALA PCO EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DAS FORMAS DA VIGA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1															
CONSIDERAÇÕES								MÃO DE OBRA DIRETA											
OBSERVAÇÕES								Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 4 8 Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
								RESUMO DO EFETIVO											
								EFETIVO DO DIA											
								JORNADA DE TRABALHO											
								Hrs DO DIA											
								Hrs ACUMULADO											
								EFETIVO EQUIPAMENTOS											
								TIPO				QTDE.							
								Veículo Leve Carminha Mueck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:															
Data: 22/05/2023				Data: 22/05/2023															

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424


*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA														
<b>GRUPO GLOBAL</b>					CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO/RDC Nº 012 2022 RDO: 112									
Condições Climáticas: Marhi: ( 1 ) SIMBOLOGIA					1- Tempo Bom 2- Chuva of. comp. Trab. 3- Chuva of. cond. Trab. Lanche: ( 1 ) Nole: ( ) SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARAMAÇÃO DA FERRAGENS DA VIGA REBOCO DA SALA PCID EXECUÇÃO DAS FORMAS DA VIGA														
CONSIDERAÇÕES					Data: S S T Q Q S S D									
					EFETIVO PESSOAL									
					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral									
OBSERVAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA									
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
					MÃO DE OBRA INDIRETA									
					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO									
					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
										TIPO				
										Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória				
Data: 23/05/2023					Data: 23/05/2023									

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES			CATEGORIA								
CONTRATO Nº 013-2023			LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022			RDO: 113			MÃO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			1 - Tempo Bom 2 - Chuva e/ou cond. Trab. 3 - Chuva e/ou cond. Trab.			Gerente de Obra			1			
SIMBOLOGIA			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro			1			
EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DA FERRAGENS DA VIGA REBOCO DA SALA PCD EXECUÇÃO DAS FORMAS DA VIGA						Tec. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra			1			
						Encarregado geral						
						Hr DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia			4			
						Pedreiro			8			
						Ajudante Geral						
Calçateiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motozista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motozista de capamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hr DO DIA												
CONSIDERAÇÕES			REBUNDO DO EFETIVO			EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hr DO DIA						
						Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS			TIPO			QTDE.			
						Veículo Leve						
						Caminhão Muncie						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Capamba						
						Patrol						
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:			Data:			24/05/2023			
Data: 24/05/2023												

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																																														
				S	T	Q	X	S	S	D																																																																																								
<p>GRUPO GLOBAL</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES</p> <p>CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO RDC Nº 912 2022 RDO: 114</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 0 ) Noite: ( )</p> <p>1- Tempo livre 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.</p> <p>SEM SERVIÇO</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux. Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calçateiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pieter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td>EFETIVO DO DIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JORNADA DE TRABALHO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh DO DIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh ACUMULADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>QTDE.</td> </tr> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Muncik</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibratória</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra	1	Engenheiro		Tec. de Segurança		Aux. Adm		Mestre de obra	1	Encarregado geral		Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro		Ajudante Geral		Calçateiro		Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pieter		Serralheiro		Hh DO DIA		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Muncik		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
CATEGORIA	QTDE																																																																																																	
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																		
Gerente de Obra	1																																																																																																	
Engenheiro																																																																																																		
Tec. de Segurança																																																																																																		
Aux. Adm																																																																																																		
Mestre de obra	1																																																																																																	
Encarregado geral																																																																																																		
Hh DO DIA																																																																																																		
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																		
Topografo																																																																																																		
Auxiliar de topografia																																																																																																		
Pedreiro																																																																																																		
Ajudante Geral																																																																																																		
Calçateiro																																																																																																		
Carpinteiro																																																																																																		
Operador de Motosserra																																																																																																		
Motorista																																																																																																		
Montador																																																																																																		
Montador/Eletricista																																																																																																		
Eletricista																																																																																																		
Operador de Patrol																																																																																																		
Operador de Escavadeira																																																																																																		
Operador de Pá carregadeira																																																																																																		
Motorista de caçamba																																																																																																		
Pieter																																																																																																		
Serralheiro																																																																																																		
Hh DO DIA																																																																																																		
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																		
EFETIVO DO DIA																																																																																																		
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																		
Hh DO DIA																																																																																																		
Hh ACUMULADO																																																																																																		
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																		
TIPO	QTDE.																																																																																																	
Veículo Leve																																																																																																		
Caminhão Muncik																																																																																																		
Caminhão Toco																																																																																																		
Escavadeira																																																																																																		
Pá carregadeira																																																																																																		
Caçamba																																																																																																		
Patrol																																																																																																		
PC 200																																																																																																		
Placa Vibratória																																																																																																		
CONSIDERAÇÕES																																																																																																		
OBSERVAÇÕES																																																																																																		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																																																																														
Data: 25/05/2023				Data: 25/05/2023																																																																																														

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 116									S	T	Q	Q	X	S	S	D
	EFETIVO PESSOAL																
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( )										CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA		QTDE			
SIMBOLOGIA										Gerente da Obra							
EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DA FERRAGENS DA VIGA REBOCO DA SALA PCI CONCRETAGEM DAS VIGAS										Engenheiro				1			
										Tec. de Segurança							
										Aux Adm							
										Escritor de obra							
										Encarregado geral				1			
										RH DO DIA							
										MÃO DE OBRA DIRETA							
										Topógrafo							
										Auxiliar de topografia							
										Pedreiro				4			
										Ajudante Geral				8			
										Calceiro							
										Carpinteiro							
										Operador de Motosserra							
										Motoista							
										Montador							
										Montador/Eletricista							
										Eletricista							
										Operador de Petrol							
										Operador de Escavadeira							
										Operador de Pá carregadeira							
										Motorista de capamba							
										Pintor							
										Serralheiro							
										RH DO DIA							
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO							
										EFETIVO DO DIA							
										JORNADA DE TRABALHO							
										RH DO DIA							
										RH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS							
										TIPO		QTDE					
										Veículo Leve							
										Caminhão Manck							
										Caminhão Toco							
										Escavadeira							
										Pá carregadeira							
										Capamba							
										Patrol							
										PC 200							
Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:												
Data: 18/05/2023					Data: 18/05/2023												

Júlia Varjão  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 013-2023 RDO: 116				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.				CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro			1			
				Aux. Adm.			1			
				Encarregado geral			1			
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pírol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capombe Pintor Serralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HR DO DIA						
				HR ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Cominício Manual						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capomba						
				Pírol						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/05/2023				Data: 27/05/2023						

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424


*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E ANUIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDC: 117							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bate 2- Chuva al. com. Trab. 3- Chuva al. com. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SÍMBOLO/OJA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRECTA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motociclista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/05/2023				Data: 28/05/2023							


*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
					S	X	T	Q	Q	S	S	D		
 <b>GRUPO GLOBAL</b> <small>CONSTRUTORA</small>	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022				RDO: 118 Nota: ( )									
	Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cl. cond. Trab. 3 - Chuva sl. cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
	EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DA FERRAGENS DA VIGA REBOCO DA SALA PCD EXECUÇÃO DE MEIO FIO				EFETIVO PESSOAL									
CATEGORIA							QTD							
MÃO DE OBRA INDIRETA														
Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Maestre de obra Encarregado geral							1							
Hrs DO DIA														
MÃO DE OBRA DIRETA														
Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							4							
Hrs DO DIA							8							
RESUMO DO EFETIVO														
CONSIDERAÇÕES							EFETIVO DO DIA							
							JORNADA DE TRABALHO							
							Hrs DO DIA							
OBSERVAÇÕES							Hrs ACUMULADO							
							EFETIVO EQUIPAMENTOS							
							TIPO	QTD						
							Veículo Leve							
							Caminhão Munck							
							Caminhão Toco							
							Escavadeira							
							Pá carregadeira							
							Caçamba							
							Párol							
							PC 200							
							Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/05/2023				Data: 29/05/2023										

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	X	Q	Q	S	S	D				
				S	T									
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEIS <b>CONTRATO N°:</b> 013-2023 <b>LICITAÇÃO F/RDC N°:</b> 012.2022 <b>RDO:</b> 119				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
<b>Condições Climáticas:</b> <b>Simbologia</b>	Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )	1- Tempo Bom    2- Chuva of. cond. Trab.    3- Chuva of. cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>		<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>										
<b>EXECUÇÃO DA FORMA DO RESERVATÓRIO</b> <b>CONCRETAGEM DAS VIGAS</b> <b>LEVANTE DE ALVENARIA</b>				Gerente de Obra      1 Engenheiro      1 Tec. de Segurança      1 Aux. Adm. Maestre de obra      1 Encarregado geral      1										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>										
				Topografo Auxiliar de topografia      4 Pedreiro      8 Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO										
				<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
								TIPO      QTDE.						
								Veículo Leve Caminhão Municipal Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 30/05/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 30/05/2023						


*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 013 2022 RDO: 120				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Baixo 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
CONCRETAGEM DO RESERVATÓRIO				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Fic. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		4				
				Ajudante Geral		8				
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Petrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Carrinho Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caminhão						
				Petrol						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/05/2023				Data: 31/05/2023						

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 121					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					QTDE
LEVANTE DE ALVENARIA ARMAÇÃO DAS FORMAS PARA CONCRETAGEM DAS VIGAS CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRAVERGA REBOCO					Gênero de Obra							
					Engenheiro							1
					Téc. de Segurança							
					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							4
					Ajudante Geral							8
					Calfiteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Folter							
					Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE.					
					Veículo Leve							
					Caminhão Muncie							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/06/2023					Data: 01/06/2023							

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES LICITAÇÃO / RDC Nº 012/2023 RDO: 122		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 013-2023		CATEGORIA					QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLO/ORA: 1- Tempo bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LEVANTE DE ALVENARIA ARMAÇÃO DAS FORMAS PARA CONCRETAGEM DAS VIGAS CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRAVERGA REBOCO		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hr DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia 4						
		Pedreiro 8						
		Ajudante Geral						
Calçateiro								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Petrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hr DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hr DO DIA						
		Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Petrol						
		PG 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/06/2023		Data: 02/06/2023						

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data:							X
S	T	Q	Q	S	S	D	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 124

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:	Madr.: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	CATEGORIA	QTDE.
				MÃO DE OBRA INDIRETA	

SIMBOLOGIA: 1- Tempo item 2- Chave of cond. Trab. 3- Chave of cond. Trab.  
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

SEM SERVIÇO

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motocista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Petrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motocista de caçamba	
Plumbar	
Serralheiro	

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA
Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Velcdo Leve	
Carrinho Munck	
Caminhao Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Petrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:   
Data: 04/06/2023

FISCALIZAÇÃO:   
Data: 04/06/2023

*Julia Varjão*  
Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				X										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO N° 013-2023				LICITAÇÃO / RDC N° 012 2022								RDO: 125		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trabl. 3- Chuva et cond. Trabl.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA			QTDE	
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Gerente de Obra		1
CONCRETAGEM DAS VIGAS CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRAVERGA REBOCO				Engenheiro								1		
				Tec. de Segurança										
				Aux. Adm.										
				Mão de obra										
				Encarregado geral								1		
				Hrs DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro								4		
				Ajudante Geral								8		
				Calçeteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Petrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba														
Pintor														
Serralheiro														
Hrs DO DIA														
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
OBSERVAÇÕES				Hrs DO DIA										
				Hrs ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO								QTDE.		
				Veículo Leve										
				Carinho Mundi										
				Carinho Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
Petrol														
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 06/06/2023				Data: 06/06/2023										

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES
CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO T RDC Nº 012 2022
RDO: 126

Table with columns for date (Dia) and days of the week (S, T, Q, Q, S, S, D) with 'X' marked in the first 'T' column.

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )
1- Tempo Bom 2- Chuva qd cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

ARMARIAÇÃO DA LAJE DA COZINHA
CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRAVERGA
REBOCO

EFETIVO PESSOAL

Table with columns for CATEGORIA and QTD. Rows include Gerente de Obra, Engenheiro, Tec. de Segurança, Aux Adm, Mestre de obra, Encarregado geral.

MÃO DE OBRA DIRETA

Table with columns for TIPO and QTD. Rows include Topógrafo, Auxiliar de topografia, Pedreiro, Ajudante Geral, Calçateiro, Carpinteiro, Operador de Motosserra, Motorista, Montador, Montador/Eletricista, Eletricista, Operador de Patrol, Operador de Escavadeira, Operador de Pá carregadeira, Motorista de caçamba, Pinor, Serralheiro.

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
HI DO DIA
HI ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS
TIPO QTD.
Veículo Leve
Caminhão Munck
Caminhão Toco
Escavadeira
Pá carregadeira
Caçamba
Patrol
PC 200
Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:
Data: 06/05/2023

FISCALIZAÇÃO:
Data: 06/05/2023

Handwritten signature of Júlia Varjão, Engenheira Civil, CREA-BA 3000041424

Handwritten signature of Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida, Representante Legal, Global Materiais, Serviços e Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES
CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022
RDO: 127

Table with columns for dates (S, T, Q, Q, S, S, D) and a row for 'X'.

CONCRETAGEM DA LAJE DA COZINHA
REBOCO

Main table for labor and equipment. Includes sections for 'MÃO DE OBRA INDIRETA' (Gerente de Obra, Engenheiro, etc.) and 'MÃO DE OBRA DIRETA' (Topografo, Auxiliar de topografia, etc.).

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 07/06/2023

Data: 07/06/2023

Handwritten signature of Júlia Varjão, Engenheira Civil, CREA-BA 3000041424.

Handwritten signature of Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida, Representante Legal, Global Materias, Serviços e Manutenção LTDA.





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data:						
S	T	Q	Q	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES

CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F. RDC Nº 012 2022 RDO: 128

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )

CATEGORIA MAO DE OBRA DIRETA QTDE

SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bora 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

ARMAGEM DA LAJE DO RESERVATÓRIO  
REBOCO

Engenheiro 1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Maistro de obra

Encarregado geral 1

Hh DO DIA

MAO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro 4

Ajudante Geral 8

Calçoteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pinor

Serralheiro

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE

Veículo Leve

Caminhão Mundi

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 08/08/2023


Data: 08/08/2023

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO RDC Nº 012 2022				RDO: 123							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trabl. 3- Chuva al. cond. Trabl.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ARMAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO REBOCO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Ilumin. de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: Data: 09/06/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/06/2023							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória							

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES
CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDO: 130

Table with columns for Date (S, T, Q, Q, X, S, S, D)

ARMACÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO
REBOCO
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Table for Mão de Obra Indireta with columns for Category and QTD. Includes roles like Engenheiro, Tec. de Segurança, Aux Adm, Encarregado geral.

Table for Mão de Obra Direta with columns for Role and QTD. Includes roles like Topógrafo, Auxiliar de topografia, Pedreiro, Ajudante Geral, etc.

CONSIDERAÇÕES

Table for Resumo do Efetivo with columns for Efetivo do Dia, Jornada de Trabalho, Hrs do Dia, Hrs Acumulado.

OBSERVAÇÕES

Table for Efetivo Equipamentos with columns for Tipo and QTD. Includes items like Veículo Leve, Caminhão, Escavadeira, etc.

GERENTE DE OBRA:
Data: 10/06/2023

FISCALIZAÇÃO:
Data: 10/06/2023

Handwritten signature of Júlia Varjão, Engenheira Civil, CREA-BA 3000041424

Handwritten signature of Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida, Representante Legal, Global Materiais, Serviços e Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO RDC Nº 012 2022 RDO: 131					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					CATEGORIA							
SEM SERVIÇO					MÃO DE OBRA INDIRETA							
					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cobocleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cecebe Pácar Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HI DO DIA HI ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					REALIZAÇÃO:							
Data: 11/06/2023					Data: 11/06/2023							

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LÓPES  
 CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F. RDC Nº 013 2022  
 RDO: 132  
 Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.  
 SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Data:		X							
S	T	Q	Q	S	S	D			

ARMAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO  
 REBOCO

EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux Adm	
Maestre de obra	
Encarregado geral	1
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	8
Calçateiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motociclista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Petrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motociclista de caçamba	
Patrão	
Serralheiro	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	
EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Basculante	
Caminhão Trator	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrão	
PC 200	
Placa Vibratória	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 12/06/2023

Data: 12/06/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
 CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012/2022  
 RDO: 133  
 Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 1- Tempo Bloco 2- Chovia c/ cond. Trab. 3- Chovia s/ cond. Trab.  
 SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA	QTD
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux. Adm.	
Mastra de obra	
Encarregado geral	1
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Proteiro	4
Ajudante Geral	8
Calceiteiro	
Carpenteiro	
Operador de Motosserra	
Motocista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Petrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pastor	
Serralheiro	

ARMAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO  
REBOCO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTD
Veículo Leve	
Caminhão Montc	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PG 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA: \_\_\_\_\_  
 Data: 13/08/2023

FISCALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 Data: 13/08/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES

CONTRATO Nº 013-2023

LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022

RDO: 124

Date		S	T	X	Q	Q	S	S	D
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux. Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

HR DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	8
Calceiteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motobrista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motobista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	

HR DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HR DO DIA	
HR ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Blindado	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 14/06/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 14/06/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022      RDO: 137						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				CATEGORIA      QTDE						
SÍMBOLOS: 1- Tempo livre    2- Chuva al cond. Trab.    3- Chuva al cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  CONCRETAGEM DA LAJE DO RESERVATÓRIO REBOCO				Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1  HÍ DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      4 Ajudante Geral      8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HÍ DO DIA HÍ ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO      QTDE						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/06/2023				Data: 15/06/2023						

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ  
 CONTRATO Nº: 013-2023  
 LICITAÇÃO / RDC Nº: 812 2022  
 RDO: 140  
 Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

EXECUÇÃO DA PINGADEIRA  
 REBOCO

EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	QTDE.
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux Adm	
Maistro de obra	
Encarregado geral	1
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	6
Calçateiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Petrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Punitor	
Serralheiro	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hrs DO DIA	
Hrs ACUMULADO	
EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Carrocinha Mundi	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Petro	
PC 200	
Placa Vibratória	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 20/06/2023

Data: 20/06/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ  
 CONTRATO N° 013-2023 LICITAÇÃO RDC N° 012/2022 RDO: 141

Data		X							
S	T	Q	Q	S	S	D			

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Téc. de Segurança	
Ass. Adm.	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
HR DO DIA	

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	8
Calceiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de PA carregadeira	
Motorista de caçamba	
Plator	
Serralheiro	
HR DO DIA	

EXECUÇÃO DA PINGADEIRA  
REBOCO

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HR DO DIA	
HR ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
PA carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA: \_\_\_\_\_ FISCALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 Data: 21/06/2023 Data: 21/06/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424


*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MONRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023				LICITAÇÃO / RDC Nº 012.2022 RDO: 143											
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1											
				Hrs DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
				Hrs DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO											
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capacão Petrol PC 200 Placa Vibratória							
								GERENTE DE OBRA:							
								FISCALIZAÇÃO:							
								Data: 23/06/2023				Data: 23/06/2023			

  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES
CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO RDC Nº 012 2022
RDO: 144

Table with columns for days of the week (S, T, Q, Q, S, S, D) and a date field.

ELETIVO PESSOAL

Table with columns for CATEGORIA and QTDE, listing roles like Gerente de Obra, Engenheiro, etc.

MÃO DE OBRA DIRETA

Table with columns for CATEGORIA and QTDE, listing various construction trades like Topografo, Pedreiro, etc.

MÃO DE OBRA OBRERA

RESUMO DO EFETIVO

Summary table with columns for EFETIVO DO DIA, JORNADA DE TRABALHO, etc.

ELETIVO EQUIPAMENTOS

Table with columns for TIPO and QTDE, listing equipment types like Veículo Leve, Caminhão, etc.

SEM SERVIÇO
CONSIDERAÇÕES
OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:
Data: 24/06/2023

FISCALIZAÇÃO:
Data: 24/06/2023

Handwritten signature of Júlia Varjão, Engenheira Civil, CREA-BA 3000041424

Handwritten signature of Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida, Representante Legal, Global Materiais, Serviços e Manutenção LTDA



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
S	T	Q	Q	S	S	X

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
CONTRATO Nº 013-2023  
LIGIÇÃO / RDC Nº 012 2022  
RDO: 148

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

CATEGORIA	QTDE
-----------	------

MÃO DE OBRA INDIRETA

CATEGORIA	QTDE
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux. Adm	
Maître de obra	
Encarregado geral	1

MÃO DE OBRA DIRETA

CATEGORIA	QTDE
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calçateiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de PE carregadeira	
Motorista de ceçamba	
Pinor	
Serralheiro	

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	JORNADA DE TRABALHO
Hrs DO DIA	
Hrs ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE
Veículo Leve	
Carrocinho Mueck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pa carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

SEM SERVIÇO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 25/06/2023

Data: 26/06/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES

Data: X S T Q Q S S D

CONTRATO N° 013-2023

LICITAÇÃO / RDC N° 012.2022

RDO: 146

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas

Marçh: ( 1 )

Torr: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

REBOCO

MÃO DE OBRA INDIRETA		QTDE
Gerente de Obra		
Engenheiro		
Tec. de Segurança		1
Aux Adm		
Mestre de obra		
Encarregado geral		1

HR DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

MÃO DE OBRA DIRETA		QTDE
Topografo		
Auxiliar de topografia		
Pedreiro		4
Ajudante Geral		8
Calçateiro		
Carpinteiro		
Operador de Motocerra		
Motorista		
Montador		
Montador/Eletricista		
Eletricista		
Operador de Patrol		
Operador de Escavadeira		
Operador de Pá carregadeira		
Motorista de caçamba		
Pistoeiro		
Serralheiro		

HR DO DIA

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 26/06/2023

Data: 26/06/2023

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HR DO DIA	
HR ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibretória	

Julia Varjão  
Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023		LICITAÇÃO / RDO Nº 012 2022 RDO: 147		Data: <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T</td> <td></td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>D</td> <td></td> </tr> </table>							S	X							T		Q	Q	S	S	D	
S	X																									
T		Q	Q	S	S	D																				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		1- Tempo Bom 2 - Chuva at cond. Trabalho 3- Chuva at cond. Trabalho		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: MÁO DE OBRA INDIRETA QTD:																						
SÍMBOLOGIA:		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hrs DO DIA																						
REBOCO ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS				MÁO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Apicador Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hrs DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD:																						
GERENTE DE OBRA: Data: 27/06/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 27/06/2023		Veículo Leve Caminhão Municipal Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																						

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES

CONTRATO N° 013-2023

LICITAÇÃO / RDC N° 012.2022

RDO: 148

Data: S T X Q Q S S D

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

SIMBOLOGIA

1

1

1 - Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3 - Chuva al cond. Trab.  
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux. Adm.

Mestre de obra

Encarregado geral

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceiteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motocista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrul

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motocista de caçamba

Pinçador

Serralheiro

GERENTE DE OBRA:

Data: 28/06/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data:

28/06/2023

Júlia Varjão  
Júlia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPIES  
 CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022  
 RDO: 149  
 Nº da Obra: ( )  
 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.  
 SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Data		X		Q		S		D	
S	T	Q	Q	S	S	D			

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS  
 REBOCO

#### EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hr DO DIA	

#### MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	6
Calçoteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de cegamba	
Pintor	
Serralheiro	
Hr DO DIA	

#### RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hr DO DIA	
Hr ACUMULADO	

#### EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE
Veículo Leve	
Caminhão Bancal	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Cegamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 28/06/2023

Data: 28/06/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA











**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Data: 

S	T	Q	Q	S	S	X
---	---	---	---	---	---	---

EFETIVO PESSOAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
 CONTRATO N° 012-2023 LICITAÇÃO / RDC N° 012 2023 RDO: 152  
 Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.  
 SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

SEM SERVIÇO

CATEGORIA

MÃO DE OBRA INDIRECTA

Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux. Adm.	
Ilustr. de obra	
Encarregado geral	1
Hr DO DIA	

MÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Moteirista	
Montador	
Montador Eletricista	
Eletricista	
Operador de Petrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	
Hr DO DIA	

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hr DO DIA	
Hr ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munic	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 02/07/2023

Data: 02/07/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES
CONTRATO Nº 013-2023
LICITAÇÃO / RDC Nº 012/2022
RDO: 163
Mantém: ( 1 )
Itens: ( 1 )
Nota: ( )

Table with columns for Date (X, S, T, Q, Q, S, S, D) and rows for S, T, Q, Q, S, S, D.

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS
REBOCO
EXECUÇÃO DO TELHADO
ARMAÇÃO DE FERRAGENS

ELETIVO PESSOAL

Table with columns CATEGORIA and QTDE. Rows include Gerente de Obra, Engenheiro, Tec. de Segurança, Aux Adm, Mestre de obra, Encarregado geral.

MÃO DE OBRA DIRETA

Table with columns for various professions and QTDE. Rows include Topógrafo, Auxiliar de topografia, Pedreiro, Apontado Geral, Calceiteiro, Carpinteiro, Operador de Motosserra, Motorista, Montador, Montador/Eltricista, Eletricista, Operador de Patrol, Operador de Escavadeira, Operador de Pá carregadeira, Motorista de caçamba, Pintor, Serralheiro.

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

Table with columns EFETIVO DO DIA, JORNADA DE TRABALHO, Hrs DO DIA, Hrs ACUMULADO.

EFETIVO EQUIPAMENTOS

Table with columns TIPO and QTDE. Rows include Veículo Leve, Caminhão Municipal, Caminhão Toco, Escavadeira, Pá carregadeira, Caçamba, Patrol, PC 200, Placa Vibratória.

GERENTE DE OBRA:

Data: 03/07/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data:

03/07/2023

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES

CONTRATO Nº 013-2023

LICITAÇÃO / RDO Nº 012/2022

RDO: 164

Data		X									
S	T	Q	Q	S	S	D					

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Maestro da obra

Encarregado geral

MÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçoteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motociclista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motociclista de capomba

Pinheiro

Serralheiro

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS  
REBOCO  
EXECUÇÃO DO TELHADO  
ARMAÇÃO DE FERRAGENS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 04/07/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 04/07/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
CONTRATO Nº 013-2023  
LICITAÇÃO / RDO Nº 012 2022

Data							
S	T	X	Q	Q	S	S	D

Condições Climáticas: Marchá: ( 1 ) Tarde: ( 1 )  
RDO: 168

SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bate 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS  
REBOCO  
EXECUÇÃO DO TELHADO  
ARMAÇÃO DE FERRAGENS

EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux Adm	
Moestre de obra	
Encarregado geral	1
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudeite Geral	6
Calçoteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motocista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patelol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motocista de capamba	
Pintor	
Serralheiro	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hrs DO DIA	
Hrs ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS		
TIPO		QTDE
Veículo Leve		
Caminhão Mixer		
Caminhão Toco		
Escavadeira		
Pá carregadeira		
Capamba		
Patrol		
PC 200		
Placa Vibratória		

GERENTE DE OBRA:  
Data: 05/07/2023

FISCALIZAÇÃO:  
Data: 05/07/2023


*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 156				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS REBOCO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DE FERRAGENS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Blindado							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/07/2023				Data: 06/07/2023							

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data:							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO F RDC Nº 012 2022 RDO: 157				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS REBOCO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DE FERRAGENS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Municipal							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/07/2023				Data: 07/07/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALIZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BORRHO DOS LOPES  
 CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022  
 RDO: 158

Data		S	T	Q	Q	S	X	S	D

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva / cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.

SEM SERVIÇO

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	
Calçateiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pinor	
Serralheiro	
Hh DO DIA	

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Municipal	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:  
 Data: 08/07/2023

FISCALIZAÇÃO:  
 Data: 08/07/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES

CONTRATO Nº 013-2023

LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022

RDO: 169

Data	X														
	S	T	Q	Q	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	D

Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tempo: ( 1 )	Noite: ( 169 )
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva Q/cond. Trabl. 3- Chuva al/cond. Trabl.	

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS
REBOCO
EXECUÇÃO DO TELHADO
ARMAÇÃO DE FERRAGENS

EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux. Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	8
Calceiteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Serralheiro	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hrs DO DIA	
Hrs ACUMULADO	

GERENTE DE OBRA

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Volcãote Leve	
Caminhão 10m3	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

Data: 10/07/2023

FISCALIZAÇÃO: Data: 10/07/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data		X									
S	T	Q	Q	S	S	S	S	S	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
 CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO T RDC Nº 012 2022 RDO: 161

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trabu. 3- Chuva al cond. Trabu.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS  
 REBOCO  
 EXECUÇÃO DO TELHADO  
 ARMAÇÃO DE FERRAGENS

EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA			
Gerente de Obra			
Engenheiro			1
Tec. de Segurança			
Aux. Adm			
Téc. de obra			
Encarregado geral			1
MÃO DE OBRA DIRETA			
Topógrafo			
Auxiliar de topografia			
Pedreiro			4
Ajudante Geral			2
Calceiteiro			
Carpinteiro			
Operador de Motosserra			
Motosserra			
Montador			
Montador/Eletricista			
Eletricista			
Operador de Patrol			
Operador de Escavadeira			
Operador de Pá carregadeira			
Motorista de caçamba			
Plator			
Serralheiro			
RESUMO DO EFETIVO			
EFETIVO DO DIA			
JORNADA DE TRABALHO			
Hrs DO DIA			
Hrs ACUMULADO			

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO	QTDE.
Veículo Leve			
Caminhão Municipal			
Caminhão Toco			
Escavadeira			
Pá carregadeira			
Caçamba			
Patrol			
PC 200			
Placa Vibratória			

GERENTE DE OBRA: Data: 11/07/2023 FISCALIZAÇÃO: Data: 11/07/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	X	Q	Q	S	S	D
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES</p> <p>CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDO: 162</p> <p>Comunicação Climática: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )</p> <p>1- Tempo Bate 2 - Chuva c/ vent. 3- Chuva sil. vent. 4- Chuva sil. vent.</p> <p>SÍMBOLOGIA</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p> <p>CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS REBOCO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DE FERRAGENS</p>					<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA QTD</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra 1</p> <p>Engenheiro</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia 4</p> <p>Pedreiro 8</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Calçoteiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motociclista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Elétrica</p> <p>Operador de Petrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motociclista de caçamba</p> <p>Pinor</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>RÉSUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO QTD</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Muirck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PG 200</p> <p>Placa Vibratória</p>							
CONSIDERAÇÕES												
OBSERVAÇÕES												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/07/2023					Data: 12/07/2023							

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424


*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDO: 162					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.					CATEGORIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS REBOCO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DE FERRAGENS CONCRETAGEM DAS VIGAS					Gerente de Obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA		
					Topógrafo							
					Axiolite de topografia							4
					Pedreiro							8
					Ajudante Geral							
					Calceiteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Mecânico de caçamba							
Pintor												
Serralheiro												
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					Veículo Leve							
					Caminhão Basculante							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/07/2023					Data: 13/07/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			Date:    S    T    Q    Q    X    S    D						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº: 013-2023    LICITAÇÃO F/RDC Nº: 012/2022    RDO: 164			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:    Março: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( )				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA:    1- Tempo Efet.    2- Chuvia af. cond. Trab.    3- Chuvia af. cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS REBOCO EXECUÇÃO DO TELHADO ARMAÇÃO DE FERRAGENS CONCRETAGEM DAS VIGAS				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hrs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		4					
				Ajudante Geral		8					
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PI carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hrs DO DIA							
				Hrs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hrs DO DIA							
				Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO    QTDE.					
						Veículo Leve					
						Caminhão Munck					
						Caminhão Toco					
						Escavadeira					
						PI carregadeira					
						Caçamba					
						Patrol					
						PC 200					
						Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 14/07/2023		Data: 14/07/2023									

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data							
S	Y	Q	Q	S	S	X	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
 CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO 1 RDC Nº 012 2022 RDO: 165  
 Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.  
 SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências:

### EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA		QTDE
<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>		
Gerente de Obra		
Engenheiro		
Tec. de Segurança		1
Aux Adm		
Mestre de obra		
Encarregado geral		1
Hh DO DIA		
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		
Topógrafo		
Auxiliar de topografia		
Pedreiro		4
Ajudante Geral		
Calçateiro		8
Carpinteiro		
Operador de Motosserra		
Motorista		
Montador		
Montador/Electricista		
Electricista		
Operador de Patrol		
Operador de Escavadeira		
Operador de Pá carregadeira		
Motorista de caçamba		
Pinator		
Serralheiro		
Hh DO DIA		

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS  
 REBOCO  
 EXECUÇÃO DO TELHADO  
 ARMAÇÃO DE FERRAGENS  
 CONCRETAGEM DAS VIGAS

### CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

### OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Carrocinha Munda	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PG 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:  
 Data: 16/07/2023 Data: 16/07/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO RDC Nº 012 2022 RDO: 166						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab. SÍMBOLOGIA:						CATEGORIA							
SEM SERVIÇO						MÃO DE OBRA INDIRECTA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Escrita de obra Encarregado geral 1  Hr DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncpl Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/07/2023						Data: 16/07/2023							

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES

CONTRATO Nº 013-2023

LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022

Data		S	X	T	Q	Q	S	S	D
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçoteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Mototista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pinor

Serralheiro

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Cominhuê Mundi

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PG 200

Placa Vibratória

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS  
REBOCO  
EXECUÇÃO DO TELHADO  
ARMAÇÃO DE FERRAGENS  
CONCRETAGEM DAS VIGAS  
DESFORMA DAS VIGAS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 18/07/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 18/07/2023

*Júlia Varjão*  
**Júlia Varjão**  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES  
 CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO RDC Nº 012 2022 RDO: 170

Data						
S	T	Q	X	S	S	D

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS  
 REBOCO  
 EXECUÇÃO DO TELHADO  
 DISPONIBILIDADE DAS VISAS  
 CONCRETAGEM DAS SAPATAS  
 EXECUÇÃO DO TELHADO

EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	
Tec. de Segurança	1
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	9
Calceiteiro	
Carpinteiro	
Operário de Mão-branca	
Molotista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Molotista de caçamba	
Pinor	
Serralheiro	
RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Gravador Munk	
Gravador Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:  
 Data: 20/07/2023

FISCALIZAÇÃO:  
 Data: 20/07/2023

*Julia Varjão*  
**Julia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES
CONTRATO Nº 013-2023
LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022
RDO: 174

Table with columns for Date (S, T, Q, Q, X, S, S, D)

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )
1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.

CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS
REBOCO
EXECUÇÃO DO TELHADO
DEFORMA DAS VIGAS
CONCRETAGEM DAS SAPATAS
EXECUÇÃO DO TELHADO

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

Table for Mão de Obra Indireta with categories like Engenheiro, Tec. de Segurança, Aux. Adm., Mestre de obra, Encarregado geral.

MÃO DE OBRA DIRETA

Table for Mão de Obra Direta with categories like Topografo, Auxiliar de topografia, Pedreiro, Ajudante Geral, Calceiteiro, Carpinteiro, Operador de Motosserra, Motorista, Montador, Montador/Eletricista, Eletricista, Operador de Paizel, Operador de Escavadeira, Operador de Pá carregadeira, Motorista de caçamba, Pintor, Serralheiro.

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

Table for Resumo do Efetivo with columns for EFETIVO DO DIA, JORNADA DE TRABALHO, Hh DO DIA, Hh ACUMULADO.

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

Table for Efetivo Equipamentos with columns for TIPO and QTDE, listing equipment like Veículo Leve, Caminhão Municipal, Caminhão Toco, Escavadeira, Pá carregadeira, Caçamba, Paizel, PC 200, Placa Vibratória.

GERENTE DE OBRA:
Data: 21/07/2023


FISCALIZAÇÃO:
Data: 21/07/2023

Handwritten signature of Júlia Varjão, Engenheira Civil, CREA-BA 3000041424

Handwritten signature of Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida, Representante Legal, Global Materiais, Serviços e Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPEZ CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO / RDC Nº 012 2022 RDO: 172					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.					CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Mão de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 HÍ DO DIA							
CONCRETO MAGRO NAS SAPATAS REBOCO EXECUÇÃO DO TELHADO DESFORMA DAS VIGAS CONCRETAGEM DAS SAPATAS EXECUÇÃO DO TELHADO					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eltricista Eltricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba Pintor Serralheiro HÍ DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HÍ DO DIA HÍ ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capomba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/07/2023					Data: 22/07/2023							

  
**Júlia Varjão**  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 3000041424

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Matenas, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MORRO DOS LOPES
CONTRATO Nº 013-2023 LICITAÇÃO J. RDC Nº 012 2022
RDO: 173

Table with columns for days of the week (S, T, Q, Q, S, S, X, D) and a date field.

SEM SERVIÇO
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

ELETIVO PESSOAL
CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE

Table for indirect labor with columns for category and quantity. Includes roles like Gerente de Obra, Engenheiro, etc.

MÃO DE OBRA DIRETA

Table for direct labor with columns for category and quantity. Includes roles like Topografo, Auxiliar de topografia, etc.

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO
EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA
Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

Table for equipment with columns for type and quantity. Includes items like Veículo Leve, Caminhão Muncik, etc.

GERENTE DE OBRA:
Data: 23/07/2023

FISCALIZAÇÃO:
Data: 23/07/2023

Handwritten signature of Júlia Varjão, Engenheira Civil, CREA-BA 3000041424

Handwritten signature of Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida, Representante Legal, Global Materias, Serviços e Manutenção LTDA



