



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 426 / 2023

Data do Empenho: 13/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: **5422 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF  
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR Estado: BA  
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**  
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 004 - EDUCALUZ  
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	132022PE			
Convênio:	Contrato: ATA RP 036-2022	244.908,67	<b>136.122,76</b>	108.785,91
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL NILTON OLIVEIRA SANTOS - CENOS, NA SEDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº013-2022PE, CONTRATO Nº036-2022, MFS-e.Nº393, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023.

Data do Empenho: 13/04/2023 Data da Liquidação: 13/04/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	2.041,84
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	4.083,68
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	8.984,10

## Cento e vinte e um mil e treze reais e quatorze centavos ##  
Valor Retido: 15.109,62  
Valor Líquido: **121.013,14**

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/04/2023	393	UN			136.122,76

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	136.122,76

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/04/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS  
Secretária de Educação  
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/04/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

3165801





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 426 / 2023      Data do Empenho: 13/04/2023      TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR	
Nome: 5422 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: SALVADOR
CNPJ: 24.597.344/0001-98      Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente: 67153-3      Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
	RG:      Estado: BA

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	
Reduzido: 1002.4451.19	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12	- Educação
Sub-Função: 361	- Ensino Fundamental
Programa: 004	- EDUCALUZ
Ação: 1.002	- Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00	- Obras e Instalações
Fonte: 1540	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 132022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: ATA RP 036-2022	244.908,67	136.122,76	108.785,91
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO -	
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL NILTON OLIVEIRA SANTOS - CENOS, NA SEDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO Nº013-2022PE, CONTRATO Nº036-2022.	

Nº Ordem	Especificação ( Ítem )	Unidade	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	136.122,76	136.122,76

## Cento e trinta e seis mil e cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos ##	136.122,76
--	------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 13/04/2023.

\_\_\_\_\_  
NILZENE PEREIRA DOS SANTOS  
Secretária de Educação  
Matrícula: 0598

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/04/2023

\_\_\_\_\_  
NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Número da Nota:  
**00000393**  
Data e Hora de Emissão:  
**11/04/2023 11:17:02**  
Código de Verificação:  
**HVUM-JCGC**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**24.597.344/0001-98**  
Nome/Razão Social:  
**MP2 CONSTRUCOES LTDA**  
Endereço:  
**Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA**  
E-mail:  
**dpm@outlook.com.br**

Inscrição Municipal:  
**561.323/001-97**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
CPF/CNPJ:  
**13.807.870/0001-19**  
Endereço:  
**PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA**  
E-mail:  
-----

Inscrição Municipal:  
-----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.  
OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL NILTON OLIVEIRA SANTOS - CENOS, SEDE  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 146/2022  
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023  
VALOR TOTAL: R\$ 136.122,76  
Valor Material 40%: R\$ 54.449,10  
Base de cálculo do INSS 60%: 81.673,66 x 11% R\$: 8.984,10  
Valor do ISS 5%: R\$ 4.083,68  
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 136.122,76**

CNAE:

**4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**

Item da Lista de Serviços:

**00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
<b>54.449,10</b>	<b>81.673,66</b>	<b>5,00%</b>	<b>4.083,68</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
<b>8.984,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,68</b>	<b>123.054,98</b>

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 04/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA n° 051888958-0

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS

Nº OBRA: 063/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022  
Nº DO CONTRATO: 036/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2022

PERÍODO DE MENÇÃO: 01/03/2023 a 31/03/2023  
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
CNPJ: 24.597.244/0001-98  
VALOR DA 1ª MENÇÃO: R\$ 136.122,76  
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA IMPLANTADA À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	ACUMULADO QUANT.	PREÇO TOTAL	SALDO	%
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1,1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	119,49	3,03	361,99	119,49	361,99	361,99	119,49	361,99	-	0,11%
1,1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	2,20	54,07	118,96	2,20	118,96	118,96	2,20	118,96	-	0,04%
1,1	Demolição de concreto com martelo e compressor	m²	61,83	79,17	4.895,31	61,83	4.895,31	4.895,31	61,83	4.895,31	-	1,45%
	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	8,00	1,25	10,03	8,00	10,03	10,03	8,00	10,03	-	0,00%
	Coleta e carga manuais de entulho	m³	64,03	16,19	1.036,96	64,03	1.036,96	1.036,96	64,03	1.036,96	-	0,31%
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASSULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DIST. EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MAXKM), AF_07/2020	MAXKM	640,30	1,02	653,68	640,30	653,68	653,68	640,30	653,68	-	0,19%
	SUBTOTAL				7.076,83							
2,0	ALAMBRADOS E PAREDES											
2,1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 Bwg, malha 2 1/2", revestido em PVC, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto muíla	M²	412,80	304,72	125.787,55	-	-	-	-	-	125.787,55	37,28%
2,2	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE NAVLON	M²	565,17	65,31	36.931,03	-	-	-	-	-	36.931,03	11,32%
2,3	ALVENARIA DE VEJADAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	6,16	57,12	351,86	6,16	351,86	351,86	6,16	351,86	-	0,10%
2,4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida ReboTec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	51,70	116,27	6.011,40	51,70	6.011,40	6.011,40	51,70	6.011,40	-	1,78%
2,5	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE TINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESSENCIAL DA D.5M4, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	70,84	25,55	1.809,78	70,84	1.809,78	1.809,78	70,84	1.809,78	-	0,54%

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAROLINA SANTOS  
MATEUS  
CNPJ: 24.597.244/0001-98



	SUBTOTAL									172.179,62									
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																		
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excusive disjuntores	un	1,00	142,35	142,35	1,00	142,35	142,35	1,00	142,35	142,35	1,00	142,35	-	291,50	-	-	-	0,04%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00	84,96	84,96	1,00	84,96	84,96	1,00	84,96	84,96	1,00	84,96	-	3.141,97	-	-	-	0,03%
3.3	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diam = 32mm (1")	m	101,44	16,22	1.645,17	101,44	1.645,17	101,44	101,44	1.645,17	101,44	101,44	1.645,17	-	-	-	-	-	0,49%
	Relator Slim LED 200W de potência, Branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	331,49	2.651,88	8,00	2.651,88	2.651,88	8,00	2.651,88	2.651,88	8,00	2.651,88	-	-	-	-	-	0,79%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	137,44	10,40	1.429,36	137,44	1.429,36	137,44	137,44	1.429,36	137,44	137,44	1.429,36	-	-	-	-	-	0,42%
	SUBTOTAL									5.953,73									
4.0	TRAVES E POSTES DE BASQUETE																		
4.1	Fedra para trave de (futebol de salão (Futsal)	par	1,00	291,50	291,50	-	291,50	291,50	-	291,50	291,50	-	291,50	-	291,50	-	-	-	0,09%
4.2	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	3.141,97	3.141,97	-	3.141,97	3.141,97	-	3.141,97	3.141,97	-	3.141,97	-	3.141,97	-	-	-	0,93%
	SUBTOTAL									3.433,47									
5	PISO																		
5.1	Lastro de brita graduada aplicada e=10cm	m²	569,60	26,21	14.930,01	569,60	14.930,01	569,60	569,60	14.930,01	569,60	569,60	14.930,01	-	-	-	-	-	4,42%
5.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	569,60	2,81	1.602,88	569,60	1.602,88	569,60	569,60	1.602,88	569,60	569,60	1.602,88	-	-	-	-	-	0,47%
5.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1.50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gardau ou similar	m²	569,60	33,67	19.180,20	569,60	19.180,20	569,60	569,60	19.180,20	569,60	569,60	19.180,20	-	-	-	-	-	5,68%
5.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	m²	569,60	84,44	48.094,69	569,60	48.094,69	569,60	569,60	48.094,69	569,60	569,60	48.094,69	-	-	-	-	-	14,25%
5.5	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M	521,20	0,57	194,67	521,20	194,67	521,20	521,20	194,67	521,20	521,20	194,67	-	-	-	-	-	0,06%
5.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021	m²	569,60	39,39	22.437,57	569,60	22.437,57	569,60	569,60	22.437,57	569,60	569,60	22.437,57	-	-	-	-	-	6,65%

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAVALO & PIAZZA  
OBRAS  
M72 CONSULTORIA E SERVIÇOS  
CIVIL, 24 501 541000099



5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²	81,27	103,02	8.372,30	81,27	8.372,30	81,27	8.372,30	-	2,48%
5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	M	2,40	44,80	107,03	2,40	107,03	2,40	107,03	-	0,03%
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_09/2014	m²	569,60	4,61	2.623,86	-	-	-	-	2.623,86	0,76%
	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cinza)	m²	159,79	17,26	2.758,61	-	-	-	-	2.758,61	0,82%
	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (verde)	m²	257,62	17,26	4.447,55	-	-	-	-	4.447,55	1,32%
	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (laranja)	m²	279,68	17,26	4.828,40	-	-	-	-	4.828,40	1,43%
	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (branco)	m²	32,29	17,26	557,45	-	-	-	-	557,45	0,17%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>130.135,03</b>						
6.0	<b>PINTURA</b>										
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos.	m²	448,27	3,73	1.670,57	-	-	-	-	1.670,57	0,49%
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	448,27	2,81	1.261,30	-	-	-	-	1.261,30	0,37%
6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	448,27	12,13	5.439,58	-	-	-	-	5.439,58	1,61%
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	448,27	15,08	6.760,40	-	-	-	-	6.760,40	2,00%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.131,85</b>						
7.0	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										
7.1	Limpeza geral	m²	744,73	2,25	1.675,12	-	-	-	-	1.675,12	0,50%
	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.977,96	1.977,96	-	-	-	-	1.977,96	0,59%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.652,98</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 337.563,51</b>		<b>136.122,76</b>		<b>136.122,76</b>	<b>201.440,75</b>	<b>59,67%</b>

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAPELLA SANTOS  
CARRA  
MIZUEIRO  
CARRA  
CARRA



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – Reforma da quadra poliesportiva do CENOS, no Município de SantaLuz - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da quadra poliesportiva do CENOS




**Foto 01 - Demolição de concreto com martelete e compressor**



**Foto 02 – REMOÇÃO DE LUMINÁRIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017**



**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051886958-0



CAMILA  
CREA-BA  
MP2 00181-1/2017  
CNPJ: 24.697.344/0001-95



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da quadra poliesportiva do CENOS



Foto 03- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021

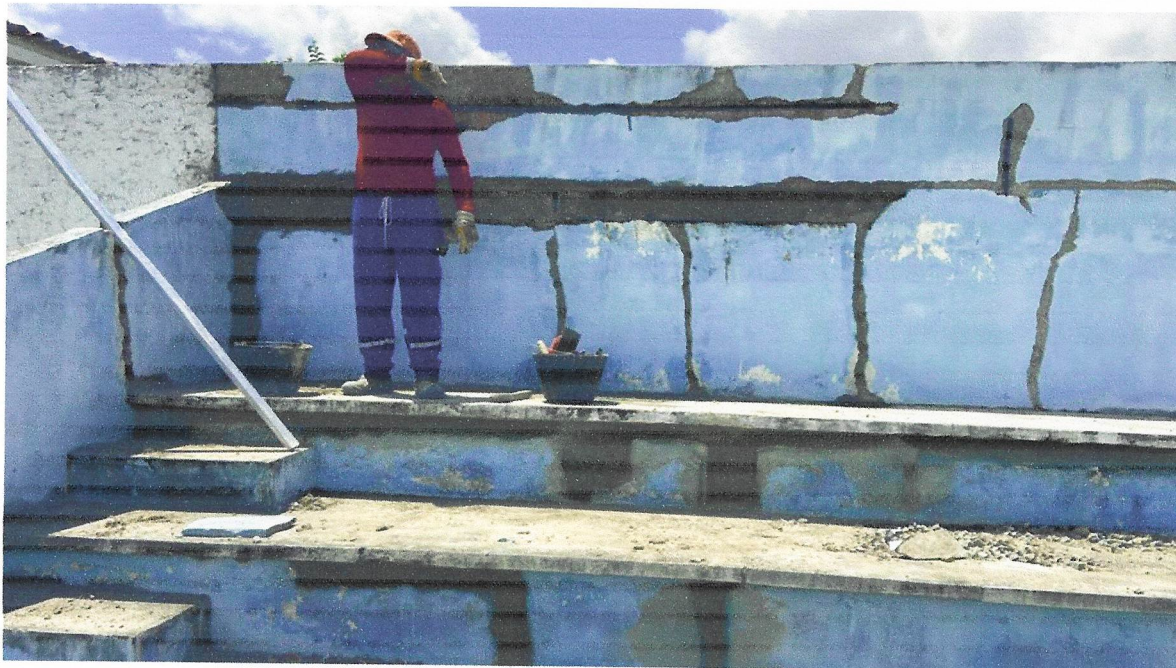


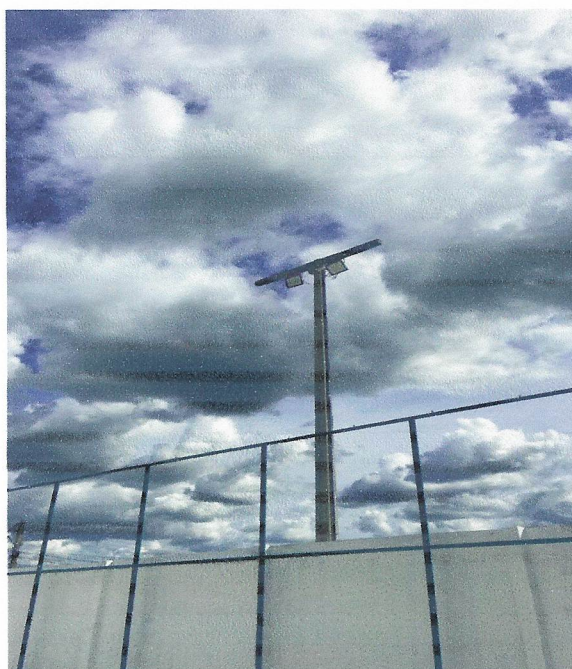
Foto 04 – Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da quadra poliesportiva do CENOS



**Foto 05- MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M<sup>3</sup>/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS.**  
AF\_06/2014



  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

  
CAMILLA  
CREA-BA nº 051888958-0  
MPE CONSTRUTORA EREL  
CNPJ nº 24.937.944/0001-95

**Foto 06- Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar**




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da quadra poliesportiva do CENOS



Foto 07- Lastro de brita graduada apiloada e=10cm



Foto 08- Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m<sup>2</sup>), Malha Pop Reforçada Gerdaud ou similar

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da quadra poliesportiva do CENOS



Foto 09 – PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF\_09/2020



Foto 10 – ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF\_09/2021



**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILA FERREIRA  
CREA-BA nº 051888958-0  
MP2 CONSTRUTORA EIREL  
CNPJ nº 24.597.344/0001-95



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reforma da quadra poliesportiva do CENOS



Foto 11 – A TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022

DAMILLA  
CREA-BA nº 05188958-0  
EMPRESA CONSTRUTORA E RE  
CNPJ 24.937.344/0001-65




**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 05188958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 1				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA										
LIMPEZA DA ÁREA				CATEGORIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Garanta de Obra										
				Engenheiro										
				Téc. de Segurança										
				Aux. Adm.										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Calceteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Sarrafheiro										
				Hh DO DIA										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
JORNADA DE TRABALHO														
Hh ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO										
				Veículo Leve										
				Caminhão Muncie										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 01/03/2023				Data: 01/03/2023										

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 CAMILLA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 CONST. CIVIL EIREL  
 CNPJ: 24.507.844/0001-05



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	X	Q	S	S	D				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA GUARDRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 038-2022			LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 2			EFETIVO PESSOAL								
	Condições Climáticas: Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( )			CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Mão de Obra Indireta											
LIMPEZA DA ÁREA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral											
				Hs DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Almoço Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cocamba Flisior Serralheiro											
				Hs DO DIA											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncok Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cocamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
				Data: 02/03/2023				Data: 02/03/2023							




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...  
 CREA-BA...  
 Nº 24.597.344/0001-95  
 CNPJ: 24.597.344/0001-95




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS <b>CONTRATO Nº:</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 015-0022 <b>RDO:</b> 3				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Boto      2- Chuva cf cond. Trab.      3- Chuva cf cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1							
<b>DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA</b> <b>RETRADA DE MATERIAL</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral      3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Maloserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro							
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO RH DO DIA RH ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 03/03/2023				Data: 03/03/2023							


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 CAMILLA R. DE OLIVEIRA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA									
 <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS <b>CONTRATO N° 626-2022</b>					<b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 4				
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cond. Trab. 3- Chuva ef. cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:</b>					<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b> <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral  Hrs DO DIA  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hrs DO DIA  <b>RESUMO DO EFETIVO</b> <b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO				
<b>CONSIDERAÇÕES:</b>					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Plataforma				
<b>OBSERVAÇÕES:</b>									
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 04/03/2023					<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 04/03/2023				


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA n° 051888958-0

  
**CAMILLA**  
 CREA-BA  
 MP2 CONSTRUÇÕES E RE  
 CNPJ 24.597.344/0001-95




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 5				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Tralh. 3- Chuva sf cond. Tralh. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calçateiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrul										
Operador de Escavadeira										
Operador de PA carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pilotar										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munc						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				PA carregadeira						
				Caçamba						
				Pilotar						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 05/03/2023				Data: 05/03/2023						

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0


  
 CAMILLA RIBEIRO DE  
 CREA-BA nº 0128200-0  
 MP2 CONSTR. 30015 EIREL  
 CNPJ: 24.597.344/0001-95



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 019-2022 LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 6			X							
			S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva Nf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			EFETIVO PESSOAL							
<b>DEMOLIÇÃO ALVENARIA</b>			CATEGORIA		QTDE					
			MÃO DE OBRA INDIRETA							
			Garanti de Obra							
			Engenheiro							1
			Téc. de Segurança							
			Aux. Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							2
			Ajudante Geral							3
			Cajoteiro							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Mecânico de capamba							
Pilotar										
Serralheiro										
OBSERVAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO							QTDE.
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Capamba							
			Patrol							
			PC 200							
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/03/2023			Data: 06/03/2023							



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 05188958-0




MP2 CONSTRUÇÕES  
 CNPJ: 24.597.344/0001-95



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALIZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 034-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 7				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE					
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA RETIRADA DE MATERIAL DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO				MÃO DE OBRA INDIRETA									
				Gerente de Obra							1		
				Engenheiro									
				Téc. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral							1		
				Hr DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro							2		
				Ajudante Geral							3		
				Calçateiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrão									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de PA carregadeira									
				Motorista de capomba									
				Pintor									
				Serralheiro									
				Hr DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hr DO DIA									
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO							QTDE.		
				Veículo Leve									
				Caminhão Munch									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				PA carregadeira									
				Capomba									
				Patrão									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:					
Data: 07/03/2023				Data: 07/03/2023									

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
**CAMILLA**  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 CONSTRUTORA CIVIL  
 CNPJ 24.597.344/0001-95

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 034-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 8				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva M cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		3				
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrão						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Mecânico de cangamba						
				Pilotar						
				Serralheiro						
				Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
				Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Cangamba						
				Patrão						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/03/2023				Data: 08/03/2023						


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 05188958-0

CAVILLA  
 CREA-BA nº 05188958-0  
 MP2 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA  
 CNPJ: 24.597.344/0001-99



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 036-0922 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 9				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO				Cargento de Obra							
				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							3
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Petrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Fioror											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Petrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/03/2023				Data: 09/03/2023							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 CAMILLA  
 CREA-BA  
 MPB 051888958-0  
 CNPJ 24.597.34/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS <b>CONTRATO Nº:</b> 636-2022 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 10										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( ) Tarde: ( ) Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:</b>				<b>EFETIVO PESSOAL</b> CATEGORIA MÁO DE OBRA INDIRETA QTDE Garante de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hrs DO DIA MÁO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Píneo Serralheiro Hrs DO DIA <b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
<b>CONSIDERAÇÕES:</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES:</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO EFETIVO QTDE Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 10/03/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 10/03/2023						

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES E OBRAS  
 CNPJ: 24.937.344/0001-95



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GÊNIO CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 018-2022 RDO: 11				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calçateiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de PA carregadeira												
Mecânico de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				PA carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 11/03/2023				Data: 11/03/2023								

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA FERREIRA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MF2 CONSTRUÇÕES E RE.  
 CNPJ: 24.597.344/0001-89

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 12				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hs DO DIA						
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caldeiro Carpinteiro Operador de Motoberra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pinçor Serralheiro Hs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA Jornada de Trabalho Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/03/2023				Data: 12/03/2023						

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 CAMILLA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 CNPJ 24.597.341/0001-07



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS <b>CONTRATO Nº:</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 13				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SIMBOLOGIA:</b> <b>Condições Climáticas:</b> <b>Tempo:</b> <b>Nota:</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>ASSENTAMENTO DE ALVENARIA</b> <b>TRATAMENTO DE FISSURAS</b>				Gerente de Obra Engenheiro      1 Tm. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1							
				Hh DO DIA							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro      2							
				Ajudante Geral      3							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motocerra							
				Maurista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eleticista							
				Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pictor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				Hh ACUMULADO							
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b>							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 13/03/2023				Data: 13/03/2023							

**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLAP...  
 CREA-B...  
 MP2 CONSTRUÇÕES E RE...  
 CNPJ: 24.597.344/0001-08

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS <b>CONTRATO Nº:</b> 038-2022 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 14				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom    2- Chuva of cond. Trab.    3- Chuva of cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1  Hh DO DIA							
<b>ASSENTAMENTO DE ALVENARIA</b> <b>TRATAMENTO DE FISSURAS</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral      3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leva Caminhão Manca Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 14/03/2023				Data: 14/03/2023							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 CAMILLA DE SOUZA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES S/A  
 CNPJ: 24.597.344/0001-95






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 034-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDC: 16 Nota: ( )							
LONGOSSE LAMACOS: Marcá: ( 1 ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Inspetor Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
CHAPISCO NA ALVENARIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pícar Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Velículo Leve Câmbio Musck Câmbio Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/03/2023				Data: 16/03/2023							

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051886958-0

CAVILLAN...  
 CREA-BA  
 MP2 150437...  
 DNPJ 24.537.344/0001-95




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	B	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS										
CONTRATO Nº 030-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 17							
Mantido ( )		Tarefa ( )		Nota: ( )							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DE REBOCO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Velículo Leve Câmbio Munch Câmbio Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/03/2023				Data: 17/03/2023							



**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA  
CREA-BA nº 051888958-0  
MP2 GUNSTON JUNIOR SREI  
CNPJ: 24.597.344/0001-95

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	D					
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 038-2022			LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 18											
	Manhã ( 1 )	Tarde ( 1 )	Noite ( )	EFETIVO PESSOAL											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chove cf cond. Trab. 3- Chove sf cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE								
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Téc. de Segurança											
				Aux. Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Canteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				GERENTE DE OBRA: Data: 18/09/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 18/09/2023							
								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIFO			QTDE.				
								Veículo Leve							
								Caminhão Munck							
Caminhão Toco															
Escavadeira															
Pá carregadeira															
Capota															
Patrol															
PC 200															
Prensa Vibratória															



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA PIRES CELESTINO  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES SIREL  
 CNPJ: 24.597.344/0001-95






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDC: 20							
Mão de obra ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
REMOÇÃO DOS REFLETORES				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							3
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Mecânico							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista							1				
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Velcudo Leva							
				Caminhão Manac							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/03/2023				Data: 20/03/2023							


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAVILLAR JUNIOR  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES CIRE  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS										
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 21							
Metrô: ( )				Torrô: ( )				Nôtr: ( )			
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
1- Tempo Bom    2- Chuva of cond. Trab.    3- Chuva of cond. Trab.											
INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NOVOS APLICAÇÃO DE SELADOR NA ARQUIBANCADA CONCRETAGEM DO PISO DE CONCRETO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Garante de Obra							
				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							3
				Ajudante Geral							10
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eleticista							1				
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor							1				
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTD.
				Veludo Leve							
				Caminhão Manç							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/03/2023				Data: 21/03/2023							

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0


  
 CAMILLA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 CNPJ: 24.507.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	X	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 024-2022 LICITAÇÃO Nº 012-2022 RDO: 22 Març: ( 1 1 ) Tarde: ( 1 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL											
SIMBOLOGIA				CATEGORIA				QTDE							
1- Tempo Bom 2- Chove of cond. Trab. 3- Chove of cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Esc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NOVOS APLICAÇÃO DE SELADOR NA ARGUBANCADA CONCRETAGEM DO PISO DE CONCRETO				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Instalante Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Instalante de caçamba Pintor Serralheiro 1											
				Hh DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO											
				CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO				QTDE			
								Veículo Leve Caminhão Manok Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/03/2023				Data: 22/03/2023											

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 CAMILLA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 24/03/2023 14:55:30  
 CNPJ 24.537.341/0001-97



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS										
CONTRATO Nº 038-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 23							
MÊS: ( 1 )				Dia: ( 1 )				Noite: ( )			
1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cond. Trab. 3- Chuvia ef. cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
<b>EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA</b> <b>CONCRETAGEM DO PISO DE CONCRETO</b>				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA				QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/03/2023				Data: 23/03/2023							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 05188958-0


  
 CAMILLA DE SOUZA  
 CREA-BA nº 05188958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES CIREL  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 658-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2023 RDC: 24				EFETIVO PESSOAL								
Marca: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trak. 3- Chuva al. cond. Trak. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE				
EMASAMENTO DA ARQUIBANCADA CONCRETAGEM DO PISO DE CONCRETO				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
Hh DO DIA												
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								3
				Ajudante Geral								10
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								1				
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPD				QTDE				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munch								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/03/2023				Data: 24/03/2023								

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051886958-0

  
 CAMILLA  
 CREA-BA nº 051886958-0  
 MPO CONSULTORIA E REE  
 CNPJ: 24.597.344/0001-85




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	X	D				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ													
	OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GENOS													
CONTRATO N° 038-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 28										
Marçá: (    1    )		Tarde: (    1    )		Noite: (    )										
1-Tempo Bom    2-Chuva al cond. Trab.    3-Chuva al cond. Trab.														
SERVÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS														
SEM SERVIÇO				EFETIVO PESSOAL										
								CATEGORIA			QTDE			
								MÃO DE OBRA INDIRETA						
								Gerente de obra						
								Especialista						
								Téc. de Segurança						
								Aux Adm						
								Mestre de obra						
								Encarregado geral						
								Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Canteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Máquina										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
				Hh DO DIA										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO			QTDE							
				Veículo Leve										
				Caminhão Muncak										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 28/03/2023				Data: 28/03/2023										



**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA n° 051836958-0

CAMILLA PINHEIRO  
CREA-BA n° 051836958-0  
MF2 CONSTRUÇÕES E REI.  
CNPJ: 24.597.344/0001-95


 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>		Data									
		S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 008-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 26									
Março ( ) 1 ) Tarde ( ) 1 ) Noite ( ) )		CATEGORIA					QTDE				
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  <b>SEM SERVIÇO</b>		MÃO DE OBRA INDIRETA									
		Gerente de Obra Engenheiro Fc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA									
<b>CONSIDERAÇÕES</b>		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capanga Pintor Serralheiro  Hh DO DIA									
<b>OBSERVAÇÕES</b>		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACURULADO									
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 27/09/2023		<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 27/09/2023									
		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muxek Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capanga Patrol PC 200 Placa Vibratória									



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051886958-0


CARVALHO  
 038-40  
 MRS  
 CNPJ: 24.997.344/0001-97




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
 <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS <b>CONTRATO N°:</b> 026-2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 012-2022 <b>RDO:</b> 27	<b>EFETIVO PESSOAL</b>											
	<b>MatrN:</b> ( 1 )		<b>Tatou:</b> ( 1 )		<b>Nota:</b> ( )		<b>CATEGORIA</b>					<b>QTDE</b>
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS E OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>								
<b>EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA</b> <b>EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONTRAÇÃO</b>				Gerente de Obra								1
				Supervisor								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				<b>h/h DO DIA</b>								
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								3
				Ajudante Geral								10
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motocerra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								1
				Pintor								
				Serralheiro								
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>								
				<b>EFETIVO DO DIA</b>								
				<b>JORNADA DE TRABALHO</b>								
				<b>h/h DO DIA</b>								
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>h/h ACUMULADO</b>								
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>								
				<b>TIPO</b>				<b>QTDE.</b>				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>PROCALDEAÇÃO:</b>								
Data: 27/03/2023				Data: 27/03/2023								




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



CAMILLA F. PINHEIRO  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MFP2 CONSTRUÇÕES EIRE  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 28						
	Marçã: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MAO DE OBRA DIRETA QTDE Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hb DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba 1 Puxar Serralheiro Hb DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hb DO DIA Hb ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
PINTURA DA ARGUEBANCADA EXECUÇÃO DE PASSEIO								
CONSIDERAÇÕES								
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/03/2023	Data: 28/03/2023							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 CAVALLARI ENGENHARIA  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S   T   Q   Q   S   S   D											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 034-2022 Licitação Nº 014-2022 Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )      RDO: 29				EFETIVO PESSOAL											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA						QTDE					
PINTURA DA ARQUIBANCADEA EXECUÇÃO DE PASSEIO				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				Gerente de Obra						1					
				Téc. de Segurança											
				Aux. Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral						1					
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Alarizar de topografia											
				Pedreiro						3					
				Ajudante Geral						4					
				Calceiteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motoeira											
				Motorista											
				Montador											
Montador/Eletricista															
Eletroleta															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pil carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor						1									
Serralheiro															
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
OBSERVAÇÕES				Hr DO DIA											
				Hr ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO						QTDE					
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pil carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 29/03/2023				Data: 29/03/2023											


Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAVILLA CAVALARI  
 CREA-BA 051888958-0  
 MPZ CONSTRUÇÕES EIRE  
 CNPJ 24.531.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	B	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS						CATEGORIA							
CONTRATO Nº 036-2022						MÃO DE OBRA INDIRETA							
LICITAÇÃO Nº 013-2022						QTDE							
RDC: 30						MÃO DE OBRA DIRETA							
Mão de obra: ( 1 )						Gerente de Obra							
Técnicos: ( 1 )						Engenheiro							
Nota: ( )						Téc. de Segurança							
1- Tempo Bom 2- Chover af. cond. Trab. 3- Chover af. cond. Trab.						Aux. Adm							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Mestre de obra							
EXECUÇÃO DE PASSEIO						Encarregado geral							
													1
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO	
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Velocidade Leve							
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Cacamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/03/2023						Data: 30/03/2023							



Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



CAMILLA PIREZ DE SOUSA  
CREA-BA 051888958-0  
MP2 CONSTRUÇÕES CIRE  
CNPJ: 24.597.844/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENOS CONTRATO Nº 036-2022						RDO: 31						
Março ( ) / Abril ( ) / Maio ( ) / Junho ( ) / Julho ( ) / Agosto ( ) / Setembro ( ) / Outubro ( ) / Novembro ( ) / Dezembro ( )						CATEGORIA Mão de obra indireta						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PASSEIO						Gerente de Obra Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
						Mão de obra direta Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrul Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Fritor Ferralheiro						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:						TIPO Quantidade Caminhão Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrul PC 200 Placa Vibratória						
Data: 31/03/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 31/03/2023						



**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051886958-0

CAMILLA  
CREA-BA  
MP2 CONSTRUÇÕES OBRAS  
CNPJ: 24.937.344/0001-92



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/04/2023 a 01/05/2023

**Certificação Número:** 2023040201162912813814

Informação obtida em 03/04/2023 08:51:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Certidão n°: 13832444/2023  
Expedição: 03/04/2023, às 08:49:04  
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20232034420

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



## **PMS - Prefeitura Municipal do Salvador**

**Secretaria Municipal da Fazenda  
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC  
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa  
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários**

**Inscrição Municipal: 561.323/001-97  
CNPJ: 24.597.344/0001-98**

**Contribuinte:** MP2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** Avenida Tancredo Neves, Nº 2539  
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913  
CAMINHO DAS ÁRVORES  
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 08:37:49 horas do dia 03/04/2023.  
Válida até dia 02/07/2023.

**Código de controle da certidão: 8C41.6DA6.EDEA.9D3B.27F7.4A3B.0917.1A84**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 13:31:24.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GBCxqh20Ma000008.SFP é:

f1e4acec-c0e8-4192-8bf6-08234d65938c

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 02/2023

NRA: GBCxqh20Ma000008

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

**CNPJ/CEI empresa:** 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/03/2023**Competência:** 02/2023**Valor recolhido:** 4.767,76**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/03/2023 18:07:38**Data de Débito:** 07/03/2023**Código da operação:** 00536990**Chave de segurança:** 5374HHFPLJ5FTEFA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	24.597.344/0001-98
<b>Nome</b>	MP2 CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	02/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	47115502 / Reinf CP 18923145413 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 5.498,72	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 15.937,97	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 3.953,46	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.390,15	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
<b>CPF</b>	045.314.075-04
<b>Telefone</b>	9606-2129

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/03/2023 10:55:49
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000119706693



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 N° CONTROLE: 06FF7i0kZuS0000-0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.158,44	0,00	0,00	0,00	5.158,44
Contribuintes Individuais	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.977,73	0,00	0,00	0,00	12.977,73
Contribuintes Individuais	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
RAT	1.946,65	0,00	0,00	0,00	1.946,65
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	478,56	0,00	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação	20.007,88	0,00	0,00	0,00	20.007,88
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	0,00	0,00	3.763,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	0,00	0,00	3.763,54
TOTAL A RECOLHER	3.763,54	0,00	0,00	0,00	3.763,54

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE  
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA  
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,  
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR  
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
478,56	0,00	3.763,54	24.597.344/0001-98	0079	2119	507
			478,56	0,00	3.763,54	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.007,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2023  
HORA: 13:28:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	20.958,11	20.007,88	950,23

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 13.861,95



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/03/2023  
HORA: 13:28:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

59.597,12

DEPÓSITO

4.767,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.767,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI  
 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023  
 N° CONTROLE: 06EF7r0kZuS0000-0  
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUÇOES EIRELI  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 LOGRADOURO  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 BAIRRO  
 CIDADE  
 TANCREDO NEVES 2539  
 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR  
 CEP  
 41820021  
 UF  
 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	59.102,05	REM SEM 13° SALÁRIO	59.597,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	4.767,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	59.102,05	REM SEM 13° SALÁRIO	59.597,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.704,70	DEPÓSITO	4.767,76
VAL DEVIDO PREV SOC	1.125,07	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023  
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° ARQUIVO: GBCxqh20MaO0000-8  
LOGRADOURO TANCREDO NEVES BAIRRO NOVA CANDEIAS CIDADE CANDEIAS CEP 43815360 UF BA  
N° CONTROLE: Lc015toTPK0000-1

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
85800000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: 06EF7r0kZuS0000-0  
----- ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 -----

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.190,68	REM SEM 13° SALÁRIO	66.685,75
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.301,66	DEPÓSITO	4.767,76
VAL DEVIDO PREV SOC	3.763,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	41
		TOTAL A RECOLHER	4.767,76

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 02/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00
NOME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOC						DEPOSITO	JAM
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	0,00	123.98467.24-6		14/09/2022	01			12/12/2022 02	07823
1.797,07		0,00		0,00				143,77	0,00
ALEX MACEDO SOUZA	0,00	160.18037.71-9		07/12/2022	01			104,81	07170
1.310,22		0,00		99,73					0,00
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	0,00	200.23321.75-4		01/08/2020	01			150,51	04110
1.881,42		0,00		151,14					0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	0,00	200.08707.42-6		19/09/2022	01			168,38	07156
2.104,77		0,00		171,24					0,00
ANGEVALDO CARDOSO DOS SANTOS ESTRELA	0,00	206.21396.06-5		15/02/2023	01			76,67	07823
958,44		0,00		71,88					0,00
BRENO CAVALCANTE DO O	0,00	144.60753.27-4		19/10/2020	01			152,18	03542
1.902,32		0,00		153,02					0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	126.23326.06-3		12/09/2022	01			104,17	07170
1.302,00		0,00		99,00					0,00
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	164.12290.23-1		16/11/2022	01			168,38	07152
2.104,77		0,00		171,24					0,00
DAMIAO BARRETO BISPO	0,00	160.00109.34-3		15/09/2022	01			168,38	07152
2.104,77		0,00		171,24					0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	0,00	200.10507.22-6		13/09/2022	01			104,16	07170
1.302,00		0,00		99,00					0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	0,00	200.27016.77-8		19/09/2022	01			104,16	07170
1.302,00		0,00		99,00					0,00
EDILSON SANTOS	0,00	210.12030.77-8		08/09/2022	01			259,11	07102
3.238,99		0,00		297,67					0,00
ELIAS DE JESUS SOUZA	0,00	160.04546.60-8		22/09/2022	01			104,81	07170
1.310,22		0,00		99,73					0,00
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	0,00	137.52159.27-7		04/06/2020	01			150,52	03542
1.881,42		0,00		151,14					0,00
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	0,00	212.41425.77-0		12/09/2022	01			104,81	07170
1.310,22		0,00		99,73					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98									
COMP: 02/2023 COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0					
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI										
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
		BASE CÁL	PREV SOC							
		BASE CÁL	PREV SOCIAL							
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS		212.11689.85-0		13/09/2022	01			07170		
1.191,53	0,00	0,00		89,36		95,32		0,00		
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS		122.81157.24-7		15/09/2022	01			07152		
2.104,77	0,00	0,00		171,24		168,39		0,00		
JEFERSON SANTOS DE JESUS		149.03088.27-4		22/09/2022	01			07170		
1.310,22	0,00	0,00		99,73		104,81		0,00		
JEFERSON XAVIER FALCAO		149.71075.27-1		05/10/2022	01			07170		
1.302,00	0,00	0,00		99,00		104,16		0,00		
JONATAS SENA DOS SANTOS		156.78852.12-8		08/09/2022	01			07170		
1.302,00	0,00	0,00		99,00		104,16		0,00		
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS		161.88428.27-1		13/09/2022	01			07170		
1.302,00	0,00	0,00		99,00		104,16		0,00		
JOSE PEREIRA DOS SANTOS		161.90124.62-4		09/02/2023	01			07152		
1.543,50	0,00	0,00		120,73		123,48		0,00		
JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS		200.12766.02-4		09/02/2023	01			07152		
1.543,50	0,00	0,00		120,73		123,48		0,00		
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ		164.62429.26-8		08/09/2022	01			07170		
1.302,00	0,00	0,00		99,00		104,16		0,00		
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA		126.17799.06-0		08/09/2022	01			07152		
2.104,77	0,00	0,00		171,24		168,39		0,00		
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA		206.81087.27-1		16/11/2022	01			07170		
1.302,00	0,00	0,00		99,00		104,16		0,00		
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA		163.50958.62-5		07/12/2022	01			07170		
1.302,00	0,00	0,00		99,00		104,16		0,00		
MANOEL REIS DOS ANJOS		114.35968.94-2		16/11/2022	01			07152		
2.104,77	0,00	0,00		171,24		168,39		0,00		
MARCELO FERREIRA DA PAZ		129.64314.44-8		08/09/2022	01			07170		
1.310,22	0,00	0,00		99,73		104,82		0,00		
MARCIO PIRES XAVIER		165.05257.76-5		14/09/2022	01			07152		
2.104,77	0,00	0,00		171,24		168,38		0,00		



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98											
COMP: 02/2023 COD REC:150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0							
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI							FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00					
						INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98						
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.302,00	0,00	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01				104,16	07170	0,00
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	0,00	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01				150,51	04110	0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.302,00	0,00	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01				104,16	07170	0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	0,00	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01				104,82	07170	0,00
REINAN DE JESUS SANTOS	954,80	0,00	166.03551.62-5	0,00	09/02/2023	01				76,38	07170	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.302,00	0,00	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01				104,16	07170	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.302,00	0,00	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01				104,17	07170	0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01				104,16	07170	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

REM 13° SAL  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO  
 CBO  
 JAM

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA  
 1.302,00  
 0,00  
 131.17567.06-1  
 0,00  
 01/07/2020 11  
 143,22  
 0,00  
 02521  
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 60.899,12  
 0,00  
 4.704,70  
 4.767,76  
 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: KGZMngg1K0Z0000-2 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	59.597,12	0,00	57.800,05	0,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	39	60.899,12	0,00	59.102,05	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: KGZMngg1KOZ0000-2 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.125,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.704,70  
SALÁRIO FAMÍLIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 20.958,11  
VALOR ABATIDO: 20.007,88 VALOR A COMPENSAR: 950,23 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.861,95

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRICÃO: 24.597.344/0001-98  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPA: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRICÃO: 9000/0528179

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRICÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	02/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	1,00	3,00	24.597.344/0001-98
MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS										9000/0528179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO	
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	11/08/2022	01			07152	0,00	
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	0,00	142.27586.27-1	11/08/2022	01			07102	0,00	
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	165.87470.26-3	11/08/2022	01			07152	0,00	
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.088,63	0,00	0,00	596,96	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: Lc015t0TPTK0000-1 RAT AJUSTADO: 3,00 FAF: 1,00  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 INSCRIÇÃO: 9000/U528179  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00
TOTALS:	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: Lc015tctPTK0000-1 INSCRIÇÃO: 3,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: 06EF7r0kZuS0000-0 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	66.685,75	0,00	64.888,68	0,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	42	67.987,75	0,00	66.190,68	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: 06EF7r0kZus0000-0 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMELES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 59.597,12  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.088,63  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS

4.767,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.767,76



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: 06EF7r0kZuS00000-0 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.763,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.301,66  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 20.958,11  
 VALOR ABATIDO: 20.007,88 VALOR A COMPENSAR: 950,23 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.861,95

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0
