



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 402 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3231 Data do Sub-Empenho: 21/09/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**  
Nome: 5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292  
Bairro: CENTRO  
CNPJ: 21.763.372/0001-40 Insc. Estadual: Cidade: Estado:  
Conta Corrente: 10495-7 Agência: 4171-8 CPF: RG:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 31/03/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Função: 15 - Urbanismo  
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenhari.	Nº Lic.:	002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	072-2023	3.013.054,26	1.500.000,00	1.513.054,26
Patrimônio:	-					

**HISTÓRICO**  
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO Nº072/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2022, NFS-e.311. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
658.445,13	411.082,74	247.362,39

Data do Empenho: 31/03/2023 Data do Liquidação: 22/09/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	27.131,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	4.932,99
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	12.332,48

## Trezentos e sessenta e seis mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos #  
Valor Retido: 44.396,93  
Valor Líquido: 366.685,81

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/09/2023	311	UNIC			411.082,74

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	411.082,74

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/09/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/09/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3248396



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 402 / 2023      Nº SUB-EMPENHO: 3231      Data do Sub-Empenho: 21/09/2023      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**      Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292      Complemento:

Bairro: CENTRO      Cidade:      Estado:

CNPJ: 21.763.372/0001-40      Insc. Estadual:      CPF:      RG:

Conta Corrente: 10495-7      Agência: 4171-8      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: **1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**      Data do Empenho: 31/03/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)


Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 072-2023	3.013.054,26	1.500.000,00	1.513.054,26
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO 072/2023. CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	658.445,13	411.082,74	247.362,39

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	411.082,74	411.082,74


## Quatrocentos e onze mil e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos ## 411.082,74

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/09/2023.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/09/2023



NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: TEOFILÂNDIA Código: 2931509 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 311</p> <p>Data/Hora: 22/09/2023 11:50:22 09/2023</p> <p>Ass. Digital: 222264984013922/09/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	--

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
<p>Nome/Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA</p> <p>Nome Fantasia: RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone: -</p> <p>CNPJ/CPF: 21.763.372/0001-40</p>	<p>Aliq.: Variável</p> <p>CEP: 4877000</p> <p>UF: BA Cidade: TEOFILÂNDIA</p> <p>Email: ribeiroanjos.engenharia@gmail.com</p> <p>I.M.: 000.001.065/001-24 I.E./RG: 145.741.972-PP ISS: EXIGÍVEL</p>

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>Endereço: PRAÇA CORONEL LEITÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone: 0</p> <p>CNPJ/CPF: 13.807.870/0001-19</p>	<p>CEP: 0000-000</p> <p>UF: BA</p> <p>Cidade: SANTALUZ - COD.MUNIC.: 2928000</p> <p>Email: sem</p> <p>I.E./RG: 0</p> <p>Inscrição Municipal:</p>


<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>											
<p>Medição 01 do Bairro Juscelino Kubitschek "JK", referente à Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede do município de Santaluz - BA. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2022, com seus Anexos E CONTRATO 072/2023.</p> <p>60% MATERIAL: R\$ 246.649,64 40% MÃO DE OBRA: R\$ 164.433,10</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4171-8 CONTA CORRENTE 10.495-7</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)</td> </tr> <tr> <td>EM 22/09/23</td> <td><i>Tony Felix Andreoli</i> Assinatura</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Tony Felix Andreoli Engenheiro Civil CREA-BA: 052.069.677.8</p>		<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)	<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)	<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)	EM 22/09/23	<i>Tony Felix Andreoli</i> Assinatura
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b>											
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)										
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)										
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)										
EM 22/09/23	<i>Tony Felix Andreoli</i> Assinatura										

<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> - EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 310 EMITIDA EM: 22/09/2023 11:35:56</p>
--

Local da Prestação do Serviço: SANTALUZ-BA Incidência do Imposto: SANTALUZ-BA												
<b>Retenções Federais R\$</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.087,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	18.087,64	0,00
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções							
0,00	0,00	0,00	0,00	18.087,64	0,00							

<b>Valores R\$</b>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>411.082,74</td> <td>246.649,64</td> <td>0,00</td> <td>164.433,10</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>3.288,66</td> <td>0,00</td> <td>389.706,44</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	411.082,74	246.649,64	0,00	164.433,10	2,00	0,00	3.288,66	0,00	389.706,44
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido										
411.082,74	246.649,64	0,00	164.433,10	2,00	0,00	3.288,66	0,00	389.706,44										

CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios
<p>Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).</p>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
	<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 65/2022</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$3.288,66 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 18.087,64</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p>
	<p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="https://www.teofilandia.ba.gov.br">https://www.teofilandia.ba.gov.br</a></p>

Nº DAM: 363104		CONTRIBUENTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda		INSCRIÇÃO: 21041	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua José Clemente				NÚMERO: 292	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Centro		MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	
				UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:		ORGÃO	
				C.N.P.J.: 21.763.372/0001-40	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433		ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 4.932,99		Quantidade/Alíquota (%): 1,000		Valor UFPM: 1,000	
				Valor R\$: 4.932,99	
				Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 4.932,99	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 21/09/2023		PARCELA: 1/1		EXERCÍCIO 2023	
				DATA EMISSÃO: 21/09/2023 03:23:04	
				DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos					
Valor do Tributo: 4.932,99		Vir. Devido sem Desconto (VD): 4.932,99		(-) VALOR DEVIDO - R\$ 4.932,99	
Taxa de Expediente: 0,00		Vir. do Desconto: 0,00			
Valor de Base Cálculo: 4.932,99		Vir. Devido com Desconto: 4.932,99		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:					
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;					
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;					
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;					
4) NFS-e N° 308 - Data de emissão: 20/09/2023.					
				(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
				(+ ) MULTA DE MORA - R\$	
				(+ ) JUROS DE MORA - R\$	
				(-) VALOR A PAGAR - R\$ 4.932,99	



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8171000049 . 3    32993906202 . 5    30930010100 . 8    00036310407 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI    VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO    VIA CONTRIBUINTE



8171000049 . 3    32993906202 . 5    30930010100 . 8    00036310407 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ    DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE    I.R.R.F - 2023  
13.807.870/0001-19



PARCELA: 1/1		Nº DAM: 363104		EXERCÍCIO 2023		DATA EMISSÃO: 21/09/2023 03:23:04		DATA VENCIMENTO: 30/09/2023	
INSCRIÇÃO: 21041						(-) VALOR DEVIDO - R\$ 4.932,99			
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda						(-) VALOR A PAGAR - R\$ 4.932,99			





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363103		CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: José Clemente				NÚMERO: 292		
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF: BA		
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 21.763.372/0001-40		R.G.:		ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 246.649,64	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 12.332,48	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 12.332,48		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/09/2023	MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 21/09/2023 03:20:53	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NFS-e Nº 308 - DATA DE EMISSÃO: 20/09/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.332,48		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.332,48		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000123 . 7    32483906202 . 7    30930010500 . 9    00036310312 . 8

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000123 . 7    32483906202 . 7    30930010500 . 9    00036310312 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ    DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Setembro	Nº DAM: 363103	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 21/09/2023 03:20:53	DATA VENCIMENTO: 30/09/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.332,48
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.332,48





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022  
Nº CONTRATO: 072/2023  
OBRA: Nº 083/2023

VALOR DA F. MEDIÇÃO: R\$ 411.082,74  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2023 A 20/09/2023  
OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação na sede do município de Santaluz-BA  
EMPRESA: RIBEIRO E ANOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.763372/0001-40

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	QUANTIDADE		VALORES		SALDO	SALDO QUANTIDADE	%
								PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
1					total									
1.1	51	ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Placa de obra em chapa aço galvanizado, rebatida - Rtv 02_01/2022	m²	6,00	394,01	478,13	R\$ 2.868,78	R\$ 2.868,78	R\$	2.868,78			
2.1	90778	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05600	120,34	146,03	R\$ 154.207,89	R\$ 154.207,89	R\$	154.207,89			0,00%
3	101189	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	m²	26.716,21	81,28	98,63	R\$ 2.635.217,05	R\$ 2.635.217,05	R\$	2.635.217,05			63,11%
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_09/2016	M	9.839,82	46,55	55,28	R\$ 543.945,24	R\$ 543.945,24	R\$	543.945,24			13,11%
4	4249	ORSE	SINALIZAÇÃO VERTICAL Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (esmalte cinza), 02 demãos de esmalte e mensagem em película reflexiva, auto adesiva	Un	114,00	122,50	146,65	R\$ 16.946,10	R\$ 16.946,10	R\$	16.946,10			4,11%
4.2	73916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	76,00	105,60	128,14	R\$ 9.738,64	R\$ 9.738,64	R\$	9.738,64			2,37%
				Total Geral				R\$ 3.362.923,49	R\$ 3.362.923,49	R\$	3.362.923,49			83,42%
								R\$ 411.082,74	R\$ 411.082,74	R\$	411.082,74			10,00%
								R\$ 1.566.492,12	R\$ 1.566.492,12	R\$	1.566.492,12			39,42%
								R\$ 1.796.431,37	R\$ 1.796.431,37	R\$	1.796.431,37			44,42%

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.22 11:39:59 -03'00'

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/09/2023 10:44:05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ByDwLcAcxrJ00002.SFP é:

895dcc88-1340-4541-aa8b-349f0ae614e5

Transmissor: DENILSON CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI:11459018000172

Inscrição do Transmissor: 11459018000172

Responsável: FORTREK EMPREENDIMENTOS

Inscrição do Responsável: 00242774520

Competência: 08/2023

NRA: ByDwLcAcxrJ00002

Base de Processamento: Teofilândia / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: DENILSON OLIVEIRA DE

Telefone: 007532610256



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 21.763.372/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:02:03 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **D86A.3E10.3888.9375**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 13/09/2023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000165/2023

Emissão: 13/09/2023

Validade: 12/12/2023

**RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA**

**CGA: 000.001.065/001-24**

**CPF/CNPJ: 21.763.372/0001-40**

**CNAE: 4120-4/00**

**RUA JOSÉ CLEMENTE, 292**

**CENTRO**

**4877000 - TEOFILÂNDIA - BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.


OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00220230000016500000097991

Emissor: VIA WEB



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235243287**

RAZÃO SOCIAL	
<b>RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>145.741.972 - BAIXADO</b>	<b>21.763.372/0001-40</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.763.372/0001-40  
Certidão nº: 45928808/2023  
Expedição: 04/09/2023, às 09:46:15  
Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.763.372/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.763.372/0001-40  
**Razão Social:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA JOSE CLEMENTE 292 A / CENTRO / TEOFILANDIA / BA / 48770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/09/2023 a 07/10/2023

**Certificação Número:** 2023090821553430559409

Informação obtida em 12/09/2023 10:56:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	21.763.372/0001-40
<b>Período apuração</b>	08/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000159149917
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	01/09/2023 10:55:54	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	56118099 / Reinf CP 21450709115 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	JOSE CLEMENTE	<b>Número</b>	292
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	Teofilândia	<b>UF</b>	BA
<b>CEP</b>	48770000	<b>Telefone</b>	7599752587
<b>Correio Eletrônico</b>	RIBEIROANJOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	<b>CPF</b>	04180411563
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		
<b>CPF</b>	04180411563	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	7532610256
<b>Correio Eletrônico</b>	FOR_FYLLIPE@HOTMAIL.COM		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.011.21009/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	66,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 66,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.011.21009/71	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	445,91		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	4.096,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4.096,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	330,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 330,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	235,93		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 235,93		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 07/2023

Nome/Razão Social	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF	21.763.372/0001-40
CNO	
Número da Declaração	320230820232613786213
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000152164939
Data da Transmissão	02/08/2023
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/09/2023  
HORA: 10:42:59  
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 08/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH			21.763.372/0001-40			2003	507
4.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,02	0,00	

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/09/2023  
HORA: 10:42:59  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
SIMPLES: 2

---

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	27
REMUNERAÇÃO	50.601,13
DEPÓSITO	4.048,09
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.048,09

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH Nº CONTROLE: KHZJU0SAJ0000-2 N° ARQUIVO: BYDWLcAcxxJ0000-2  
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 TOMADOR/ORA: LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292 UF: BA CEP: 48770-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0075-99975258 CNAE: 4120400  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779  
 INSCRIÇÃO: 4120400  
 TOTAL 4120400

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,02
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,02
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,02

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ÉQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELEA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITCANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
22	KEYNE PRISCILLA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	204:00	1.224,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	16:00	96,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Keyne Priscilla da Silva*  
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
22	KEYNE PRISCILLA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	204:00	1.224,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	16:00	96,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Keyne Priscilla da Silva*  
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
20	LUCAS DE JESUS VISITAÇÃO AUXILIAR DE ENGENHARIA	312105	1	1
		Admissão: 01/09/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas de Jesus Visitação*  
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
20	LUCAS DE JESUS VISITAÇÃO AUXILIAR DE ENGENHARIA	312105	1	1
		Admissão: 01/09/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas de Jesus Visitação*  
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
31	VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
31	VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código 23 Nome do Funcionário LAZARO SOUZA CONCEIÇÃO  
 CBO 716610 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.550,00	
998	I.N.S.S.	7,72		119,70

Total de Vencimentos	1.550,00	Total de Descontos	119,70
Valor Líquido	↑		1.430,30

Sal. Contr. INSS	1.550,00	Base Calc. FGTS	1.550,00	Base Calc. IRRF	1.430,30	Faixa RRF	0,00
Salário Base	1.550,00	FGTS do Mês	124,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Laçaro S. Conceição*  
 Assinatura do Funcionário

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

Mensalista  
 CC: GERAL  
 Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código 33 Nome do Funcionário LUCIANO DE JESUS SANTOS  
 Departamento 1 Filial 1  
 717020 Admissão: 23/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.332,98	100,16
998	I.N.S.S.	7,51		

Total de Vencimentos	1.332,98	Total de Descontos	100,16
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	↑	1.232,82
---------------	---	----------

Salário Base	1.332,98	Base Calc. INSS	1.332,98	Base Calc. FGTS	1.332,98	Base Calc. IRRF	1.232,82	Faixa IRRF	0,00

*Luciano de Jesus Santos*  
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

CNPJ: 21.763.372/0001-40

Código 29 Nome do Funcionário VANDERSON DE JESUS SILVA  
 PEDREIRO  
 CBO 715210 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 17/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58	180,86
998	T.N.S.S.	8,11		

Total de Vencimentos	2.229,58	Total de Descantos	180,86
Valor Líquido	↑		2.048,72

Salário Base	2.229,58	Base Calc. INSS	2.229,58	Base Calc. FGTS	2.229,58	Base Calc. IRRF	1.479,95	Faixa IRRF	0,00
		Sal. Cont. INSS	2.229,58			FGTS do Mês	178,36		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanderson de Jesus Silva*  
 Assinatura do Funcionário

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

CNPJ: 21.763.372/0001-40

Código 29 Nome do Funcionário VANDERSON DE JESUS SILVA PEDREIRO  
 CBO 715210 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 17/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58	180,86
998	I.N.S.S.	8,11		

Total de Vencimentos 2.229,58 Total de Descontos 180,86

Valor Líquido  2.048,72

Salário Base 2.229,58 Base Calc. INSS 2.229,58 Base Calc. FGTS 2.229,58 Base Calc. IRRF 1.479,95 F.G.T.S. co INSS 178,36 F.G.T.S. co IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanderson de Jesus Silva*  
 Assinatura do Funcionário

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CC: GERAL Mensalista  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código 32 Nome do Funcionário MAX DOS SANTOS NUNES PEDREIRO  
 CBO 715210 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 05/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58	180,86
998	I.N.S.S.	8,11		

Total de Vencimentos	2.229,58	Total de Descontos	180,86
Valor Líquido	2.048,72		

Salário Base	2.229,58	Base Calc. FGTS	2.229,58	Base Calc. IRRF	2.048,72	FGTS do Mês	178,36	FGTS IRRF	0,00
--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Max dos Santos Nunes*

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Código Nome do Funcionário

14. ADAGILSON RODRIGUES DOS SANTOS  
PEDREIRO

CBO Departamento Filial  
715210 1 1  
Admissão: 03/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,11	2.229,58	180,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.229,58	180,86	
			Valor Líquido →	2.048,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.229,58	2.229,58	2.229,58	178,36	2.048,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

6/9/23

Data

Adagilson Rodrigues dos Santos

PEDREIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Mensalista

Código Nome do Funcionário

14 ADAGILSON RODRIGUES DOS SANTOS  
PEDREIRO

CBO Departamento Filial  
715210 1 1  
Admissão: 03/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,11	2.229,58	180,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.229,58	180,86	
			Valor Líquido →	2.048,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.229,58	2.229,58	2.229,58	178,36	2.048,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

6/9/23

Data

Adagilson Rodrigues dos Santos

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS SERVENTE COMUM	717020	1	1	
		Admissão: 03/08/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.332,98		
998	I.N.S.S.	7,51		100,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.332,98	100,16	
			Valor Líquido →	1.232,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.332,98	1.332,98	1.332,98	106,63	1.232,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ronaldo Rodrigues dos Santos  
Assinatura do Funcionário

6/9/23

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS SERVENTE COMUM	717020	1	1	
		Admissão: 03/08/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.332,98		
998	I.N.S.S.	7,51		100,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.332,98	100,16	
			Valor Líquido →	1.232,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.332,98	1.332,98	1.332,98	106,63	1.232,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ronaldo Rodrigues dos Santos  
Assinatura do Funcionário

6/9/23

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO DE JESUS PEDREIRO	715210	1	1	
		Admissão: 03/08/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58		
998	I.N.S.S.	8,11		180,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.229,58	180,86	
			Valor Líquido →	2.048,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.229,58	2.229,58	2.229,58	178,36	2.048,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2023

Data

*Antonio Carlos do Nascimento de Jesus*  
Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO DE JESUS PEDREIRO	715210	1	1	
		Admissão: 03/08/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58		
998	I.N.S.S.	8,11		180,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.229,58	180,86	
			Valor Líquido →	2.048,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.229,58	2.229,58	2.229,58	178,36	2.048,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2023

Data

*Antonio Carlos do Nascimento de Jesus*  
Assinatura do Funcionário

CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Código Nome do Funcionário  
30 ELIOMAR DE CARVALHO SANTOS  
ENCARREGADO DE OBRA

CBO Departamento Faltas  
710205 1 -  
Admissão: 01/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	220:00	3.431,06	314,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,17 15,00		97,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.431,06	411,82	
			Valor Líquido →	3.019,24	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.431,06	3.431,06	3.431,06	274,48	3.116,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 6.9.23  
 Eliomar de Carvalho Santos  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Código Nome do Funcionário  
30 ELIOMAR DE CARVALHO SANTOS  
ENCARREGADO DE OBRA

CBO Departamento Faltas  
710205 1 1  
Admissão: 01/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	220:00	3.431,06	314,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,17 15,00		97,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.431,06	411,82	
			Valor Líquido →	3.019,24	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.431,06	3.431,06	3.431,06	274,48	3.116,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 6.9.23  
 Eliomar de Carvalho Santos  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

NPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Código 24 Nome do Funcionário GENIVALDO DE JESUS PEDREIRO

080 715210 Departamento 1 Filial 1

Admissão: 01/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,11	2.229,58	180,86
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.229,58	180,86
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	2.048,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.229,58		2.229,58	2.229,58	178,36
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.048,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Genivaldo de Jesus*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

IBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
NPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Código Nome do Funcionário  
42 MANOEL PEDRO DA SILVA NETO  
ENCARREGADO DE OBRA

CBO Departamento Filial  
710205 1 1  
Admissão: 17/05/2023

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.431,06	
998	I.N.S.S.	9,17		314,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		97,04
Total de Vencimentos			3.431,06	411,82
Valor Líquido			⇒ 3.019,24	
Salário Base			3.431,06	
Sal. Contr. INSS			3.431,06	
Base Cál. FGTS			3.431,06	
FGTS do Mês			274,48	
Base Cál. IRRF			3.116,28	
Faixa IRRF				15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Manoel Pedro da Silva Neto*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

NPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Código 19 Nome do Funcionário JOSE HILTON DE JESUS SANTOS  
SERVENTE COMUM

CBO 717020 Departamento 1 Fimel 1  
Admissão: 03/08/2022

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.332,98	100,16
998	I.N.S.S.	7,51		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.332,98	100,16
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.232,82
			<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.232,82	0,00
			<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Sal. Cál. FGTS</b>
			1.332,98	1.332,98
			<b>Salário Base</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>
			1.332,98	106,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



IBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 NPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código 26 Nome do Funcionario ERASMO DE JESUS PEREIRA ARMADOR

CBO 715315 Departamento 1 Final 1  
 Admissão: 01/09/2022

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58	
998	I.N.S.S.	8,11		180,86

Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
2.229,58		2.229,58		2.229,58		178,36		2.048,72		0,00	
		Total de Vencimentos				Total de Descontos					
		2.229,58				180,86					
		Valor Líquido		⇒		2.048,72					

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erasmoo de Jesus Pereira*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2022 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 143				S	T	Q	Q	x	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							QTDE
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
REJUNTAMENTO DE PEDRAS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							1 2 4
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							QTDE.
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/09/2023				Data: 01/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:13:50 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 144				S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( 144 ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL						
SEM SERVIÇO				CATEGORIA			QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/09/2023				Data: 02/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:14:17 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.098.977.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 092-2022 RDO: 145				S	T	Q	Q	S	S	X
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/09/2023				Data: 03/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:14:37 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 146				X							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				S	T	Q	Q	S	S	D	
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ATERRAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO				CATEGORIA QTDE							
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/09/2023				Data: 04/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:15:00 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	X						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO N° 072-2022		EFETIVO PESSOAL							
LICITAÇÃO N° 002-2022		CATEGORIA							
RDO: 147		QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom	2- Chuva c/ cond. Trab.	3- Chuva s/ cond. Trab.	Noite: ( )					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra							
		Engenheiro	1						
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral							1
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							1
		Ajudante Geral							2
		Calceteiro							4
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO							
		Veículo Leve							QTDE.
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/09/2023		Data: 05/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:15:20 -03'00'

*fy*  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.008/877.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 148				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
				Engenheiro							1	
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							1	
				Ajudante Geral							2	
				Calceteiro							4	
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/09/2023				Data: 06/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.20 08:15:40 -03'00'

*fy*  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.070.077.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 149				S	T	Q	Q	X	S	S	D			
				EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ESPALHAMENTO DE PARALELOS				Gerente de Obra										
				Engenheiro							1			
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral							1			
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES				Topografo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro							1			
				Ajudante Geral							2			
				Calceteiro							4			
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
Pintor														
Serralheiro														
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO										
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 07/09/2023				Data: 07/09/2023										

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:16:00 -03'00'

*Tony Felix Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.077.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 150				S	T	Q	Q	X	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELOS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							1
				Ajudante Geral							2
				Calceteiro							4
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 08/09/2023				TIPO							QTDE.
FISCALIZAÇÃO:				Veículo Leve							
Data: 08/09/2023				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:16:23 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.006.077.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 151				S	T	Q	Q	S	X	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTDE				
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
GERENTE DE OBRA: Data: 09/09/2023				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
FISCALIZAÇÃO: Data: 09/09/2023				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.20 08:16:47 -03'00'

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.000.177.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2022				S	T	Q	Q	S	S	X	D	
LICITAÇÃO N° 002-2022				EFETIVO PESSOAL								
RDO: 152				CATEGORIA				QTDE				
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SÍMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
Pintor												
Serralheiro												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 10/09/2023				Data: 10/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.20 08:17:09 -03'00'

*Tony Felix Andrade*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.000.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 072-2022				EFETIVO PESSOAL								
LICITAÇÃO Nº 092-2022				CATEGORIA								
RDO: 153				QTDE								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELOS ASSENTAMENTO DE PARALELOS				Téc. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
EFETIVO EQUIPAMENTOS				RESUMO DO EFETIVO								
				Hh ACUMULADO								
GERENTE DE OBRA:				TIPO								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
FISCALIZAÇÃO:												
Data: 11/09/2023				Data: 11/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.20 08:17:32 -03'00'

*Fy*  
Tony Félix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.046/077.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 154					S	X	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS					EFETIVO PESSOAL							
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELOS ASSENTAMENTO DE PARALELOS					CATEGORIA							
					MÃO DE OBRA INDIRETA							QTDE
					Gerente de Obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
Hh DO DIA												
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							1
					Ajudante Geral							2
					Calceteiro							4
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							QTDE.
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/09/2023					Data: 12/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563 RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.20 08:18:03 -03'00'

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.577.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	T	X	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 072-2022		CATEGORIA						
LICITAÇÃO N° 092-2022		QTDE						
RDO: 155		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança						
ESPALHAMENTO DE PARALELOS ASSENTAMENTO DE PARALELOS		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçeteiro						
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/09/2023		Data: 13/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563 RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.20 08:18:30 -03'00'

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.002/77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2022 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 156				S	T	Q	X	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
ESPALHAMENTO DE PARALELOS ASSENTAMENTO DE PARALELOS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro				4			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/09/2023				Data: 14/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:18:52 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.000.77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2022 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 157			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			CATEGORIA							
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA							
ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS			Gerente de Obra							1
			Engenheiro							
			Tec. de Segurança							
			Aux Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral							1
Hh DO DIA										
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							1
			Ajudante Geral							2
			Calceteiro							4
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor							
			Serralheiro							
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO							QTDE.
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/09/2023			Data: 15/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:19:10 -03'00'

  
**Tony Francisco Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.066.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2022 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 157						S	T	Q	Q	X	S	S	D		
						EFETIVO PESSOAL							QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						CATEGORIA									
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA									
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra									
ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS						Engenheiro									
						Tec. de Segurança						1			
						Aux. Adm.									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral							1		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro								1	
						Ajudante Geral								2	
						Calçeteiro								4	
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO	QTDE.								
						Veículo Leve									
						Caminhão Muncck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 15/09/2023						Data: 15/09/2023									

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:19:10 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA		QTDE					
CONTRATO Nº 072-2022		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Licitação Nº 092-2022		RDO: 158							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
Pedreiro									
Ajudante Geral									
Calceteiro									
Carpinteiro									
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Serralheiro									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veiculo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/09/2023		Data: 16/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.20 08:19:26 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.058.877.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO Nº 072-2022				LICITAÇÃO Nº 002-2022			RDO: 159			
Manhã: ( 1 )				Tarde: ( 1 )			Noite: ( )			
Condições Climáticas: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
Ajudante Geral										
Calçeteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/09/2023				Data: 17/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:19:47 -03'00'

Tony Fyllipe de  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.035.177.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 072-2022				EFETIVO PESSOAL								
LICITAÇÃO Nº 002-2022				CATEGORIA								
RDO: 160				MÃO DE OBRA INDIRETA								
Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				QTDE								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 1								
				Ajudante Geral 2								
				Calceteiro 4								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
Data: 18/09/2023				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
FISCALIZAÇÃO:				TIPO								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
Data: 18/09/2023				Data: 18/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.09.20 08:20:03 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.041.177.8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Juscelino Kubitschek no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 083/2023 e Contrato nº 072-2023.


Data	Município	Empresa
20/09/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 01



Execução de Pavimentação da Rua projetada 10

IMAGEM 02

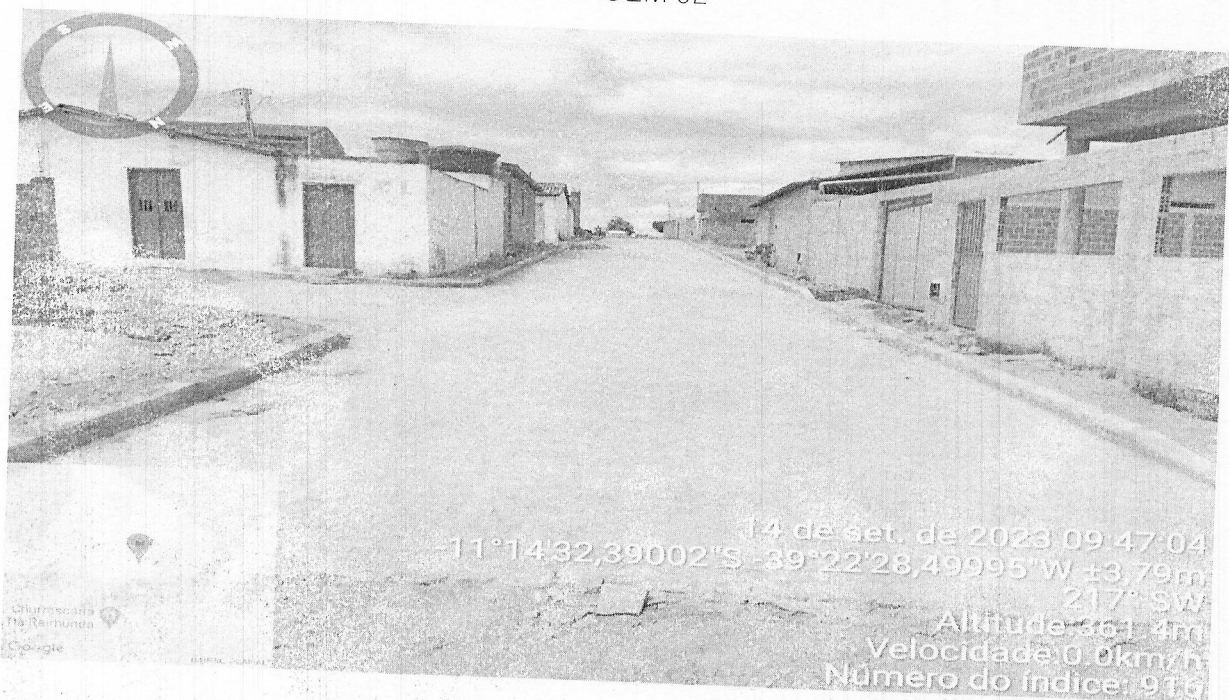

Execução de Pavimentação da Rua Projetada 10

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE DE  
OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.22 11:37:59 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro CREA  
CREA-BA: 052.069.677.8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ


Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Juscelino Kubitschek no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 083/2023 e Contrato nº 072-2023.


Data	Município	Empresa
20/09/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 03

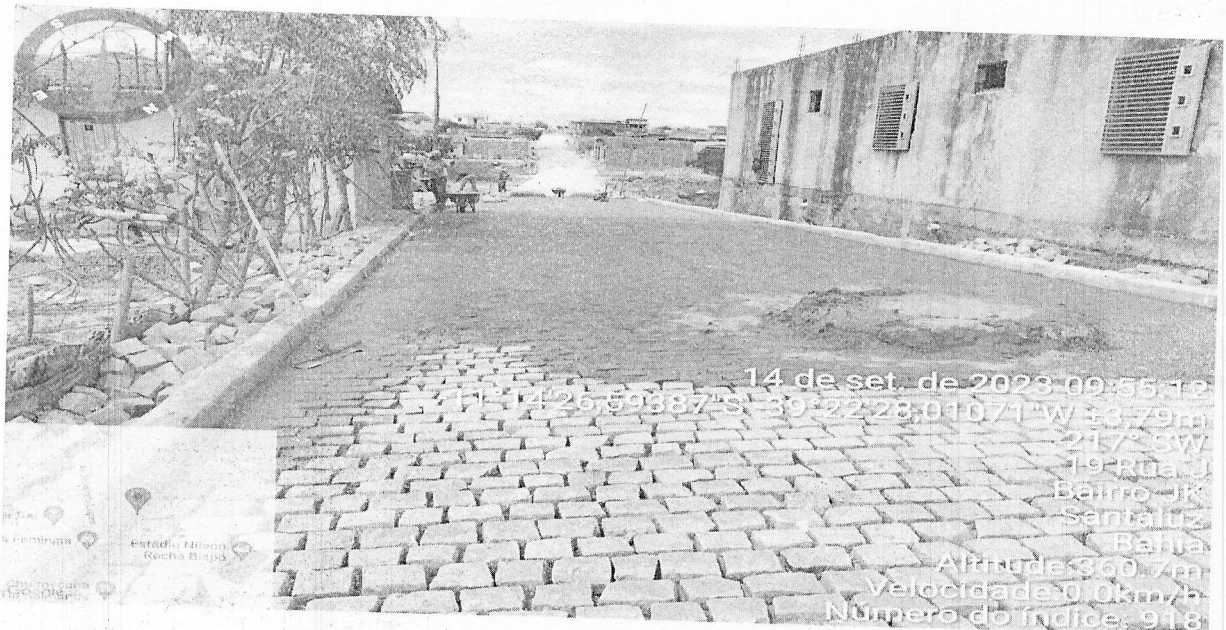

Execução de Pavimentação da Rua projetada 02

IMAGEM 04

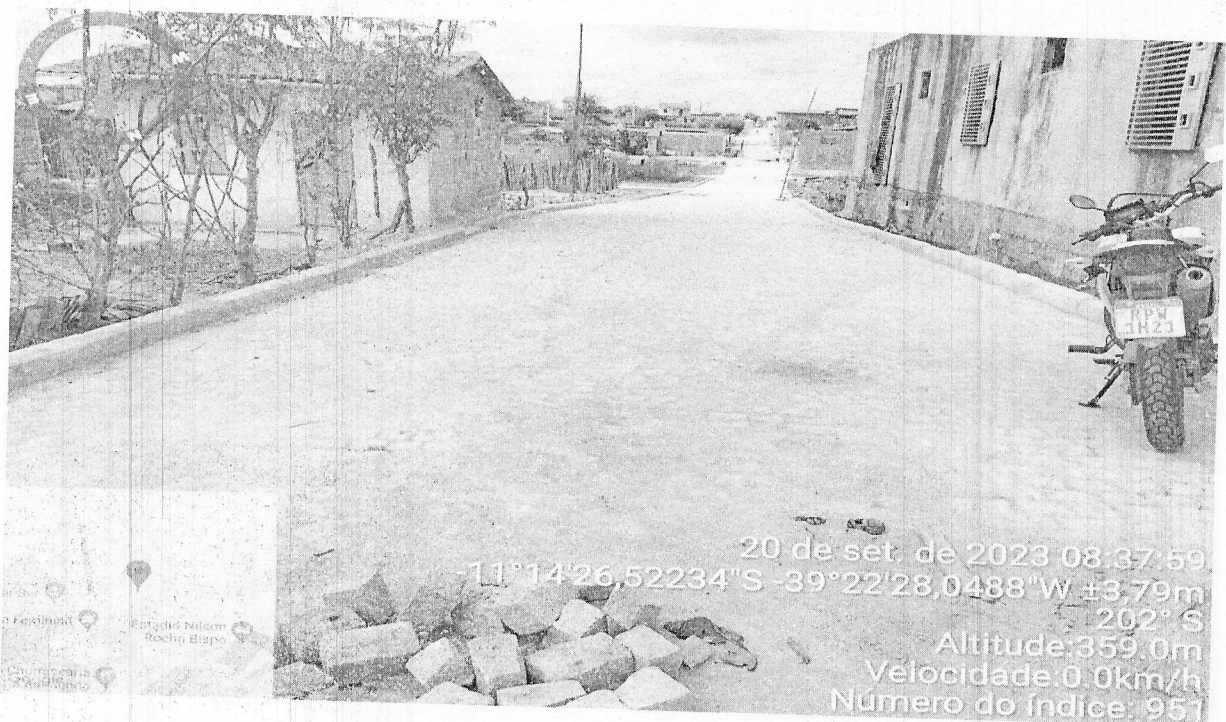

Execução de Pavimentação da Rua projetada 02

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.22 11:38:17 -03'00'

*Tony Felix Andrade*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ


Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Juscelino Kubitschek no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 083/2023 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
20/09/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA.21.763.372/0001-40

IMAGEM 05

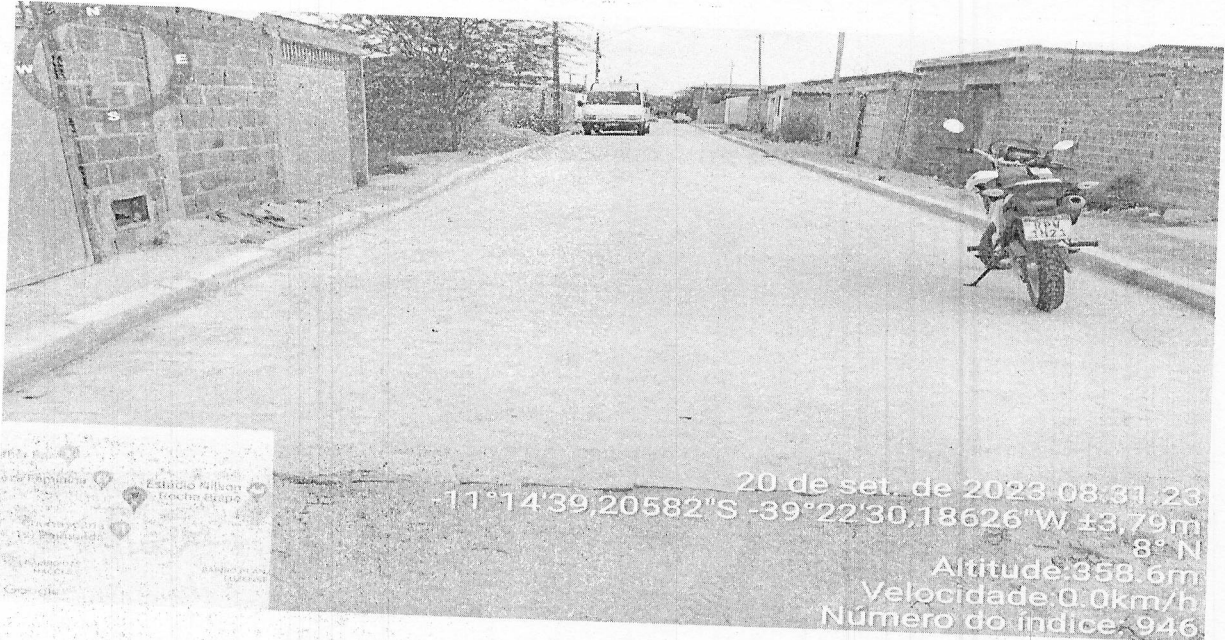

Execução de Pavimentação da Rua Izidro José dos Santos (trecho I)

IMAGEM 06



Execução de Pavimentação da Rua Izidro José dos Santos (trecho I)

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.22 11:38:33 -03'00'

*Fy*  
Tony Felix Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Juscelino Kubitschek no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 083/2023 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
20/09/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 07



Execução de Pavimentação da Rua projetada 04

IMAGEM 08



Execução de Pavimentação da Rua projetada 05 (trecho III)

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.22 11:38:51 -03'00'

*Tony Felix An. Jrade*  
Engenheiro C<sup>o</sup> II  
CREA-BA: 052.039.677.8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ


Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Juscelino Kubitschek no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 083/2023 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
20/09/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA.21.763.372/0001-40

IMAGEM 09

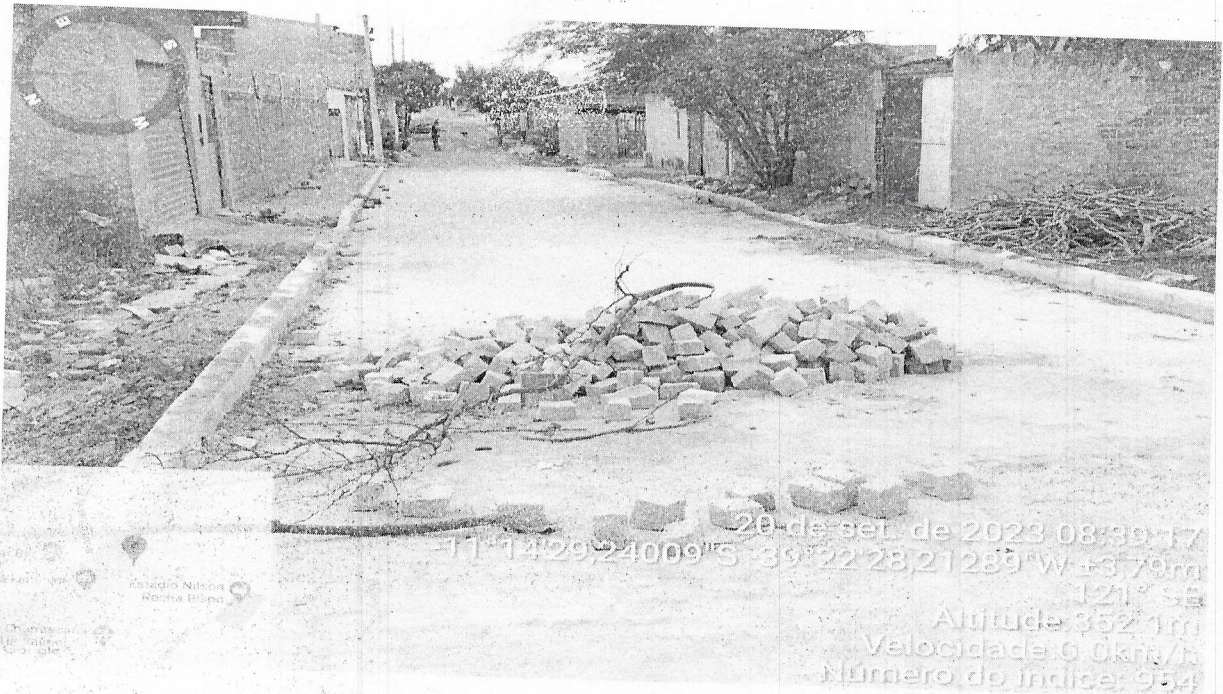

Execução de Pavimentação da Rua projetada 05 (trecho II)

IMAGEM 10



Execução de Pavimentação da Rua projetada 05 (trecho I)

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.09.22 11:39:08 -03'00'

*Felix Almeida*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.066.677-8
