



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 1014 / 2023 Data do Empenho: 24/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR							
Nome:	4260 - ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Tipo Pessoa:	Jurídica				
Endereço:	R ALTO DA CHACRINHA, 25	Complemento:	CASA				
Bairro:	CONTORNO	Cidade:		Estado:			
CNPJ:	19.650.110/0001-27	Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
Conta Corrente:	39975113-4	Agência:	0001	Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.:	008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	255-2022	103.963,10	84.212,61	19.750,49
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO 008-2022RDC, OBRA 047/2022, MEDIÇÃO Nº09, PERÍODO DE 01/10/2023 A 20/10/2023, NFS-e.Nº202324.

Data do Empenho: 24/10/2023 Data do Liquidação: 24/10/2023



RETENÇÕES			
Código	Descrição	Valor	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	1.010,55	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.526,38	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	5.558,03	
## Setenta e cinco mil e cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos ##		Valor Retido	9.094,96
		Valor Líquido	75.117,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/10/2023	202324	U			84.212,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	84.212,61

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/10/2023.</p> <p></p> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/10/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO**PROCESSO ADM: 215-2022**

EMPENHO: 1014 / 2023	Data do Empenho: 24/10/2023	TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal
-----------------------------	------------------------------------	--

FORNECEDOR		
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25	Complemento: CASA	
Bairro: CONTORNO	Cidade:	Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27	Insc. Estadual:	RG:
Conta Corrente: 39975113-4	Agência: 0001	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR



Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 255-2022	103.963,10	84.212,61	19.750,49
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	84.212,61	84.212,61

## Oitenta e quatro mil e duzentos e doze reais e sessenta e um centavos ##	84.212,61
---	------------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/10/2023.  <hr/> ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/10/2023  <hr/> NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--

3267841



PREFEITURA DE
QUEIMADAS
FLOR PRIMEIRA DO SISAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
202324
Data da Competência:
Outubro/2023
Data e Hora da Emissão:
20/10/2023 14:41:00
Código Verificação:
51D9BB5C4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
19.650.110/0001-27
Telefone:
753644155...
Nome/Razão Social:
**ARCO CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Endereço:
RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail:
ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal:
154100189
Inscrição Estadual:

Nome Fantasia:



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13807870000119
Telefone:

Nome/Razão Social:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço:
AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail:
secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 255/2022, SENDO 60% SERVIÇOS (R\$ 50.527,57) E 40% MATERIAIS (R\$ 33.685,04) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2022 NÚMERO DA OBRA 047/2022 PERÍODO 01/10/2023 A 20/10/2023. BM 09

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 24/10/2023 Tony Felix Andrade
Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CPF: BA: 032.099.877.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 84.212,61

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG

	VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
	R\$ 84.212,61	R\$ 33.685,04	R\$ 0,00	R\$ 50.527,57	5%	R\$ 0,00	R\$ 2.526,38	R\$ 0,00
	VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.558,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.128,20	

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE CHANCELLOR
101 SHALICE DRIVE, SUITE 100
BERKELEY, CALIFORNIA 94720-1010
TEL: (415) 495-1000 FAX: (415) 495-1001
WWW.UCALIF.EDU



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363772		CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Alto da Chacrinha					NÚMERO: 25	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 19.650.110/0001-27			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 50.527,57	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.526,38	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.526,38		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/11/2023	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 13/11/2023 04:22:17	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 202324 - DATA DE EMISSÃO: 20/10/2023.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.526,38		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.526,38		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000025 . 7

26383906202 . 7

31130010500 . 5

00036377212 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000025 . 7

26383906202 . 7

31130010500 . 5

00036377212 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 363772	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 13/11/2023 04:22:17	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.526,38
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.526,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 363773		CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli			INSCRIÇÃO: 20260	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua Alto da Chacrinha						NÚMERO: 25
COMPLEMENTO:			BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 19.650.110/0001-27		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 1.010,55	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.010,55	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.010,55	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 13/11/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 13/11/2023 04:23:38	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.010,55		
Valor do Tributo: 1.010,55	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.010,55		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
Valor de Base Cálculo: 1.010,55	Vir. Devido com Desconto: 1.010,55		(+) MULTA DE MORA - R\$			
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF-e N° 202324 - DATA DE EMISSÃO: 20/10/2023.			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.010,55		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000010 . 4

10553906202 . 3

31130010100 . 4

00036377307 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000010 . 4

10553906202 . 3

31130010100 . 4

00036377307 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363773	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 13/11/2023 04:23:38	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO: 20260			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.010,55
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.010,55



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 End: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 19.650.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022
 P. ADM: 215/2022
 N DA OBRA: 047/2022



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba


B.D.I.
 23,54%

PERÍODO: 01/10/2023 A 20/10/2023

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		%
						Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94		R\$ -	6,00	R\$ 2.498,94	0,00	R\$ -	100%
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40		R\$ -	320,00	R\$ 27.654,40	0,00	R\$ -	100%
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76		R\$ -	1,00	R\$ 1.398,76	0,00	R\$ -	100%
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31		R\$ -	1,00	R\$ 1.096,31	0,00	R\$ -	100%
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 809,66	0%
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58		R\$ -	0,00	R\$ -	2,52	R\$ 2.895,58	0%
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40		R\$ -	20,00	R\$ 26.245,40	0,00	R\$ -	100%
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42		R\$ -	891,68	R\$ 6.063,42	0,00	R\$ -	100%
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575,00	R\$ 0,23	R\$ 362,25		R\$ -	1575,00	R\$ 362,25	0,00	R\$ -	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
2.1	EDIFICAÇÃO											
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95		R\$ -	713,77	R\$ 75.002,95	0,00	R\$ -	100%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14		R\$ -	174,70	R\$ 15.639,14	0,00	R\$ -	100%
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98		R\$ -	93,47	R\$ 758,98	0,00	R\$ -	100%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09		R\$ -	129,38	R\$ 5.386,09	0,00	R\$ -	100%
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS											
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67		R\$ -	15,68	R\$ 1.403,67	0,00	R\$ -	100%
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62		R\$ -	13,87	R\$ 112,62	0,00	R\$ -	100%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41		R\$ -	11,42	R\$ 475,41	0,00	R\$ -	100%
2.3	CASTELO D'ÁGUA											
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75		R\$ -	0,00	R\$ -	3,65	R\$ 326,75	0%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30		R\$ -	0,00	R\$ -	4,84	R\$ 39,30	0%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20		R\$ -	0,00	R\$ -	1,23	R\$ 51,20	0%
3	FUNDAÇÕES											
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS											
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68		R\$ -	46,65	R\$ 1.594,68	0,00	R\$ -	100%
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66		R\$ -	131,71	R\$ 22.145,66	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA BA: 052.009/2017.8

3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	317,20	R\$ 19,21	R\$ 6.092,94	R\$ -	317,20	R\$ 6.092,94	0,00	R\$ -	100%
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	41,25	R\$ 18,03	R\$ 743,85	R\$ -	41,25	R\$ 743,85	0,00	R\$ -	100%
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	366,94	R\$ 16,11	R\$ 5.911,14	R\$ -	366,94	R\$ 5.911,14	0,00	R\$ -	100%
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12.5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	225,00	R\$ 13,58	R\$ 3.055,77	R\$ -	225,00	R\$ 3.055,77	0,00	R\$ -	100%
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 5.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	134,38	R\$ 20,38	R\$ 2.738,12	R\$ -	134,38	R\$ 2.738,12	0,00	R\$ -	100%
3.1.9	CONCRETO BOMBEADO FCK=25 MPA: INCLUIDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,55	R\$ 680,42	R\$ 10.580,53	R\$ -	15,55	R\$ 10.580,53	0,00	R\$ -	100%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES										
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	60,44	R\$ 33,31	R\$ 2.013,26	R\$ -	60,44	R\$ 2.013,26	0,00	R\$ -	100%
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	55,45	R\$ 735,61	R\$ 40.789,57	R\$ -	55,45	R\$ 40.789,57	0,00	R\$ -	100%
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55	R\$ 90,76	R\$ 31.725,16	R\$ -	349,55	R\$ 31.725,16	0,00	R\$ -	100%
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,10	R\$ 17,62	R\$ 11.630,96	R\$ -	660,10	R\$ 11.630,96	0,00	R\$ -	100%
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,60	R\$ 15,65	R\$ 1.777,84	R\$ -	113,60	R\$ 1.777,84	0,00	R\$ -	100%
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,41	R\$ 13,11	R\$ 346,24	R\$ -	26,41	R\$ 346,24	0,00	R\$ -	100%
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,91	R\$ 20,55	R\$ 7.334,50	R\$ -	356,91	R\$ 7.334,50	0,00	R\$ -	100%
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	24,18	R\$ 636,71	R\$ 15.395,65	R\$ -	24,18	R\$ 15.395,65	0,00	R\$ -	100%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA										
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	R\$ 81,63	R\$ 2.857,05	R\$ -	0,00	R\$ -	35,00	R\$ 2.857,05	0%
3.3.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,38	R\$ 111,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 111,90	0%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 33,31	R\$ 161,22	R\$ -	0,00	R\$ -	4,84	R\$ 161,22	0%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,40	R\$ 105,02	R\$ 462,09	R\$ -	0,00	R\$ -	4,40	R\$ 462,09	0%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 15,65	R\$ 1.824,95	R\$ -	0,00	R\$ -	116,61	R\$ 1.824,95	0%
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 13,11	R\$ 1.098,36	R\$ -	0,00	R\$ -	83,78	R\$ 1.098,36	0%
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	R\$ 13,30	R\$ 184,47	R\$ -	0,00	R\$ -	13,87	R\$ 184,47	0%
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	R\$ 20,55	R\$ 268,79	R\$ -	0,00	R\$ -	13,08	R\$ 268,79	0%
3.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	2,42	R\$ 645,38	R\$ 1.561,82	R\$ -	0,00	R\$ -	2,42	R\$ 1.561,82	0%
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS										


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.577.8

3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 30 CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	R\$ 144,77	R\$ 2.533,48	R\$ 2.533,48	R\$ -	17,50	R\$ 2.533,48	0,00	R\$ -	100%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 33,31	R\$ 41,64	R\$ 41,64	R\$ -	1,25	R\$ 41,64	0,00	R\$ -	100%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	R\$ 105,02	R\$ 525,10	R\$ 525,10	R\$ -	5,00	R\$ 525,10	0,00	R\$ -	100%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES; UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 20,55	R\$ 209,40	R\$ 209,40	R\$ -	10,19	R\$ 209,40	0,00	R\$ -	100%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	0,63	R\$ 645,38	R\$ 406,59	R\$ 406,59	R\$ -	0,63	R\$ 406,59	0,00	R\$ -	100%
3.5	MURETA E BRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME											
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 33,31	R\$ 403,72	R\$ 403,72	R\$ -	12,12	R\$ 403,72	0,00	R\$ -	100%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	R\$ 735,61	R\$ 831,24	R\$ 831,24	R\$ -	1,13	R\$ 831,24	0,00	R\$ -	100%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	R\$ 90,76	R\$ 4.036,10	R\$ 4.036,10	R\$ -	44,47	R\$ 4.036,10	0,00	R\$ -	100%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,20	R\$ 17,62	R\$ 1.483,60	R\$ 1.483,60	R\$ -	84,20	R\$ 1.483,60	0,00	R\$ -	100%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,64	R\$ 645,38	R\$ 2.349,18	R\$ 2.349,18	R\$ -	3,64	R\$ 2.349,18	0,00	R\$ -	100%
4	SUPERESTRUTURA											
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES											
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 63,75	R\$ 21.250,43	R\$ 21.250,43	R\$ -	333,34	R\$ 21.250,43	0,00	R\$ -	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 16,41	R\$ 13.773,41	R\$ 13.773,41	R\$ -	839,33	R\$ 13.773,41	0,00	R\$ -	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 13,66	R\$ 4.273,94	R\$ 4.273,94	R\$ -	312,88	R\$ 4.273,94	0,08	R\$ 1,09	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 22,34	R\$ 10.057,91	R\$ 10.057,91	R\$ -	450,22	R\$ 10.057,91	0,00	R\$ -	100%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 604,92	R\$ 11.039,79	R\$ 11.039,79	R\$ -	18,25	R\$ 11.039,79	0,00	R\$ -	100%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS											
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	344,10	R\$ 98,83	R\$ 34.007,40	R\$ 34.007,40	R\$ -	344,10	R\$ 34.007,40	0,00	R\$ -	100%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 18,65	R\$ 12.605,72	R\$ 12.605,72	R\$ -	675,91	R\$ 12.605,72	0,00	R\$ -	100%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	R\$ 16,41	R\$ 158,19	R\$ 158,19	R\$ -	9,64	R\$ 158,19	0,00	R\$ -	100%


4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 13,66	R\$ 4.990,13	R\$ -	365,31	R\$ 4.990,13	0,00	R\$ -	100%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	R\$ 584,99	R\$ 14.361,50	R\$ -	24,55	R\$ 14.361,50	0,00	R\$ -	100%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS										
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	124,12	R\$ 73,23	R\$ 9.089,31	R\$ -	124,12	R\$ 9.089,31	0,00	R\$ -	100%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES										
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	R\$ 63,75	R\$ 1.147,50	R\$ -	18,00	R\$ 1.147,50	0,00	R\$ -	100%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	R\$ 18,65	R\$ 254,76	R\$ -	13,66	R\$ 254,76	0,00	R\$ -	100%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 22,34	R\$ 981,17	R\$ -	43,92	R\$ 981,17	0,00	R\$ -	100%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	R\$ 604,92	R\$ 459,74	R\$ -	0,76	R\$ 459,74	0,00	R\$ -	100%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE										
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 63,75	R\$ 1.226,55	R\$ -	0,00	R\$ -	19,24	R\$ 1.226,55	0%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 20,40	R\$ 311,30	R\$ -	0,00	R\$ -	15,26	R\$ 311,30	0%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 18,65	R\$ 362,74	R\$ -	0,00	R\$ -	19,45	R\$ 362,74	0%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 16,41	R\$ 459,64	R\$ -	0,00	R\$ -	28,01	R\$ 459,64	0%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 22,34	R\$ 381,12	R\$ -	0,00	R\$ -	17,06	R\$ 381,12	0%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$ 604,92	R\$ 744,05	R\$ -	0,00	R\$ -	1,23	R\$ 744,05	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL										
5.1	ELEMENTOS VAZADOS										
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$ 145,28	R\$ 886,21	R\$ -	6,10	R\$ 886,21	0,00	R\$ -	100%
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 58,12	R\$ 33.289,39	R\$ -	572,77	R\$ 33.289,39	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Araújo de
Engenharia
CREA-BA: 052.000.177.8

5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$ 94,87	R\$ 15.210,51	R\$ -	160,33	R\$ 15.210,51	0,00	R\$ -	100%
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,91	R\$ 78,32	R\$ 38.917,99	R\$ -	496,91	R\$ 38.917,99	0,00	R\$ -	100%
5.1.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$ 102,11	R\$ 992,51	R\$ -	7,00	R\$ 714,77	2,72	R\$ 277,74	72%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$ 29,16	R\$ 9.092,09	R\$ -	311,80	R\$ 9.092,09	0,00	R\$ -	100%
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$ 471,07	R\$ 3.796,82	R\$ -	0,00	R\$ -	8,06	R\$ 3.796,82	0%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$ 195,51	R\$ 703,84	R\$ -	0,00	R\$ -	3,60	R\$ 703,84	0%
5.3	ALVENARIA DA MURETA										
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$ 78,32	R\$ 4.930,24	R\$ -	62,95	R\$ 4.930,24	0,00	R\$ -	100%
6	ESQUADRIAS										
6.1	PORTAS DE MADEIRA										
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.091,40	R\$ 6.548,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 6.548,40	0%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 2.019,92	R\$ 6.059,76	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 6.059,76	0%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.139,29	R\$ 6.835,74	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 6.835,74	0%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.139,29	R\$ 9.114,32	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 9.114,32	0%
6.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$ 847,60	R\$ 2.034,24	R\$ -	0,00	R\$ -	2,40	R\$ 2.034,24	0%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 332,16	R\$ 2.657,28	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 2.657,28	0%
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 57,82	R\$ 231,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 231,28	0%
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	R\$ 147,23	R\$ 1.884,54	R\$ -	0,00	R\$ -	12,80	R\$ 1.884,54	0%
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO										
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	2,10	R\$ 528,40	R\$ 1.109,64	R\$ -	0,00	R\$ -	2,10	R\$ 1.109,64	0%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,68	R\$ 528,40	R\$ 887,71	R\$ -	0,00	R\$ -	1,68	R\$ 887,71	0%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	3,36	R\$ 528,40	R\$ 1.775,42	R\$ -	0,00	R\$ -	3,36	R\$ 1.775,42	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.677.8


6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$ 493,20	R\$ 41.172,34	R\$ -	0,00	R\$ -	83,48	R\$ 41.172,34	0%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 638,33	R\$ 1.302,19	R\$ -	0,00	R\$ -	2,04	R\$ 1.302,19	0%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV										
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	R\$ 1.648,75	R\$ 1.648,75	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.648,75	0%
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA										
6.5.1	JA - 01. 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$ 834,69	R\$ 734,53	R\$ -	0,00	R\$ -	0,88	R\$ 734,53	0%
6.5.2	JA - 02. 1,10M X1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	R\$ 834,69	R\$ 1.794,58	R\$ -	0,00	R\$ -	2,15	R\$ 1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03. 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO. BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	R\$ 478,30	R\$ 770,06	R\$ -	0,00	R\$ -	1,61	R\$ 770,06	0%
6.5.4	JA - 04. 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	R\$ 834,69	R\$ 2.278,70	R\$ -	0,00	R\$ -	2,73	R\$ 2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05. 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO. BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 478,30	R\$ 1.033,13	R\$ -	0,00	R\$ -	2,16	R\$ 1.033,13	0%
6.5.6	JA - 06. 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.7	JA - 07. 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	R\$ 470,18	R\$ 5.924,27	R\$ -	0,00	R\$ -	12,60	R\$ 5.924,27	0%
6.5.8	JA - 08. 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	R\$ 470,18	R\$ 3.949,51	R\$ -	0,00	R\$ -	8,40	R\$ 3.949,51	0%
6.5.9	JA - 09. 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	R\$ 470,18	R\$ 2.962,13	R\$ -	0,00	R\$ -	6,30	R\$ 2.962,13	0%
6.5.10	JA - 10. 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.11	JA - 11. 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	R\$ 470,18	R\$ 2.468,45	R\$ -	0,00	R\$ -	5,25	R\$ 2.468,45	0%
6.5.12	JA - 12. 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20	R\$ 470,18	R\$ 1.974,76	R\$ -	0,00	R\$ -	4,20	R\$ 1.974,76	0%
6.5.13	JA - 13. 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80	R\$ 470,18	R\$ 7.899,02	R\$ -	0,00	R\$ -	16,80	R\$ 7.899,02	0%
6.5.14	JA - 14. 1,60MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO. BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,72	R\$ 478,30	R\$ 1.300,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,72	R\$ 1.300,98	0%


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro de Arquitetura
 CREA BA 05261/2017.8

6.5.15	Tela de nylon para proteção-fixada na esquadria	m²	10,28	R\$ 33,05	R\$ 339,75		R\$ -	0,00	R\$ -	10,28	R\$ 339,75	0%
6.6	VIDROS											
6.6.1	JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,33	R\$ 225,10	R\$ 3.000,58		R\$ -	0,00	R\$ -	13,33	R\$ 3.000,58	0%
6.6.2	BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,20	R\$ 350,96	R\$ 2.526,91		R\$ -	0,00	R\$ -	7,20	R\$ 2.526,91	0%
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,50	R\$ 706,17	R\$ 5.296,28		R\$ -	0,00	R\$ -	7,50	R\$ 5.296,28	0%
6.6.4	INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P" FACHADA"	m²	68,22	R\$ 433,72	R\$ 29.588,38		R\$ -	0,00	R\$ -	68,22	R\$ 29.588,38	0%
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO											
6.7.1	GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA	m²	95,08	R\$ 346,12	R\$ 32.909,09		R\$ -	0,00	R\$ -	95,08	R\$ 32.909,09	0%
6.7.2	Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m²	6,72	R\$ 346,12	R\$ 2.325,93		R\$ -	0,00	R\$ -	6,72	R\$ 2.325,93	0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA											
7.1.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintura 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	881,21	R\$ 223,07	R\$ 196.571,51		R\$ -	708,69	R\$ 158.087,48	172,52	R\$ 38.484,04	80%
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	850,66	R\$ 261,07	R\$ 222.081,81	290,00	R\$ 75.710,30	290,00	R\$ 75.710,30	560,66	R\$ 146.371,51	34%
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,15	R\$ 105,47	R\$ 7.293,25	39,15	R\$ 4.129,15	69,15	R\$ 7.293,25	0,00	R\$ -	100%
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,60	R\$ 61,43	R\$ 5.749,85		R\$ -	0,00	R\$ -	93,60	R\$ 5.749,85	0%
7.1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,70	R\$ 61,43	R\$ 2.807,35		R\$ -	0,00	R\$ -	45,70	R\$ 2.807,35	0%
7.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,60	R\$ 61,43	R\$ 7.777,04		R\$ -	0,00	R\$ -	126,60	R\$ 7.777,04	0%
7.1.7	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,60	R\$ 46,68	R\$ 10.904,45		R\$ -	233,60	R\$ 10.904,45	0,00	R\$ -	100%
7.1.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem	m²	25,96	R\$ 493,50	R\$ 12.811,26		R\$ -	0,00	R\$ -	25,96	R\$ 12.811,26	0%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO											
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	394,06	R\$ 14,65	R\$ 5.772,98		R\$ -	394,06	R\$ 5.772,98	0,00	R\$ -	100%
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	125,46	R\$ 55,81	R\$ 7.001,92		R\$ -	0,00	R\$ -	125,46	R\$ 7.001,92	0%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO											
9.1	EDIFICACAO											
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2569,60	R\$ 5,23	R\$ 13.439,01		R\$ -	2569,60	R\$ 13.439,01	0,00	R\$ -	100%
9.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1589,78	R\$ 37,28	R\$ 59.267,00		R\$ -	1589,78	R\$ 59.267,00	0,00	R\$ -	100%
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	979,82	R\$ 44,69	R\$ 43.788,16		R\$ -	979,82	R\$ 43.788,16	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.577.8

9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$ 25,48	R\$ 26.111,14		R\$ -	1024,77	R\$ 26.111,14	0,00	R\$ -	100%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	376,80	R\$ 66,26	R\$ 24.966,77	66,00	R\$ 4.373,16	346,00	R\$ 22.925,96	30,80	R\$ 2.040,81	92%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	176,57	R\$ 58,34	R\$ 10.301,09		R\$ -	0,00	R\$ -	176,57	R\$ 10.301,09	0%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	33,90	R\$ 58,34	R\$ 1.977,73		R\$ -	0,00	R\$ -	33,90	R\$ 1.977,73	0%
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$ 21,40	R\$ 2.722,08		R\$ -	0,00	R\$ -	127,20	R\$ 2.722,08	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	697,80	R\$ 56,16	R\$ 39.188,45		R\$ -	0,00	R\$ -	697,80	R\$ 39.188,45	0%
9.2	MURETA											
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 5,23	R\$ 512,80		R\$ -	98,05	R\$ 512,80	0,00	R\$ -	100%
9.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 37,28	R\$ 3.655,30		R\$ -	98,05	R\$ 3.655,30	0,00	R\$ -	100%
10	SISTEMAS DE PISOS											
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	R\$ 43,59	R\$ 17.801,28		R\$ -	204,38	R\$ 8.908,92	204,00	R\$ 8.892,36	50%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	R\$ 34,15	R\$ 4.444,96		R\$ -	56,80	R\$ 1.939,72	73,36	R\$ 2.505,24	44%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	375,34	R\$ 40,27	R\$ 15.114,94		R\$ -	56,80	R\$ 2.287,34	318,54	R\$ 12.827,61	15%
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$ 61,18	R\$ 2.289,36		R\$ -	0,00	R\$ -	37,42	R\$ 2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$ 50,09	R\$ 7.460,91		R\$ -	0,00	R\$ -	148,95	R\$ 7.460,91	0%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,90	R\$ 88,67	R\$ 3.803,94		R\$ -	0,00	R\$ -	42,90	R\$ 3.803,94	0%
10.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	R\$ 16,14	R\$ 1.097,52		R\$ -	0,00	R\$ -	68,00	R\$ 1.097,52	0%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	R\$ 65,45	R\$ 3.498,30		R\$ -	0,00	R\$ -	53,45	R\$ 3.498,30	0%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	R\$ 94,54	R\$ 165,45		R\$ -	0,00	R\$ -	1,75	R\$ 165,45	0%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA											
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	R\$ 138,78	R\$ 35.361,14		R\$ -	0,00	R\$ -	254,80	R\$ 35.361,14	0%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,38	R\$ 455,75	R\$ 7.920,94		R\$ -	0,00	R\$ -	17,38	R\$ 7.920,94	0%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	27,74	R\$ 71,35	R\$ 1.979,25		R\$ -	0,00	R\$ -	27,74	R\$ 1.979,25	0%


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

10.2.4	DIRECIONAL -PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,50	R\$ 120,42	R\$ 903,15	R\$ -	0,00	R\$ -	7,50	R\$ 903,15	0%
10.2.5	ALERTA - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	R\$ 120,42	R\$ 587,65	R\$ -	0,00	R\$ -	4,88	R\$ 587,65	0%
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	m²	21,96	R\$ 10,67	R\$ 234,31	R\$ -	0,00	R\$ -	21,96	R\$ 234,31	0%
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	R\$ 13,15	R\$ 4.534,25	R\$ -	0,00	R\$ -	344,81	R\$ 4.534,25	0%
10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,06	R\$ 35,61	R\$ 287,02	R\$ -	0,00	R\$ -	8,06	R\$ 287,02	0%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS										
11.1	EDIFICAÇÃO										
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2004,59	R\$ 20,91	R\$ 41.915,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2004,59	R\$ 41.915,98	0%
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1902,96	R\$ 15,46	R\$ 29.419,76	R\$ -	0,00	R\$ -	1902,96	R\$ 29.419,76	0%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	442,55	R\$ 14,66	R\$ 6.487,78	R\$ -	0,00	R\$ -	442,55	R\$ 6.487,78	0%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	R\$ 14,73	R\$ 6.518,76	R\$ -	0,00	R\$ -	442,55	R\$ 6.518,76	0%
11.1.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$ 31,05	R\$ 3.838,09	R\$ -	0,00	R\$ -	123,61	R\$ 3.838,09	0%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	R\$ 26,77	R\$ 11.276,33	R\$ -	0,00	R\$ -	421,23	R\$ 11.276,33	0%
11.1.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$ 30,95	R\$ 393,68	R\$ -	0,00	R\$ -	12,72	R\$ 393,68	0%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92	R\$ -	0,00	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
11.1.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$ 54,20	R\$ 5.508,35	R\$ -	0,00	R\$ -	101,63	R\$ 5.508,35	0%
11.1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92	R\$ -	0,00	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
11.2	MURETA										
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,05	R\$ 20,91	R\$ 2.050,23	R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 2.050,23	0%
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 15,46	R\$ 1.515,85	R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 1.515,85	0%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA										
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO										
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,60	R\$ 9,10	R\$ 251,16	R\$ -	27,60	R\$ 251,16	0,00	R\$ -	100%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,90	R\$ 5,76	R\$ 961,34	R\$ -	166,90	R\$ 961,34	0,00	R\$ -	100%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,05	R\$ 20,07	R\$ 1.626,67	R\$ -	81,05	R\$ 1.626,67	0,00	R\$ -	100%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 33,05	R\$ 363,55	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 363,55	0%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	134,60	R\$ 54,57	R\$ 7.345,12	R\$ -	0,00	R\$ -	134,60	R\$ 7.345,12	0%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,55	R\$ 67,89	R\$ 3.703,40	R\$ -	0,00	R\$ -	54,55	R\$ 3.703,40	0%
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 38,30	R\$ 114,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 114,90	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CPEA-BA: 052.009.577.8

12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 243,73	R\$ 1.462,38	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 330,49	R\$ 660,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,55	R\$ 18,20	R\$ -	4,00	R\$ 18,20	0,00	R\$ -	100%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$ 4,32	R\$ 311,04	R\$ -	72,00	R\$ 311,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$ 12,25	R\$ 490,00	R\$ -	40,00	R\$ 490,00	0,00	R\$ -	100%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 34,03	R\$ 204,18	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 49,86	R\$ 99,72	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 99,72	0%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 22,87	R\$ 137,22	R\$ -	6,00	R\$ 137,22	0,00	R\$ -	100%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$ 31,16	R\$ 62,32	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)	UN	4,00	R\$ 38,79	R\$ 155,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 155,16	0%
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 12,81	R\$ 384,30	R\$ -	30,00	R\$ 384,30	0,00	R\$ -	100%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ -	1,00	R\$ 14,55	0,00	R\$ -	100%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)	UN	5,00	R\$ 29,58	R\$ 147,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 147,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 6,17	R\$ 18,51	R\$ -	3,00	R\$ 18,51	0,00	R\$ -	100%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,92	R\$ 35,84	R\$ -	2,00	R\$ 35,84	0,00	R\$ -	100%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 97,39	R\$ 779,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 152,90	R\$ 305,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,51	R\$ 34,04	R\$ -	4,00	R\$ 34,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	R\$ 10,11	R\$ 889,68	R\$ -	88,00	R\$ 889,68	0,00	R\$ -	100%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 15,70	R\$ 439,60	R\$ -	28,00	R\$ 439,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 41,29	R\$ 165,16	R\$ -	4,00	R\$ 165,16	0,00	R\$ -	100%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 54,56	R\$ 1.418,56	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 1.418,56	0%
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 152,90	R\$ 917,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 16,87	R\$ 792,89	R\$ -	47,00	R\$ 792,89	0,00	R\$ -	100%
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 16,87	R\$ 202,44	R\$ -	12,00	R\$ 202,44	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8


12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 14,05	R\$ 238,85	R\$ -	17,00	R\$ 238,85	0,00	R\$ -	100%
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 24,64	R\$ 344,96	R\$ -	14,00	R\$ 344,96	0,00	R\$ -	100%
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 96,69	R\$ 676,83	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 676,83	0%
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 148,06	R\$ 592,24	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 592,24	0%
12.1.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 23,16	R\$ 231,60	R\$ -	10,00	R\$ 231,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 83,40	R\$ 166,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 166,80	0%
12.1.39	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 83,40	R\$ 1.084,20	R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.084,20	0%
12.1.40	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 83,40	R\$ 250,20	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 250,20	0%
12.1.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9,00	R\$ 26,28	R\$ 236,52	R\$ -	9,00	R\$ 236,52	0,00	R\$ -	100%
12.1.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8,00	R\$ 26,28	R\$ 210,24	R\$ -	8,00	R\$ 210,24	0,00	R\$ -	100%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS										
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 289,97	R\$ 869,91	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 869,91	0%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 352,10	R\$ 352,10	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 83,01	R\$ 166,02	R\$ -	2,00	R\$ 166,02	0,00	R\$ -	100%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 167,14	R\$ 1.337,12	R\$ -	4,00	R\$ 668,56	4,00	R\$ 668,56	50%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 94,47	R\$ 2.834,10	R\$ -	10,00	R\$ 944,70	20,00	R\$ 1.889,40	33%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 89,77	R\$ 538,62	R\$ -	1,00	R\$ 89,77	5,00	R\$ 448,85	17%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC										
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,60	R\$ 34,17	R\$ 8.426,32	R\$ -	246,60	R\$ 8.426,32	0,00	R\$ -	100%
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	R\$ 66,60	R\$ 199,80	R\$ -	3,00	R\$ 199,80	0,00	R\$ -	100%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 27,17	R\$ 298,87	R\$ -	11,00	R\$ 298,87	0,00	R\$ -	100%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 27,24	R\$ 1.280,28	R\$ -	47,00	R\$ 1.280,28	0,00	R\$ -	100%
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 83,82	R\$ 335,28	R\$ -	4,00	R\$ 335,28	0,00	R\$ -	100%
13.1.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 66,37	R\$ 66,37	R\$ -	1,00	R\$ 66,37	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.055.177.8

13.2	ACESSÓRIOS											
13.2.1	Ralo hemisférico em P.F, tipo abacaxi Ø 100mm	un	11,00	R\$ 46,01	R\$ 506,11	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 506,11	0%	
13.2.2	CAIXA DE AREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 1.078,20	0%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA											
14.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,30	R\$ 63,96	R\$ 9.549,23	R\$ -	149,30	R\$ 9.549,23	0,00	R\$ -	100%	
14.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,30	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57	R\$ -	115,30	R\$ 2.581,57	0,00	R\$ -	100%	
14.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,10	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38	R\$ -	173,10	R\$ 5.705,38	0,00	R\$ -	100%	
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33	R\$ -	0,00	R\$ -	69,55	R\$ 3.240,33	0%	
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 27,17	R\$ 163,02	R\$ -	6,00	R\$ 163,02	0,00	R\$ -	100%	
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00	R\$ -	9,00	R\$ 198,00	0,00	R\$ -	100%	
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00	R\$ 12,88	R\$ 399,28	R\$ -	31,00	R\$ 399,28	0,00	R\$ -	100%	
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	R\$ 8,32	R\$ 266,24	R\$ -	32,00	R\$ 266,24	0,00	R\$ -	100%	
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 27,24	R\$ 326,88	R\$ -	12,00	R\$ 326,88	0,00	R\$ -	100%	
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 31,14	R\$ 871,92	R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 871,92	0%	
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 12,21	R\$ 219,78	R\$ -	18,00	R\$ 219,78	0,00	R\$ -	100%	
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	106,00	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08	R\$ -	106,00	R\$ 1.185,08	0,00	R\$ -	100%	
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08	R\$ -	14,00	R\$ 1.109,08	0,00	R\$ -	100%	
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 50,31	R\$ 402,48	R\$ -	8,00	R\$ 402,48	0,00	R\$ -	100%	
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ -	1,00	R\$ 53,33	0,00	R\$ -	100%	
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 23,79	R\$ 214,11	R\$ -	9,00	R\$ 214,11	0,00	R\$ -	100%	
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ -	1,00	R\$ 29,99	0,00	R\$ -	100%	
14.19	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 66,93	R\$ 267,72	R\$ -	4,00	R\$ 267,72	0,00	R\$ -	100%	
14.20	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 66,93	R\$ 803,16	R\$ -	12,00	R\$ 803,16	0,00	R\$ -	100%	
14.21	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 21,85	R\$ 284,05	R\$ -	13,00	R\$ 284,05	0,00	R\$ -	100%	

Tony *Arx* Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.033.677.8

14.22	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 45,47	R\$ 45,47	R\$ -	1,00	R\$ 45,47	0,00	R\$ -	100%
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36	R\$ -	12,00	R\$ 246,36	0,00	R\$ -	100%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$ 37,66	R\$ 715,54	R\$ -	19,00	R\$ 715,54	0,00	R\$ -	100%
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 179,93	R\$ 719,72	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 719,72	0%
14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 314,08	R\$ 3.768,96	R\$ -	12,00	R\$ 3.768,96	0,00	R\$ -	100%
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 12,14	R\$ 182,10	R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 182,10	0%
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	R\$ 94,14	R\$ 282,42	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 282,42	0%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	R\$ 12,03	R\$ 108,27	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 108,27	0%
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9,00	R\$ 13,15	R\$ 118,35	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 118,35	0%
14.31	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	R\$ 3.570,15	R\$ 3.570,15	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.570,15	0%
14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1,00	R\$ 8.367,68	R\$ 8.367,68	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 8.367,68	0%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 272,64	R\$ 1.090,56	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.090,56	0%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 456,55	R\$ 4.108,95	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 4.108,95	0%
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	9,70	R\$ 108,45	R\$ 1.051,97	R\$ -	0,00	R\$ -	9,70	R\$ 1.051,97	0%
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 347,93	R\$ 4.523,09	R\$ -	10,00	R\$ 3.479,30	3,00	R\$ 1.043,79	77%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 130,08	R\$ 1.691,04	R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.691,04	0%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 202,92	R\$ 1.217,52	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.217,52	0%
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 423,60	R\$ 2.118,00	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 2.118,00	0%
15.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 260,39	R\$ 260,39	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 260,39	0%
15.9	banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm	un	2,00	R\$ 325,13	R\$ 650,26	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 650,26	0%
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 783,52	R\$ 2.350,56	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.350,56	0%
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 89,41	R\$ 715,28	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 715,28	0%
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 32,23	R\$ 290,07	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 290,07	0%
15.15	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	107,00	R\$ 14,87	R\$ 1.591,09	R\$ -	0,00	R\$ -	107,00	R\$ 1.591,09	0%
15.16	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	3,00	R\$ 66,57	R\$ 199,71	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,71	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.638.577.8

15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,55	R\$ 931,95		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 931,95	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 370,16	0%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 59,63	R\$ 954,08		R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 954,08	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 59,63	R\$ 178,89		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 178,89	0%
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 69,07	R\$ 966,98		R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 966,98	0%
15.24	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 67,82	R\$ 678,20		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 678,20	0%
15.25	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	R\$ 45,79	R\$ 641,06		R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 360,56	R\$ 2.523,92		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 349,21	R\$ 1.746,05		R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 332,16	R\$ 2.989,44		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,87	R\$ 1.027,87		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.027,87	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL											
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m²	1,14	R\$ 482,23	R\$ 549,74		R\$ -	0,00	R\$ -	1,14	R\$ 549,74	0%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 638,33	R\$ 153,20		R\$ -	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 153,20	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$ 50,37	R\$ 1.893,91		R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 1.893,91	0%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$ 18,46	R\$ 694,10		R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 694,10	0%
16.5	Fita anticorrosiva	Un	4,00	R\$ 8,20	R\$ 32,80		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,80	0%
16.6	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 159,05	R\$ 159,05		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 159,05	0%
16.7	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$ 45,98	R\$ 91,96		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 408,53	R\$ 408,53		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo inflamável	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO											
17.1	EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 227,04	R\$ 1.362,24		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 761,41	R\$ 1.522,82		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 132,05	R\$ 924,35		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 140,35	R\$ 140,35		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 140,35	0%
17.5	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,55	R\$ 169,10		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 169,10	0%
17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,90	R\$ 735,60		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 735,60	0%

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.033.577.8

17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$ 147,13	R\$ 9.269,19	R\$ -	0,00	R\$ -	63,00	R\$ 9.269,19	0%
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.525,01	R\$ 3.050,02	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 3.050,02	0%
17.9	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 370,36	R\$ 370,36	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 370,36	0%
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 289,97	R\$ 1.449,85	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.449,85	0%
17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 191,86	R\$ 575,58	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 575,58	0%
17.12	UNIÃO. EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 179,17	R\$ 716,68	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 716,68	0%
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$ 24,70	R\$ 889,20	R\$ -	0,00	R\$ -	36,00	R\$ 889,20	0%
17.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10,00	R\$ 18,46	R\$ 184,60	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 184,60	0%
17.15	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a	un	1,00	R\$ 2.826,84	R\$ 2.826,84	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.826,84	0%
17.16	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 219,18	R\$ 219,18	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 219,18	0%
17.17	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$ 219,18	R\$ 438,36	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 438,36	0%
17.18	Placa de sinalizacao de seguranga contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e piclogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	R\$ 27,31	R\$ 928,54	R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 928,54	0%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V										
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO										
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 597,68	R\$ 597,68	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 597,68	0%
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 769,98	R\$ 1.539,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.539,96	0%
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 883,24	R\$ 2.649,72	R\$ -	2,00	R\$ 1.766,48	1,00	R\$ 883,24	67%
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 99,54	R\$ 99,54	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 99,54	0%
18.2	DISJUNTORES										
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$ 11,69	R\$ 771,54	R\$ -	0,00	R\$ -	66,00	R\$ 771,54	0%
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 37,17	0%
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,39	R\$ 24,78	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 24,78	0%
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$ 13,67	R\$ 218,72	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 218,72	0%
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 15,23	R\$ 60,92	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 60,92	0%
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 22,11	R\$ 22,11	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 22,11	0%
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 73,28	R\$ 146,56	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 146,56	0%
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 81,82	R\$ 327,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 327,28	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.009/577.8

18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 89,46	R\$ 178,92		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 178,92	0%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 99,19	R\$ 198,38		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 198,38	0%
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 132,13	R\$ 264,26		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 264,26	0%
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 569,56	R\$ 1.139,12		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.139,12	0%
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 132,81	R\$ 132,81		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 132,81	0%
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2,00	R\$ 248,90	R\$ 497,80		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 497,80	0%
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	R\$ 132,81	R\$ 398,43		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 398,43	0%
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	24,00	R\$ 104,15	R\$ 2.499,60		R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 2.499,60	0%
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8,00	R\$ 104,15	R\$ 833,20		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 833,20	0%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	408,30	R\$ 9,84	R\$ 4.017,67		R\$ -	408,30	R\$ 4.017,67	0,00	R\$ -	100%
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,40	R\$ 12,81	R\$ 2.234,06		R\$ -	174,40	R\$ 2.234,06	0,00	R\$ -	100%
18.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,90	R\$ 17,40	R\$ 5.827,26		R\$ -	0,00	R\$ -	334,90	R\$ 5.827,26	0%
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,20	R\$ 25,44	R\$ 259,49		R\$ -	0,00	R\$ -	10,20	R\$ 259,49	0%
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 42,95	R\$ 1.718,00		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 1.718,00	0%
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,80	R\$ 22,66	R\$ 675,27		R\$ -	0,00	R\$ -	29,80	R\$ 675,27	0%
18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 244,68	R\$ 2.691,48		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 2.691,48	0%
18.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00	R\$ 16,01	R\$ 2.721,70		R\$ -	120,00	R\$ 1.921,20	50,00	R\$ 800,50	71%
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$ 10,97	R\$ 1.097,00		R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 1.097,00	0%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5871,30	R\$ 4,26	R\$ 25.011,74		R\$ -	0,00	R\$ -	5871,30	R\$ 25.011,74	0%
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	253,90	R\$ 6,88	R\$ 1.746,83		R\$ -	0,00	R\$ -	253,90	R\$ 1.746,83	0%
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1472,40	R\$ 9,37	R\$ 13.796,39		R\$ -	0,00	R\$ -	1472,40	R\$ 13.796,39	0%
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,50	R\$ 23,52	R\$ 811,44		R\$ -	34,50	R\$ 811,44	0,00	R\$ -	100%
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	R\$ 27,00	R\$ 1.574,10		R\$ -	0,00	R\$ -	58,30	R\$ 1.574,10	0%
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,60	R\$ 36,28	R\$ 3.214,41		R\$ -	0,00	R\$ -	88,60	R\$ 3.214,41	0%
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,80	R\$ 78,17	R\$ 22.106,48		R\$ -	0,00	R\$ -	282,80	R\$ 22.106,48	0%


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA BA: 052.051.077.8

18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 94,31	R\$ 3.772,40		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 3.772,40	0%
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,80	R\$ 162,56	R\$ 25.977,09		R\$ -	0,00	R\$ -	159,80	R\$ 25.977,09	0%
18.5	ELETROCALHAS											
18.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,20	R\$ 100,10	R\$ 7.527,52		R\$ -	0,00	R\$ -	75,20	R\$ 7.527,52	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS											
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95,00	R\$ 30,71	R\$ 2.917,45		R\$ -	0,00	R\$ -	95,00	R\$ 2.917,45	0%
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R\$ 32,41	R\$ 745,43		R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 745,43	0%
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 43,10	R\$ 129,30		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 129,30	0%
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	R\$ 45,20	R\$ 1.536,80		R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 1.536,80	0%
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 25,33	R\$ 75,99		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 75,99	0%
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 59,75	R\$ 119,50		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 119,50	0%
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 54,43	R\$ 54,43		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 54,43	0%
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 30,71	R\$ 307,10		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 307,10	0%
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 221,24	R\$ 1.769,92		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.769,92	0%
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11,00	R\$ 102,83	R\$ 1.131,13		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.131,13	0%
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	56,00	R\$ 118,28	R\$ 6.623,68		R\$ -	0,00	R\$ -	56,00	R\$ 6.623,68	0%
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25,00	R\$ 165,86	R\$ 4.146,50		R\$ -	0,00	R\$ -	25,00	R\$ 4.146,50	0%
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00	R\$ 205,96	R\$ 1.853,64		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 1.853,64	0%
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	R\$ 410,44	R\$ 1.641,76		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.641,76	0%
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00	R\$ 410,44	R\$ 410,44		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 410,44	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8,00	R\$ 152,18	R\$ 1.217,44		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.217,44	0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO											
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,90	R\$ 15,20	R\$ 971,28		R\$ -	63,90	R\$ 971,28	0,00	R\$ -	100%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 6,17	R\$ 74,04		R\$ -	12,00	R\$ 74,04	0,00	R\$ -	100%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50		R\$ -	14,00	R\$ 80,50	0,00	R\$ -	100%
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 9,10	R\$ 27,30		R\$ -	3,00	R\$ 27,30	0,00	R\$ -	100%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA											
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS											
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 948,33	R\$ 2.844,99		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.844,99	0%
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	R\$ 507,92	R\$ 507,92		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 507,92	0%
20.1.3	GUIA DE CABO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 41,83	R\$ 83,66		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 83,66	0%
20.1.4	GUIA DE CABOS DE VERTICAL, FECHADO	UN	1,00	R\$ 41,83	R\$ 41,83		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 41,83	0%
20.1.5	GUIA DE CABO VERTICAL	UN	2,00	R\$ 41,83	R\$ 83,66		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 83,66	0%

Tomada de Amostragem
 Controlada
 03/11/2019 17:08

20.1.6	GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO	UN	1,00	R\$ 41,83	R\$ 41,83	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 41,83	0%
20.1.7	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00	R\$ 65,67	R\$ 131,34	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 131,34	0%
20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	R\$ 726,43	R\$ 726,43	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 726,43	0%
20.1.9	ACESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300 MPBS	UN	2,00	R\$ 634,89	R\$ 1.269,78	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.269,78	0%
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS										
20.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579,00	R\$ 14,57	R\$ 8.436,03	R\$ -	0,00	R\$ -	579,00	R\$ 8.436,03	0%
20.2.2	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113,00	R\$ 13,66	R\$ 1.543,58	R\$ -	0,00	R\$ -	113,00	R\$ 1.543,58	0%
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ45/RJ45 DE 2,50m	UN	19,00	R\$ 17,77	R\$ 337,63	R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 337,63	0%
20.3	TOMADAS										
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	R\$ 39,49	R\$ 750,31	R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 750,31	0%
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	R\$ 72,64	R\$ 581,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 581,12	0%
20.3.3	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	Un	10,00	R\$ 42,93	R\$ 429,30	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 429,30	0%
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS										
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$ 244,68	R\$ 978,72	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 978,72	0%
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	R\$ 16,01	R\$ 432,27	R\$ -	0,00	R\$ -	27,00	R\$ 432,27	0%
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
20.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,20	R\$ 10,38	R\$ 157,78	R\$ -	15,20	R\$ 157,78	0,00	R\$ -	100%
20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,05	R\$ 9,84	R\$ 1.102,57	R\$ -	0,00	R\$ -	112,05	R\$ 1.102,57	0%
20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,80	R\$ 18,01	R\$ 86,45	R\$ -	0,00	R\$ -	4,80	R\$ 86,45	0%
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	55,20	R\$ 28,10	R\$ 1.551,12	R\$ -	0,00	R\$ -	55,20	R\$ 1.551,12	0%
20.5.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	51,65	R\$ 57,43	R\$ 2.966,26	R\$ -	0,00	R\$ -	51,65	R\$ 2.966,26	0%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA										
21.1	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	un	1,00	R\$ 1.920,13	R\$ 1.920,13	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.920,13	0%
21.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1,00	R\$ 1.468,08	R\$ 1.468,08	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.468,08	0%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 113,47	R\$ 113,47	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 113,47	0%
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,60	R\$ 11,47	R\$ 1.245,64	R\$ -	0,00	R\$ -	108,60	R\$ 1.245,64	0%
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 24,49	R\$ 269,39	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 269,39	0%
22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00	R\$ 9,62	R\$ 38,48	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 38,48	0%
22.5	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33,00	R\$ 24,49	R\$ 808,17	R\$ -	0,00	R\$ -	33,00	R\$ 808,17	0%
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 307,60	0%
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	26,18	R\$ 89,52	R\$ 2.343,63	R\$ -	0,00	R\$ -	26,18	R\$ 2.343,63	0%
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	26,18	R\$ 41,63	R\$ 1.089,87	R\$ -	0,00	R\$ -	26,18	R\$ 1.089,87	0%
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 94,61	R\$ 1.040,71	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.040,71	0%
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	26,00	R\$ 35,07	R\$ 911,82	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 911,82	0%
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	261,00	R\$ 63,70	R\$ 16.625,70	R\$ -	0,00	R\$ -	261,00	R\$ 16.625,70	0%
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	174,50	R\$ 82,38	R\$ 14.375,31	R\$ -	0,00	R\$ -	174,50	R\$ 14.375,31	0%
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 45,07	R\$ 495,77	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 495,77	0%
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM²	UN	251,00	R\$ 13,53	R\$ 3.396,03	R\$ -	0,00	R\$ -	251,00	R\$ 3.396,03	0%
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22,00	R\$ 37,07	R\$ 815,54	R\$ -	0,00	R\$ -	22,00	R\$ 815,54	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA: 032.000.177.8

23	SERVICOS COMPLEMENTARES												
23.1	GERAIS												
23.1.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.036,44	R\$ 2.036,44		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.036,44	0%	
23.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	38,34	R\$ 357,31	R\$ 13.699,27		R\$ -	0,00	R\$ -	38,34	R\$ 13.699,27	0%	
23.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	R\$ 357,31	R\$ 9.608,07		R\$ -	0,00	R\$ -	26,89	R\$ 9.608,07	0%	
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	30,15	R\$ 126,19	R\$ 3.804,63		R\$ -	0,00	R\$ -	30,15	R\$ 3.804,63	0%	
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	R\$ 205,07	R\$ 1.911,25		R\$ -	4,50	R\$ 922,82	4,82	R\$ 988,44	48%	
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	79,65	R\$ 92,81	R\$ 7.392,32		R\$ -	0,00	R\$ -	79,65	R\$ 7.392,32	0%	
23.1.7	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	148,00	R\$ 34,77	R\$ 5.145,96		R\$ -	0,00	R\$ -	148,00	R\$ 5.145,96	0%	
23.1.8	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 3.819,30	R\$ 3.819,30		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.819,30	0%	
23.1.9	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 12.775,93	R\$ 12.775,93		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 12.775,93	0%	
23.1.10	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	R\$ 1.271,21	R\$ 1.271,21		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.271,21	0%	
23.1.11	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 732,57	R\$ 732,57		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 732,57	0%	
23.1.12	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	19,00	R\$ 184,29	R\$ 3.501,51		R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 3.501,51	0%	
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L												
23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00	R\$ 46.413,61	R\$ 46.413,61		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 46.413,61	0%	
23.2.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,00	R\$ 106,31	R\$ 425,24		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 425,24	0%	
23.2.4	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	101,80	R\$ 58,96	R\$ 6.002,13		R\$ -	0,00	R\$ -	101,80	R\$ 6.002,13	0%	
23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,90	R\$ 12,08	R\$ 614,87		R\$ -	0,00	R\$ -	50,90	R\$ 614,87	0%	
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
24.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	R\$ 151,29	R\$ 19.365,12		R\$ -	127,00	R\$ 19.213,83	1,00	R\$ 151,29	99%	
25	SERVICOS FINAIS												
25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	891,68	R\$ 2,18	R\$ 1.942,96		R\$ -	0,00	R\$ -	891,68	R\$ 1.942,96	0%	
25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R\$ 1.751,58	R\$ 1.751,58		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.751,58	0%	
VALOR POR EXTENSO: OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS				R\$ 2.265.645,95		R\$ 84.212,61		R\$ 1.107.612,28		R\$ 1.158.033,67	48,89%		

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:19.650.110/0001-27

Fabio da Silva Oliveira

Sócio Administrador

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PEY2X-GNRJR-UKJU7-VTKSX

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/PEY2X-GNRJR-UKJU7-VTKSX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA,
CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

DATA: 20/10/2023



FOTO 97: INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA E CALHA PLUVIAL

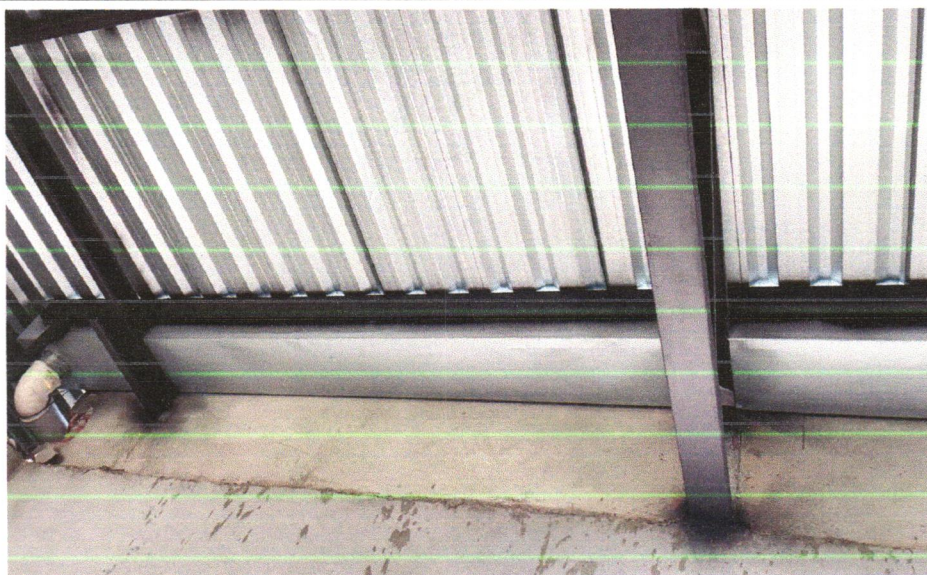


FOTO 98: INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA E CALHA PLUVIAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA: 032.010.17.3


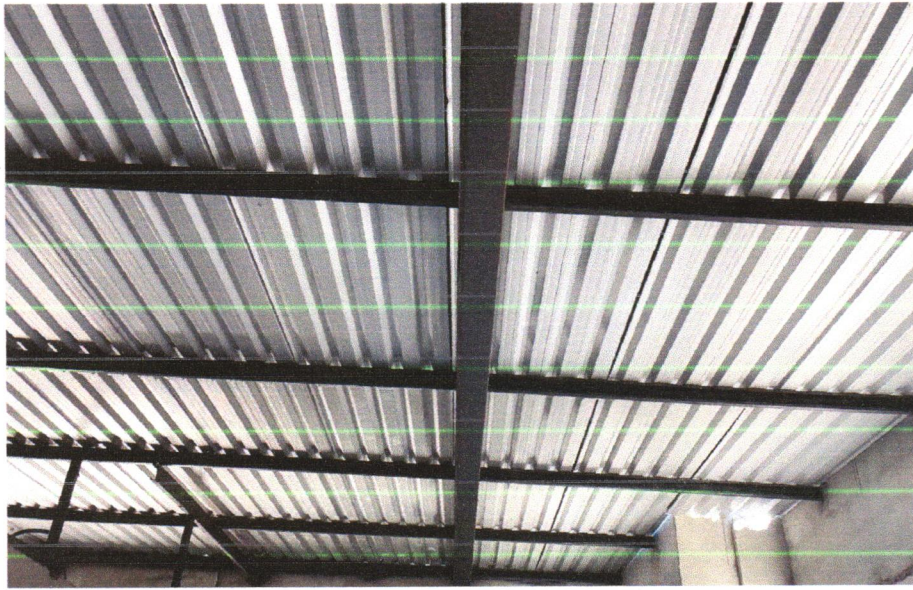


FOTO 99: INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA



FOTO 100: ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Tony Flávio Andrade
Engenheiro Civil
CPF: 3-DA-092101177.8

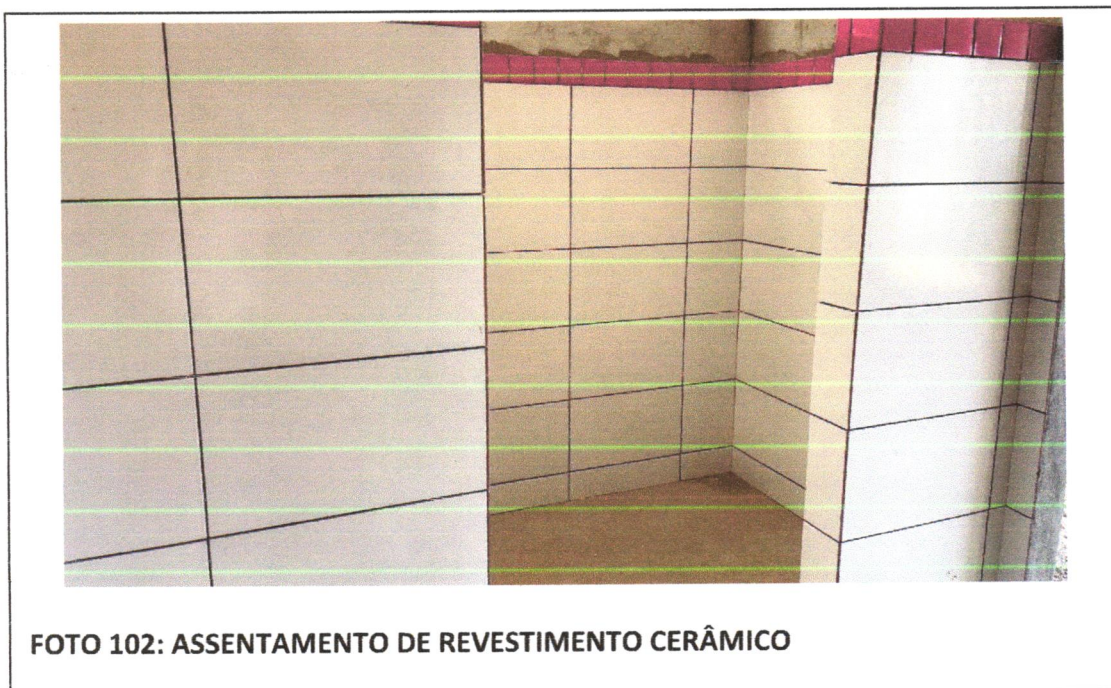

Tony *Ar* Andrade
Especialista em Imóveis
CRM: 104.002.000/7.8

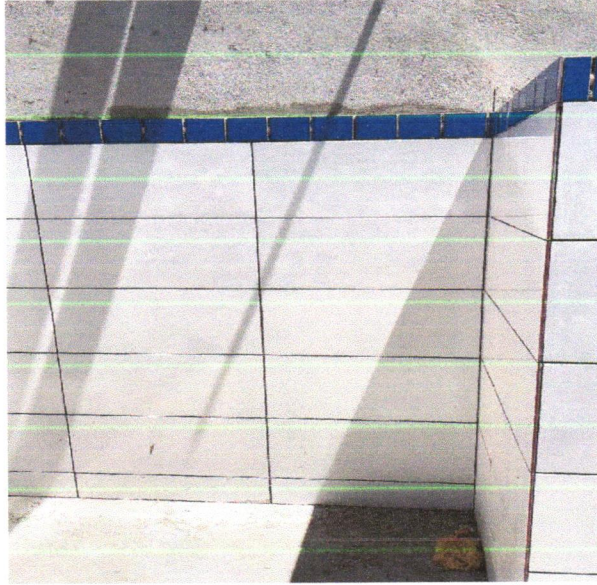


FOTO 103: ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO



FOTO 104: ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Tony *[Signature]* Arce de
Engenheiro
CREA-BA: 0321/2017-3



TOTY P. P. P. P. P.
CNPJ Nº. 05240111/000178



FOTO 107: INSTALAÇÃO CALHA PLUVIAL

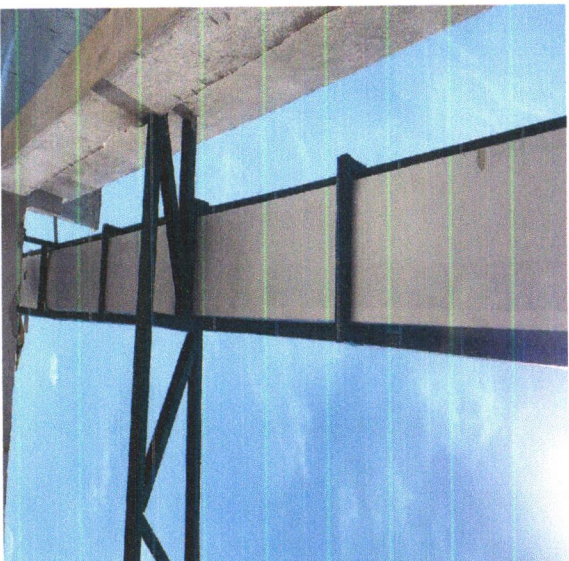


FOTO 108: INSTALAÇÃO CALHA PLUVIAL

Tomaz F. M. Araújo
Assinador de Imóveis CRI
CPF nº 092.174.577-3



FOTO 109: INSTALAÇÃO CALHA PLUVIAL



FOTO 110: INSTALAÇÃO TELHA METÁLICA

Tomaz F. de
Carvalho
CPF: 04.402.177.0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KYJE2-JZP5D-6VTFY-F7N6K

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/KYJE2-JZP5D-6VTFY-F7N6K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 316
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Período: 13/09/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.680.110/0001-21
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **317**

ANOTAÇÕES

Período: 14/09/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Geleiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.350-000 - QUEIMADAS-BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	318
-----	------------


ANOTAÇÕES


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Periodo:	15/09/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Engenheiro Civil nº 12345
 CPF: 052.000.000-00


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 SANTALUZ - BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	319
-----	------------

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Período:	16/09/2023
----------	------------


Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:


 Tony Pereira
 Engenheiro Civil
 Nº 178
 CREA-BA/178
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHA...

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	320
-----	------------

ANOTAÇÕES

17/09/2023

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:

Tony F. A. ...
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA ALTO DA CHACRIKHA 25 - CONJUNTO

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 321
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Periodo: 18/09/2023
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Filho Andrade
 Engenheiro Civil
 CRP: 0329 3577.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 0477/2022	Nº:	322
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES	Periodo:	19/09/2023
------------------	----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/2001-27]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACINHA, 25 - CONTIGUO
 [48.380-000 - QUEBRAS/BA]








RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 323
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Periodo:	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL		20/09/2023	
		Condição do Tempo	
		Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
		Engenheiro Civil	1
		Administrativo	1
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Amador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL	21		

ASSINATURAS:


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Tony Engenheiro
 CRP: BA: 0321 7.8


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 324
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 21/09/2023
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

[Assinatura]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CREA-BA. 052.000.000-0

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 325
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 22/09/2023
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	326
-----	------------

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	23/09/2023
----------	------------

Condição do Tempo

Manhã			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Tarde			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Noite			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
CREA-BA: 051.178

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
48.260-000 - QUEIMADAS-BA
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 327
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 24/09/2023

Condição do Tempo

Bom Chuva Não Operável
Manhã
 Bom Chuva Não Operável
Tarde
 Bom Chuva Não Operável
Noite

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.053-577.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 JARDIM SÃO GUILHERME, 100 - SANTALUZ, BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	328
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	25/09/2023
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony F...
 Engenheiro
 CREDA DA: 0021...7.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 329
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Periodo: 26/09/2023
------------------	----------------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CALHA PLUVIAL



Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

<p>ASSINATURAS:</p> <p> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA Engenheiro CREA-BA: 05211/2019 7.8</p>	<p> ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Rua ... 110/111/112 - 377 ARCO - 00000000-0000-0000-0000-000000000000 EIRELI - 00000000-0000-0000-0000-000000000000 Número de Inscrição Estadual: 15.107.912-1 48.500-000-000000000000</p>
--	---





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	330
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	27/09/2023
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Tony Felix A. ...
 Engenheiro
 CREA-BA: 0341/2013

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[Handwritten Signature]
 19.059.410/0001-07
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 15.088.000/0001-03

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/LAXB-5B148-9X5M8-F79HG>.







RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº:	331
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES		Periodo:	28/09/2023																						
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL		Condição do Tempo Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável EFETIVO DA OBRA ARCO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>10</td></tr> <tr><td>Amiador</td><td>2</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	10	Amiador	2	Serralheiro	0	Eletricista	0	Gesseiro	0	TOTAL	21
Função	Qtde.																								
Engenheiro Civil	1																								
Administrativo	1																								
Mestre de Obras	1																								
Pedreiro	6																								
Ajudante Comum	10																								
Amiador	2																								
Serralheiro	0																								
Eletricista	0																								
Gesseiro	0																								
TOTAL	21																								

ASSINATURAS:


 Tony Felix Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CREFAMBA: 032.011.177.8


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 [19.050.110/0001-27]
 ARCO CONST. E EMPREEND. EIRELI
 [19.050.110/0001-27]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/LAXB-5BJ48-9X5M8-F79HG>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **332**

ANOTAÇÕES

Período: 29/09/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tory P...
 Engenheiro Civil
 CPF nº 7.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Arco

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	333
-----	------------

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Período:	30/09/2023
----------	------------


Condição do Tempo			
Manhã			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Tarde			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Noite			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CPF nº 053.977.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.300-000

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LAXBP-5BJ48-9X5M8-F79HG

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:


Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LAXBP-5BJ48-9X5M8-F79HG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	334
-----	------------

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	01/10/2023
----------	------------


Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 ENGR. CIVIL
 CREA-BA: 0251

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS
 RUA ALTO DA CHACRINHA


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-L-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	335
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES		Período:	02/10/2023																						
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p> <p>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CALHA PLUVIAL</p>		<p>Condição do Tempo</p> <p>Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p>Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p>Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p>EFETIVO DA OBRA</p> <p>ARCO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>10</td></tr> <tr><td>Amador</td><td>2</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	10	Amador	2	Serralheiro	0	Eletricista	0	Gesseiro	0	TOTAL	21
Função	Qtde.																								
Engenheiro Civil	1																								
Administrativo	1																								
Mestre de Obras	1																								
Pedreiro	6																								
Ajudante Comum	10																								
Amador	2																								
Serralheiro	0																								
Eletricista	0																								
Gesseiro	0																								
TOTAL	21																								

ASSINATURAS: _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--	--

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.







RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	336
------------	------------

ANOTAÇÕES	
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p> <p>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA CALHA PLUVIAL</p>	

Período:	03/10/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:
<p> ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</p>
<p> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA</p>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	337
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES		Periodo:	04/10/2023																						
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS		Condição do Tempo Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável EFETIVO DA OBRA ARCO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>10</td></tr> <tr><td>Amador</td><td>2</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	10	Amador	2	Serralheiro	0	Eletricista	0	Gesseiro	0	TOTAL	21
Função	Qtde.																								
Engenheiro Civil	1																								
Administrativo	1																								
Mestre de Obras	1																								
Pedreiro	6																								
Ajudante Comum	10																								
Amador	2																								
Serralheiro	0																								
Eletricista	0																								
Gesseiro	0																								
TOTAL	21																								

ASSINATURAS:


 Tony André de Santana
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CREA-BA: 05527


 Santo
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ **CONTRATO:** 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA **RDC:** 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA **CONTRATADA:** ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **339**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS

Período: 06/10/2023

Condição do Tempo

Bom Chuva Não Operável
 Bom Chuva Não Operável
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **340**

ANOTAÇÕES

Período: 07/10/2023

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:

Tony Andrade
 Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.850.110/0001-57
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINA, 25
 46.500-000 - QUEBRAS

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	341
-----	------------

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	08/10/2023
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 BA: 052.001.577.8
 MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

18.350.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTA DO QUADRADO 25 - POLO
 48.300-000 - QUEMADAS

[Handwritten Signature]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QUUJ-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 342
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	09/10/2023																						
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS		Condição do Tempo Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável EFETIVO DA OBRA ARCO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>10</td></tr> <tr><td>Amador</td><td>2</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	10	Amador	2	Serralheiro	0	Eletricista	0	Gesseiro	0	TOTAL	21
Função	Qtde.																								
Engenheiro Civil	1																								
Administrativo	1																								
Mestre de Obras	1																								
Pedreiro	6																								
Ajudante Comum	10																								
Amador	2																								
Serralheiro	0																								
Eletricista	0																								
Gesseiro	0																								
TOTAL	21																								

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 344
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:																						
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS		11/10/2023 Condição do Tempo Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável EFETIVO DA OBRA ARCO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>10</td></tr> <tr><td>Amador</td><td>2</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	10	Amador	2	Serralheiro	0	Eletricista	0	Gesseiro	0	TOTAL	21
Função	Qtde.																							
Engenheiro Civil	1																							
Administrativo	1																							
Mestre de Obras	1																							
Pedreiro	6																							
Ajudante Comum	10																							
Amador	2																							
Serralheiro	0																							
Eletricista	0																							
Gesseiro	0																							
TOTAL	21																							

ASSINATURAS:

Tony F. A. [Assinatura]
 Engenheiro Civil
 Prefeitura Municipal de Santaluz/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
 ARCO CONSTRUÇÕES
 Rua Alto da Cachaça, 25 - Distrito de
 45.350-000 - QUEMADOURA - BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 345
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Periodo:	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS		12/10/2023	
		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
Função	Qtde.		
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Amador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL	21		

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 062.050.177.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Carla
 19.650.110/ARCO 27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA DE SANTALUZ Nº 111
 48.500-000 - CUIABÁ, MT

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 346
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS		13/10/2023	
		Condição do Tempo	
		Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
		Engenheiro Civil	1
		Administrativo	1
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Amador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL	21		

ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	347
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	14/10/2023
----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA: 052.018/377.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA C...
 TORNO

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	348
-----	------------

ANOTAÇÕES
DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	15/10/2023
Condição do tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	0
Administrativo	0
Mestre de Obras	0
Pedreiro	0
Ajudante Comum	0
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	0

ASSINATURAS:

Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 Nº 17.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Dante
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CRACIUNHA, 100 - SANTALUZ/BA
 48.360-000 - OUPINCOIS-BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	349
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Período:	16/10/2023
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

[Handwritten Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[Handwritten Signature]





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	350
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES		Periodo:	17/10/2023
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS) CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS		Condição do Tempo Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA ARCO	
		Função	Qtde.
		Engenheiro Civil	1
		Administrativo	1
		Mestre de Obras	1
		Pedreiro	6
		Ajudante Comum	10
		Amador	2
		Serralheiro	0
		Eletricista	0
		Gezeiro	0
		TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	352
-----	------------

ANOTAÇÕES

Periodo:	19/10/2023
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Geleiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **353**

ANOTAÇÕES

Período: 20/10/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amiador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

[Assinatura]
 Tony Leix A. ...
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/F9QU-U-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>.





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/F9QUU-K8PW4-DNZ5V-LFB9Z>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:07 do dia 27/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2023.

Código de controle da certidão: **F6AC.FBB6.350A.50DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 51859086/2023
Expedição: 27/09/2023, às 08:42:56
Validade: 25/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27
Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2023 a 11/11/2023

Certificação Número: 2023101319573377731281

Informação obtida em 20/10/2023 14:57:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235449994**

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº. 676/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		C.G.A 154100189	C.N.P.J. 19.650.110/0001-27
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA, 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
29/09/2023

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 27/03/2024

31411.676.20230929.N.292.539





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/10/2023 15:54:10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo L5DxjHIEHXf00009.SFP é:

1c5f34d2-4128-4f6b-9ee3-ace7e322337b

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO LTDA:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 09/2023

NRA: L5DxjHIEHXf00009

Base de Processamento: Queimadas / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	09/2023	Número do Recibo	0000050000168693323
Data/Hora da Transmissão	10/10/2023 10:05:26	Identificação da Apuração de Débitos	21794858137 / eSocial 57831817 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	59,82	59,82	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	10.044,95	2.369,45	7.675,50

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
Nome	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	21794858137 / eSocial 57831817 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 568,42	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.465,52	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 395,33	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 50,16	R\$ 50,16
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.479,43	R\$ 50,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF	997.255.335-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/10/2023 10:05:26
Nº do recibo de entrega	0000050000168693323
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	552.207.625-91

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	09/2023	Número do Recibo	0000050000168693323
Data/Hora da Transmissão	10/10/2023 10:05:26	Identificação da Apuração de Débitos	21794858137 / eSocial 57831817 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2023	568,42	568,42	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	1.363,28	1.363,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	102,24	102,24	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	170,41	170,41	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	13,63	13,63	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	68,16	68,16	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	102,24	102,24	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	40,89	40,89	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS	09/2023	50,16	0,00	50,16

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	09/2023	Número do Recibo	50000168693323
Data/Hora da Transmissão	10/10/2023 10:05:26	Identificação da Apuração de Débitos	21794858137 / eSocial 57831817 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000164036514
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	Queimadas	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	568,42		
Deduções	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 508,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	1.363,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.363,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	102,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 102,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	170,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 170,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	13,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	68,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	102,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 102,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	40,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	50,16		
Saldo a Pagar	50,16		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	09/2023	Número do Recibo	0000050000168693323
Data/Hora da Transmissão	10/10/2023 10:05:26	Identificação da Apuração de Débitos	21794858137 / eSocial 57831817 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 59,82 - Valor Utilizado: 59,82 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	
				Valor Utilizado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		09/2023	568,42	59,82	59,82

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 10.044,95 - Valor Utilizado: 2.369,45 = Saldo Disponível: 7.675,50)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	
				Valor Utilizado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		09/2023	568,42	508,60	508,60
113401 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		09/2023	1.363,28	1.363,28	1.363,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		09/2023	170,41	170,41	170,41
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		09/2023	13,63	13,63	13,63
118101 - CP TERCEIROS - SENAI		09/2023	68,16	68,16	68,16
118401 - CP TERCEIROS - SESI		09/2023	102,24	102,24	102,24
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		09/2023	40,89	40,89	40,89
164401 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		09/2023	102,24	102,24	102,24

Código	Nome	Cargo	Nome	Vin	Cat	Fpg	H.mes	Admissão	ST	Data	ST
Trabalhando											
7	ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	715437	ENCARREGADO DE OBRAS	1	1	D	220,00	01/02/2019	1	31/12/2021	
15	DENIS MARIO DA SILVA BORGES	65	PEDREIRO	1	1	D	220,00	03/02/2021	1	01/10/2022	

Total situação: 2

Demitido											
16	ANTONIO MARCOS DE JESUS MOREIRA	65	PEDREIRO	1	1	D	220,00	03/05/2021	8	01/03/2022	
6	CASSIANO DOS SANTOS JUNIOR	65	PEDREIRO	1	1	D	220,00	01/02/2019	8	27/04/2019	
14	CENILDO ARAÚJO SANTOS	65	PEDREIRO	1	1	D	220,00	01/12/2019	8	28/08/2020	
5	JACSON SILVA DAS VIRGENS	140	SERVENTE COMUM	1	1	D	220,00	01/08/2018	8	01/05/2019	
3	JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE JESÚS MOREIRA	96	SERVENTE DE PEDREIRO	1	1	D	220,00	04/06/2018	8	14/05/2019	
1	JOSIAS NASCIMENTO ARAUJO	45	VIDRACEIRO	1	1	D	220,00	05/06/2018	8	07/09/2019	
11	NAIELE SANTOS SILVA	715434	AUXILIAR ADMINISTRATI	1	1	D	220,00	01/10/2019	8	30/12/2019	
12	ROSINETE ROSA DE SOUZA	715434	AUXILIAR ADMINISTRATI	1	1	D	220,00	01/10/2019	8	01/04/2021	
4	SILVIO ROBERTO MACEDO NASCIMENTO	715133	OPERADOR DE BETONEIRA	1	1	D	220,00	04/06/2018	8	06/07/2018	
17	TIAGO SANTANA PINHO CARNEIRO	715436	PINTOR	1	1	D	220,00	01/09/2021	8	01/03/2022	
8	UERICO GOES DOS SANTOS	65	PEDREIRO	1	1	D	220,00	01/03/2019	8	03/09/2020	
2	VIVALDO LOPES SANTANA	96	SERVENTE DE PEDREIRO	1	1	D	220,00	04/06/2018	8	06/09/2018	

Total situação: 12

Férias											
13	SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS	715435	TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	1	D	220,00	01/10/2019	9	01/11/2023	

Total situação: 1

Total de empregados: 15

Cat: CATEGORIA

Vin: VINCULO EMPREGATÍCIO

Fpg: FORMA DE PAGAMENTO

MT : MOTIVO

ST : SITUAÇÃO

1 - Trabalhando	12 - Novo afast. mesma doença
2 - Afastado Direitos Integrais	13 - Exercício de mandato sindical
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias	14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
4 - Servico Militar	15 - Aposent. por invalid. doença profissional
5 - Licenca maternidade	16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional
6 - Doença periodo superior a 15 dias	17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento	18 - Doença periodo igual ou inferior a 15 dias
8 - Demitido	19 - Aborto nao criminoso
9 - Ferias	20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho	21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
11 - Prorrogação licença maternidade	22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
	23 - Transferido
	24 - Outros motivos de afastamento



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
19.650.110/0001-27

Razão Social
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período de Apuração
01/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23283.0240556-9

Pagar este documento até

10/10/2023

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

50,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	50,16			50,16
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	50,16			50,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 50160385232 7 83071623283 1 02405569104 5



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.23283.0240556-9
Pagar até: 10/10/2023
Valor: 50,16

Pague com o PIX



Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor

R\$ 50,16

Data

10/10/2023

18:32:12



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Razão Social

MINISTERIO DA ECONOMIA

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do devedor

Nome

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

19.650.110/0001-27

Dados do pagador

Nome

FABIO DA SILVA OLIVEIRA

CPF

CNPJ
19.650.110/0001-27

Razão Social
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23268.1365056-2

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000164036514

Valor Total do Documento

2.419,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	50,16			50,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	508,60			508,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.363,28			1.363,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	170,41			170,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	13,63			13,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	68,16			68,16
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	102,24			102,24
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	40,89			40,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	102,24			102,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	2.419,61			2.419,61

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

25/09/2023 09:54:30

85800000024 0 19610385232 9 93071623268 4 13650562037 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 19610385232 9 93071623268 4 13650562037 2



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.23268.1365056-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 2.419,61

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA.

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: L5DX:HLEHXf0000-9
 COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: MIBYe7bq7010000-6 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 UF: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	577,60	0,00	0,00	0,00	577,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.363,28	0,00	0,00	0,00	1.363,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	204,49	0,00	0,00	0,00	204,49
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos & Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMNTC COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.085,55	0,00	0,00	0,00	2.085,55
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.085,55	0,00	0,00	0,00	2.085,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS AITS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000050 453101802311 007681180819 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: L5DxjH1EHXf0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023 N° CONTROLE: MIbYe7bq7010000-6

TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: Lw9Cqp1HCCY0000-8
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	545,31
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	577,60	DEPÓSITO	545,31
VAL DEVIDO PREV SOC	2.085,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000050 453101802311 007681180819 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: L5DxjH1EHXf0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023 N° CONTROLE: MIbYe7bq7010000-6

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	577,60	DEPÓSITO	545,31
VAL DEVIDO PREV SOC	2.085,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	545,31

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 18/10/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:52:21

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	6.816,40
DEPÓSITO	545,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	545,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO COECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000050 453101802311 007681180819 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON ARAUJO DOS SANTCS			128.02888.07-4		01/02/2019		01		07102
3.049,82	0,00		0,00	274,97				243,99	0,00
DENIS MARIO DA SILVA BORGES			203.63232.16-2		03/02/2021		01		07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48				178,36	0,00
SAIONARE DE OLIVEIRA SANTCS			134.10368.42-5		01/10/2019		01		03516
1.537,00	0,00		0,00	120,15				122,96	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.816,40 0,00 0,00 577,60 545,31 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/10/2023
HORA: 15:52:21
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000050 453101802311 007681180819 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Lw9Cqp1HCCY0000-8

N° ARQUIVO: L5DxjHlEHXf0000-9
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.816,40	0,00	6.816,40	0,00
TOTAIS:	3	6.816,40	0,00	6.816,40	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: L5DxjH1EHXf0000-9
 COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Lw9Cqp1HCCY0000-8 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRC: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFCNE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.085.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	577.60
SALÁRIO FAMÍLIA:	59.82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	20 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/10/2023
HORA: 15:52:21
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000050 453101802311 007681180819 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: MibYe7bq7010000-6 N° ARQUIVO: L5DxjH1EHXf0000-9
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.816,40	0,00	6.816,40	0,00
TOTAIS:	3	6.816,40	0,00	6.816,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/10/2023
HORA: 15:52:21
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000050 453101802311 007681180819 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº DE CONTROLE: MIBYe7bq7010000-6	Nº ARQUIVO: L5DxjH1EHXf0000-9
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA:	RAT: 3.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25	BAIRRO: CONTORNO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000	CNAE PREPONDERANTE: 4120400	CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	6.816,40
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
545,31	0,00	0,00	0,00	545,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: MibYe7bq7010000-6 N° ARQUIVO: L5DxjH1EHXf0000-9
 COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRC: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: EA CEP: 48860-000 TELEFCNE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.085.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	577.60
SALÁRIO FAMÍLIA:	59.82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/10/2023 HORA: 15:52:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2023

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 2.085,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.085,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000207

855502702107

019650110006

012720230997

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/10/2023 HORA: 15:52:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2023

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 2.085,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.085,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000207

855502702107

019650110006

012720230997



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 18/10/2023
HORA: 15:52:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			19.650.110/0001-27			2100	507		
577,60	1.567,77	0,00	59,82	0,00	0,00	2.085,55	0,00		
