



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 49.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 34 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 27 Data do Sub-Empenho: 17/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25	Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO	Cidade:
CNPJ: 19.850.110/0001-27	Insc. Estadual:
CPF:	RG:
Conta Corrente: 39975113-4	Agência: 0001
	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Estado:	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	
Rede zido: 1007.4451.1754 - CRÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 17/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 255-2022	6.965.000,00	226.718,33	6.738.281,67
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO 008-2022RDC, OBRA 047/2022, MEDIÇÃO Nº10, PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024, NFS-e Nº202324	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	226.718,33	226.718,33	0,00

Data do Empenho: 17/01/2024 Data do Liquidação: 17/01/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	14.963,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.720,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	6.801,55
## Duzentos e dois mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos ##		24.485,57
		<b>Valor Retido</b>
		<b>Valor Liquidado</b>
		<b>202.232,76</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/01/2024	20241	U			226.718,33

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	226.718,33

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/01/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/01/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22</p>
---	---

3412676



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 34 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 27	Data do Sub-Empenho: 17/01/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R ALTO DA CHACRINHA, 25		Complemento: CASA
Bairro:	CONTORNO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	19.650.110/0001-27	Insc. Estadual:	RG:
Conta Corrente:	39975113-4	Agência: 0001	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.


<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
Reduzido:	1007.4451.1754	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 17/01/2024
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função:	15 - Urbanismo		
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana		
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes		
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.:	008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	255-2022	6.965.000,00	226.718,33	6.738.281,67
Patrimônio:	-					

<b>HISTÓRICO</b>		<b>Movimentação Empenho</b>		
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO À PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		226.718,33	226.718,33	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	226.718,33	226.718,33

## Duzentos e vinte e seis mil e setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos ## 226.718,33

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/01/2024.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/01/2024
 <hr/> <b>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR</b> Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 <hr/> <b>WALDSON LOPES DE GÓES FILHO</b> Contador(a) CPF: 024.127.355-22



PREFEITURA DE  
**QUEIMADAS**  
FLOR PRIMEIRA DO SISAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:  
**20241**  
Data da Competência:  
**Janeiro/2024**  
Data e Hora da Emissão:  
**12/01/2024 10:23:00**  
Código Verificação:  
**F582E3026**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:  
**19.650.110/0001-27**  
Inscrição Municipal:  
**154100189**  
Telefone:  
**753644155...**  
Inscrição Estadual:  
  
Nome/Razão Social:  
**ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
Nome Fantasia:  
**\*\*\*\*\***  
Endereço:  
**RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA**  
E-mail:  
**ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM**



## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:  
**13807870000119**  
Inscrição Municipal:  
  
Telefone:  
  
Inscrição Estadual:  
  
Nome/Razão Social:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**  
Endereço:  
**AV GETULIO VARGAS Nº SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000**  
E-mail:  
**secretariafinancas2021@outlook.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 255/2022, SENDO 60% SERVIÇOS ( R\$ 136.031,00 ) E 40% MATERIAIS ( R\$ 90.687,33 ) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº215/2022 NUMERO DA OBRA 047/2022 PERÍODO 01/01/2024 A 12/01/2024 BM 10

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
EM 15/01/2024 Tony Felício Assinatura

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 226.718,33**

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG

	VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
	R\$ 226.718,33	R\$ 90.687,33	R\$ 0,00	R\$ 136.031,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 6.801,55	R\$ 0,00
	VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.963,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.953,37	

## DADOS COMPLEMENTARES

## OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	-------------------

### Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 365222	CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli		INSCRIÇÃO: 20260	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua Alto da Chacrinha				NÚMERO: 25
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 19.050.110/0001-27	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 2.720,62	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.720,62	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.720,62
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 18/01/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/01/2024 11:15:58	DATA VENCIMENTO: 31/01/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(-) VALOR DEVIDO - R\$		2.720,62
Valor do tributo: 2.720,62	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.720,62	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 2.720,62	Vlr. Devido com Desconto: 2.720,62	(+ ) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES:		(+ ) JUROS DE MORA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) VALOR A PAGAR - R\$		2.720,62
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;				
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;				
4) NF-e Nº 20241 - Data de emissão: 12/01/2024.				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000027 . 2    20623906202 . 2    40131010100 . 1    00036522207 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000027 . 2    20623906202 . 2    40131010100 . 1    00036522207 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 365222	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/01/2024 11:15:58	DATA VENCIMENTO: 31/01/2024
INSCRIÇÃO: 20260			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.720,62
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.720,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 365221		CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Alto da Chacrinha					NÚMERO: 25	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 19.650.110/0001-27			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 136.031,00	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.801,55	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.801,55		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/01/2024	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 18/01/2024 11:12:26	DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 20241 - DATA DE EMISSÃO: 12/01/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.801,55		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.801,55		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000068 . 6    01553906202 . 4    40131010500 . 2    00036522112 . 6

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000068 . 6    01553906202 . 4    40131010500 . 2    00036522112 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 365221	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 18/01/2024 11:12:26	DATA VENCIMENTO: 31/01/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.801,55
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.801,55



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 End.: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 19.650.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022  
 P. ADM: 215/2022  
 N DA OBRA: 047/2022



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022  
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO  
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba

B.D.I.  
 23,54%

PERÍODO: 01/01/2024 A 12/01/2024

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		%
						Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
<b>1</b>	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94		R\$ -	6,00	R\$ 2.498,94	0,00	R\$ -	100%
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40		R\$ -	320,00	R\$ 27.654,40	0,00	R\$ -	100%
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76		R\$ -	1,00	R\$ 1.398,76	0,00	R\$ -	100%
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31		R\$ -	1,00	R\$ 1.096,31	0,00	R\$ -	100%
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66	1,00	R\$ 809,66	1,00	R\$ 809,66	0,00	R\$ -	100%
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58	2,52	R\$ 2.895,58	2,52	R\$ 2.895,58	0,00	R\$ -	100%
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40		R\$ -	20,00	R\$ 26.245,40	0,00	R\$ -	100%
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42		R\$ -	891,68	R\$ 6.063,42	0,00	R\$ -	100%
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575,00	R\$ 0,23	R\$ 362,25		R\$ -	1575,00	R\$ 362,25	0,00	R\$ -	100%
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS</b>							0,00				
<b>2.1</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>							0,00				
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95		R\$ -	713,77	R\$ 75.002,95	0,00	R\$ -	100%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14		R\$ -	174,70	R\$ 15.639,14	0,00	R\$ -	100%
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98		R\$ -	93,47	R\$ 758,98	0,00	R\$ -	100%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09		R\$ -	129,38	R\$ 5.386,09	0,00	R\$ -	100%
<b>2.2</b>	<b>MURETA E ABRIGO GÁS</b>							0,00				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67		R\$ -	15,68	R\$ 1.403,67	0,00	R\$ -	100%
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62		R\$ -	13,87	R\$ 112,62	0,00	R\$ -	100%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41		R\$ -	11,42	R\$ 475,41	0,00	R\$ -	100%
<b>2.3</b>	<b>CASTELO D'ÁGUA</b>							0,00				
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75		R\$ -	0,00	R\$ -	3,65	R\$ 326,75	0%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30		R\$ -	0,00	R\$ -	4,84	R\$ 39,30	0%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20		R\$ -	0,00	R\$ -	1,23	R\$ 51,20	0%
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>							0,00				
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS - SAPATAS</b>							0,00				
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68		R\$ -	46,65	R\$ 1.594,68	0,00	R\$ -	100%
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAMENTOS, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66		R\$ -	131,71	R\$ 22.145,66	0,00	R\$ -	100%

Tony Faik Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 062.000.077,8

3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	317,20	R\$ 19,21	R\$ 6.092,94	R\$ -	317,20	R\$ 6.092,94	0,00	R\$ -	100%
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	41,25	R\$ 18,03	R\$ 743,85	R\$ -	41,25	R\$ 743,85	0,00	R\$ -	100%
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	366,94	R\$ 16,11	R\$ 5.911,14	R\$ -	366,94	R\$ 5.911,14	0,00	R\$ -	100%
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12.5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	225,00	R\$ 13,58	R\$ 3.055,77	R\$ -	225,00	R\$ 3.055,77	0,00	R\$ -	100%
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 5.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	134,38	R\$ 20,38	R\$ 2.738,12	R\$ -	134,38	R\$ 2.738,12	0,00	R\$ -	100%
3.1.9	CONCRETO BOMBEADO FCK=25 MPA: INCLUIDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,55	R\$ 680,42	R\$ 10.580,53	R\$ -	15,55	R\$ 10.580,53	0,00	R\$ -	100%
3.2	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>						0,00				
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	60,44	R\$ 33,31	R\$ 2.013,26	R\$ -	60,44	R\$ 2.013,26	0,00	R\$ -	100%
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	55,45	R\$ 735,61	R\$ 40.789,57	R\$ -	55,45	R\$ 40.789,57	0,00	R\$ -	100%
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55	R\$ 90,76	R\$ 31.725,16	R\$ -	349,55	R\$ 31.725,16	0,00	R\$ -	100%
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,10	R\$ 17,62	R\$ 11.630,96	R\$ -	660,10	R\$ 11.630,96	0,00	R\$ -	100%
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,60	R\$ 15,65	R\$ 1.777,84	R\$ -	113,60	R\$ 1.777,84	0,00	R\$ -	100%
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,41	R\$ 13,11	R\$ 346,24	R\$ -	26,41	R\$ 346,24	0,00	R\$ -	100%
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,91	R\$ 20,55	R\$ 7.334,50	R\$ -	356,91	R\$ 7.334,50	0,00	R\$ -	100%
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	24,18	R\$ 636,71	R\$ 15.395,65	R\$ -	24,18	R\$ 15.395,65	0,00	R\$ -	100%
3.3	<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>						0,00				
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	R\$ 81,63	R\$ 2.857,05	R\$ -	0,00	R\$ -	35,00	R\$ 2.857,05	0%
3.3.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,38	R\$ 111,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 111,90	0%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 33,31	R\$ 161,22	R\$ -	0,00	R\$ -	4,84	R\$ 161,22	0%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,40	R\$ 105,02	R\$ 462,09	R\$ -	0,00	R\$ -	4,40	R\$ 462,09	0%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 15,65	R\$ 1.824,95	R\$ -	0,00	R\$ -	116,61	R\$ 1.824,95	0%
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 13,11	R\$ 1.098,36	R\$ -	0,00	R\$ -	83,78	R\$ 1.098,36	0%
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	R\$ 13,30	R\$ 184,47	R\$ -	0,00	R\$ -	13,87	R\$ 184,47	0%
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	R\$ 20,55	R\$ 268,79	R\$ -	0,00	R\$ -	13,08	R\$ 268,79	0%
3.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	2,42	R\$ 645,38	R\$ 1.561,82	R\$ -	0,00	R\$ -	2,42	R\$ 1.561,82	0%
3.4	<b>ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>						0,00				

Tony Felix Almeida  
Engenheiro  
CPEA-BA-052.000.000-77.8

3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	R\$ 144,77	R\$ 2.533,48		R\$ -	17,50	R\$ 2.533,48	0,00	R\$ -	100%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 33,31	R\$ 41,64		R\$ -	1,25	R\$ 41,64	0,00	R\$ -	100%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	R\$ 105,02	R\$ 525,10		R\$ -	5,00	R\$ 525,10	0,00	R\$ -	100%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 20,55	R\$ 209,40		R\$ -	10,19	R\$ 209,40	0,00	R\$ -	100%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	0,63	R\$ 645,38	R\$ 406,59		R\$ -	0,63	R\$ 406,59	0,00	R\$ -	100%
3.5	<b>MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME</b>							0,00				
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 33,31	R\$ 403,72		R\$ -	12,12	R\$ 403,72	0,00	R\$ -	100%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	R\$ 735,61	R\$ 831,24		R\$ -	1,13	R\$ 831,24	0,00	R\$ -	100%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	R\$ 90,76	R\$ 4.036,10		R\$ -	44,47	R\$ 4.036,10	0,00	R\$ -	100%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,20	R\$ 17,62	R\$ 1.483,60		R\$ -	84,20	R\$ 1.483,60	0,00	R\$ -	100%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,64	R\$ 645,38	R\$ 2.349,18		R\$ -	3,64	R\$ 2.349,18	0,00	R\$ -	100%
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>							0,00				
4.1	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>							0,00				
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 63,75	R\$ 21.250,43		R\$ -	333,34	R\$ 21.250,43	0,00	R\$ -	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 16,41	R\$ 13.773,41		R\$ -	839,33	R\$ 13.773,41	0,00	R\$ -	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 13,66	R\$ 4.273,94	0,08	R\$ 1,09	312,88	R\$ 4.273,94	0,00	R\$ -	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 22,34	R\$ 10.057,91		R\$ -	450,22	R\$ 10.057,91	0,00	R\$ -	100%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 604,92	R\$ 11.039,79		R\$ -	18,25	R\$ 11.039,79	0,00	R\$ -	100%
4.2	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>							0,00				
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	344,10	R\$ 98,83	R\$ 34.007,40		R\$ -	344,10	R\$ 34.007,40	0,00	R\$ -	100%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 18,65	R\$ 12.605,72		R\$ -	675,91	R\$ 12.605,72	0,00	R\$ -	100%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	R\$ 16,41	R\$ 158,19		R\$ -	9,64	R\$ 158,19	0,00	R\$ -	100%

  
 Tony Felix Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 022.039.077.8

4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 13,66	R\$ 4.990,13		R\$ -	365,31	R\$ 4.990,13	0,00	R\$ -	100%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	R\$ 584,99	R\$ 14.361,50		R\$ -	24,55	R\$ 14.361,50	0,00	R\$ -	100%
4.3	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>							0,00				
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	124,12	R\$ 73,23	R\$ 9.089,31		R\$ -	124,12	R\$ 9.089,31	0,00	R\$ -	100%
4.4	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>							0,00				
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	R\$ 63,75	R\$ 1.147,50		R\$ -	18,00	R\$ 1.147,50	0,00	R\$ -	100%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	R\$ 18,65	R\$ 254,76		R\$ -	13,66	R\$ 254,76	0,00	R\$ -	100%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 22,34	R\$ 981,17		R\$ -	43,92	R\$ 981,17	0,00	R\$ -	100%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	R\$ 604,92	R\$ 459,74		R\$ -	0,76	R\$ 459,74	0,00	R\$ -	100%
4.5	<b>CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE</b>							0,00				
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 63,75	R\$ 1.226,55	19,24	R\$ 1.226,55	19,24	R\$ 1.226,55	0,00	R\$ -	100%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 20,40	R\$ 311,30	15,26	R\$ 311,30	15,26	R\$ 311,30	0,00	R\$ -	100%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 18,65	R\$ 362,74	19,45	R\$ 362,74	19,45	R\$ 362,74	0,00	R\$ -	100%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 16,41	R\$ 459,64	28,01	R\$ 459,64	28,01	R\$ 459,64	0,00	R\$ -	100%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 22,34	R\$ 381,12	17,06	R\$ 381,12	17,06	R\$ 381,12	0,00	R\$ -	100%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$ 604,92	R\$ 744,05	1,23	R\$ 744,05	1,23	R\$ 744,05	0,00	R\$ -	100%
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>							0,00				
5.1	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>							0,00				
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$ 145,28	R\$ 886,21		R\$ -	6,10	R\$ 886,21	0,00	R\$ -	100%
5.1.2	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>							0,00				
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 58,12	R\$ 33.289,39		R\$ -	572,77	R\$ 33.289,39	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.000.077.8

5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$ 94,87	R\$ 15.210,51		R\$ -	160,33	R\$ 15.210,51	0,00	R\$ -	100%
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,91	R\$ 78,32	R\$ 38.917,99		R\$ -	496,91	R\$ 38.917,99	0,00	R\$ -	100%
5.1.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$ 102,11	R\$ 992,51	2,72	R\$ 277,74	9,72	R\$ 992,51	0,00	R\$ -	100%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENHO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$ 29,16	R\$ 9.092,09		R\$ -	311,80	R\$ 9.092,09	0,00	R\$ -	100%
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$ 471,07	R\$ 3.796,82		R\$ -	0,00	R\$ -	8,06	R\$ 3.796,82	0%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$ 195,51	R\$ 703,84		R\$ -	0,00	R\$ -	3,60	R\$ 703,84	0%
5.3	<b>ALVENARIA DA MURETA</b>							0,00				
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$ 78,32	R\$ 4.930,24		R\$ -	62,95	R\$ 4.930,24	0,00	R\$ -	100%
6	<b>ESQUADRIAS</b>							0,00				
6.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>							0,00				
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.091,40	R\$ 6.548,40		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 6.548,40	0%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 2.019,92	R\$ 6.059,76		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 6.059,76	0%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.139,29	R\$ 6.835,74	6,00	R\$ 6.835,74	6,00	R\$ 6.835,74	0,00	R\$ -	100%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.139,29	R\$ 9.114,32	8,00	R\$ 9.114,32	8,00	R\$ 9.114,32	0,00	R\$ -	100%
6.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$ 847,60	R\$ 2.034,24		R\$ -	0,00	R\$ -	2,40	R\$ 2.034,24	0%
6.2	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>							0,00				
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 332,16	R\$ 2.657,28		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 2.657,28	0%
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 57,82	R\$ 231,28		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 231,28	0%
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	R\$ 147,23	R\$ 1.884,54		R\$ -	0,00	R\$ -	12,80	R\$ 1.884,54	0%
6.3	<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>							0,00				
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	2,10	R\$ 528,40	R\$ 1.109,64		R\$ -	0,00	R\$ -	2,10	R\$ 1.109,64	0%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,68	R\$ 528,40	R\$ 887,71		R\$ -	0,00	R\$ -	1,68	R\$ 887,71	0%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	3,36	R\$ 528,40	R\$ 1.775,42		R\$ -	0,00	R\$ -	3,36	R\$ 1.775,42	0%

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 032.033.077.8

6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$ 493,20	R\$ 41.172,34	R\$ -	0,00	R\$ -	83,48	R\$ 41.172,34	0%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 638,33	R\$ 1.302,19	R\$ -	0,00	R\$ -	2,04	R\$ 1.302,19	0%
6.4	<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>						0,00				
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	R\$ 1.648,75	R\$ 1.648,75	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.648,75	0%
6.5	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>						0,00				
6.5.1	JA - 01, 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$ 834,69	R\$ 734,53	R\$ -	0,00	R\$ -	0,88	R\$ 734,53	0%
6.5.2	JA - 02, 1,10M X1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	R\$ 834,69	R\$ 1.794,58	R\$ -	0,00	R\$ -	2,15	R\$ 1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03, 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	R\$ 478,30	R\$ 770,06	R\$ -	0,00	R\$ -	1,61	R\$ 770,06	0%
6.5.4	JA - 04, 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	R\$ 834,69	R\$ 2.278,70	R\$ -	0,00	R\$ -	2,73	R\$ 2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05, 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 478,30	R\$ 1.033,13	R\$ -	0,00	R\$ -	2,16	R\$ 1.033,13	0%
6.5.6	JA - 06, 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.7	JA - 07, 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	R\$ 470,18	R\$ 5.924,27	R\$ -	0,00	R\$ -	12,60	R\$ 5.924,27	0%
6.5.8	JA - 08, 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	R\$ 470,18	R\$ 3.949,51	R\$ -	0,00	R\$ -	8,40	R\$ 3.949,51	0%
6.5.9	JA - 09, 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	R\$ 470,18	R\$ 2.962,13	R\$ -	0,00	R\$ -	6,30	R\$ 2.962,13	0%
6.5.10	JA - 10, 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.11	JA - 11, 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	R\$ 470,18	R\$ 2.468,45	R\$ -	0,00	R\$ -	5,25	R\$ 2.468,45	0%
6.5.12	JA - 12, 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20	R\$ 470,18	R\$ 1.974,76	R\$ -	0,00	R\$ -	4,20	R\$ 1.974,76	0%
6.5.13	JA - 13, 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80	R\$ 470,18	R\$ 7.899,02	R\$ -	0,00	R\$ -	16,80	R\$ 7.899,02	0%
6.5.14	JA - 14, 1,60MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,72	R\$ 478,30	R\$ 1.300,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,72	R\$ 1.300,98	0%

Tony Felfel Andrade  
Engenheiro  
CREA-BA: 05201/1077.8

6.5.15	Tela de nylon para proteção-fixada na esquadria	m²	10,28	R\$ 33,05	R\$ 339,75		R\$ -	0,00	R\$ -	10,28	R\$ 339,75	0%
<b>6.6</b>	<b>VIDROS</b>							0,00				
6.6.1	JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,33	R\$ 225,10	R\$ 3.000,58		R\$ -	0,00	R\$ -	13,33	R\$ 3.000,58	0%
6.6.2	BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,20	R\$ 350,96	R\$ 2.526,91		R\$ -	0,00	R\$ -	7,20	R\$ 2.526,91	0%
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,50	R\$ 706,17	R\$ 5.296,28		R\$ -	0,00	R\$ -	7,50	R\$ 5.296,28	0%
6.6.4	INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P"FACHADA"	m²	68,22	R\$ 433,72	R\$ 29.588,38		R\$ -	0,00	R\$ -	68,22	R\$ 29.588,38	0%
<b>6.7</b>	<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>							0,00				
6.7.1	GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA	m²	95,08	R\$ 346,12	R\$ 32.909,09		R\$ -	0,00	R\$ -	95,08	R\$ 32.909,09	0%
6.7.2	Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m²	6,72	R\$ 346,12	R\$ 2.325,93		R\$ -	0,00	R\$ -	6,72	R\$ 2.325,93	0%
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>							0,00				
7.1.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lantermin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	881,21	R\$ 223,07	R\$ 196.571,51	72,34	R\$ 16.136,88	781,03	R\$ 174.224,36	100,18	R\$ 22.347,15	89%
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	850,66	R\$ 261,07	R\$ 222.081,81	438,12	R\$ 114.379,99	728,12	R\$ 190.090,29	122,54	R\$ 31.991,52	86%
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,15	R\$ 105,47	R\$ 7.293,25		R\$ -	69,15	R\$ 7.293,25	0,00	R\$ -	100%
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,60	R\$ 61,43	R\$ 5.749,85		R\$ -	0,00	R\$ -	93,60	R\$ 5.749,85	0%
7.1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,70	R\$ 61,43	R\$ 2.807,35		R\$ -	0,00	R\$ -	45,70	R\$ 2.807,35	0%
7.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,60	R\$ 61,43	R\$ 7.777,04	126,00	R\$ 7.740,18	126,00	R\$ 7.740,18	0,60	R\$ 36,86	100%
7.1.7	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,60	R\$ 46,68	R\$ 10.904,45		R\$ -	233,60	R\$ 10.904,45	0,00	R\$ -	100%
7.1.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem	m²	25,96	R\$ 493,50	R\$ 12.811,26		R\$ -	0,00	R\$ -	25,96	R\$ 12.811,26	0%
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							0,00				
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	m²	394,06	R\$ 14,65	R\$ 5.772,98		R\$ -	394,06	R\$ 5.772,98	0,00	R\$ -	100%
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	125,46	R\$ 55,81	R\$ 7.001,92	125,46	R\$ 7.001,92	125,46	R\$ 7.001,92	0,00	R\$ -	100%
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>							0,00				
<b>9.1</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>							0,00				
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2569,60	R\$ 5,23	R\$ 13.439,01		R\$ -	2569,60	R\$ 13.439,01	0,00	R\$ -	100%
9.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1589,78	R\$ 37,28	R\$ 59.267,00		R\$ -	1589,78	R\$ 59.267,00	0,00	R\$ -	100%
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	979,82	R\$ 44,69	R\$ 43.788,16		R\$ -	979,82	R\$ 43.788,16	0,00	R\$ -	100%

Tony F. Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.000/377.8

9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$ 25,48	R\$ 26.111,14		R\$ -	1024,77	R\$ 26.111,14	0,00	R\$ -	100%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	376,80	R\$ 66,26	R\$ 24.966,77	30,80	R\$ 2.040,81	376,80	R\$ 24.966,77	0,00	R\$ -	100%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	176,57	R\$ 58,34	R\$ 10.301,09		R\$ -	0,00	R\$ -	176,57	R\$ 10.301,09	0%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	33,90	R\$ 58,34	R\$ 1.977,73		R\$ -	0,00	R\$ -	33,90	R\$ 1.977,73	0%
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$ 21,40	R\$ 2.722,08		R\$ -	0,00	R\$ -	127,20	R\$ 2.722,08	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	697,80	R\$ 56,16	R\$ 39.188,45		R\$ -	0,00	R\$ -	697,80	R\$ 39.188,45	0%
<b>9.2</b>	<b>MURETA</b>							0,00				
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 5,23	R\$ 512,80		R\$ -	98,05	R\$ 512,80	0,00	R\$ -	100%
9.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 37,28	R\$ 3.655,30		R\$ -	98,05	R\$ 3.655,30	0,00	R\$ -	100%
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>							0,00				
<b>10.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>							0,00				
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	R\$ 43,59	R\$ 17.801,28		R\$ -	204,38	R\$ 8.908,92	204,00	R\$ 8.892,36	50%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	R\$ 34,15	R\$ 4.444,96		R\$ -	56,80	R\$ 1.939,72	73,36	R\$ 2.505,24	44%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	375,34	R\$ 40,27	R\$ 15.114,94		R\$ -	56,80	R\$ 2.287,34	318,54	R\$ 12.827,61	15%
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$ 61,18	R\$ 2.289,36		R\$ -	0,00	R\$ -	37,42	R\$ 2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$ 50,09	R\$ 7.460,91		R\$ -	0,00	R\$ -	148,95	R\$ 7.460,91	0%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,90	R\$ 88,67	R\$ 3.803,94		R\$ -	0,00	R\$ -	42,90	R\$ 3.803,94	0%
10.1.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	R\$ 16,14	R\$ 1.097,52		R\$ -	0,00	R\$ -	68,00	R\$ 1.097,52	0%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	R\$ 65,45	R\$ 3.498,30	53,45	R\$ 3.498,30	53,45	R\$ 3.498,30	0,00	R\$ -	100%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	R\$ 94,54	R\$ 165,45	1,75	R\$ 165,45	1,75	R\$ 165,45	0,00	R\$ -	100%
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>							0,00				
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	R\$ 138,78	R\$ 35.361,14		R\$ -	0,00	R\$ -	254,80	R\$ 35.361,14	0%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,38	R\$ 455,75	R\$ 7.920,94		R\$ -	0,00	R\$ -	17,38	R\$ 7.920,94	0%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	27,74	R\$ 71,35	R\$ 1.979,25		R\$ -	0,00	R\$ -	27,74	R\$ 1.979,25	0%

Tony F. *Ar.*  
Encar.  
CREA DA *Ar.* 7.8



10.2.4	DIRECIONAL -PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,50	R\$ 120,42	R\$ 903,15		R\$ -	0,00	R\$ -	7,50	R\$ 903,15	0%
10.2.5	ALERTA - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	R\$ 120,42	R\$ 587,65		R\$ -	0,00	R\$ -	4,88	R\$ 587,65	0%
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP)	m²	21,96	R\$ 10,67	R\$ 234,31		R\$ -	0,00	R\$ -	21,96	R\$ 234,31	0%
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	R\$ 13,15	R\$ 4.534,25		R\$ -	0,00	R\$ -	344,81	R\$ 4.534,25	0%
10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,06	R\$ 35,61	R\$ 287,02		R\$ -	0,00	R\$ -	8,06	R\$ 287,02	0%
<b>11</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>											
<b>11.1</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>							0,00				
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2004,59	R\$ 20,91	R\$ 41.915,98	500,00	R\$ 10.455,00	500,00	R\$ 10.455,00	1504,59	R\$ 31.460,98	25%
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1902,96	R\$ 15,46	R\$ 29.419,76		R\$ -	0,00	R\$ -	1902,96	R\$ 29.419,76	0%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	442,55	R\$ 14,66	R\$ 6.487,78	440,00	R\$ 6.450,40	440,00	R\$ 6.450,40	2,55	R\$ 37,38	99%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	R\$ 14,73	R\$ 6.518,76		R\$ -	0,00	R\$ -	442,55	R\$ 6.518,76	0%
11.1.5	PINTURA ESMALTÊ ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$ 31,05	R\$ 3.838,09		R\$ -	0,00	R\$ -	123,61	R\$ 3.838,09	0%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTÊ SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	R\$ 26,77	R\$ 11.276,33		R\$ -	0,00	R\$ -	421,23	R\$ 11.276,33	0%
11.1.8	PINTURA ESMALTÊ FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$ 30,95	R\$ 393,68		R\$ -	0,00	R\$ -	12,72	R\$ 393,68	0%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTÊ SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92		R\$ -	0,00	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
11.1.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$ 54,20	R\$ 5.508,35		R\$ -	0,00	R\$ -	101,63	R\$ 5.508,35	0%
11.1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTÊ SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92		R\$ -	0,00	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
<b>11.2</b>	<b>MURETA</b>							0,00				
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,05	R\$ 20,91	R\$ 2.050,23		R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 2.050,23	0%
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 15,46	R\$ 1.515,85		R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 1.515,85	0%
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>							0,00				
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>							0,00				
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,60	R\$ 9,10	R\$ 251,16		R\$ -	27,60	R\$ 251,16	0,00	R\$ -	100%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,90	R\$ 5,76	R\$ 961,34		R\$ -	166,90	R\$ 961,34	0,00	R\$ -	100%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,05	R\$ 20,07	R\$ 1.626,67		R\$ -	81,05	R\$ 1.626,67	0,00	R\$ -	100%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 33,05	R\$ 363,55	11,00	R\$ 363,55	11,00	R\$ 363,55	0,00	R\$ -	100%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	134,60	R\$ 54,57	R\$ 7.345,12		R\$ -	0,00	R\$ -	134,60	R\$ 7.345,12	0%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,55	R\$ 67,89	R\$ 3.703,40		R\$ -	0,00	R\$ -	54,55	R\$ 3.703,40	0%
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 38,30	R\$ 114,90		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 114,90	0%

Tony F. A. Prado  
Engenheiro Civil  
CREA/PA 032.055.677.8

12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 243,73	R\$ 1.462,38	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 330,49	R\$ 660,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,55	R\$ 18,20	R\$ -	4,00	R\$ 18,20	0,00	R\$ -	100%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$ 4,32	R\$ 311,04	R\$ -	72,00	R\$ 311,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$ 12,25	R\$ 490,00	R\$ -	40,00	R\$ 490,00	0,00	R\$ -	100%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 34,03	R\$ 204,18	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 49,86	R\$ 99,72	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 99,72	0%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 22,87	R\$ 137,22	R\$ -	6,00	R\$ 137,22	0,00	R\$ -	100%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$ 31,16	R\$ 62,32	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)	UN	4,00	R\$ 38,79	R\$ 155,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 155,16	0%
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 12,81	R\$ 384,30	R\$ -	30,00	R\$ 384,30	0,00	R\$ -	100%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ -	1,00	R\$ 14,55	0,00	R\$ -	100%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)	UN	5,00	R\$ 29,58	R\$ 147,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 147,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 6,17	R\$ 18,51	R\$ -	3,00	R\$ 18,51	0,00	R\$ -	100%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,92	R\$ 35,84	R\$ -	2,00	R\$ 35,84	0,00	R\$ -	100%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 97,39	R\$ 779,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 152,90	R\$ 305,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,51	R\$ 34,04	R\$ -	4,00	R\$ 34,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	R\$ 10,11	R\$ 889,68	R\$ -	88,00	R\$ 889,68	0,00	R\$ -	100%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 15,70	R\$ 439,60	R\$ -	28,00	R\$ 439,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 41,29	R\$ 165,16	R\$ -	4,00	R\$ 165,16	0,00	R\$ -	100%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 54,56	R\$ 1.418,56	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 1.418,56	0%
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 152,90	R\$ 917,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 16,87	R\$ 792,89	R\$ -	47,00	R\$ 792,89	0,00	R\$ -	100%
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 16,87	R\$ 202,44	R\$ -	12,00	R\$ 202,44	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 062.0...77.8

12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 14,05	R\$ 238,85		R\$ -	17,00	R\$ 238,85	0,00	R\$ -	100%
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 24,64	R\$ 344,96		R\$ -	14,00	R\$ 344,96	0,00	R\$ -	100%
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 96,69	R\$ 676,83		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 676,83	0%
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 148,06	R\$ 592,24		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 592,24	0%
12.1.37	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 23,16	R\$ 231,60		R\$ -	10,00	R\$ 231,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 83,40	R\$ 166,80		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 166,80	0%
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 83,40	R\$ 1.084,20		R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.084,20	0%
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 83,40	R\$ 250,20		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 250,20	0%
12.1.41	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9,00	R\$ 26,28	R\$ 236,52		R\$ -	9,00	R\$ 236,52	0,00	R\$ -	100%
12.1.42	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8,00	R\$ 26,28	R\$ 210,24		R\$ -	8,00	R\$ 210,24	0,00	R\$ -	100%
12.2	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>							0,00				
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 289,97	R\$ 869,91		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 869,91	0%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 352,10	R\$ 352,10		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 83,01	R\$ 166,02		R\$ -	2,00	R\$ 166,02	0,00	R\$ -	100%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 167,14	R\$ 1.337,12	4,00	R\$ 668,56	8,00	R\$ 1.337,12	0,00	R\$ -	100%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 94,47	R\$ 2.834,10	20,00	R\$ 1.889,40	30,00	R\$ 2.834,10	0,00	R\$ -	100%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 89,77	R\$ 538,62	5,00	R\$ 448,85	6,00	R\$ 538,62	0,00	R\$ -	100%
13	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							0,00				
13.1	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>							0,00				
13.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,60	R\$ 34,17	R\$ 8.426,32		R\$ -	246,60	R\$ 8.426,32	0,00	R\$ -	100%
13.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	R\$ 66,60	R\$ 199,80		R\$ -	3,00	R\$ 199,80	0,00	R\$ -	100%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 27,17	R\$ 298,87		R\$ -	11,00	R\$ 298,87	0,00	R\$ -	100%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 27,24	R\$ 1.280,28		R\$ -	47,00	R\$ 1.280,28	0,00	R\$ -	100%
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 83,82	R\$ 335,28		R\$ -	4,00	R\$ 335,28	0,00	R\$ -	100%
13.1.6	TÉ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 66,37	R\$ 66,37		R\$ -	1,00	R\$ 66,37	0,00	R\$ -	100%

Tony Edson de Azevedo  
*A.*  
 02/08/2024 17:08



13.2	ACESSÓRIOS												
13.2.1	Ralo hemisférico em P.F. tipo abacaxi Ø 100mm	un	11,00	R\$ 46,01	R\$ 506,11		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 506,11	0%	
13.2.2	CAIXA DE AREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 1.078,20	0%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							0,00					
14.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,30	R\$ 63,96	R\$ 9.549,23		R\$ -	149,30	R\$ 9.549,23	0,00	R\$ -	100%	
14.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,30	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57		R\$ -	115,30	R\$ 2.581,57	0,00	R\$ -	100%	
14.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,10	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38		R\$ -	173,10	R\$ 5.705,38	0,00	R\$ -	100%	
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33		R\$ -	0,00	R\$ -	69,55	R\$ 3.240,33	0%	
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 27,17	R\$ 163,02		R\$ -	6,00	R\$ 163,02	0,00	R\$ -	100%	
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00		R\$ -	9,00	R\$ 198,00	0,00	R\$ -	100%	
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00	R\$ 12,88	R\$ 399,28		R\$ -	31,00	R\$ 399,28	0,00	R\$ -	100%	
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	R\$ 8,32	R\$ 266,24		R\$ -	32,00	R\$ 266,24	0,00	R\$ -	100%	
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 27,24	R\$ 326,88		R\$ -	12,00	R\$ 326,88	0,00	R\$ -	100%	
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 31,14	R\$ 871,92		R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 871,92	0%	
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 12,21	R\$ 219,78		R\$ -	18,00	R\$ 219,78	0,00	R\$ -	100%	
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	106,00	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08		R\$ -	106,00	R\$ 1.185,08	0,00	R\$ -	100%	
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08		R\$ -	14,00	R\$ 1.109,08	0,00	R\$ -	100%	
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 50,31	R\$ 402,48		R\$ -	8,00	R\$ 402,48	0,00	R\$ -	100%	
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 53,33	R\$ 53,33		R\$ -	1,00	R\$ 53,33	0,00	R\$ -	100%	
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 23,79	R\$ 214,11		R\$ -	9,00	R\$ 214,11	0,00	R\$ -	100%	
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99		R\$ -	1,00	R\$ 29,99	0,00	R\$ -	100%	
14.19	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 66,93	R\$ 267,72		R\$ -	4,00	R\$ 267,72	0,00	R\$ -	100%	
14.20	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 66,93	R\$ 803,16		R\$ -	12,00	R\$ 803,16	0,00	R\$ -	100%	
14.21	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 21,85	R\$ 284,05		R\$ -	13,00	R\$ 284,05	0,00	R\$ -	100%	

Tony Felix Andrade  
 Eng.º Civil  
 CREA-DF nº 062.055.877.8

14.22	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 45,47	R\$ 45,47		R\$ -	1,00	R\$ 45,47	0,00	R\$ -	100%
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36		R\$ -	12,00	R\$ 246,36	0,00	R\$ -	100%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$ 37,66	R\$ 715,54		R\$ -	19,00	R\$ 715,54	0,00	R\$ -	100%
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 179,93	R\$ 719,72	4,00	R\$ 719,72	4,00	R\$ 719,72	0,00	R\$ -	100%
14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 314,08	R\$ 3.768,96		R\$ -	12,00	R\$ 3.768,96	0,00	R\$ -	100%
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 12,14	R\$ 182,10	15,00	R\$ 182,10	15,00	R\$ 182,10	0,00	R\$ -	100%
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	R\$ 94,14	R\$ 282,42	3,00	R\$ 282,42	3,00	R\$ 282,42	0,00	R\$ -	100%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	R\$ 12,03	R\$ 108,27		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 108,27	0%
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9,00	R\$ 13,15	R\$ 118,35		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 118,35	0%
14.31	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	R\$ 3.570,15	R\$ 3.570,15		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.570,15	0%
14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1,00	R\$ 8.367,68	R\$ 8.367,68		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 8.367,68	0%
15	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>							0,00				
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 272,64	R\$ 1.090,56		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.090,56	0%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 456,55	R\$ 4.108,95		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 4.108,95	0%
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	9,70	R\$ 108,45	R\$ 1.051,97		R\$ -	0,00	R\$ -	9,70	R\$ 1.051,97	0%
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 347,93	R\$ 4.523,09	3,00	R\$ 1.043,79	13,00	R\$ 4.523,09	0,00	R\$ -	100%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 130,08	R\$ 1.691,04		R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.691,04	0%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 202,92	R\$ 1.217,52		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.217,52	0%
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 423,60	R\$ 2.118,00		R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 2.118,00	0%
15.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 260,39	R\$ 260,39		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 260,39	0%
15.9	banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm	un	2,00	R\$ 325,13	R\$ 650,26		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 650,26	0%
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 783,52	R\$ 2.350,56		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.350,56	0%
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 89,41	R\$ 715,28		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 715,28	0%
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 32,23	R\$ 290,07		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 290,07	0%
15.15	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	107,00	R\$ 14,87	R\$ 1.591,09		R\$ -	0,00	R\$ -	107,00	R\$ 1.591,09	0%
15.16	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	3,00	R\$ 66,57	R\$ 199,71		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,71	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 032.635.077,8

15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,55	R\$ 931,95	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 931,95	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 370,16	0%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 59,63	R\$ 954,08	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 954,08	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 59,63	R\$ 178,89	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 178,89	0%
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 69,07	R\$ 966,98	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 966,98	0%
15.24	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 67,82	R\$ 678,20	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 678,20	0%
15.25	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	R\$ 45,79	R\$ 641,06	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 360,56	R\$ 2.523,92	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 349,21	R\$ 1.746,05	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 332,16	R\$ 2.989,44	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,87	R\$ 1.027,87	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.027,87	0%
16	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>						0,00				
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,14	R\$ 482,23	R\$ 549,74	R\$ -	0,00	R\$ -	1,14	R\$ 549,74	0%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 638,33	R\$ 153,20	R\$ -	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 153,20	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$ 50,37	R\$ 1.893,91	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 1.893,91	0%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$ 18,46	R\$ 694,10	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 694,10	0%
16.5	Fita anticorrosiva	Un	4,00	R\$ 8,20	R\$ 32,80	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,80	0%
16.6	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 159,05	R\$ 159,05	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 159,05	0%
16.7	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$ 45,98	R\$ 91,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 408,53	R\$ 408,53	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo inflamável	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
17	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>						0,00				
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 227,04	R\$ 1.362,24	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 761,41	R\$ 1.522,82	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 132,05	R\$ 924,35	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 140,35	R\$ 140,35	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 140,35	0%
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,55	R\$ 169,10	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 169,10	0%
17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,90	R\$ 735,60	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 735,60	0%

Tony Felipe Almeida  
Engenheiro  
CREA-BA: 052.0/2017.8

17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$ 147,13	R\$ 9.269,19	R\$ -	0,00	R\$ -	63,00	R\$ 9.269,19	0%	
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.525,01	R\$ 3.050,02	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 3.050,02	0%	
17.9	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 370,36	R\$ 370,36	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 370,36	0%	
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 289,97	R\$ 1.449,85	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.449,85	0%	
17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 191,86	R\$ 575,58	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 575,58	0%	
17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 179,17	R\$ 716,68	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 716,68	0%	
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$ 24,70	R\$ 889,20	R\$ -	0,00	R\$ -	36,00	R\$ 889,20	0%	
17.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10,00	R\$ 18,46	R\$ 184,60	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 184,60	0%	
17.15	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a	un	1,00	R\$ 2.826,84	R\$ 2.826,84	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.826,84	0%	
17.16	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 219,18	R\$ 219,18	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 219,18	0%	
17.17	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$ 219,18	R\$ 438,36	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 438,36	0%	
17.18	Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	R\$ 27,31	R\$ 928,54	R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 928,54	0%	
18	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>											
18.1	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>											
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 597,68	R\$ 597,68	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 597,68	0%	
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 769,98	R\$ 1.539,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.539,96	0%	
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 883,24	R\$ 2.649,72	R\$ -	2,00	R\$ 1.766,48	1,00	R\$ 883,24	67%	
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 99,54	R\$ 99,54	1,00	R\$ 99,54	1,00	R\$ 99,54	0,00	R\$ -	100%
18.2	<b>DISJUNTORES</b>											
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$ 11,69	R\$ 771,54	R\$ -	0,00	R\$ -	66,00	R\$ 771,54	0%	
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 37,17	0%	
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,39	R\$ 24,78	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 24,78	0%	
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$ 13,67	R\$ 218,72	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 218,72	0%	
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 15,23	R\$ 60,92	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 60,92	0%	
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 22,11	R\$ 22,11	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 22,11	0%	
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 73,28	R\$ 146,56	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 146,56	0%	
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 81,82	R\$ 327,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 327,28	0%	

Tony F. A. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.011.077.8

18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 89,46	R\$ 178,92		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 178,92	0%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 99,19	R\$ 198,38		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 198,38	0%
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 132,13	R\$ 264,26		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 264,26	0%
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 569,56	R\$ 1.139,12		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.139,12	0%
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 132,81	R\$ 132,81		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 132,81	0%
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2,00	R\$ 248,90	R\$ 497,80		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 497,80	0%
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	R\$ 132,81	R\$ 398,43		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 398,43	0%
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	24,00	R\$ 104,15	R\$ 2.499,60		R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 2.499,60	0%
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8,00	R\$ 104,15	R\$ 833,20		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 833,20	0%
<b>18.3</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>							0,00				
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	408,30	R\$ 9,84	R\$ 4.017,67		R\$ -	408,30	R\$ 4.017,67	0,00	R\$ -	100%
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,40	R\$ 12,81	R\$ 2.234,06		R\$ -	174,40	R\$ 2.234,06	0,00	R\$ -	100%
18.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,90	R\$ 17,40	R\$ 5.827,26		R\$ -	0,00	R\$ -	334,90	R\$ 5.827,26	0%
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,20	R\$ 25,44	R\$ 259,49		R\$ -	0,00	R\$ -	10,20	R\$ 259,49	0%
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 42,95	R\$ 1.718,00		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 1.718,00	0%
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,80	R\$ 22,66	R\$ 675,27		R\$ -	0,00	R\$ -	29,80	R\$ 675,27	0%
18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 244,68	R\$ 2.691,48		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 2.691,48	0%
18.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00	R\$ 16,01	R\$ 2.721,70		R\$ -	120,00	R\$ 1.921,20	50,00	R\$ 800,50	71%
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$ 10,97	R\$ 1.097,00		R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 1.097,00	0%
<b>18.4</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>							0,00				
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5871,30	R\$ 4,26	R\$ 25.011,74	3573,20	R\$ 15.221,83	3573,20	R\$ 15.221,83	2298,10	R\$ 9.789,91	61%
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	253,90	R\$ 6,88	R\$ 1.746,83	127,87	R\$ 879,75	127,87	R\$ 879,75	126,03	R\$ 867,09	50%
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1472,40	R\$ 9,37	R\$ 13.796,39	782,14	R\$ 7.328,65	782,14	R\$ 7.328,65	690,26	R\$ 6.467,74	53%
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,50	R\$ 23,52	R\$ 811,44		R\$ -	34,50	R\$ 811,44	0,00	R\$ -	100%
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	R\$ 27,00	R\$ 1.574,10		R\$ -	0,00	R\$ -	58,30	R\$ 1.574,10	0%
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,60	R\$ 36,28	R\$ 3.214,41		R\$ -	0,00	R\$ -	88,60	R\$ 3.214,41	0%
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,80	R\$ 78,17	R\$ 22.106,48		R\$ -	0,00	R\$ -	282,80	R\$ 22.106,48	0%

Tony Félix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREBA/DF 032022077.8

18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 94,31	R\$ 3.772,40	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 3.772,40	0%
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,80	R\$ 162,56	R\$ 25.977,09	R\$ -	0,00	R\$ -	159,80	R\$ 25.977,09	0%
<b>18.5</b>	<b>ELETROCALHAS</b>										
18.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,20	R\$ 100,10	R\$ 7.527,52	R\$ -	0,00	R\$ -	75,20	R\$ 7.527,52	0%
<b>18.6</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>										
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95,00	R\$ 30,71	R\$ 2.917,45	R\$ -	0,00	R\$ -	95,00	R\$ 2.917,45	0%
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R\$ 32,41	R\$ 745,43	R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 745,43	0%
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 43,10	R\$ 129,30	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 129,30	0%
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	R\$ 45,20	R\$ 1.536,80	R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 1.536,80	0%
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 25,33	R\$ 75,99	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 75,99	0%
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 59,75	R\$ 119,50	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 119,50	0%
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 54,43	R\$ 54,43	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 54,43	0%
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 30,71	R\$ 307,10	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 307,10	0%
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 221,24	R\$ 1.769,92	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.769,92	0%
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	11,00	R\$ 102,83	R\$ 1.131,13	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.131,13	0%
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	56,00	R\$ 118,28	R\$ 6.623,68	R\$ -	0,00	R\$ -	56,00	R\$ 6.623,68	0%
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25,00	R\$ 165,86	R\$ 4.146,50	R\$ -	0,00	R\$ -	25,00	R\$ 4.146,50	0%
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00	R\$ 205,96	R\$ 1.853,64	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 1.853,64	0%
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	R\$ 410,44	R\$ 1.641,76	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.641,76	0%
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00	R\$ 410,44	R\$ 410,44	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 410,44	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8,00	R\$ 152,18	R\$ 1.217,44	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.217,44	0%
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>										
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,90	R\$ 15,20	R\$ 971,28	R\$ -	63,90	R\$ 971,28	0,00	R\$ -	100%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 6,17	R\$ 74,04	R\$ -	12,00	R\$ 74,04	0,00	R\$ -	100%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50	R\$ -	14,00	R\$ 80,50	0,00	R\$ -	100%
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 9,10	R\$ 27,30	R\$ -	3,00	R\$ 27,30	0,00	R\$ -	100%
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>										
<b>20.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>										
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 948,33	R\$ 2.844,99	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.844,99	0%
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	R\$ 507,92	R\$ 507,92	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 507,92	0%
20.1.3	GUIA DE CABO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 41,83	R\$ 83,66	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 83,66	0%
20.1.4	GUIA DE CABOS DE VERTICAL, FECHADO	UN	1,00	R\$ 41,83	R\$ 41,83	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 41,83	0%
20.1.5	GUIA DE CABO VERTICAL	UN	2,00	R\$ 41,83	R\$ 83,66	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 83,66	0%

Tony Felipe  
Engenheiro  
CREA-BA 052.000/077.8

20.1.6	GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO	UN	1,00	R\$ 41,83	R\$ 41,83		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 41,83	0%
20.1.7	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00	R\$ 65,67	R\$ 131,34		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 131,34	0%
20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	R\$ 726,43	R\$ 726,43		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 726,43	0%
20.1.9	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300 MPBS	UN	2,00	R\$ 634,89	R\$ 1.269,78		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.269,78	0%
<b>20.2</b>	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>							0,00				
20.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579,00	R\$ 14,57	R\$ 8.436,03		R\$ -	0,00	R\$ -	579,00	R\$ 8.436,03	0%
20.2.2	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113,00	R\$ 13,66	R\$ 1.543,58		R\$ -	0,00	R\$ -	113,00	R\$ 1.543,58	0%
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19,00	R\$ 17,77	R\$ 337,63		R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 337,63	0%
<b>20.3</b>	<b>TOMADAS</b>							0,00				
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	R\$ 39,49	R\$ 750,31		R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 750,31	0%
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	R\$ 72,64	R\$ 581,12		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 581,12	0%
20.3.3	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	Un	10,00	R\$ 42,93	R\$ 429,30		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 429,30	0%
<b>20.4</b>	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>							0,00				
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$ 244,68	R\$ 978,72		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 978,72	0%
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	R\$ 16,01	R\$ 432,27	27,00	R\$ 432,27	27,00	R\$ 432,27	0,00	R\$ -	100%
<b>20.5</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>							0,00				
20.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,20	R\$ 10,38	R\$ 157,78		R\$ -	15,20	R\$ 157,78	0,00	R\$ -	100%
20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,05	R\$ 9,84	R\$ 1.102,57	112,05	R\$ 1.102,57	112,05	R\$ 1.102,57	0,00	R\$ -	100%
20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,80	R\$ 18,01	R\$ 86,45	4,80	R\$ 86,45	4,80	R\$ 86,45	0,00	R\$ -	100%
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	55,20	R\$ 28,10	R\$ 1.551,12		R\$ -	0,00	R\$ -	55,20	R\$ 1.551,12	0%
20.5.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	51,65	R\$ 57,43	R\$ 2.966,26		R\$ -	0,00	R\$ -	51,65	R\$ 2.966,26	0%
<b>21</b>	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>							0,00				
21.1	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	un	1,00	R\$ 1.920,13	R\$ 1.920,13		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.920,13	0%
21.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1,00	R\$ 1.468,08	R\$ 1.468,08		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.468,08	0%
<b>22</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>							0,00				
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 113,47	R\$ 113,47		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 113,47	0%
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,60	R\$ 11,47	R\$ 1.245,64		R\$ -	0,00	R\$ -	108,60	R\$ 1.245,64	0%
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 24,49	R\$ 269,39		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 269,39	0%
22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00	R\$ 9,62	R\$ 38,48		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 38,48	0%
22.5	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33,00	R\$ 24,49	R\$ 808,17		R\$ -	0,00	R\$ -	33,00	R\$ 808,17	0%
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	R\$ 307,60	R\$ 307,60		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 307,60	0%
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	26,18	R\$ 89,52	R\$ 2.343,63		R\$ -	0,00	R\$ -	26,18	R\$ 2.343,63	0%
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	26,18	R\$ 41,63	R\$ 1.089,87		R\$ -	0,00	R\$ -	26,18	R\$ 1.089,87	0%
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 94,61	R\$ 1.040,71		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.040,71	0%
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	26,00	R\$ 35,07	R\$ 911,82		R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 911,82	0%
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	261,00	R\$ 63,70	R\$ 16.625,70		R\$ -	0,00	R\$ -	261,00	R\$ 16.625,70	0%
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	174,50	R\$ 82,38	R\$ 14.375,31		R\$ -	0,00	R\$ -	174,50	R\$ 14.375,31	0%
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 45,07	R\$ 495,77		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 495,77	0%
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	251,00	R\$ 13,53	R\$ 3.396,03		R\$ -	0,00	R\$ -	251,00	R\$ 3.396,03	0%
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22,00	R\$ 37,07	R\$ 815,54		R\$ -	0,00	R\$ -	22,00	R\$ 815,54	0%

Tony Felix Almeida  
Eng.º Civil  
CREA-BA 062.000.177.3





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9DHF2-NVQQZ-P5M6M-G8QN3

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/9DHF2-NVQQZ-P5M6M-G8QN3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**  
PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA  
QUEIMADAS  
BA

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº. 676/2023**

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

<b>Nome</b> <b>ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>		<b>C.G.A</b> 154100189	<b>C.N.P.J.</b> 19.650.110/0001-27
<b>Endereço:</b> RUA ALTO DA CHACRINHA, 25			
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 48860000	<b>Município:</b> QUEIMADAS	<b>UF:</b> BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

**Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .  
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:  
29/09/2023

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 27/03/2024

31411.676.20230929.N.292.539





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20236795257**

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>114.761.127 - BAIXADO</b>	<b>19.650.110/0001-27</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:01:56 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2024.

Código de controle da certidão: **5428.A8D8.D542.DA2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Certidão nº: 74798939/2023  
Expedição: 27/12/2023, às 08:13:11  
Validade: 24/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.650.110/0001-27  
**Razão Social:** ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL  
**Endereço:** RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/12/2023 a 26/01/2024

**Certificação Número:** 2023122802345597360430

Informação obtida em 12/01/2024 10:40:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 12/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:07:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

10.224,60

DEPÓSITO

817,96

ENCARGOS FGTS

45,18

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

863,14

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: 15/01/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 12/01/2024  
HORA: 15:07:08  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			19.650.110/0001-27		0000	2100	507
577,60	1.567,77	0,00	59,82	0,00	0,00	2.085,55	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 12/01/2024

HORA: 15:07:08

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA N° CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	577,60	0,00	0,00	0,00	577,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.363,28	0,00	0,00	0,00	1.363,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	204,49	0,00	0,00	0,00	204,49
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.085,55	0,00	0,00	0,00	2.085,55
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.085,55	0,00	0,00	0,00	2.085,55

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/01/2024  
HORA: 15:07:08  
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS			128.02888.07-4	01/02/2019	01			07102
3.049,82	1.524,91		0,00	274,97			365,98	0,00
DENIS MARIO DA SILVA BORGES			203.63232.16-2	03/02/2021	01			07152
2.229,58	1.114,79		0,00	182,48			267,54	0,00
SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS			134.10368.42-5	01/10/2019	01			03516
1.537,00	768,50		0,00	120,15			184,44	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
6.816,40 3.408,20 0,00 577,60 817,96 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/01/2024  
HORA: 15:07:08  
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Nº DE CONTROLE: AHGiy9f1C3g0000-7  
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO  
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000

Nº ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00
TOTAIS:	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: AHGiy9f1C3g0000-7

N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.085.55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 577.60  
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0  
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0  
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0  
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0  
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/01/2024  
HORA: 15:07:08  
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00
TOTAIS:	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/01/2024  
HORA: 15:07:08  
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº DE CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1	Nº ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS:2100	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25	BAIRRO: CONTORNO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000		CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	6.816,40
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.408,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 15/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
817,96	45,18	0,00	0,00	863,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0  
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.085.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	577.60
SALÁRIO FAMÍLIA:	59.82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1

TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: AHGiy9f1C3g0000-7  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	3.408,20
		DEPÓSITO	817,96
		ENCARGOS FGTS	45,18
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	3.408,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	577,60	DEPÓSITO	817,96
VAL DEVIDO PREV SOC	2.085,55	ENCARGOS FGTS	45,18
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1  
COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13° SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	3.408,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	577,60	DEPÓSITO	817,96
VAL DEVIDO PREV SOC	2.085,55	ENCARGOS FGTS	45,18
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	863,14

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	19.650.110/0001-27
<b>Nome</b>	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>Período de apuração</b>	12/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 568,42	R\$ 508,60
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.465,52	R\$ 1.465,52
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 395,33	R\$ 395,33
<b>IRRF</b>	R\$ 100,32	R\$ 100,32
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.529,59	R\$ 2.469,77

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

<b>Nome</b>	FABIO DA SILVA OLIVEIRA
<b>CPF</b>	997.255.335-34
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/01/2024 11:54:49
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000198291290
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	552.207.625-91

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	568,42	59,82	508,60

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.363,28	0,00	1.363,28
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	102,24	0,00	102,24

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	170,41	0,00	170,41
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	13,63	0,00	13,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	68,16	0,00	68,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	102,24	0,00	102,24
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	40,89	0,00	40,89

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2023	100,32	0,00	100,32

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	59,82	59,82	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 59,82 - Valor Utilizado: 59,82 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
	Descrição do Débito		Descrição do Crédito
	Código Receita	PA Débito	Débito Declarado
			Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/A VULSO		12/2023	568,42
			59,82

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000192444124
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	QUEIMADAS	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	568,42		
Deduções	Salário Família: 59,82		
Saldo a Pagar	508,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	170,41		
Saldo a Pagar	170,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	68,16		
Saldo a Pagar	68,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	102,24		
Saldo a Pagar	102,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	13,63		
<b>Saldo a Pagar</b>	13,63		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	40,89		
<b>Saldo a Pagar</b>	40,89		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	102,24		
<b>Saldo a Pagar</b>	102,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	1.363,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.363,28		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	100,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	100,32		

CNPJ <b>19.650.110/0001-27</b>	Razão Social <b>ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24012.5459013-0</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000192444124</b>			Valor Total do Documento <b>2.469,77</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	100,32			100,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	508,60			508,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.363,28			1.363,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	170,41			170,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	13,63			13,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	68,16			68,16
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	102,24			102,24
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	40,89			40,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	102,24			102,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.469,77</b>			<b>2.469,77</b>

SEMDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/01/2024 16:55:36

85820000024 4 69770385240 0 19071624012 4 54590130703 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4 69770385240 0 19071624012 4 54590130703 5



CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Número: 07.16.24012.5459013-0  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 2.469,77

Pague com o PIX





# Pagamento Darf Numerado



## R\$ 2.469,77

Pagamento

Outras saídas



### Sobre a transação

Data da transação

Segunda-feira, 15/01/2024

Adicione descrição

### Ações



Precisa de ajuda?



### Ofertas pra você

Cadastre sua chave no Inter e faça um Pix quando e onde quiser!





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/01/2024 15:08:29.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MnQqMLOhRbG00000.SFP é:

534e1148-3d07-48d1-a563-95bffaec5304

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO LTDA:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 12/2023

NRA: MnQqMLOhRbG00000

Base de Processamento: Santaluz / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>354</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	21/10/2023
----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
**Tony Felix**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>355</b>
-----	------------

### ANOTAÇÕES

Período:	22/10/2023
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
**Tony Felix**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>356</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	23/10/2023
----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony André*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*[Assinatura]*  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>357</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 24/10/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA Tony Felix Andrade Engenheiro Civil CREA-BA: 052.059.677.8	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI [ 19.650.110/0001-27 ] ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/4XHWf-BELBV-7WQVV-NZ49H>.  
 Registro de Imóveis do Brasil



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>358</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	25/10/2023
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony P. Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*Antônio*  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/4XHWf-BELBV-7WQVV-NZ49H>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>359</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 26/10/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
 Tony Felix Andrade ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA: 052.034/2017-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 19.650.110/0001-27 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/4XHWf-BELBV-7WQVV-NZ49H>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	360
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 27/10/2023
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:


  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA 7.8  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.655.277/8


  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27-7  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 L 48.860-000 - QUEIMADAS - BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	361
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES	Período:	28/10/2023
-----------	----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:


  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Tony Ar-trade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.577/8


  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

362

### ANOTAÇÕES

Período:

29/10/2023

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

#### Condição do Tempo

##### Manhã

Bom  Chuva  Não Operável

##### Tarde

Bom  Chuva  Não Operável

##### Noite

Bom  Chuva  Não Operável

#### EFETIVO DA OBRA

##### ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Felipe André de*  
 ENGRº - 17.8  
 CREA-BA/051177.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*Felipe*

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25, CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA      RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA      CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **363**

**ANOTAÇÕES**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Período:	30/10/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Felix Andrade*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.035.677.8

*[Assinatura]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS - BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº: <b>364</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Período:	31/10/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro Civil  
 CRCA-BA: 052.055.677.8

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4XHWF-BELBV-7WQVV-NZ49H

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/4XHWF-BELBV-7WQVV-NZ49H>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>365</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	01/11/2023
----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Geoseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
**Tony Ferreira Arade**  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.099.677.8


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>366</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	02/11/2023
----------	------------

FERIADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony F. Andrade*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

*Sonia*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>367</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	03/11/2023
----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

*Edix Andrade*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Eng.º  
 CREA-BA: 052.039.077.8

*Santa*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.850.110/0001-21  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>368</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	04/11/2023
----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
**Tony Felix Andraus**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.095.677-8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>369</b>
-----	------------

### ANOTAÇÕES

Período:	05/11/2023
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Feijó Andrade*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREA-BA 052.500/2017-8

*Sonia*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZZ>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>370</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 06/11/2023
-----------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.17.8

ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº: <b>371</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 INÍCIO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA

Período: 07/11/2023

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony Artrado*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*Sônia*  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHAGRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	372
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período:	08/11/2023
------------------	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtd.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony*  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.0...77.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>374</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA

Período: 10/11/2023

**Condição do Tempo**

<b>Manhã</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

*Tony Felix Andrade*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREA-BA: 052.577/8

*Santa*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>375</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	11/11/2023
----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREA-BA: 062.000.000-0

*[Assinatura]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>376</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	12/11/2023
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Electricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

  
**Tony Felix Andrade**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 ENGRº 052.089.877.8  
 CREA-BA: 052.089.877.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>377</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA

Período:	13/11/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 052.058.877.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validade/XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZ2>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>378</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 14/11/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 52.045.877.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Antonio*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.850.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-B/A

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZ2>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>379</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	15/11/2023
----------	------------

FERIADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
RDC: 032.023.077.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*[Assinatura]*

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
ARCO CONSTRUÇÕES  
E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
48.860-000 - QUEIMADAS - BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	380
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período:	16/11/2023
------------------	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	<p><i>Tony Felix Andrade</i>                  Engenheiro Civil                  CRP: 052.059/077.8</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA</p>	<p><i>Santo</i></p> <p>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                  [ 19.650.110/0001-27 ]                  ARCO CONSTRUÇÕES                  E EMPREENDIMENTOS EIRELI                  RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO                  [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]</p>
--------------	---	---

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZ2>.









# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>383</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	19/11/2023
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA BA 052.000-377.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*[Assinatura]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador/xn3ku-xmr4f-xhf2t-f4rzz>.



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **384**

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 20/11/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 INÍCIO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CREA: BA: 052.021-177.0

*[Assinatura]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 0477/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

**385**

**ANOTAÇÕES**

Período:

21/11/2023

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 INÍCIO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 052.053.877.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Santa*

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.050.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACHINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	386
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES	Período:	22/11/2023
-----------	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ARA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Geleiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 052.059.877.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 09.850.910/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>387</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	23/11/2023
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ARA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.014/377.3  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.630.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.360-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	388
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>		Período:	24/11/2023
------------------	--	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 062.052.377.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*[Assinatura]*

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZ2>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>390</b>
-----	------------

### ANOTAÇÕES

Período:	26/11/2023
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

  
 Tony Felix Andrade  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREM-CA: 052.012.017.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.630.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CANTURNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>391</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 27/11/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

*[Assinatura]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*[Assinatura]*  
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>392</b>
-----	------------

### ANOTAÇÕES

Período:	28/11/2023
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felipe Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 052.071/377.8

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Sonia*

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>393</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:																								
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p> <p>CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS            CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)            CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS            CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS            CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA            CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)</p>		<p>29/11/2023</p> <p><b>Condição do Tempo</b></p> <p><b>Manhã</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p><b>Tarde</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p><b>Noite</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p><b>EFEATIVO DA OBRA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ARCO</th> </tr> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>10</td></tr> <tr><td>Armador</td><td>2</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Eltricista</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>0</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>21</b></td></tr> </tbody> </table>	ARCO		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	10	Armador	2	Serralheiro	0	Eltricista	0	Gesseiro	0	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>
ARCO																										
Função	Qtde.																									
Engenheiro Civil	1																									
Administrativo	1																									
Mestre de Obras	1																									
Pedreiro	6																									
Ajudante Comum	10																									
Armador	2																									
Serralheiro	0																									
Eltricista	0																									
Gesseiro	0																									
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>																									

ASSINATURAS:

<p><b>Tony Felix Andrade</b>  <i>(Assinatura)</i>            Engenheiro Civil            PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA            CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA 077,8</p>	<p><i>(Assinatura)</i>            ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI            19.650.110/0001-27  <b>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>            RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO            48.860-000 - QUEIMADAS-BA</p>
---	--

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZZ>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA      RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA      CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **394**

### ANOTAÇÕES

Período: 30/11/2023

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom    Chuva    Não Operável

**Tarde**  
 Bom    Chuva    Não Operável

**Noite**  
 Bom    Chuva    Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

#### ASSINATURAS:

*Tony Felix Almeida*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 082.413.77.8

*[Assinatura]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 29 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZ2

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XN3KU-XMR4F-XHF2T-F4RZ2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	395
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período:	01/12/2023
------------------	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE SELADOR)

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CRETA DA: 052.000.077.8

*[Assinatura]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 0477/2022	Nº:	396
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES	Período:	02/12/2023
-----------	----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Electricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 032.055.877.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	397
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES	Período:	03/12/2023
-----------	----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
<p>_____                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  <i>Tony F. Andrade</i>                  Engenheiro Civil                  CREA-BA: 062.033/677.8</p>	<p>_____                  ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                  P 19.650.110/0001-27                  ARCO CONSTRUÇÕES                  E EMPREENDIMENTOS EIRELI                  RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO                  L 48.860-000 - QUEIMADAS-BA</p>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº:	399
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)

Período: 05/12/2023

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony Feijó Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CRP: 032.611.177.8

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*[Assinatura]*  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>400</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 06/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA</p> <p><i>Tony Feik</i> Engenheiro Civil CREA-BA: 002.000.000-077.8</p>	<p>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</p> <p>19.650.110/0001-27</p> <p><b>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b></p> <p>RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO</p> <p>48.860-000 - QUEIMADAS-BA</p>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	401
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>		Período:	07/12/2023
------------------	--	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony Felix Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 002.000.177.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*[Assinatura]*  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>402</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 08/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.088.077-8

*[Assinatura]*  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>403</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 09/12/2023
------------------	---------------------

SABADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
<p>_____                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  <i>Antonio de Andrade</i>                  Engenheiro Civil                  CREM. BA: 052.000/77.8</p>	<p>_____                  ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                  P. 19.650.110/0001-27  <b>ARCO CONSTRUÇÕES                  E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                  RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO                  48.860-000 - QUEIMADAS-BA</p>





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>404</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 10/12/2023
------------------	---------------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA <b>Tony Felix Andrade</b> Engenheiro Civil CREA-BA: 062.000/77.9	 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 19.850.110/0001-27 <b>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b> RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº:	405
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONCLUSÃO DA CONFEÇÃO DO ABRIGO DE GÁS  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁRA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)

Período: 11/12/2023

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável  
**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável  
**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*[Assinatura]*  
 Tony Roberto de  
 Engenheiro Civil  
 C.T.E. Nº: 062.000.77.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*[Assinatura]*  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA


INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>406</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 12/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONCLUSÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (ÁREAS MOLHADAS)  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 INÍCIO DO ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	<p style="text-align: center;">                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA                  Engenheiro Civil                  CREA-BA: 052.099.677.8             </p>	<p style="text-align: center;">                   [ 19.650.110/0001-27 ]                  ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  <b>E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                  RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO                  [ 48.860.000-QUEIMADAS-BA ]             </p>
--------------	---	---

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>407</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 13/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 032.000/77.8

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>408</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 14/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Electricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.000-077.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	409
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>		Período:	15/12/2023
------------------	--	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
 Tony Felix Andrade PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA CREA-BA: 052.066.677.8	 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 19.650.110/0001-27 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO 48.860-000 - QUIFIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>411</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	17/12/2023
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 052.000.77.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>412</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 18/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony Felix Andrade*  
 Engenheiro C-1  
 CREA-BA: 052.056.277.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*[Assinatura]*  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>413</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONCLUSÃO PARCIAL DO ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO  
 INÍCIO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO

Período: 19/12/2023

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

  
 Tony Felix Andrade  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREA-BA: 052.000.677.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>414</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	20/12/2023
----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO

Condição do Tempo			
Manhã			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Tarde			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Noite			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.089.077.8



\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **415**

**ANOTAÇÕES**

Período: 21/12/2023

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony Felix Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.053.077.0

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

*[Assinatura]*  
 19.850.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>416</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 22/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO

<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
*Tony F. Andrade*  
 Engenheiro  
 CREA/BA 052.069.677.8

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>417</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	23/12/2023
----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
*Tony Fernandes*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA-032.000/2017-8

*Arco*

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>418</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	24/12/2023
DOMINGO - NÃO HOVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA		<b>Condição do Tempo</b>	
		<b>Manhã</b>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<b>Tarde</b>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<b>Noite</b>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
		<b>ARCO</b>	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>		

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Endereço: ...  
 CREA-BA: 052.051.077.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>419</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	25/12/2023
----------	------------

FERIADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony Felício*  
 0008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 CREA-BA: 000000000-77.8

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650-110/500127  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>420</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	26/12/2023
----------	------------

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA

**ASSINATURAS:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony F...*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 032.0... 77.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>421</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

Período: 27/12/2023

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 INÍCIO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Antonio*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 032.069.677-8

\_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>422</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 28/12/2023
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA Tony Andrade Engenheiro Civil CRECI-BA: 052.059.677.8	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI [ 19.650.110/0001-27 ] ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>423</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
- CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA
- CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
- CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS

Período: 29/12/2023

**Condição do Tempo**

<b>Manhã</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*Tony Felix Andrade*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 062.064.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
L 48.860-000 - QUEIMADAS - BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>424</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	30/12/2023
----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	19.650.110/0001-27 <b>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b> RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA Tony F. ... Engenheiro ... CREA-BA: 027.000.177.8	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/UCWK4-QU8EM-G6UBM-HND82>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>426</b>
-----	------------

### ANOTAÇÕES

Período:	01/01/2024
----------	------------

FERIADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável


**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

**ARCO**

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

  
 Tony  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 052.000.577.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/EDBNS-Z3T9M-N72X5-XT3JE>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>427</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	02/01/2024
----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CRP: 052.0.1877.3

19.650.110/0001-27 |  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>428</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

Período:	03/01/2024
----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS  
 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo			
Manhã			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Tarde			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Noite			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:  <div style="text-align: center;">                       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA                      Engenharia                      CREA-BA: 052.C-23773                 </div>	[ 19.650.110/0001-27 ] <b>ARCO CONSTRUÇÕES                  E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b> RUA ALTO DA CHAGRINHA, 25 - CONTORNO [ 48.860-000 - SANTALUZ/BA ] ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--	--





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>429</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período: 04/01/2024
------------------	---------------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:	19.650.110/0001-27 <b>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b> RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO 48.860-000 - QUENEDAS-BA ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>430</b>
-----	------------

### ANOTAÇÕES

Período:	05/01/2024
----------	------------

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

#### ASSINATURAS:

*46*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CREA-BA: 062.0... 77.8

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACARREIA, 25 - CONTORNO  
 48.360-000 - QUEVEDAS/BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	431
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES	Período:	06/01/2024
-----------	----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Engenheiro  
 CREA BA: 0221 - 17.3

19.650.110/0001-277  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 - BARRAGEM  
 44.860-000 QUEIMADAS-BA



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	N°:	432
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período:	07/01/2024
------------------	----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
   
 Engenheiro
   
 CREA-BA: 052.011.077.3

19.650.110/0001-27
   
 ARCO CONSTRUÇÕES
   
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
   
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	433
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>		Período:	08/01/2024
------------------	--	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	434
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período:	09/01/2024
------------------	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

Tony Felix Andrade  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CPEF-BA 12.000.007/11

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 15.636.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	435
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

<b>ANOTAÇÕES</b>	Período:	10/01/2024
------------------	----------	------------

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS  
 CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA  
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREA-BA 032.033.077.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 19.650.110/0001-27  
 ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25, CONDOMÍNIO  
 48.860-000 - QUEMADAS-BA





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EDBNS-Z3T9M-N72X5-XT3JE

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EDBNS-Z3T9M-N72X5-XT3JE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>436</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

Período: 11/01/2024

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
- CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA
- CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
- CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**ASSINATURAS:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: <b>437</b>
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
- CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA
- CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
- CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Período:	12/01/2024
<b>Condição do Tempo</b>	
<b>Manhã</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Tarde</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>Noite</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

<p>_____                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  <i>Tony P. ...</i>                  Engenheiro                  CREMBA 0221/2017.8</p>	<p>_____                  ARCO-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                  19.650.110/0001-27  <b>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                  RUA ALÍO DA CHACRINHA 25 - PORTO REAL                  L. 48.860-000 - OURÉM/BA</p>
---	--

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/554QW-JDPGE-73YBH-NXCNZ>.





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 554QW-JDPGE-73YBH-NXCN2

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/554QW-JDPGE-73YBH-NXCN2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 10ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA, CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

DATA: 10/01/2024

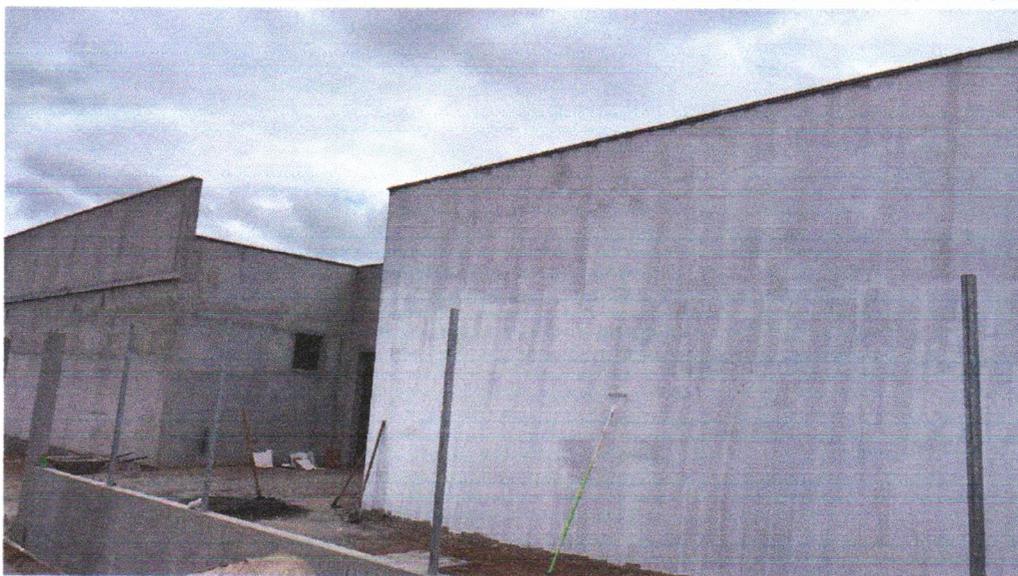


FOTO 111: PINTURA

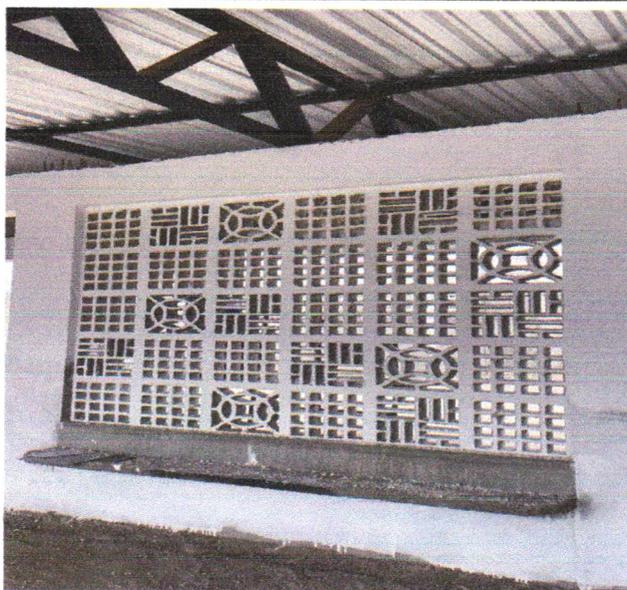


FOTO 112: PINTURA

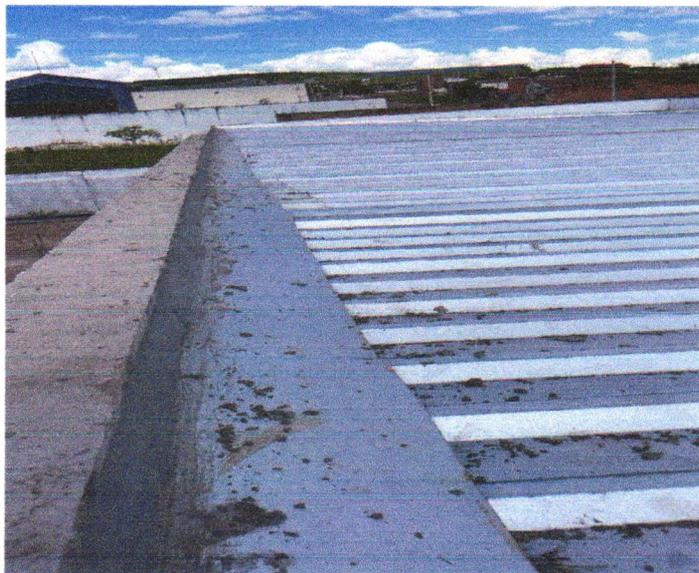



FOTO 113: RUFO




FOTO 114: REGISTRO



**FOTO 115: ASSENTAMENTO KIT PORTA**

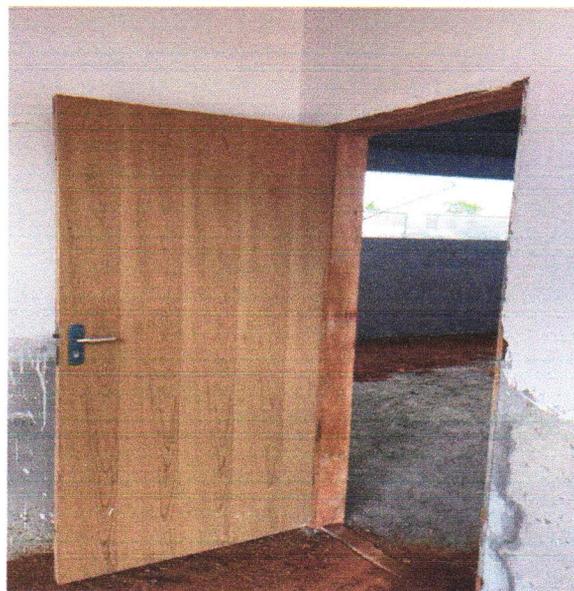


**FOTO 116: ASSENTAMENTO KIT PORTA**

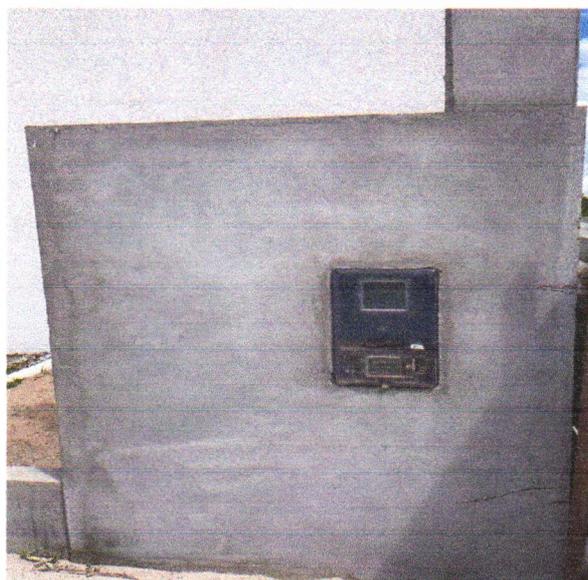


**FOTO 117: QUADRO DE MEDIÇÃO**



**FOTO 118: VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA**

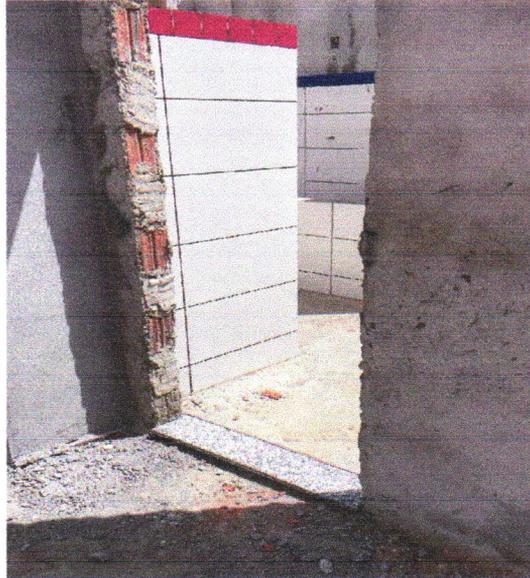

**FOTO 119: SOLEIRA DE GRANITO**

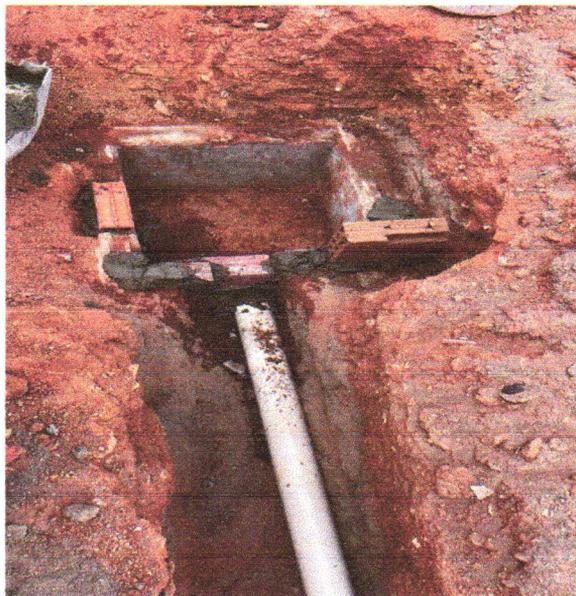

**FOTO 120: LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO**



**FOTO 121: IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA**



**FOTO 122: INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

Tony Felipe Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.093/077.8

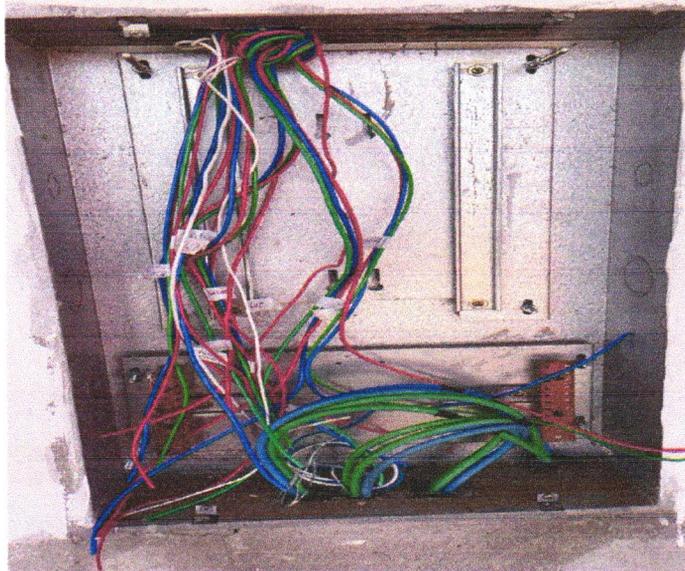


FOTO 123: INSTALAÇÃO ELÉTRICA



FOTO 124: INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Tony F. A. Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 062.053.677.8

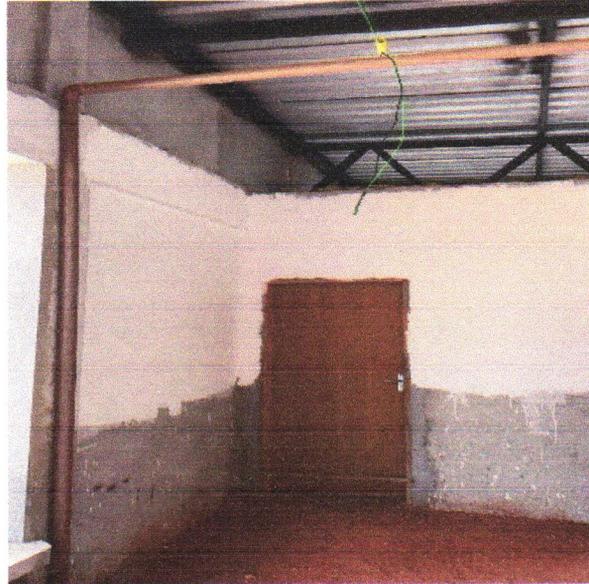


FOTO 125: TUBO PVC SOLDAVEL 60MM

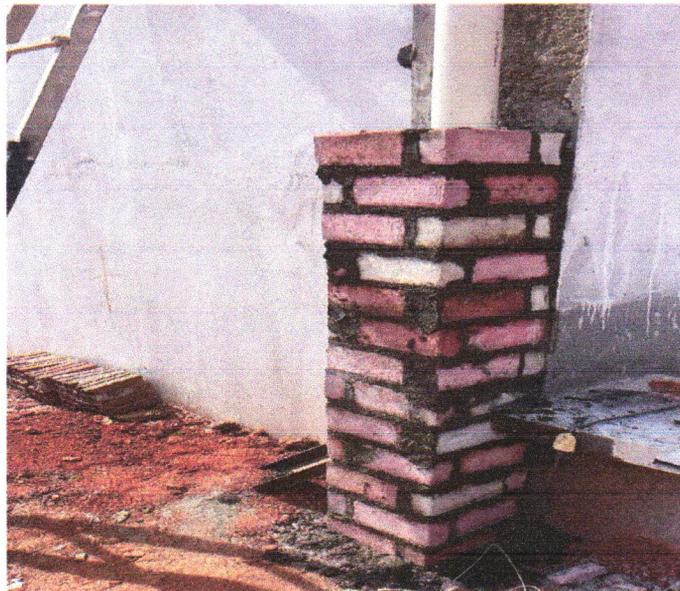


FOTO 126: ASSENTAMENTO TIJOLO MACIÇO

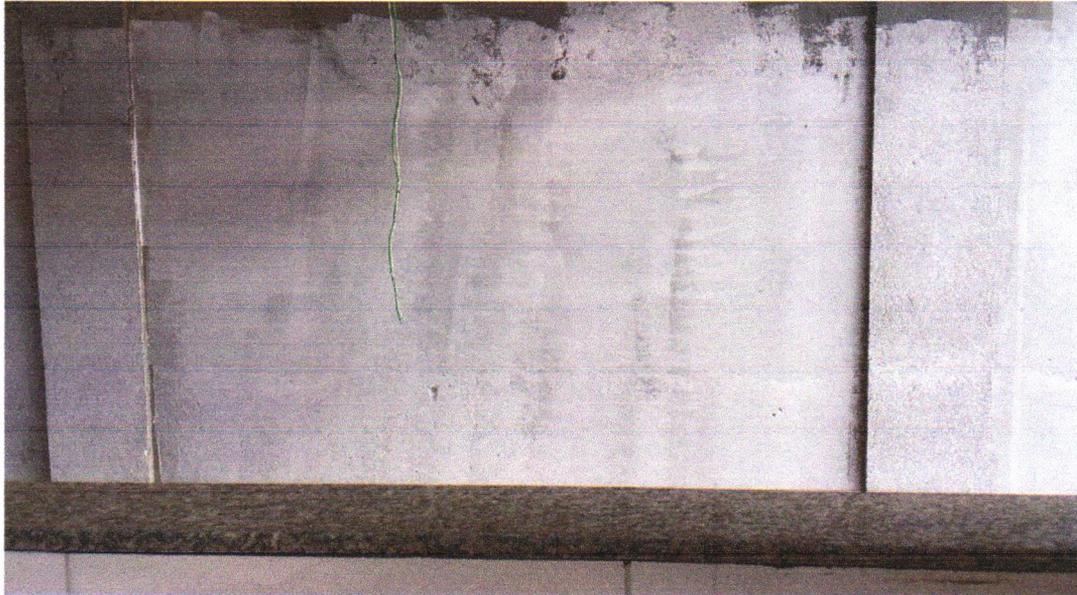


FOTO 127: ASSENTAMENTO PEITORIL



FOTO 128: ABRIGO DE GÁS



**FOTO 129: ELÉTRICA (CAIXA 4X2)**



**FOTO 130: REGISTRO**

47  
Táhy Feijó Andrade  
Engenheiro de Edifícios  
CREA-BA-062.011/17.8



Tony Ferraz de  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.063.877.8

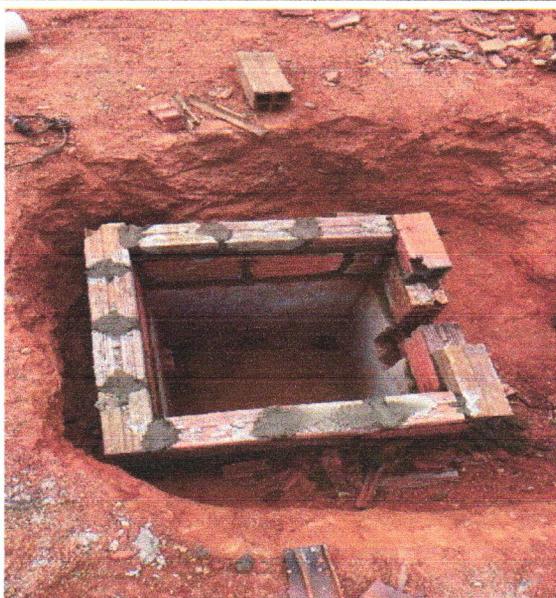


FOTO 133: CAIXA DE GORDURA

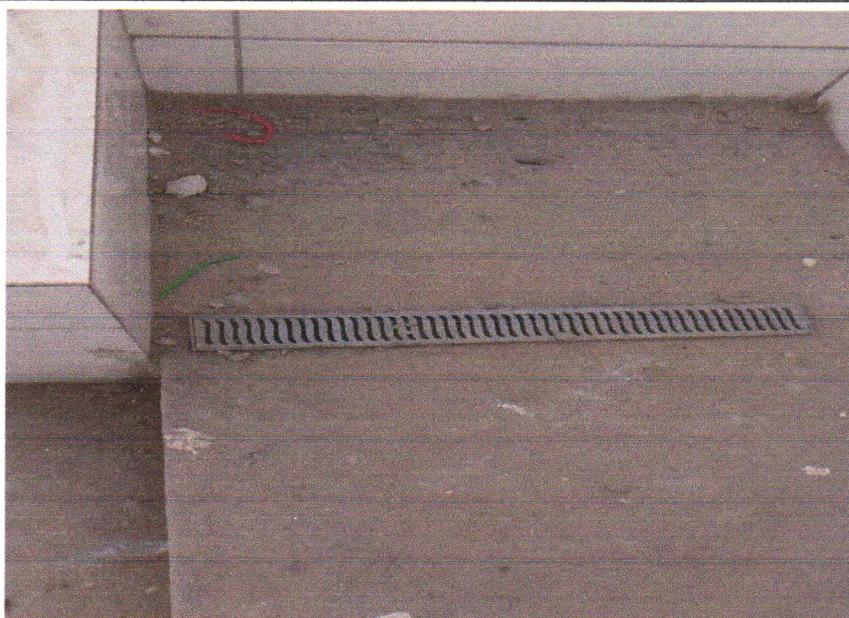


FOTO 134: RALO LINEAR



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FCL6G-RG4YQ-LHLH4-9KWHX

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registroidoveis.org.br/validate/FCL6G-RG4YQ-LHLH4-9KWHX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registroidoveis.org.br/validate>
