



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 491 / 2024 Data do Empenho: 20/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

**FORNECEDOR**

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	1.193.270,17	23.660,36	1.169.609,81
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOA ESCURA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 006-2022RDC, CONTRATO Nº 245-2022. OBRA Nº 094/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 466.

Data do Empenho: 20/05/2024 Data do Liquidação: 20/05/2024

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	1.561,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	283,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	709,81
## Vinte e um mil e cento e cinco reais e cinco centavos ##		
<b>Valor Retido</b>		2.555,31
<b>Valor Líquido</b>		21.105,05

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/05/2024	466	U			23.660,36

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	23.660,36

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2024.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
--	--

**DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA**

EM 21/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 491 / 2024 Data do Empenho: 20/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

**FORNECEDOR**

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)



Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	1.193.270,17	23.660,36	1.169.609,81
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOA ESCURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO Nº006-2022RDC, CONTRATO Nº245-2022.

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	23.660,36	23.660,36

## Vinte e três mil e seiscentos e sessenta reais e trinta e seis centavos ## 23.660,36

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/05/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/05/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
--	---





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 20/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>	
	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>	
	FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>	
	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – LAGOA ESCURA
<b>Processo Licitatório:</b>	RDC 006-2022
<b>Contrato:</b>	245/2022
<b>Processo administrativo:</b>	177/2022
<b>Nº da obra:</b>	094/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b>	466
<b>VALOR DA NOTA:</b>	R\$ 23.660,36
<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b>	01/04/2024 a 30/04/2024
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b>	
	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
<b>CONTA:</b>	AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
	Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO  
JACUÍPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

466

Data e hora de Emissão:

16/05/2024 08:33:41

Código de Verificação:

f6fcd4600d



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 33957361000180  
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUÍPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

16/05/2024  
Assinatura

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

Assinatura  
Engenheiro Civil  
Cred 062008919-7

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE LAGOA ESCURA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/04/2024 Á 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.660,36

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 9.464,14

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 14.196,22

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA


**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.660,36**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>9.464,14</b>	Base de cálculo (R\$): <b>14.196,22</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>709,81</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
--	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>1.561,58</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>283,92</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$): <b>21.105,05</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 05/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396046		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO PEDRO PAULO DA SILVA						NUMERO: 133
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo: 14.196,21	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 709,81	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 709,81		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 21/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 21/05/2024 10:01:50	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 466 - DATA DE EMISSÃO: 16/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	709,81		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	709,81		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000007 . 0      09813906202 . 4      40630010500 . 3      00039604612 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000007 . 0      09813906202 . 4      40630010500 . 3      00039604612 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396046	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 21/05/2024 10:01:50	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	709,81
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	709,81





I.R.R.F

Nº DAM: 396045	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA PEDRO PAULO DA SILVA		NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>		
Base Cálculo: 283,92	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 283,92	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$ 283,92
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>		
DATA LANÇAMENTO: 21/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024
DATA EMISSÃO: 21/05/2024 09:59:58	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 283,92
Valor do Tributo: 283,92	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 283,92	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 283,92	Vlr. Devido com Desconto: 283,92	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 283,92
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e Nº 466 - Data de emissão: 16/05/2024		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000002 . 4      83923906202 . 0      40630010100 . 2      00039604507 . 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000002 . 4      83923906202 . 0      40630010100 . 2      00039604507 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM. 396045	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 21/05/2024 09:59:58	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	283,92
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	283,92



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 1ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$ 23.660,36
Nº DO CONTRATO	OS: 094/2023	02/10/2023
	245/2022	


PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE LAGOA ESCURA

Item	Descrição	Orçamento Sintético					PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%	
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)		
<b>46</b>	<b>OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO LAGOA ESCURA</b>					<b>196.632,84</b>		<b>23.660,36</b>		<b>23.660,36</b>		<b>172.972,50</b>	<b>88%</b>	
<b>46.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>4.226,50</b>		<b>3.501,12</b>		<b>3.501,12</b>		<b>725,39</b>	<b>17%</b>	
46.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.411,64	6	2.411,64	6,00	2.411,64	0,00	0,00	0%	
46.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	80	2,91	3,59	287,20		0,00	0,00	80,00	287,20	100%		
46.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	3,9	27,05	33,41	130,29	1,15	38,42	1,15	38,42	2,75	91,87	71%	
46.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3X KM	39	7,19	8,88	346,32		0,00	0,00	39,00	346,32	100%		
46.1.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	6,57	23,44	28,95	190,20	6,57	190,20	6,57	190,20	0,00	0,00	0%	
46.1.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	1	3,27	4,03	4,03		1	4,03	1,00	4,03	0,00	0%	
46.1.7	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20		194,20	20,00	194,20	0,00	0,00	0%	
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m²	8,30	8,77	10,61	66,87	6,3	66,87	6,30	66,87	0,00	0,00	0%	
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	11,6	14,05	28,09	2	28,09	2,00	28,09	0,00	0,00	0%	
<b>47</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>298,61</b>		<b>298,61</b>		<b>298,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
47.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m³	1,97	122,70	151,58	298,61		1,97	298,61	1,97	298,61	0,00	0%	
<b>48</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>5.358,23</b>		<b>5.358,24</b>		<b>5.358,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
48.1	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	43,8	18,33	22,64	991,63	43,8	991,63	43,80	991,63	0,00	0,00	0%	
48.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	6,57	19,02	23,49	154,32		6,57	154,33	6,57	154,33	0,00	0%	
48.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,22	468,50	578,78	127,33		0,22	127,33	0,22	127,33	0,00	0%	
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af 08/2017	m²	1,15	147,85	179,02	205,87	1,15	205,87	1,15	205,87	0,00	0,00	0%	
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	2,88	20,18	24,43	70,37		2,88	70,37	2,88	70,37	0,00	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	1,15	2.735,20	3.311,92	3.808,71	1,15	3.808,71	1,15	3.808,71	0,00	0,00	0%	
	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>9.472,09</b>		<b>5.597,14</b>		<b>5.597,14</b>		<b>3.874,94</b>	<b>41%</b>	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	0,52	2.735,20	3.311,92	1.722,20	0,52	1.722,20	0,52	1.722,20	0,00	0,00	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	2,34	2.735,20	3.311,92	7.749,89	1,17	3.874,94	1,17	3.874,94	1,17	3.874,94	50%	
<b>49</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					<b>21.940,09</b>		<b>4.700,47</b>		<b>4.700,47</b>		<b>17.239,62</b>	<b>79%</b>	
49.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	53,9	56,93	70,33	3.790,78		0,00	0,00	0,00	53,90	3.790,78	100%	
49.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	238,39	53,42	65,99	15.731,36		71,23	4.700,47	71,23	4.700,47	167,16	11.030,99	70%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	14,60	55,05	66,85	973,07		0,00	0,00	0,00	14,60	973,07	100%	
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	10,00	40,65	49,21	492,12		0,00	0,00	0,00	10,00	492,12	100%	

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-2






	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	14,60	53,90	65,26	952,75		0,00	0,00	0,00	14,60	952,75	100%
<b>50</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					<b>39.495,91</b>		<b>4.204,77</b>		<b>4.204,77</b>		<b>35.291,14</b>	<b>89%</b>
50.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	476,78	8,09	9,99	4.763,03	126,78	1.266,53	126,78	1.266,53	350,00	3.496,50	73%
50.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	496,78	24,58	30,36	15.082,24	96,78	2.938,24	96,78	2.938,24	400,00	12.144,00	81%
50.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	27,26	452,02	558,42	15.222,52		0,00	0,00	0,00	27,26	15.222,52	100%
50.4	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	23	91,04	112,47	2.586,81		0,00	0,00	0,00	23,00	2.586,81	100%
50.5	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48		0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	13,00	71,02	85,99	1.117,83		0,00	0,00	0,00	13,00	1.117,83	100%
	<b>AR-CONDICIONADO</b>					<b>937,28</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>937,28</b>	<b>100%</b>
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52		0,00	0,00	0,00	6,00	38,52	100%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69		0,00	0,00	0,00	6,00	45,69	100%
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	3,00	60,83	73,65	220,94		0,00	0,00	0,00	3,00	220,94	100%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	58,01	70,24	632,13		0,00	0,00	0,00	9,00	632,13	100%
<b>51</b>	<b>PINTURA</b>					<b>19.485,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>19.485,30</b>	<b>100%</b>
51.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	576,83	3,48	4,29	2.474,60		0,00	0,00	0,00	576,83	2.474,60	100%
51.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	576,83	11,48	14,18	8.179,44		0,00	0,00	0,00	576,83	8.179,44	100%
51.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	576,83	12,40	15,31	8.831,26		0,00	0,00	0,00	576,83	8.831,26	100%
<b>52</b>	<b>ESQUADRIA</b>					<b>16.840,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>16.840,46</b>	<b>100%</b>
52.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	3,04	652,93	806,62	2.452,12		0,00	0,00	0,00	3,04	2.452,12	100%
52.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	226,30	279,57	559,14		0,00	0,00	0,00	2,00	559,14	100%
52.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,16	234,77	290,03	3.236,73		0,00	0,00	0,00	11,16	3.236,73	100%
52.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,08	464,29	573,58	619,46		0,00	0,00	0,00	1,08	619,46	100%
52.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08		0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
52.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	890,70	1.100,37	4.401,48		0,00	0,00	0,00	4,00	4.401,48	100%
52.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96		0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	13,60	101,08	122,39	1.664,49		0,00	0,00	0,00	13,60	1.664,49	100%
<b>53</b>	<b>PISO</b>					<b>25.696,28</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>25.696,28</b>	<b>100%</b>
53.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	196,98	49,37	60,99	12.013,81		0,00	0,00	0,00	196,98	12.013,81	100%
53.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	129,34	8,23	10,16	1.314,09		0,00	0,00	0,00	129,34	1.314,09	100%
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m²	128,32	52,08	63,05	8.090,80		0,00	0,00	0,00	128,32	8.090,80	100%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	41,63	72,37	82,72	3.443,76		0,00	0,00	0,00	41,63	3.443,76	100%
	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,50	72,49	87,77	833,82		0,00	0,00	0,00	9,50	833,82	100%
<b>53.3</b>	<b>PISO EXTERNO</b>					<b>2.245,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.245,30</b>	<b>100%</b>
53.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	2,56	712,74	880,51	2.245,30		0,00	0,00	0,00	2,56	2.245,30	100%
<b>54</b>	<b>RAMPA</b>					<b>493,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>493,47</b>	<b>100%</b>
54.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,5	60,24	74,42	111,63		0,00	0,00	0,00	1,50	111,63	100%
54.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3	8,09	9,99	29,97		0,00	0,00	0,00	3,00	29,97	100%
54.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3	24,58	30,36	91,08		0,00	0,00	0,00	3,00	91,08	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



54.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,75	19,02	23,49	17,61		0,00	0,00	0,00	0,75	17,61	100%
54.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3	36,56	45,16	135,48		0,00	0,00	0,00	3,00	135,48	100%
54.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,9	96,87	119,67	107,70		0,00	0,00	0,00	0,90	107,70	100%
<b>55</b>	<b>BANCO E CANTEIRO</b>					<b>1.907,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.907,86</b>	<b>100%</b>
55.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	0,82	12,12	14,97	12,27		0,00	0,00	0,00	0,82	12,27	100%
55.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,12	84,72	104,66	12,55		0,00	0,00	0,00	0,12	12,55	100%
55.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39		0,00	0,00	0,00	3,00	276,39	100%
55.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,55	19,02	23,49	12,91		0,00	0,00	0,00	0,55	12,91	100%
55.5	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,84	60,24	74,42	136,93		0,00	0,00	0,00	1,84	136,93	100%
55.6	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,66	887,83	887,83		0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
55.7	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,67	92,75	114,58	420,50		0,00	0,00	0,00	3,67	420,50	100%
55.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3,68	8,09	9,99	36,76		0,00	0,00	0,00	3,68	36,76	100%
55.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 6MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,68	24,58	30,36	111,72		0,00	0,00	0,00	3,68	111,72	100%
<b>56</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>28.066,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.066,49</b>	<b>100%</b>
56.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,64	77,75	96,05	3.807,42		0,00	0,00	0,00	39,64	3.807,42	100%
56.2	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	m	12,56	45,39	56,07	704,23		0,00	0,00	0,00	12,56	704,23	100%
56.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	27,13	33,51	670,20		0,00	0,00	0,00	20,00	670,20	100%
56.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,47	42,17	52,09	6.483,64		0,00	0,00	0,00	124,47	6.483,64	100%
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,47	26,12	31,82	3.935,62		0,00	0,00	0,00	124,47	3.935,62	100%
56.5	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	11,05	159,93	197,57	2.183,14		0,00	0,00	0,00	11,05	2.183,14	100%
56.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19		0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	100%
<b>57</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>6.050,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.050,56</b>	<b>100%</b>
57.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	13	97,93	120,98	1.572,74		0,00	0,00	0,00	13,00	1.572,74	100%
57.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	23,37	28,87	375,31		0,00	0,00	0,00	13,00	375,31	100%
57.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,82	30,41	486,56		0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%
57.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50		0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
57.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160	2,90	3,58	572,80		0,00	0,00	0,00	160,00	572,80	100%
57.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260	4,20	5,18	1.346,80		0,00	0,00	0,00	260,00	1.346,80	100%
57.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33		0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
57.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10		0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
57.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34		0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
57.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99		0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
57.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	8,78	10,84	867,20		0,00	0,00	0,00	80,00	867,20	100%
57.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00		0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89		0,00	0,00	0,00	2,00	34,89	100%
<b>58</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>10.984,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.984,00</b>	<b>100%</b>
58.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	337,62	417,09	2.502,54		0,00	0,00	0,00	6,00	2.502,54	100%
58.2	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03		0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2

Rankin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea nº 052008919-7



58.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12		0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
58.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22		0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
58.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	35,8	22,36	27,62	988,80		0,00	0,00	0,00	35,80	988,80	100%
58.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	20	22,81	28,17	563,40		0,00	0,00	0,00	20,00	563,40	100%
58.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56		0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
58.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66		0,00	0,00	0,00	6,00	129,66	100%
58.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98		0,00	0,00	0,00	2,00	91,98	100%
58.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66		0,00	0,00	0,00	3,00	72,66	100%
58.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75		0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%
58.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	44,92	56,49	332,94		0,00	0,00	0,00	6,00	332,94	100%
58.13	Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96		0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%
58.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64		0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
58.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10		0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
58.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64		0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
<b>59</b>	<b>SERVICOS FINAIS</b>					<b>1.813,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.813,79</b>	<b>100%</b>
59.1	Limpeza geral	m²	151,8	2,20	2,71	411,37		0,00	0,00	0,00	151,80	411,37	100%
59.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42		0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA  
196.632,84

TOTAL DO PERÍODO  
23.660,36

TOTAL ACUMULADO  
23.660,36

SALDO  
172.972,50

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA 052008919-7



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2024 a 20/05/2024

**Certificação Número:** 2024042102202503646366

Informação obtida em 22/04/2024 13:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20241733768

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:15:45 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **F25A.73D8.AE2F.F86D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão N°: 00000019

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília


EMITIDA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 23/06/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: gLgPfXm7

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 28056491/2024

Expedição: 22/04/2024, às 13:20:58

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	13,96		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	69,83		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 69,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**


<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	465,53		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 465,53		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**


<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	423,60		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	30,66		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 30,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	12,26		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 12,26		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**


<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	18,39		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 18,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,45		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	7,35		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,79		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,79		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	245,30		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 245,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	606,33		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 606,33		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	232,98		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 232,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000228469559
Data/Hora da Transmissão	07/05/2024 10:22:37	Identificação da Apuração de Débitos	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.832,49	3.533,04	4.299,45



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	33.957.361/0001-80
<b>Período de Apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000228469559
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	07/05/2024 10:22:37	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	606,33	606,33	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	232,98	232,98	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	245,30	245,30	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	423,60	423,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	36,79	36,79	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	30,66	30,66	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,45	2,45	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	12,26	12,26	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	18,39	18,39	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	7,35	7,35	0,00

**Obra: 90.011.25370/73**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra: 90.011.25370/73**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	8,65	8,65	0,00

**Obra: 90.014.24417/77**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra: 90.014.24417/77**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	14,42	14,42	0,00



1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	8,65	8,65	0,00

**Obra:** 90.015.29338/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	465,53	465,53	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	69,83	69,83	0,00

**Obra:** 90.015.29338/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	58,19	58,19	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,65	4,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	23,27	23,27	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	34,91	34,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	13,96	13,96	0,00

**Obra:** 90.015.74165/79  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra:** 90.015.74165/79  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	8,65	8,65	0,00



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	33.957.361/0001-80
<b>Nome</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	04/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 839,31	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.236,66	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 457,07	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.533,04	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
<b>CPF</b>	038.768.825-08
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	07/05/2024 10:22:37
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000228469559



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000228469559
Data/Hora da Transmissão	07/05/2024 10:22:37	Identificação da Apuração de Débitos	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CONSELHEIRO ELIEL MARTINS	Número	131
Complemento	CASA TERREO	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7591895303
Correio Eletrônico	ASCN.EGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CPF	03876882508
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO		
CPF	03876882508	CRC	-
UF	-	Telefone	7133220908
Correio Eletrônico	ascn.engenharia@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	58,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	34,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,91		
Saldo a Pagar	0,00		



CPF/CNPJ do Empregador  
33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador  
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124050607372601-9

Tag  
33957361 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/05/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**532,50**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
<b>Total Geral:</b>		<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 12:02:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5adece582aa543c285b68ddc0aaa51885204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630425E9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5adece582aa543c285b68ddc0aaa5188



**Comprovante de pagamento**

07/05/2024 - 08:12:39

 Transação efetuada com sucesso.

Valor original	R\$ 532,50
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Abatimento	R\$ 0,00
Valor	R\$ 532,50
Tarifa	Tarifa cobrada de acordo com <a href="#">Tabela de Tarifas</a> , disponível na Internet

Descrição

Fgts

 **Recebedor**

Nome **Caixa Economica Federal**  
CNPJ 00.360.305/0001-04  
Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
Logradouro SBS QUADRA 4 LT 3/4  
CEP 70092900  
Cidade Brasilia  
UF DF

 **Devedor**

Nome Ascñ Construtora Ltda  
CNPJ 33.957.361/0001-80

 **Pagador**

Nome Ascñ Construtora Ltda  
CNPJ 33.957.361/0001-80  
Instituição BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.



ID/Transação

E07237373202405071111BoI7I5TFIbX

Código de Autenticação

cRUBfebdyKPNIGEehx2c59mlwkMTdm/R7Dg8Qw  
8IYSOjhaQfUKxW73W/kd1kitM5





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
							<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
							<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>90.011.25370/73</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>




### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>90.014.24417/77</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			ENOCK JOSE PEREIRA NETO	14	041.621.565-30	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.015.74165/79</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607372601-9 Emitida por: 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA Data Emissão: 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.011.25370/73											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Estabelecimento		90.011.25370/73	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Estabelecimento: 90.014.24417/77											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Estabelecimento		90.014.24417/77	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Estabelecimento: 90.015.29338/78											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21	
Total do Estabelecimento		90.015.29338/78	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21	
Estabelecimento: 90.015.74165/79											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Estabelecimento		90.015.74165/79	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total da Guia			6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	



**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato à termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.011.25370/73	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
04/2024	90.014.24417/77	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
04/2024	90.015.29338/78	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
04/2024	90.015.74165/79	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total da Guia</b>			<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>




### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
<b>Estabelecimento: 90.011.25370/73</b>										
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.011.25370/73</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Estabelecimento: 90.014.24417/77</b>										
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.014.24417/77</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Estabelecimento: 90.015.29338/78</b>										
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>
<b>Estabelecimento: 90.015.74165/79</b>										
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.74165/79</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total da Guia</b>			<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador


Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
	<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.							CATEGORIA						
CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDO: 1							MAO DE OBRA DIRETA						
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )							Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.							Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇO							Aux. Adm.						
							Mestre de obra						
							Encarregado geral						
							HR DO DIA						
							MAO DE OBRA DIRETA						
							Topografo						
							Auxiliar de topografia						
							Pedreiro						
							Ajudante Geral						
							Calefeiro						
							Carpinteiro						
							Operador de Motosserra						
							Motorista						
							Montador						
							Montador/Eletricista						
							Eletricista						
							Operador de Patrol						
							Operador de Escavadeira						
							Operador de Pá carregadeira						
							Motorista de caçamba						
							Pintor						
							Serralheiro						
							RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES							EFETIVO DO DIA						
							JORNADA DE TRABALHO						
							HR DO DIA						
							HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							TIPO						
							QTD						
							Veículo Leve						
							Caminhão Munck						
							Caminhão Toco						
							Escavadeira						
							Pá carregadeira						
							Caçamba						
							Patrol						
							PC 200						
							Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:							FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/10/2023 a 28/02/2024							Data: 02/10/2023 a 29/02/2024						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHIA - POSTO DE LA GUA ESCURA.									
CONTRATO N° 248/2024		RDC: 005		RDO: 2		CATEGORIA			QTD
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico φ=0,09m - revestida Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01		Gerente de Obra Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia 3 Pedreiro 2 Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES:		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES:		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yucco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 550 Piso Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 01/03/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 01/03/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 052088919-7






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAOJA ESCURA.									
CONTRATO Nº 2462922									
Município	1	RDC: 005	RDO: 3	Nome	3	Q'DE	Q'DE	Q'DE	Q'DE
Composição Unitária:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SMB/COBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
Um lote de alvenaria de bloco cerâmico em 0,80m - revestida									
Um lote em nível de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01									
OBSERVAÇÕES									
Hh DDDIA									
Hh DDDIA									
RESUMO DO EFETIVO									
EFETIVO DO DIA									
JORNADA DE TRABALHO									
Hh DDDIA									
Hh ACOMULADO									
EFETIVO EQUIPAMENTOS									
TIPO									
Veículo Leve									
Caminhão Munck									
Caminhão Pato									
Escavadeira									
Placa carregadora									
Cavadeira									
Pá Carregadeira									
Placa Vibratória									
Fiscalização:									
Data: 02/02/2024									

  
 Franklin de J. Sei.  
 Engenheiro Civil  
 CREA 042/08919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LA GOA ESCURA.											
CONTRATO N° 246/2022		RDC: 006		RDO: 4		CATEGORIA					
Condições climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				HR DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
HR DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Traco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/03/2024				Data: 03/03/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO DE EMPREITA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RFO/OBRA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE  
 OBJETO: SANTA LIZBENHA - POSTO DE LÍDIOA ESCOLA.

CONTRATO N.º 246/2022 RDO: 006  
 Março 1 1 1 1 RDO: Nível 5


SIMBOLOGIA  
 1-Tempo Base 2-Chuva de 1cent. Yva 3-Chuva de 1cent. Yva  
 SERVIÇOS EXECUTIVOS/OCCORRÊNCIAS

Demanda de liberação de horas adicionais em/dia - reatada  
 Demanda a maior de przo em/onda sobre tempo de contrato - Rev 01

CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDETERMINADA	QTD	Dia						
			X	T	Q	Q	S	S	D
ELETIVO PESSOAL									
Engenheiro	1								
Mestre de obra									
Escriturante geral	1								
MÃO DE OBRA DETERMINADA									
Topógrafo									
Ativador de torçães									
Padreiro									
Aparador geral	2								
Carretilha									
Operador de Máquina									
Mobilista									
Montador									
Operador de Máquina									
Operador de Escavadeira									
Operador de P/carrigadeira									
Mobilista de cisternas									
Operário									
Servente									
RESUMO DO EFETIVO									
EFETIVO DIA									
JORNADA DE TRABALHO									
REALIZADO									
OBSERVAÇÕES									
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO: 04.02.2024									
Data: 04.02.2024			Data: 04.02.2024			Data: 04.02.2024			

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051889554-2

  
**J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 0652708919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																		
				S	X	T	Q	Q	S	S	D											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL																		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.																						
CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 006		RDC: 6		CATEGORIA				QTDE										
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				1 - Tempo Bom 2 - Chuva al. cond. Trab. 3 - Chuva al. cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA														
SMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Gerente de Obra		1								
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico $\varnothing$ 0,20m - revestida Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01												Engenheiro		1								
												Téc. de Segurança										
												Aux. Adm.										
												Mestre de obra										
												Encarregado geral										1
				Hh DO DIA																		
				MAO DE OBRA DIRETA																		
				Topografo																		
				Auxiliar de topografia																		
				Pedreiro								2										
				Ajudante Geral								2										
				Canteiro																		
				Carpinteiro																		
				Operador de Motosserra																		
				Motorista																		
				Montador																		
				Montador/Eletricista																		
				Eletricista																		
				Operador de Patrol																		
				Operador de Escavadeira																		
				Operador de Pá carregadeira																		
				Motorista de caçamba																		
				Pintor																		
				Serralheiro																		
				Hh DO DIA																		
				RESUMO DO EFETIVO																		
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA																		
				JORNADA DE TRABALHO																		
				Hh DO DIA																		
				Hh ACUMULADO																		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																		
				TIPO								QTDE										
				Veículo Leve																		
				Caminhão Munck																		
				Caminhão Yoco																		
				Escavadeira																		
				Pá carregadeira																		
				Caçamba																		
				Párol																		
				PC 306																		
				Pílica Vibratória																		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																		
Data: 06/03/2024				Data: 06/03/2024																		


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2


  
**Franklin de J. Sei**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 057008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LA GOA ESCURA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 245/2022 RDC: 005 RDO: 7				CATEGORIA QTD						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1-Tempo Bom 2-Chuva s/ cond. Trab. 3-Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS Demolição de alvenaria de bloco cerâmico esp=0,09m - revestida Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				HR DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Traco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/02/2024				Data: 06/02/2024						

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Franklin de J. Se**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 248/2022      RDC: 005      RDO: 8				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 )      Tarde ( 1 )      Noite ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva al cond. Trab.    3- Chuva al cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Demolição de alvenaria de bloco cerâmico $\approx 0,09m$ - revestida Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017				Engenheiro				1			
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				2			
				Cajoteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				P/C 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/03/2024				Data: 07/03/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Anilton de S. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.													
CONTRATO N° 246/022		RDC: 006		RDO: 9		CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( 9 )						MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
						Téc. de Segurança							1
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico $\varnothing$ 0,20m - revestida Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_132017						Aux. Edm							
						Mestre de obra							1
						Encarregado geral							
						RH DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							2
						Ajudante Geral							
						Calceiro							2
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caixa							
						Pintor							
						Serralheiro							
						RH DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						RH DO DIA							
						RH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							QTD
						Veículo Leve							
						Caminhão Munch							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						P201							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/02/024				Data: 08/02/024									

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2

  
**Franklin de I. Se.**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 0517779919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.													
CONTRATO Nº 245/0022		RDC: 005		RDC: 10		CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva a cond. Trab. 3 - Chuva a cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
						Téc. de Segurança							1
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico esp=0,08m - revestida Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_120017						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							1
						Encargado geral							
						HR DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							2
						Ajudante Geral							
						Caleteiro							2
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						HR DO DIA							
OBSERVAÇÕES						HR ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							QTD.
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncie							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 09/03/024				Data: 09/03/024									

Franklin de F. Se.  
Engenheiro Civil  
Crea 062008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	D						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL												
CONTRATO Nº 246/2022						RDC: 005		RDC: 11										
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						CATEGORIA			QTDE									
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA												
SEM SERVIÇOS						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
						Gerente de Obra												
						Engenheiro												
						Téc. de Segurança												
						Aux. Adm.												
						Mestre de obra												
						Encarregado geral												
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
												EFETIVO DO DIA						
JORNADA DE TRABALHO																		
HR DO DIA																		
OBSERVAÇÕES						HR ACUMULADO												
						EFETIVO EQUIPAMENTOS												
						TIPO												
						QTDE												
						Veículo Leve												
						Caminhão Múncik												
						Caminhão Yoce												
						Escavadeira												
						Pá carregadeira												
						Cajamba												
						Fúro												
						FC 200												
						Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:												
Data: 10/02/2024						Data: 10/02/2024												

*Franklin de J. Sena*  
**Engenheiro Civil**  
 Crea 462068919-7


*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	
				X	S
				T	Q
				Q	S
				S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA. <b>CONTRATO N°:</b> 248/2022			<b>RDC:</b> 005 <b>RDO:</b> 12		
<b>SIMBOLOGIA</b> 1 - Tempo Bom 2 - Chuva of. cond. Trab. 3 - Chuva sf. cond. Trab. Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )			<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>MAO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral		
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. nº_1222017 Demolição de reboco			1 1		
<b>CONSIDERAÇÕES</b>			<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO		
<b>OBSERVAÇÕES</b>			<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória		
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 11/02/2024			<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 11/02/2024		

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - 051888554-2**


  
**Anklín de T. Sena**  
**Engenheiro Civil**  
**C.º 052008919-7**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA. CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDO: 13				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3 - Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA				Q/TDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. sf_12/2017 Demolição de reboco				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				Q/TDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/03/2024				Data: 12/03/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 042008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 246/2022						CATEGORIA						
RDC: 095						Q/DE						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab.						Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS(TOCORRENCIAS)						Engenheiro						
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. sf_132017						Fisc. de Segurança						
Demolição de reboco						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Canteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Mototista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Pánel						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Mototista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Q/DE						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Fevo						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Pánel						
						PC 350						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13032024						Data: 13032024						

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREB. 051188919-7


  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data															
					S	T	Q	Q	S	S	D	X	X	X	X					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.																				
CONTRATO Nº 246/2022					RDO: 005				RDO: 15				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )					MAO DE OBRA INDIRETA															
SIMBOLOGIA: 1-Tempo Bom 2-Chuva d cond. Trab. 3-Chuva d cond. Trab.					Gerente de Obra											1				
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. #_132917 Demolição de reboco					Engenheiro															
					Tec. de Segurança															
					Aux Adm															
					Mestre de obra															
					Encarregado geral											1				
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS					MAO DE OBRA DIRETA															
					Topógrafo															
					Auxiliar de topografia															
					Pedreiro											2				
					Ajudante Geral											2				
					Canteiro															
					Carpinteiro															
					Operador de Motosserra															
					Motofista															
					Montador															
					Montador/Eletricista															
					Eletricista															
					Operador de Patrol															
					Operador de Escavadeira															
					Operador de Pá carregadeira															
					Motofista de caçamba															
					Pintor															
					Serralheiro															
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO										
					EFETIVO DO DIA															
					JORNADA DE TRABALHO															
					HR DO DIA															
OBSERVAÇÕES					HR ACUMULADO															
					EFETIVO EQUIPAMENTOS															
					TIPO											QTDE				
					Veículo Leve															
					Caminhão Muncie															
					Caminhão Yoco															
					Escavadeira															
					Pá carregadeira															
					Caçamba															
Patrol																				
FC 200																				
Picca Vibratória																				
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:															
Data: 14/03/2024					Data: 14/03/2024															

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 051888554-2


Franklin de S. Ser.  
Engenheiro Civil  
C.º 057089919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.											
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 005				RDC: 16			
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA							
SÍMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra 1							
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. nº_122017				Tec. de Segurança							
Demolição de reboco				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD							
				Veículo Leve							
				Caminhão Mercedes							
				Caminhão Yeco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PCC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/03/2024				Data: 15/03/2024							

  
**Franklin de J. S.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 01700019-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.				EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 246/2022		RDC: 005		RDO: 17		CATEGORIA		QTD						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral										
EMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE				Hh O DIA										
				MAO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
				Hh O DIA										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh O DIA										
				Hh ACUMULADO										
				CONSIDERAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Yoco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
				TIP										
				QTD										
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
				Data: 16/02/2024				Data: 16/02/2024						

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Anklir de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				E F E T I V O P E S S O A L										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.														
CONTRATO Nº 246/2022		RDC: 006	RDO: 18	CATEGORIA Q/T/D										
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Nota ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra										
SEM SERVIÇOS				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux. Adm.										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
CONSIDERAÇÕES				HR DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Cajeteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Elétrica										
				Elétrica										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
				OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
EFETIVO DO DIA														
JORNADA DE TRABALHO														
GERENTE DE OBRA:				HR DO DIA										
				HR ACUMULADO										
				FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								VEÍCULO						
								Tipo Q/T/D						
								Veículo Leve						
								Caminhão Munch						
								Caminhão Toco						
								Escavadeira						
								Pá carregadeira						
								Caçamba						
								Patrol						
				Data: 17/03/2024				PC 200						
								Placa Vibratória						

*AAH*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - 051888554-2**

*[Signature]*  
**Franklin de J. Se.**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 057008919-7**





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.												
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 005			RDO: 19					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Base 2- Chuva d'cond. Trab. 3- Chuva d'cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motoquista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motoquista de caçamba								
				Pastor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/02/2024				Data: 18/02/2024								


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
**Franklin de J. Se**  
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA. CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 006 RDO: 20						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.						CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CONCRETO PCK = 20MPA, TRAÇO 1.2,7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO						MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
						MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/03/2024						Data: 19/03/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 111919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 006		RDO: 21		QTD				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
CONCRETO FCK = 30MPa TRACÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO				Aux Adm								
				Mestre de obra								
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas) sf_062017				Encarregado geral 1								
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.												
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Calceiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Petrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTD				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/03/2023				Data: 20/03/2023								

Franklin de J. Sen.  
Engenheiro Civil  
Crea 057000919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LA GOA ESCURA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 005 RDC: 22				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_08/2017 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.				MAO DE OBRA INDIRETA						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra			1			
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			2			
				Ajudante Geral			2			
				Calefeiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/03/2024				Data: 21/03/2024						

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Franklin de J. Sei**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 077000919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA. CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 095 RDO: 23						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas), sf_082017 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM.						Gerente de Obra							
						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							
						Aux. Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calefeiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/03/2024						Data: 22/03/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052008919-7


  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDO: 24						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de formas), al_06/2017 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.						CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
						HR DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncik Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/03/2024						Data: 23/03/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2

  
**Antônio de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 157008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 24632024					RDC: 005			RDC: 26				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite					CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. com. Trab. 3- Chuva sl. com. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇOS					Gerente de Obra							
					Engenheiro							
					Téc. de Segurança							
					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Caleiteiro							
					Capimbeiro							
					Operador de Motosserra							
					Motofista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motofista de caçamba							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							QTDE
					Veículo Leste							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Traco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Antonio Soares Cordeiro Neto					FISCALIZAÇÃO: [Assinatura]							
Data: 24/03/2024					Data: 24/03/2024							


*Franklin de J. Sena*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 062008919-7


*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
					X									
					S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LA GOA ESCURA. CONTRATO N° 246/2022 RDC: 005 RDO: 26					EFTIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.					CATEGORIA					QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS)														
MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1														
MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Píster SerraBreiro														
CONSIDERAÇÕES RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol P/C 200 Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 25/03/2024					Data: 25/03/2024									

  
**Frankir de J. Sena**  
**Engenheiro Civil**  
**C.º 052008919-7**

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - 051888554-2**






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.											
CONTRATO Nº 246/2024				RDC: 005				RDC: 27			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3 - Chuva al cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS).				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				HR DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calefeiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrul							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Fator							
				Serralheiro							
				HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				DURADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
				HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Yeco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrul							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/03/2024				Data: 26/03/2024							

*Franklin de J. Sena*  
**Franklin de J. Sena**  
Engenheiro Civil  
CREA 062008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.													
CONTRATO Nº 246/2022						CATEGORIA							
RDC: 606						QTD							
RDO: 29						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Note ( )						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al.ond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), F						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Padreiro							
						Ajudante Geral							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Metalista							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pa carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pinto							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTD							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pa carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/03/2024						Data: 28/03/2024							

  
**Franklin de L. Sen.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 057008919-7


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.											
CONTRATO Nº 246/2022		RDC: 006		RDO: 30		CATEGORIA			QTD		
Condições climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS).				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motozista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motozista de caçamba							
				Pintor							
				Serraheira							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTD			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Yeco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 29/03/2024		Data: 29/03/2024									

Antônio de J. Ser.  
Engenheiro Civil  
Crea 067008919-7

Antônio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ								Data						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZIANA - POSTO DE LAGOA ESCURA.								E F E T I V O						
CONTRATO Nº 248/022								RDC: 005		RDC: 31		CATEGORIA		
Materia: 1								1 - Terra e Comp. Trab.		2 - Chapa e Comp. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA		
Materia: 2								3 - Chapa e Comp. Trab.		3 - Chapa e Comp. Trab.		QTD		

COMPRESSÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA EDIFICAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZIANA - POSTO DE LAGOA ESCURA. (COMPOSTO POR REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR TERCELA (CASA EM EMPREENDIMENTO).

COMENTÁRIOS	ATIVIDADE	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ATIVIDADES PLANIFICADAS		MATERIAL
						PREVISTO	REALIZADO	
CONSIDERAÇÕES	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					
	RECURSO EFETIVO	DIÁRIO DE TRABALHO	1					

GERENTE DE OBRA: \_\_\_\_\_ FISCALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_

Data: 28/03/2024 Data: 28/03/2024


**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2

*Anklir de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
CREA + 052118919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LA GOA ESCURA. CONTRATO Nº 246/2022 RDO: 005 RDO: 32					S	T	Q	Q	S	S	X	D				
					EFETIVO PESSOAL											
Condições climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite					CATEGORIA		Q'DE									
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva sl cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA											
SEM SERVIÇOS					Gerente de Obra											
					Engenheiro											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Tec. de Segurança											
					Aux. Adm.											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral											
					MÃO DE OBRA DIRETA											
					Topografo											
					Auxiliar de topografia											
					Pedreiro											
					Ajudante Geral											
					Calçeteiro											
					Carpinzeiro											
					Operador de Motosserra											
					Motorista											
					Montador											
					Montador/Eletricista											
					Eletricista											
					Operador de Patrol											
					Operador de Escavadeira											
					Operador de Pá carregadeira											
					Motorista de caçamba											
					Pintor											
					Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					HH DO DIA											
					HH ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO		Q'DE									
					Veículo Leve											
					Caminhão Munch											
					Caminhão Yeco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					P/C 200											
					Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 31/03/2024					Data: 31/03/2024											


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA: 051888554-2


  
**Franklin de J. Ser**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA: 1370009919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LA GOA ESCURA.								
CONTRATO N° 248/2022		RDC: 005		RDC: 33		CATEGORIA		
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )		MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1						
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 2						
		Ajudante Geral 2						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/04/2024		Data: 01/04/2024						

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

  
**Franklin de J. S. B.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0570002710-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.												
CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDC: 34												
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA QTDE								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA								
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X28 CM (ESPESURA)				Gerente de Obra								
				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA				
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro								2				
Ajudante Geral								2				
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTDE
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/04/2024				Data: 02/04/2024								


Franklin de T. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.		EFTIVO PESSOAL						
Condições Climáticas	CONTRATO N° 246/2022 RDC: 006 Note: 36							
SIMBOLOGIA	Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1 - Tempo Bom 2 - Chuva d cond. Trab. 3 - Chuva d cond. Trab.	MAO DE OBRA INDIRETA						
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X28 CM (ESPESURA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS		Hrs DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografa Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Empilhista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toce Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/04/2024		Data: 03/04/2024						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
 Franklin de J. S.  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 0577110919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	X	Q	S	S	D	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 006				RDO: 36				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Nota ( )						CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA								
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESURA						Gerente de Obra								
						Engenheiro								1
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								1
												MÃO DE OBRA DIRETA		
						Topógrafo								
						Auxiliar de topografia								2
						Pedreiro								2
						Ajudante Geral								2
						Calceteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Serralheiro								
						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						HR DO DIA								
						HR ACUMULADO								
						EQUIPAMENTOS								
						TIPO				QTDE				
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Yoco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Fazlo								
						FC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/04/2024						Data: 04/04/2024								

Franklin de J. S.  
Engenheiro Civil  
CREA 052009919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data												
						S	T	Q	Q	X	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						CATEGORIA												
CONTRATO Nº 246/2022						RDC: 006			RDC: 37			MAC DE OBRA INDIRETA						
L. condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAC DE OBRA DIRETA												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X20 CM (ESPESURA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR						Gerente de obra												
						Engenheiro 1												
						Tec. de Segurança												
						Aux. Adm.												
						Mestre de obra												
						Encarregado geral 1												
						HR DO DIA												
						MAC DE OBRA DIRETA												
						Topógrafo												
						Auxiliar de topografia												
						Pedreiro 2												
						Ajudante Geral 2												
						Carpinteiro												
						Operador de Motocerra												
						Motorista												
						Montador												
						Montador/Eletricista												
						Eletricista												
						Operador de Pátio												
						Operador de Escavadeira												
						Operador de Pá carregadeira												
						Motorista de caçamba												
						Pintor												
						Serra-beirô												
						HR DO DIA												
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO												
						EFETIVO DO DIA												
						JORNADA DE TRABALHO												
						HR DO DIA												
						HR ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS												
						TIPO												
						QTDE.												
						Veículo Leve												
						Caminhão Muncie												
						Caminhão Toco												
						Escavadeira												
						Pá carregadeira												
						Caçamba												
						Folhel												
						PC 200												
						Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:												
Data: 05/04/2024						Data: 05/04/2024												

*Franklin de J. Sen.*  
**Franklin de J. Sen.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 052008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	X	S	D				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BÁHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 005						RDC: 38					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						CATEGORIA						QTD					
SIMBOLOGIA						1- Tempo Bom 2- Chuva sl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra						Engenheiro 1					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X28 CM (ESPESURA 10 CM) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM P						Tec. de Segurança						Aux. Adm.					
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM P						Mestre de obra						Encarregado geral 1					
						HH DO DIA											
						MAO DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Auxiliar de topografia						2					
						Pedreiro						2					
						Ajudante Geral						2					
						Carpinteiro											
						Operador de Motosserra											
						Mototista											
						Montador											
						Montador de Iatrica											
						Eleticista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de PI carregadeira											
						Motorista de caminhão											
						Pintor											
						Serralheiro											
						HH DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						HH DO DIA											
						HH ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO E EQUIPAMENTOS											
						TIPO						QTD					
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Yoco											
						Escavadeira											
						PI carregadeira											
						Caminhão											
						Patrol											
						PC 200											
						Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						Data: 06/04/2024					
Data: 06/04/2024																	

*Franklin de S. Sen.*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 22008919-7

*AS*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 246/2022				RDC: 006			RDC: 39			
Condições Climáticas				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
SEM SERVIÇOS				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cajoteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de PL carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO						
				QTD.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Yeco						
				Escavadeira						
				PL carregadeira						
				Cilindros						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/04/2024				Data: 07/04/2024						


  
**Franklin de J. Ser.**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 052008919-7**

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 051888554-2**






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA. CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDO: 41				S	X						
					T	Q	Q	S	S	D	
Condições climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Nota: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3 - Chuva al cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra 1 Encarregado geral 1							
Hh D'O DIA				Hh D'O DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pl carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
Hh D'O DIA				Hh D'O DIA							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh D'O DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA: _____				FISCALIZAÇÃO: _____							
Data: 09/04/2024				Data: 09/04/2024							

  
 Franklin de J. Se  
 Engenheiro Civil  
 CREA 057000919-7


  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
						S	T	X	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.																	
CONTRATO N° 246/2022						RDC: 005		RDO: 42		CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Gerente de Obra											
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X23 CM (ESPESURA 10 CM) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR						Engenheiro 1											
						Téc. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral											
						SOCEIRA EM GRANITO, LARGURA											
						Hh DO DIA											
						MAO DE OBRA DIRETA											
						Topografo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro 2											
						Ajudante Geral 2											
						Calceteiro											
						Capiniano											
						Operador de Motocerra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de PA carregadeira											
						Motorista de caçamba											
						Pintor											
						Serralheiro											
						Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO E EQUIPAMENTOS											
						TIPO				QTDE							
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Yoco											
						Escavadeira											
						PA carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 10/04/2024						Data: 10/04/2024											

  
**Franklin de L. Seixas**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 057118919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.													
CONTRATO Nº 246/2022						CATEGORIA							
RDC: 005						Q TDE							
RDC: 43						MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Engenheiro 1							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X20 CM ESPESURA SERVIÇOS EXECUTADOS 7 OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Cajeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Mentador							
						Mentador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Q TDE							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Yaco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/04/2024						Data: 11/04/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Franklin de J. S.**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA. CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDC: 44						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1-Tempo Bom 2-Chuva al cond. Trab. 3-Chuva al cond. Trab.						CATEGORIA			QTYE				
SIMBOLOGIA						MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR						Engenheiro							
						Encarregado geral							
						Mestre de obra							
						Aux. Adm.							
						Aux. de Segurança							
						Mão de obra							
						Encarregado geral							
						Mão de obra							
						Mão de obra							
						Mão de obra							
HH DO DIA						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Caleteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de P2 carregadeira							
						Motofreta de caçamba							
						Pintor							
Serralheiro													
HH DO DIA						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						HH DO DIA							
						HH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						P2 carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:	
Data: 12/04/2024						Data: 12/04/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2


  
**Franklin de J. Sei**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 262008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.												
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 005		RDO: 45		CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )		1 - Tempo Bom 2 - Chuva d. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X23 CM ESPESURA 12 CM. SERVIÇOS EXECUTADOS TODOS CORRENTES. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR						Engenheiro 1						
						Yer. de Segurança						
						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						HR DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 2						
						Ajudante Geral 2						
						Canteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Metalista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						HR DO DIA						
						HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTD						
						Válculo Leve						
						Caminhão Muncie						
						Caminhão Yoco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/04/2024						Data: 13/04/2024						


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
**Franklin de S. S.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 352008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 246/2022						RDC: 005		RDC: 46		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS						Engenheiro							
						Téc. de Segurança							
						Aux. Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calefeiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
Pintor													
Serralheiro													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						HORAS DE TRABALHO							
						HH DO DIA							
OBSERVAÇÕES						HH ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
P/C 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/04/2024						Data: 14/04/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Franklin de J. Sei**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 160889919-7










RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
						S	T	Q	X	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						CATEGORIA											
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 005		RDC: 50		MAC DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						Gerente de Obra											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva sí cond. Trab. 3- Chuva sí cond. Trab.						Engenheiro											
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19 CM (ESPESSURA 10 CM) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR						Tec. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral											
						Hr DO DIA											
						MAC DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro											
						Ajudante Geral											
						Calceiro											
						Carpinteiro											
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Páteo											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caçamba											
						Pintor											
						Serralheiro											
						Hr DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hr DO DIA											
						Hr ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO											
						QTD											
						Veículo Leve											
						Caminhão Munch											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Páteo											
						Pá 250											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 18/04/2024						Data: 18/04/2024											

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 051888554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data							
										S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.										EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 005 RDC: 51										CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af cond. Trab. 3 - Chuva af cond. Trab.										MAO DE OBRA INDIRETA							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X23 CM ESPESSURA 13 CM E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PR										Gerente de Obra				1			
										Engenheiro							
										Tec. de Segurança							
										Aux. Adm.							
										Mestre de obra							
										Encarregado geral				1			
										HR DO DIA							
MAO DE OBRA DIRETA																	
Topografo																	
Auxiliar de topografia																	
Pedreiro				2													
Ajudante Geral				2													
Calceteiro																	
Carpinteiro																	
Operador de Motosserra																	
Motorista																	
Montador																	
Montador/Eletricista																	
Eletricista																	
Operador de Patrol																	
Operador de Escavadeira																	
Operador de Pa carregadeira																	
Motorista de caçamba																	
Pintor																	
Serralheiro																	
HR DO DIA																	
RESUMO DO EFETIVO																	
EFETIVO DO DIA																	
JORNADA DE TRABALHO																	
HR DO DIA																	
HR ACUMULADO																	
EFETIVO EQUIPAMENTOS																	
TIPO				QTDE													
Veiculo Leve																	
Caminhão Munk																	
Caminhão Toco																	
Escavadeira																	
Pa carregadeira																	
Caçamba																	
Patrol																	
PC 200																	
Placa Vibratória																	
OBSERVAÇÕES																	
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:												
Data: 19/04/2024					Data: 19/04/2024												


  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052008919-7


  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data												
						S	T	Q	Q	S	S	X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ																		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BÁHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL												
CONTRATO Nº 246/2022						RDC: 005		RDC: 53		CATEGORIA			QTD					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva de cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						Gerente de Obra												
SEM SERVIÇOS						Engenheiro												
						Téc. de Segurança												
						Aux. Adm.												
						Mestre de obra												
						Encarregado geral												
						Hr DO DIA												
						MÃO DE OBRA DIRETA												
						Topógrafo												
						Auxiliar de topografia												
						Pedreiro												
						Ajudante Geral												
						Calceiro												
						Carpinteiro												
						Operador de Motosserra												
						Motorista												
						Montador												
						Montador/Eletricista												
						Eletricista												
						Operador de Patrol												
						Operador de Escavadeira												
						Operador de Pa carregadeira												
						Motorista de caçamba												
						Pintor												
						Serralheiro												
Hr DO DIA																		
COMENTÁRIOS						RESUMO DO EFETIVO												
						EFETIVO DO DIA												
						JORNADA DE TRABALHO												
						Hr DO DIA												
OBSERVAÇÕES						Hr ACUMULADO												
												EFETIVO EQUIPAMENTOS						
												TIPO						
						QTD												
						Veículo Leve												
						Caminhão Munk												
						Caminhão Toco												
						Escavadeira												
						Pa carregadeira												
						Caçamba												
						Patrol												
						Pic 200												
						Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:												
Data: 21/04/2024						Data: 21/04/2024												

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Franklin de J. Ser.**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 005		RDO: 05		QTD			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bem 2 - Chuva sf cond. Trab. 3 - Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências				Engenheiro							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESURA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PR				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh/D/DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calculista							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Mote-rista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Mote-rista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh/D/DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh/D/DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/04/2024				Data: 23/04/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 052119919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 246/2022						RDC: 005		RDC: 56		CATEGORIA			QTD
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1-Tempo Bom 2-Chuva af. cond. Trab. 3-Chuva af. cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						Engenheiro							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE						Téc. de Segurança							
						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTD							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munch							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						P/C 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/04/2024						Data: 24/04/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - 051888554-2**


  
**Ankli de J. Se**  
**Engenheiro Civil**  
**CRCB 051118919-7**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	X	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO DE LAGOA ESCURA.															
CONTRATO Nº 246/2022		RDC: 005		RDO: 67		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PR				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux. Adm.											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA: Data: 25/04/2024				FISCALIZAÇÃO:											
								Data: 25/04/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
**Franklin de J. Se**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 057008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 246/2022		RDC: 006		RDO: 58		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PR						Gerente de Obra			1				
						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral			1				
Hh DO DIA													
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro			2				
						Ajudante Geral			2				
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTDE				
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/04/2024						Data: 26/04/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
**Franklin de J. S.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 057119919-7





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 006 RDO: 69				CATEGORIA QTDE							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Nota _____ SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PR				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
OBSERVAÇÕES				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							2
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/04/2024				Data: 27/04/2024							


  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
 Antônio de J. Seixas  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 052008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LA GOA ESCURA.				S	T	Q	Q	S	S	X	
											D
CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDO: 60				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cajeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Fisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/04/2024				Data: 28/04/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
 Franklin de J. Se  
 Engenheiro Civil  
 C: 0570009919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							Data									
							X									
							S	T	Q	Q	S	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO DE LAGOA ESCURA.							EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 005 RDO: 61							CATEGORIA QTDE									
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )							MAO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Engenheiro 1									
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PR							Tec. de Segurança									
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022							Aux Adm									
							Mestre de obra									
							Encarregado geral 1									
							Hh DO DIA									
							MAO DE OBRA DIRETA									
							Topografo									
							Auxiliar de topografia									
							Pedreiro 2									
							Ajudante Geral 2									
							Calceteiro									
							Carpinteiro									
							Operador de Motosserra									
							Motorista									
							Montador									
							Montador/Eletricista									
							Eletricista									
							Operador de Patrol									
							Operador de Escavadeira									
							Operador de Pá carregadeira									
							Motorista de caçamba									
							Pintor									
							Serralheiro									
							Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO									
							EFETIVO DO DIA									
							JORNADA DE TRABALHO									
							Hh DO DIA									
							Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS									
							TIPO QTDE									
							Veículo Leve									
							Caminhão Munc									
							Caminhão Toco									
							Escavadeira									
							Pá carregadeira									
							Caçamba									
							Patrol									
							PC 200									
							Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:							FISCALIZAÇÃO:									
Data: 29/04/2024							Data: 29/04/2024									

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2

  
**Franklin de J. Se...**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 2008919-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO DE LAGOA ESCURA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 246/2022      RDC: 005      RDO: 62				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 )      Tarde ( 1 )      Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PR Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022				Gerente de Obra Engenheiro      1							
				Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral      2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				QTDE			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/04/2024				Data: 30/04/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - 051888554-2**

  
**Franklin de S. Ser**  
**Engenheiro Civil**  
**C.º 2008919-7**



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO LAGOA ESCURA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura



FOTO 01 – Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02\_01/2022



FOTO 02 – Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02\_01/2022

*Franklin de I. Sena*  
 Engenheiro Civil  
 CREA BA 2008919-7


*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA BA 051888554-2

to

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura




**FOTO 03 - Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida**

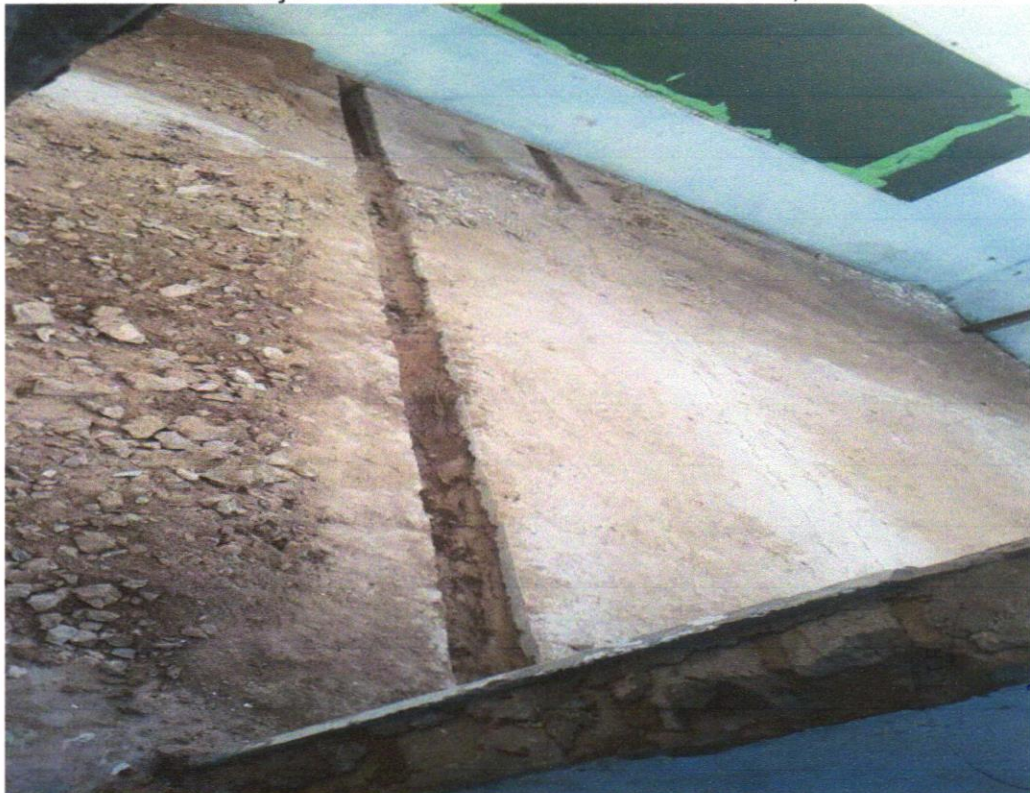

**FOTO 04 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017**

*Franklin de J. Se...*  
Engenheiro Civil  
CREA: 062008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA: 051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura



Foto 5 -Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

  
Franklin de F. Sen.  
Engenheiro Civil  
Crea 062008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188854-2

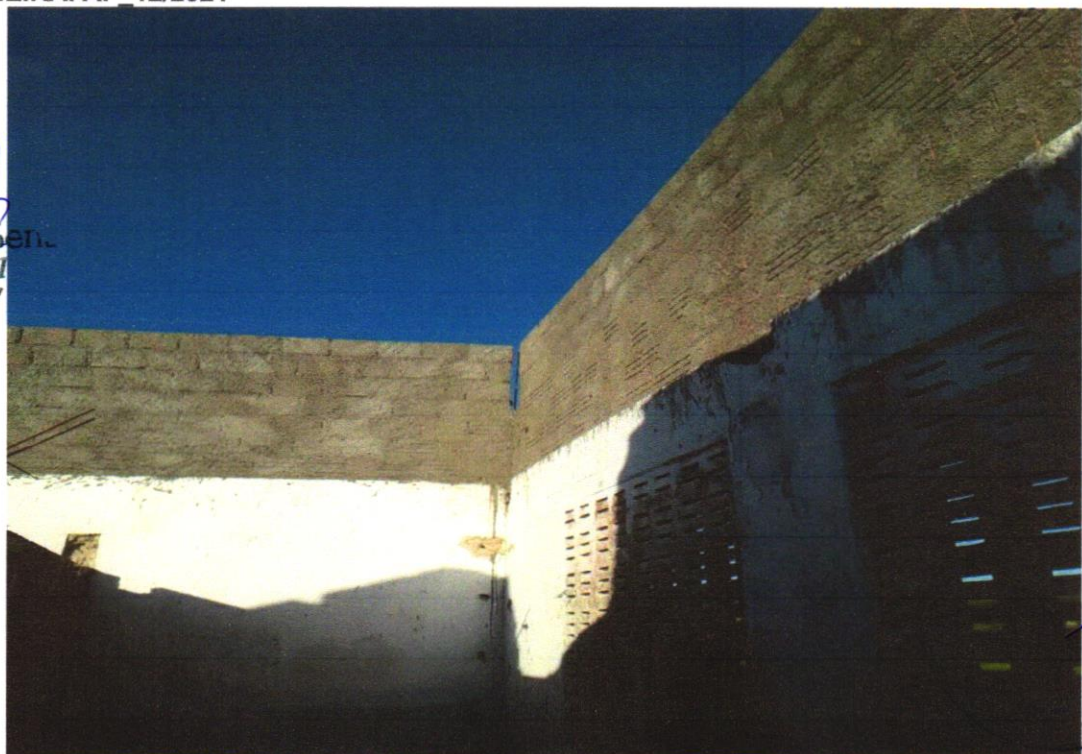


FOTO 06 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura



**Foto 07 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**




*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
CREA 152008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA 15188854-2

**FOTO 08 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**




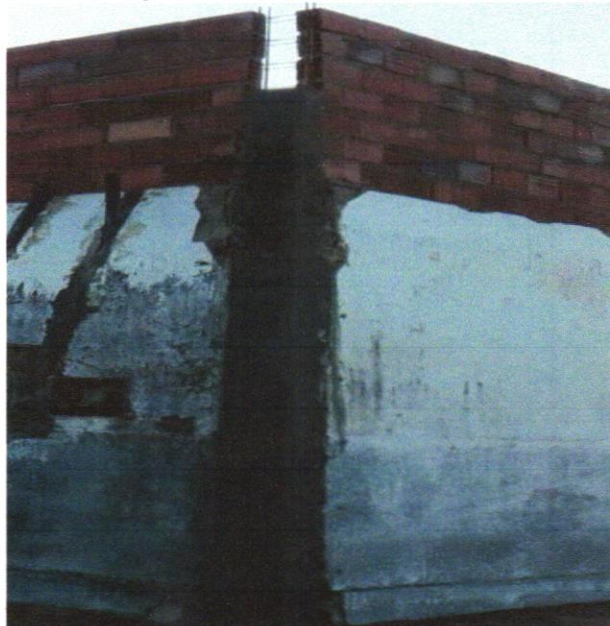
DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura

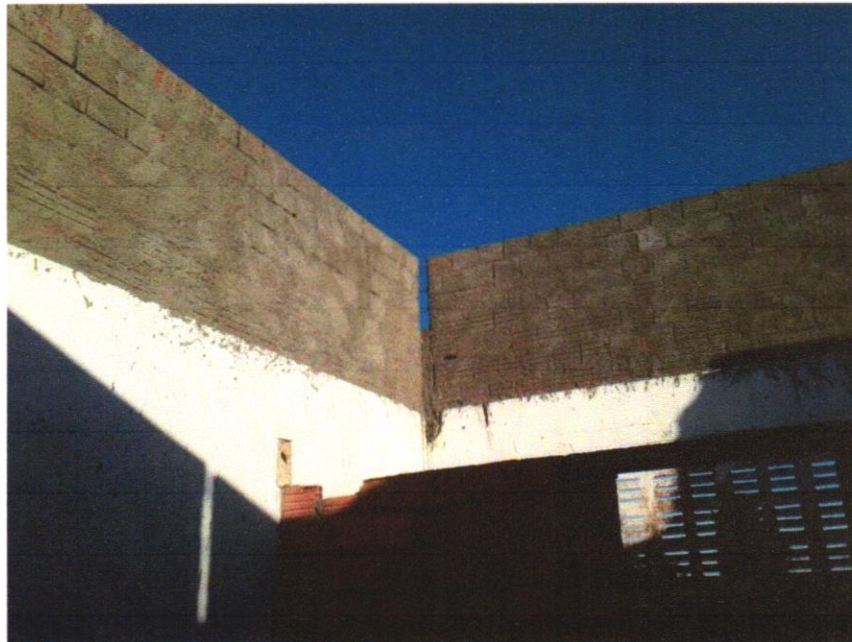

**FOTO 09** – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06

  
Franklin de J. Ser.,  
Engenheiro Civil  
CREA 062008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 1051888554-2



**FOTO 10** – COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura



**FOTO 11 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M<sup>3</sup>/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
C. da 062008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2





**FOTO 12 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M<sup>3</sup>/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura



**FOTO 13 – Demolição de reboco**

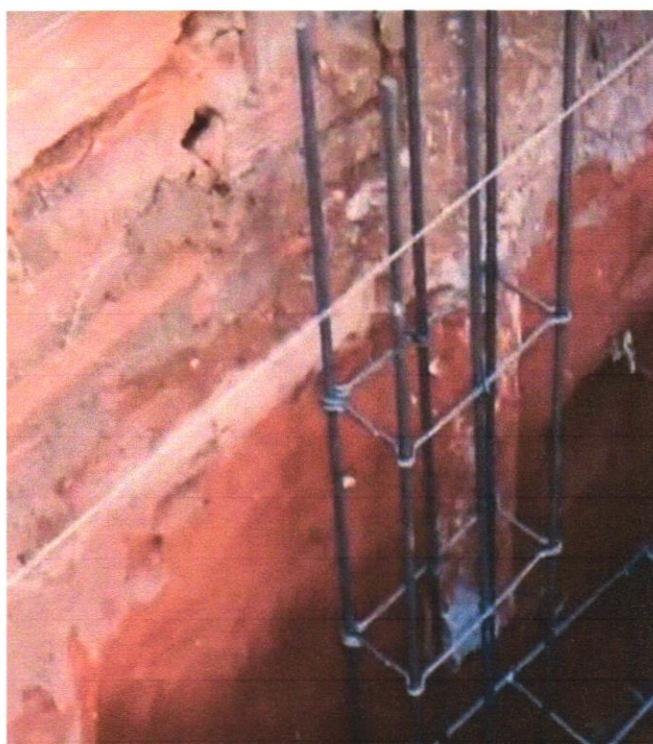

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PA 2008919-7



  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PA 05188854-2

**FOTO 14 - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af\_06/2017**


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura




FOTO 15 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af\_12/2017



FOTO 16 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm

  
Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA 062008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 05188854-2




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Lagoa Escura



**Foto 17 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017**

*Handwritten signature*  
 Franklin de O. Sei  
 Engenheiro Civil  
 CREA 262008919-7

*Handwritten signature*  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

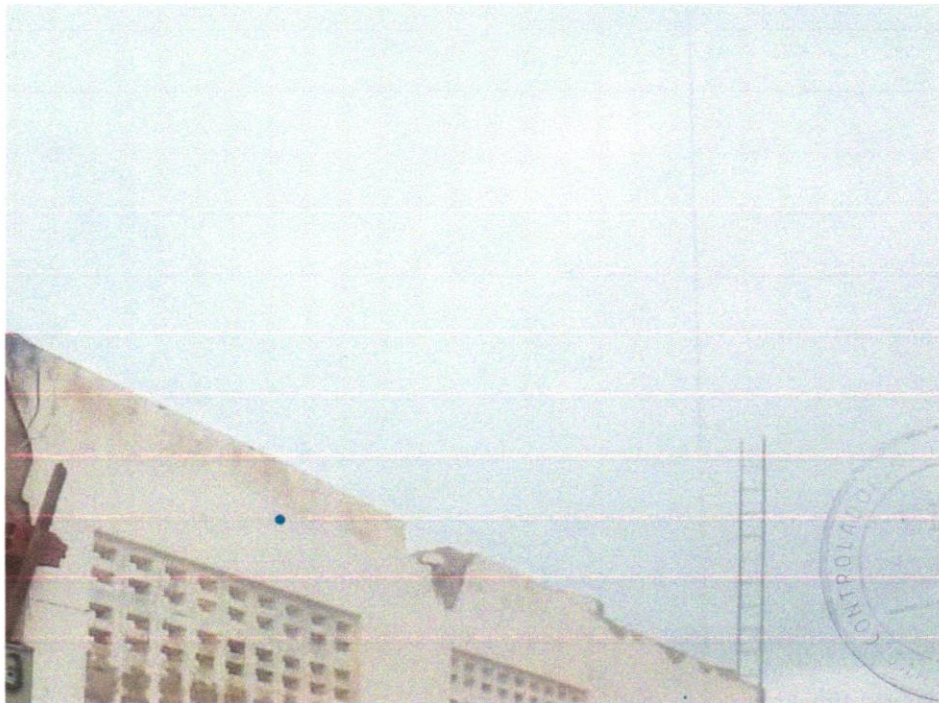

**Foto 18 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017**
