



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LETTAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2024

EMPENHO: 492 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1171 Data do Sub-Empenho: 20/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 20/05/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	1.124.978,37	13.857,58	1.111.120,79
Patrimônio: -			

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE TAPINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DR, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº 097/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 467.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
13.857,58	13.857,58	0,00

Data do Empenho: 20/05/2024

Data do Liquidação: 20/05/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	914,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	166,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	415,73
## Doze mil e trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos ##		Valor Retido 1.496,62
		Valor Líquido 12.360,96

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/05/2024	467	U			13.857,58

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	13.857,58

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2024.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2024, podendo efetuar o pagamento.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Contador(a)  
 Matrícula: 6408

### DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 21/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 20/05/2024

A empresa:


ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – TAPINHA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 097/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 467 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 13.857,58 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2024 a 30/04/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos







**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da nota:

**467**

Data e hora de Emissão:

**16/05/2024 08:37:08**

Código de Verificação:

**489fca6751**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**33957361000180 003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

M 16/05/2024 Assinatura

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**13807870000119 0000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

Franklin de J. Serrão  
Engenheiro Civil  
Crea 062008919-7

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE TAPINHA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/04/2024 Á 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.857,58

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 5.543,03

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 8.314,55

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$13.857,58**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**





Valor total das deduções (R\$): <b>5.543,03</b>	Base de cálculo (R\$): <b>8.314,55</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>415,73</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>914,60</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>166,29</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>12.360,96</b>
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 05/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396047		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NUMERO 133	
COMPLEMENTO			BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUIPE	UF BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santaluz				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
8.314,54	5,000	415,73		415,73		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 21/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 21/05/2024 10:05:43	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 467 - DATA DE EMISSÃO: 16/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	415,73		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	415,73		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8175000004 . 4    15733906202 . 6    40630010500 . 3    00039604712 . 8

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000004 . 4    15733906202 . 6    40630010500 . 3    00039604712 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM 396047	EXERCÍCIO 2024	DATA 21/05/2024 10:05:43	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	415,73
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	415,73







I.R.R.F

Nº DAM: 396044	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA PEDRO PAULO DA SILVA			NUMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE	UF BA
<b>DOCUMENTOS</b>			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>			
CÓDIGO ATIV.: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>			
Base Cálculo: 166,29	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 166,29
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$ 166,29	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>			
DATA LANÇAMENTO: 21/05/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 21/05/2024 09:58:45
			DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$	166,29
Valor do Tributo: 166,29	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 166,29	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 166,29	Vlr. Devido com Desconto: 166,29	(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) VALOR A PAGAR - R\$	166,29
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			
4) NF-e Nº 467 - Data de emissão: 16/05/2024			



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000001 . 3      66293906202 . 9      40630010100 . 2      00039604407 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000001 . 3      66293906202 . 9      40630010100 . 2      00039604407 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM. 396044	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 21/05/2024 09:58:45	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	166,29
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	166,29





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 1ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$	13.857,58
	OS: 097/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022		

PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE TAPINHA

Item	Descrição	Orçamento Sintético				PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%	
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.		Preço total (R\$)
<b>16</b>	<b>OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE TAPINHA</b>					<b>96.412,45</b>		<b>13.857,58</b>		<b>13.857,58</b>		<b>82.554,87</b>	<b>86%</b>
<b>17</b>	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>					<b>5.820,66</b>		<b>5.043,46</b>		<b>5.043,46</b>		<b>577,20</b>	<b>10%</b>
17.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	6	2.979,30	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%
17.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	10	2,91	3,59	35,90	10	35,90	10,00	35,90	0,00	0,00	0%
17.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,5	52,52	64,88	421,72	6,5	421,72	6,50	421,72	0,00	0,00	0%
17.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	65	7,19	8,88	577,20		0,00	0,00	65,00	577,20	100%	
17.5	Demolição de reboco	m²	40	7,86	9,71	388,40	40	388,40	40,00	388,40	0,00	0,00	0%
17.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	31,8	23,44	28,95	920,61	31,8	920,61	31,80	920,61	0,00	0,00	0%
17.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	73,83	3,27	4,03	297,53	73,83	297,53	73,83	297,53	0,00	0,00	0%
<b>18</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>1.043,11</b>		<b>174,32</b>		<b>174,32</b>		<b>868,79</b>	<b>83%</b>
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	1,15	122,70	151,58	174,31	1,15	174,32	1,15	174,32	0,00	-0,01	0%
18.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	7,26	96,87	119,67	868,80		0,00	0,00	7,26	868,80	100%	
<b>19</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>754,09</b>		<b>754,10</b>		<b>754,10</b>		<b>-0,01</b>	<b>0%</b>
19.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	3,83	19,02	23,49	89,96		89,97	3,83	89,97	0,00	-0,01	0%
19.2	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	25,5	18,33	22,64	577,32	25,5	577,32	25,50	577,32	0,00	0,00	0%
19.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,15	468,50	578,78	86,81	0,15	86,82	0,15	86,82	0,00	-0,01	0%
<b>20</b>	<b>ALVENARIA</b>					<b>7.789,54</b>		<b>6.195,89</b>		<b>6.195,89</b>		<b>1.593,65</b>	<b>20%</b>
20.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	31,8	56,93	70,33	2.236,49	31,8	2.236,49	31,80	2.236,49	0,00	0,00	0%
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	84,15	53,42	65,99	5.553,05	60	3.959,40	60,00	3.959,40	24,15	1.593,65	29%
<b>21</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					<b>19.194,16</b>		<b>1.689,80</b>		<b>1.689,80</b>		<b>17.504,36</b>	<b>91%</b>
21.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	178,3	8,09	9,99	1.781,21							
21.2	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,17	452,02	558,42	7.912,81	64,12	640,56	64,12	640,56	114,18	1.140,65	84%
21.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	209,7	24,58	30,36	6.366,49		0,00	0,00		14,17	7.912,81	100%
21.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,65	83,47	103,11	273,24	34,56	1.049,24	34,56	1.049,24	17,91	5.317,29	84%
								0,00	0,00	0,00	2,65	273,24	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7





21.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	19	91,04	112,47	2.136,93	0,00	0,00	0,00	19,00	2.136,93	100%
21.6	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
22	PINTURA	m²	375,83	3,48	4,29	12.895,52	0,00	0,00	0,00	375,83	12.895,52	100%
22.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	375,83	3,48	4,29	1.612,31	0,00	0,00	0,00	375,83	1.612,31	100%
22.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	375,83	11,48	14,18	5.329,26	0,00	0,00	0,00	375,83	5.329,26	100%
22.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	375,83	12,40	15,31	5.753,95	0,00	0,00	0,00	375,83	5.753,95	100%
23	ESQUADRIA	m²	2,52	652,93	806,62	10.721,66	0,00	0,00	0,00	2,52	10.721,66	100%
23.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação - exclusive puxador - Rev 01 - 10/2021	M	1	226,30	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	1,00	279,57	100%
23.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	m²	5,8	234,77	290,03	1.682,17	0,00	0,00	0,00	5,80	1.682,17	100%
23.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,08	464,29	573,58	619,46	0,00	0,00	0,00	1,08	619,46	100%
23.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08	0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
23.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74	0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,74	100%
23.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 90X210. EXCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96	0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
23.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96	0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
24	PISO	m²	114,16	49,37	60,99	7.529,03	0,00	0,00	0,00	114,16	7.529,03	100%
24.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M	55,75	8,23	10,16	6.962,61	0,00	0,00	0,00	55,75	6.962,61	100%
24.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	58,41	8,23	10,16	566,42	0,00	0,00	0,00	58,41	566,42	100%
25	PISO EXTERNO	m²	1,98	712,74	880,51	2.384,90	0,00	0,00	0,00	1,98	2.384,90	100%
25.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	8,62	60,24	74,42	641,50	0,00	0,00	0,00	8,62	641,50	100%
25.2	Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / cal / areia) c/ Junta de 2,0cm - R1	m²	1,16	60,24	74,42	641,50	0,00	0,00	0,00	1,16	641,50	100%
26	CANTEIROS E BANCOS	m²	0,9	12,12	14,97	1.363,80	0,00	0,00	0,00	0,90	1.363,80	100%
26.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF. 05/2018	m²	0,9	12,12	14,97	1.363,80	0,00	0,00	0,00	0,90	1.363,80	100%
26.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,15	84,72	104,66	15,69	0,00	0,00	0,00	0,15	15,69	100%
26.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39	0,00	0,00	0,00	3,00	276,39	100%
26.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	2,82	19,02	23,49	66,24	0,00	0,00	0,00	2,82	66,24	100%
26.5	Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / cal / areia) c/ Junta de 2,0cm - R1	m²	1,4	60,24	74,42	104,18	0,00	0,00	0,00	1,40	104,18	100%
26.6	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
27	COBERTURA	m²	59,4	49,14	60,70	14.533,80	0,00	0,00	0,00	59,40	14.533,80	100%
27.1	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	19,8	77,75	96,05	1.901,79	0,00	0,00	0,00	19,80	1.901,79	100%
27.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	49,38	57,95	71,59	3.535,11	0,00	0,00	0,00	49,38	3.535,11	100%
27.3	Forno de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aratorros ou similar, instalado - Rev.06 - 10/2021	m²	49,38	8,70	10,74	530,34	0,00	0,00	0,00	49,38	530,34	100%
27.4	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1	m	13	45,39	56,07	728,91	0,00	0,00	0,00	13,00	728,91	100%
27.5	Ruífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	m²	9,1	159,93	197,57	1.797,88	0,00	0,00	0,00	9,10	1.797,88	100%
27.6	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19	0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	100%
27.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF. 07/2017	m³	9	97,93	120,98	3.783,22	0,00	0,00	0,00	9,00	3.783,22	100%
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	9	23,37	28,87	259,83	0,00	0,00	0,00	9,00	259,83	100%
28.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	UN	9	23,37	28,87	259,83	0,00	0,00	0,00	9,00	259,83	100%
28.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	11	24,62	30,41	334,51	0,00	0,00	0,00	11,00	334,51	100%
28.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
28.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	70	2,90	3,58	250,60	0,00	0,00	0,00	70,00	250,60	100%
28.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	70	2,90	3,58	250,60	0,00	0,00	0,00	70,00	250,60	100%



Antônio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 C.º nº 36.270.8919-7

Antônio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188855-2



28.6	M	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	120	4,20	5,18	621,60	0,00	0,00	0,00	120,00	621,60	100%
28.7	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
28.8	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
28.9	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
28.10	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
28.11	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40	8,78	10,84	433,60	0,00	0,00	0,00	40,00	433,60	100%
28.12	un	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
29		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>7.435,16</b>					<b>7.435,16</b>	<b>100%</b>
29.1	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4	337,62	417,09	1.668,36	0,00	0,00	0,00	4,00	1.668,36	100%
29.2	un	Torneira de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
29.3	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
29.4	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2	259,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
29.5	M	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30	22,36	27,62	828,60	0,00	0,00	0,00	30,00	828,60	100%
29.6	M	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	10	22,81	28,17	281,70	0,00	0,00	0,00	10,00	281,70	100%
29.7	un	Caixa de descarga de sobrepor completa acros ou similar	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
29.8	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5	9,03	11,15	55,75	0,00	0,00	0,00	5,00	55,75	100%
29.9	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	4	19,61	24,22	96,88	0,00	0,00	0,00	4,00	96,88	100%
29.10	un	Tubo 16,90" de pvc rígido soldável marrom, diâmetro = 25mm	4	9,84	12,15	48,60	0,00	0,00	0,00	4,00	48,60	100%
29.11	UN	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4	44,92	55,49	221,96	0,00	0,00	0,00	4,00	221,96	100%
29.12	un	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15, pessoas (v=900 litros)	1	548,52	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
29.13	UN	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
29.14	un	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
30		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>1.563,80</b>					<b>1.563,80</b>	<b>100%</b>
30.1	m²	Limpeza geral	59,55	2,20	2,71	161,38	0,00	0,00	0,00	59,55	161,38	100%
30.2	un	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

TOTAL DA OBRA 96.412,45

TOTAL DO PERÍODO 13.857,58

TOTAL ACUMULADO 13.857,58

SALDO 82.554,87

VALOR GERAL



*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão Nº: 00000019

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

EMITIDA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 23/06/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: gLgPfxm7

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241733768**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>33.957.361/0001-80</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:15:45 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **F25A.73D8.AE2F.F86D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 28056491/2024

Expedição: 22/04/2024, às 13:20:58

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/05/2024 a 08/06/2024

**Certificação Número:** 2024051020125415952615

Informação obtida em 16/05/2024 07:20:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000228469559
Data/Hora da Transmissão	07/05/2024 10:22:37	Identificação da Apuração de Débitos	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CONSELHEIRO ELIEL MARTINS	Número	131
Complemento	CASA TERREO	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7591895303
Correio Eletrônico	ASCN.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CPF	03876882508
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO		
CPF	03876882508	CRC	-
UF	-	Telefone	7133220908
Correio Eletrônico	ascn.engenharia@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	58,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	34,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,91		
Saldo a Pagar	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	13,96		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	69,83		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 69,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.29338/78	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	465,53		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 465,53		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	423,60		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	30,66		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 30,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	12,26		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 12,26		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	18,39		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 18,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,45		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	7,35		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,79		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,79		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	245,30		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 245,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	606,33		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 606,33		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	232,98		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 232,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000228469559
Data/Hora da Transmissão	07/05/2024 10:22:37	Identificação da Apuração de Débitos	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.832,49	3.533,04	4.299,45



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	33.957.361/0001-80
<b>Período de Apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000228469559
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	07/05/2024 10:22:37	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	606,33	606,33	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	232,98	232,98	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	245,30	245,30	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	423,60	423,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	36,79	36,79	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	30,66	30,66	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,45	2,45	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	12,26	12,26	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	18,39	18,39	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	7,35	7,35	0,00

**Obra: 90.011.25370/73**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra: 90.011.25370/73**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	8,65	8,65	0,00

**Obra: 90.014.24417/77**


**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra: 90.014.24417/77**

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	14,42	14,42	0,00





1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	8,65	8,65	0,00

**Obra:** 90.015.29338/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	465,53	465,53	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	69,83	69,83	0,00

**Obra:** 90.015.29338/78  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	58,19	58,19	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,65	4,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	23,27	23,27	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	34,91	34,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	13,96	13,96	0,00

**Obra:** 90.015.74165/79  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	43,28	43,28	0,00

**Obra:** 90.015.74165/79  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	8,65	8,65	0,00



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	33.957.361/0001-80
<b>Nome</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	04/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	72250701 / Reinf CP 25734396771 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 839,31	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.236,66	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 457,07	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.533,04	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
<b>CPF</b>	038.768.825-08
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	07/05/2024 10:22:37
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000228469559




### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.011.25370/73</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024				GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
									<b>Total do Tomador</b>	Sem Tomador	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
									<b>Total do Estabelecimento</b>	90.014.2441777	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
									<b>Total da Guia</b>		<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024			ENOCK JOSE PEREIRA NETO	14	041.621.565-30	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>
<b>Total da Guia</b>										<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.015.74165/79</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.011.25370/73</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.014.24417/77</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.015.29338/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>

**Estabelecimento:** 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.74165/79</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total da Guia</b>			<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>



**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro da confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.011.25370/73	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
04/2024	90.014.24417/77	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
04/2024	90.015.29338/78	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
04/2024	90.015.74165/79	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total da Guia</b>			<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.011.25370/73</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.014.24417/77</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>

**Estabelecimento:** 90.015.29338/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.29338/78</b>	<b>2.327,68</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,21</b>

**Estabelecimento:** 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.74165/79</b>	<b>1.442,98</b>	<b>115,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,43</b>
<b>Total da Guia</b>			<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607372601-9 **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA **Data Emissão:** 06/05/2024 12:02:01 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	
	<b>Total da Guia</b>	<b>6.656,62</b>	<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>	



CPF/CNPJ do Empregador  
33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador  
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124050607372601-9

Tag  
33957361 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/05/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**532,50**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
<b>Total Geral:</b>		<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 12:02:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5adec582aa543c285b68ddc0aaa51885204000053039865802BR5923CAIXA ECD0001CA.FP000AL6008020111a62070503\*\*\*630425E9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5adec582aa543c285b68ddc0aaa5188





# Comprovante de pagamento

07/05/2024 - 08:12:39

 Transação efetuada com sucesso.

Valor original	R\$ 532,50
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Abatimento	R\$ 0,00
Valor	R\$ 532,50
Tarifa	Tarifa cobrada de acordo com <a href="#">Tabela de Tarifas</a> , disponível na Internet

## Descrição

Fgts

## ↑ Recebedor

Nome **Caixa Economica Federal**  
CNPJ 00.360.305/0001-04  
Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
Logradouro SBS QUADRA 4 LT 3/4  
CEP 70092900  
Cidade Brasilia  
UF DF

## — Devedor

Nome Ascñ Construtora Ltda  
CNPJ 33.957.361/0001-80

## ● Pagador

Nome Ascñ Construtora Ltda  
CNPJ 33.957.361/0001-80  
Instituição BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.



ID/Transação


E07237373202405071111BoI7I5TFIbX


Código de Autenticação

cRUbfeddyKPNIGEehx2c59mlwkMTdm/R7Dg8Qw  
8IYSOjhaQfUKxW73W/kd1kitM5




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - POSTO TAPINHA.						MÃO DE OBRA DIRETA						
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 985		RDD: 1 ao 151		CATEGORIA						
Condições Climáticas		Tempo ( )		Chuva ( )		MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
		3 - Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Téc. de Segurança						
SEM SERVIÇO						Aux. Adm.						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						HR DO DIA						
OBSERVAÇÕES						HR ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Trator						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
PFC 308												
Pisca Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/10/2023 a 29/02/2024						Data: 02/10/2023 a 29/02/2024						

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA.											
CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 005		RDO: 151		CATEGORIA			QTD
Condições climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calefeiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				H/D DIA							
				H/D ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTD
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/02/2024				Data: 29/02/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2


  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Cred. 052008919-7





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	G	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO DE LAGOA ESCURA												
CONTRATO N° 245/2022				RDC: 005		RDC: 102		CATEGORIA				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
				1								
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico $\phi=0,09m$ - revestida				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
Demolição manual de piso cimentado sobre lastra de concreto - Rev 01				Mestre de obra								
				1								
				Encarregado geral								
				HR DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				2								
				Padreiro								
				2								
				Ajudante Geral								
				Carpinteiro								
				Operador de Metoserra								
				Motorista								
				Montador								
				Mantenedor/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Faltas:								
				Sarrafeiro								
				HR DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HR DO DIA								
				HR ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTD								
				Veículo Leve								
				Caminhão Manick								
				Caminhão Traco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				FC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/03/2024				Data: 01/03/2024								

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
**Antonio de J. Sereno**  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062008919-7





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
OBJETO: CONTRATO DE BARRAGEM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAUPANA.									
CONTRATO Nº 2462022	MARCHA	1	1	1	1	1	1	1	1
RDC: 066	TARDE	1	1	1	1	1	1	1	1
RDC: 066	NOITE	154							
1 - Tempo Básico	2 - Chave de cond. Trab.	3 - Chave de cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências									
SEMI SERVIÇOS									
CATEGORIA	MACRO DE OBRA	QUÍDE							
Engenheiro	Gerente de Obra								
Mestre de obra	Mestre de obra								
Encarregado geral	Encarregado geral								
HR DO DIA	HR DO DIA								
Tecnólogo	MAO DE OBRA DIRETA								
Operador de máquina	Operador de máquina								
Ajudante Geral	Ajudante Geral								
Carpinteiro	Carpinteiro								
Operador de Motocerra	Operador de Motocerra								
Montador	Montador								
Mecânico/Elétrica	Mecânico/Elétrica								
Eletricista	Eletricista								
Operador de Páteo	Operador de Páteo								
Operador de Escavadeira	Operador de Escavadeira								
Operador de Caminhão	Operador de Caminhão								
Mecânico de Sinalização	Mecânico de Sinalização								
Pintor	Pintor								
Serralheiro	Serralheiro								
HR DO DIA	HR DO DIA								
RESUMO DO EFETIVO	RESUMO DO EFETIVO								
FORMA DE TRABALHO	FORMA DE TRABALHO								
HR ACUMULADO	HR ACUMULADO								
TIPO	TIPO								
Vacuola Leve	Vacuola Leve								
Caminhão Múnc	Caminhão Múnc								
Caminhão Tccc	Caminhão Tccc								
Escavadeira	Escavadeira								
Carrregadeira	Carrregadeira								
Páteo	Páteo								
PFC 200	PFC 200								
Placa Vibratória	Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:	GERENTE DE OBRA:								
Data: 03/02/2024	Data: 03/02/2024								


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**
  
 Engenheiro Civil
   
 CREA 052008919-7




  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**
  
 Engenheiro Civil
   
 CREA 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 005 RDO: 157				CATEGORIA QTD						
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2016 Demolição manual de piso cimentado sobre lastre de concreto - Rev 01 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA OBRERA DE TRABALHO HN DO DIA HN ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD.						
OBSERVAÇÕES				Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol CPC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/03/2024				Data: 06/03/2024						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea 051888554-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2










RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.													
CONTRATO Nº 2462022		RDC: 005		RDC: 160		CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
						1							
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO						Tec. de Segurança							
						1							
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018						Aux. Adm							
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01						Mestre de obra							
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017						Encargado geral							
						1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						2							
						Ajudante Geral							
						2							
						Caleteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motoleira de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Q/DE							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Trator							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/03/2024						Data: 09/03/2024							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREB 057008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 005			RDC: 162			CATEGORIA		Q/DE	
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS						Engenheiro									
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						Tec. de Segurança									
						Aux Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral									
						Hh DO DIA									
						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Calceiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
						RESUMO DO EFETIVO									
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO		Q/DE							
						Veículo Leve									
						Caminhão Municipal									
						Caminhão Trator									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 11/03/2024						Data: 11/03/2024									

Franklin de J. Ser...  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 2008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 05188854-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 005 RDO: 164				S	T	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				CATEGORIA		QYDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_122021				Gerente de Obra		1				
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
HH DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		2				
				Canteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Furo						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				HH DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HH DO DIA						
				HH ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QYDE				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Pintor						
				PFC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/03/2024				Data: 13/03/2024						

  
 Anklindo J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	X	S	S	D	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 095		RDC: 186		CATEGORIA			QYDE
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra							1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES:				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							2
				Cabeleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
OBSERVAÇÕES:				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operadora Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Data: 14/03/2024				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QYDE
				Veículo Leve							
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
Data: 14/03/2024				Data: 14/03/2024							

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Cred 062008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 095		RDC: 196		CATEGORIA				QTD
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								1
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								2
				Ajudante Geral								2
				Calçateiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTD
				Veículo Leve								
				Caminhão MuncK								
				Caminhão Toce								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/03/2024				Data: 15/03/2024								

  
 Franklin J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Cred. BR 2008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PD51888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 005			RDO: 160			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						CATEGORIA Q1DE						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra						
						Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						HH DO DIA						
OBSERVAÇÕES						HH ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO Q1DE						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Yoco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/03/2024						Data: 17/03/2024						

*Franklin de J. Sena*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 2062008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data												
						S	X	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA.						EFETIVO PESSOAL												
CONTRATO Nº 246/2022 RDO: 006 RDO: 170						CATEGORIA Q/DE												
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA												
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_12/2021						Gerente de Obra												
						Engenheiro 1												
						Tec. de Segurança												
						Aux Adm												
						Mestre de obra												
						Encarregado geral 1												
						Hr DO DIA												
						MÃO DE OBRA DIRETA												
						Topografo												
						Auxiliar de topografia												
						Pedreiro 2												
						Ajudante Geral 2												
						Cajeteiro												
						Carpinteiro												
						Operador de Motosserra												
						Motorista												
						Montador												
Montador/Eletricista																		
Eletricista																		
Operador de Patrol																		
Operador de Escavadeira																		
Operador de Pl carregadeira																		
Motorista de caçamba																		
Pintor																		
Serralheiro																		
Hr DO DIA																		
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO												
						EFETIVO DO DIA												
						JORNADA DE TRABALHO												
						Hr DO DIA												
OBSERVAÇÕES						Hr ACUMULADO												
												EFETIVO EQUIPAMENTOS						
												TIPO Q/DE						
						Veículo Leve												
						Caminhão Munck												
						Caminhão Toco												
						Escavadeira												
						Pl carregadeira												
						Caçamba												
						Patrol												
						PC 200												
						Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:												
Data: 19/03/2024						Data: 19/03/2024												

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	Q	S	S	D						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHÁ						EFETIVO PESSOAL													
CONTRATO Nº 246/2022						CATEGORIA													
RDC: 005						MAO DE OBRA INDIRETA													
RDO: 171						QI DE													
CONDICÕES CENOTÉCICAS: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.						Gerente de Obra													
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021						Engenheiro													
						Tec. de Segurança							1						
						Aux. Adm													
						Mestre de obra													
						Encarregado geral							1						
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA													
						JORNADA DE TRABALHO													
						HR DO DIA													
OBSERVAÇÕES						HR ACUMULADO													
						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO													
						QI DE													
						Veículo Leve													
						Caminhão Munck													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pá carregadeira													
						Cacamba													
						Patrol													
						PC 200													
						Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:													
Data: 20/03/2023						Data: 20/03/2023													

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 005		RDC: 172		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							1
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							2
				Calefeiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motofixa							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de P3 carregadeira											
Motofixa de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTD
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				P3 carregadeira							
				Caçamba							
				Pano							
				P3 300							
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/03/2024				Data: 21/03/2024							

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 362908919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022						CATEGORIA							
RDC: 006						MÃO DE OBRA DIRETA							
RDO: 173						QTDE							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						Gerente de obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						Aux. Adm.							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Canteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						HR DO DIA							
						HR ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munc							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						P3 carregadeira							
						Cajamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/03/2024						Data: 22/03/2024							

  
 Anklir de J. Seix  
 Engenheiro Civil  
 Crec. 157008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 005		RDC: 180		MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Engenheiro 1							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021						Tec. de Segurança							
						SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO	
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/03/2024						Data: 28/03/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 246/2022						CATEGORIA						
RDC: 005						Q/DE						
RDC: 182						MAO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇOS						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Cabeleiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
OBSERVAÇÕES						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caixa						
						Pintor						
						Serralheiro						
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						HH DO DIA						
EFETIVO EQUIPAMENTOS						TIPO						
						Q/DE						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/03/2024						Data: 31/03/2024						

  
 Antonio de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 057008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPUIHA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 005		RDC: 104		CATEGORIA			Q'DE
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva de cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X20 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_12/2021						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						JORNADA DE TRABALHO							
						RH DO DIA							
						RH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
						TIPO			Q'DE				
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Cajamba							
						Patrol							
						P/C 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/04/2024						Data: 02/04/2024							

  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 062008919-7

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	X	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022						CATEGORIA							
RDC: 005						MAO DE OBRA INDIRETA							
RDC: 188						QTD							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva de cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_12/2021						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CORREÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Cajamba							
						Patrol							
						PIC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/04/2024						Data: 06/04/2024							

*(Handwritten Signature)*  
**Franklin de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 Cred 262008919-7

*(Handwritten Signature)*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFTIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 005			RDC: 190			QTD		
Condições Climáticas Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cand. Trab. 3- Chuva al. cand. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calefeiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Faltol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTD								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
Faltol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 08/04/2024				Data: 08/04/2024								

*Franklin de J. Se.*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA Nº 2008919-7

*AS*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA + 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 005      RDO: 191						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014				CATEGORIA      QTDE MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral      1						
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia      2 Pedreiro      2 Ajudante Geral      2 Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO RH DO DIA RH ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Yeco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/04/2024				Data: 09/04/2024						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 062008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 062008919-7





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 005 RDC: 192						EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						CATEGORIA QTD						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014						MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Servente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral SOCEIRA EM GRANITO, LARGURA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Patrel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO RH DO DIA RH ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrel P/C 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/04/2024						Data: 10/04/2024						

  
 Antonio de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 352008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDO: 193		CATEGORIA			QTD		
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MAO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mostra de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa carregadeira											
Motorista de caminhão											
Pintor											
Sarrafeiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caminhão							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/04/2024				Data: 11/04/2024							

  
**Anklir de J. Sena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 1888554-2

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 1888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.													
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 005		RDC: 194		CATEGORIA							
Condições Climáticas		Manhã ( 1 )		Tarde ( 1 )		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA DIRETA							
1 - Tempo Bom 2 - Chuva of. cond. Trab. 3 - Chuva of. cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/0021						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calçateiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
OBSERVAÇÕES						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:						Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Trator							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/04/2024						Data: 12/04/2024							

*Antônio de J. Neto*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 052008919-7

*Antônio de J. Neto*  
**Antônio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 005 RDO: 196						CATEGORIA QTD							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Acz. Alm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
						HR DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de cangamba Pintor Serralheiro							
						HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Yoco Escavadeira Pa carregadeira Cangamba Ffzrel PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/04/2024						Data: 13/04/2024							

  
 Antônio de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO N° 2452022		RDC: 005		RDO: 197		CATEGORIA					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021				Téc. de Segurança							
				Aco. Adm.							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_302514				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				HR DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Cajoteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Moteirista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Moteirista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				HR DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
				HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO/EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Municipal							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/04/2024				Data: 15/04/2024							

  
 Antônio de J. Sr.  
 Engenheiro Civil  
 Crea 352008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	X	S	S	D	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 246/2022						RDC: 005		RDC: 201		CATEGORIA			Q/DE	
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDERETA								
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva of. cond. Trab. 3 - Chuva sí. cond. Trab.						Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						Yei. de Segurança								
						Aux. Adm.							1	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014						Mestre de obra								
						Encarregado geral							1	
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 4MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014						Hh DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topógrafo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro							2	
						Ajudante Geral							2	
						Calceteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Serralheiro								
						Hh DO DIA								
						RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO							Q/DE	
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/04/2024						Data: 19/04/2024								

  
 Franklin de J. Sei.  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
						S	T	Q	Q	S	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.														
CONTRATO Nº 246/2022						RDC: 005		RDC: 202		CATEGORIA				QTD
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						Gerente de Obra							1	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						Téc. de Segurança								
						Aux. Adm.								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_96/2014						Mestre de obra								
						Encarregado geral							1	
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 8MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_96/2014						Hr DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro							2	
						Ajudante Geral							2	
						Caleteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Serralheiro								
						Hr DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hr DO DIA								
						Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO E EQUIPAMENTOS								
						TIPO			QTD					
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Yoco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PFC 200								
						Pisca Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/04/2024						Data: 20/04/2024								

  
 Antônio de J. Ser.  
 Engenheiro Civil  
 Crea 062008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 005		RDO: 203		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )		1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.		Note ( )		MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS						Engenheiro							
						Téc. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO	
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTDE				
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Traco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Cangamba							
Patrol													
Pic 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/04/2024						Data: 21/04/2024							

*Antonio de J. Sen.*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 2008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL			
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 005			RDC: 204			CATEGORIA				QYDE
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra				
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						Engenheiro				1						
						Téc. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral				1						
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014																
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,8 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 8MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014																
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						RH DO DIA										
OBSERVAÇÕES						RH ACUMULADO										
						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO QYDE										
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:						Veículo Leve										
						Caminhão Munch										
						Caminhão Yeco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
P/C 200																
Placa Vibratória																
Data: 22/04/2024						Data: 22/04/2024										

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 Reg. 02719919-7

**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRIHA.													
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		RDC: 005		RDC: 205		CATEGORIA							
Madrugada ( )		Manhã ( 1 )		Tarde ( 1 )		MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra							
1 - Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Téc. de Segurança							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/021						Aux Adm							
						Mestre de obra							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014						Encarregado geral							
						R\$ DO DIA							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calefiteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
Serralheiro													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						R\$ DO DIA							
						R\$ ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncie							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/04/2024						Data: 23/04/2024							

  
 Antônio de J. Sen.  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052008919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	X	Q	S	S	D		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA						EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 246/2024						CATEGORIA								
RDC: 006						MAO DE OBRA INDIRETA								
RDC: 206						QTDE								
C. Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA: 1-Tempo Bom 2-Chuva cf cond. Trab. 3-Chuva cf cond. Trab.						Engenheiro								
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						Téc. de Segurança								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021						Aux. Adm								
						Mestre de obra							1	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014						Encarregado geral							1	
						HR DO DIA								
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,8 M3H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 4MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topógrafo								
CONSIDERAÇÕES						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro							2	
						Ajudante Geral							2	
						Calefeiro								
						Capitaneiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
Serralheiro														
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
GERENTE DE OBRA:						HR DO DIA								
						HR ACUMULADO								
						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
FISCALIZAÇÃO:						TIPO							QTDE	
						Veículo Leve								
						Caminhão Muncie								
						Caminhão Yoco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
Patrol														
Data: 24/04/2024						Data: 24/04/2024								

  
 Franklin de J. Sen.  
 Engenheiro Civil  
 CREA 062188919-7

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.								
CONTRATO Nº 246/2022		RDC: 005		RDO: 208		CATEGORIA		
Manhã ( 1 )		Tarde ( 1 )		Noite		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBÓLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva al cond. Trab.		3 - Chuva al cond. Trab.		
Condições Climáticas		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
Chapim de concreto pré-moldado		Gerente de Obra				Engenheiro		
		Tec. de Segurança				Aux Adm		
		Mestre de obra				Encarregado geral		
						Hh DO DIA		
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pa carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pa carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/04/2024		Data: 26/04/2024						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 05188554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 05188554-2













RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 01 – REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017



  
Franklin de J. Seris  
Engenheiro Civil  
CREA nº 2008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2



FOTO 02 – COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 03 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021

*Franklin de S. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea 062008919-7

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA 1051888554-2

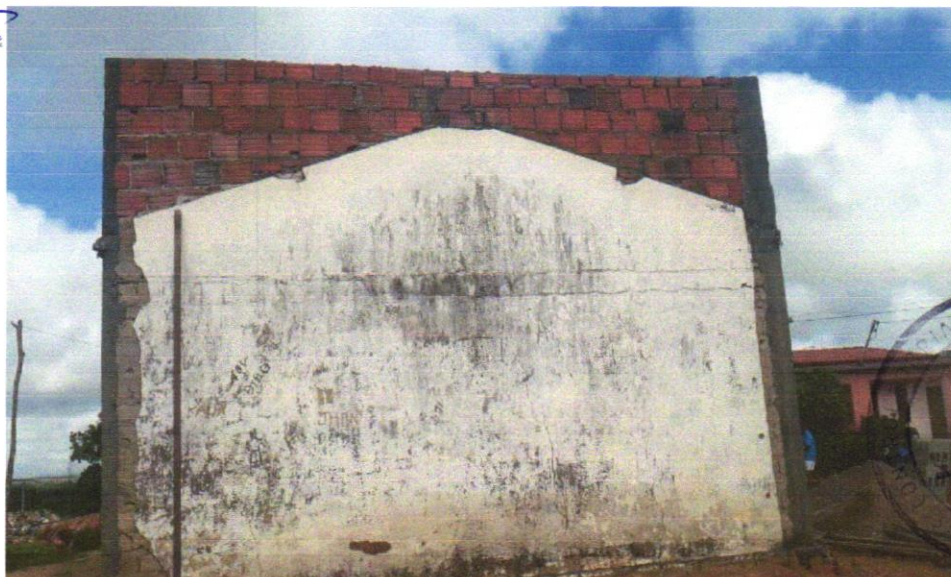


FOTO 04 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 05 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017

*Antonio de J. Se.*  
Engenheiro Civil  
Crea 22008919-7



*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2




FOTO 06 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Foto 07- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

  
Antonio de J. Se...  
Engenheiro Civil  
CREA 052008919-7

  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2



FOTO 08 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 09 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021

*Handwritten signature*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 047000919-7

*Handwritten signature*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188855-2

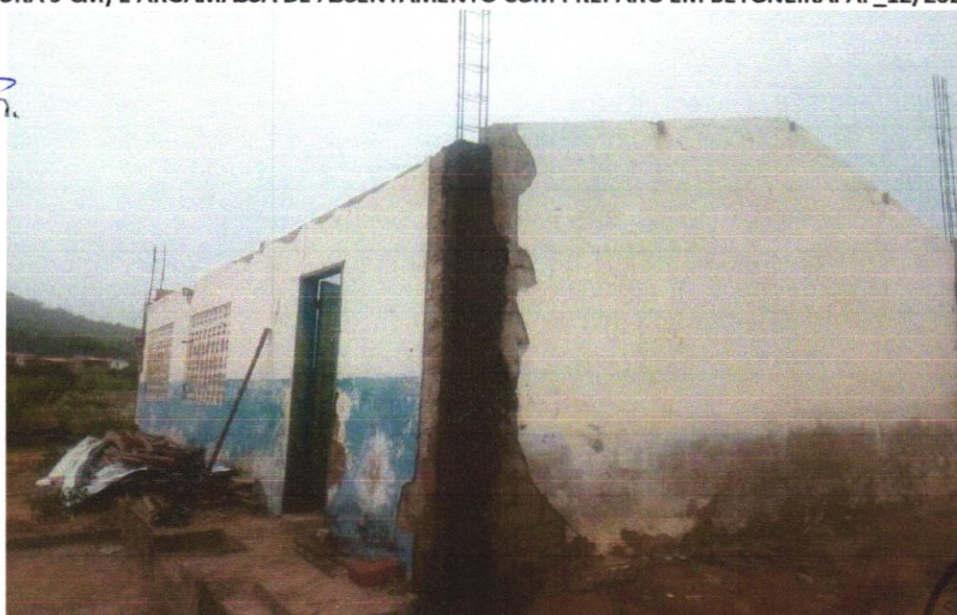


FOTO 10 – COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



**FOTO 11 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014**

*Handwritten signature of Franklin de J. Se...*  
**Franklin de J. Se...**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 062008919-7

*Handwritten signature of Antonio Soares Cordeiro Neto*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



**FOTO 12 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



**FOTO 13 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

*Antônio de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
CREA 2008919-7

*Antônio Soares Cordeiro Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2



**FOTO 14 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017**





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha




FOTO 15 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

*[Handwritten signature]*  
**Vanilda de J. Sêi**  
 Engenheira Civil  
 Crea 052008919-7



*[Handwritten signature]*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2

FOTO 16 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Foto 17 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02\_01/2022

*Antônio de J. Sena*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 00009919-7

*Antônio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



Foto 18 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02\_01/2022





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Foto 19- LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018

*Handwritten signature*  
**Franklin de J. Seixas**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 057008919-7

*Handwritten signature*  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

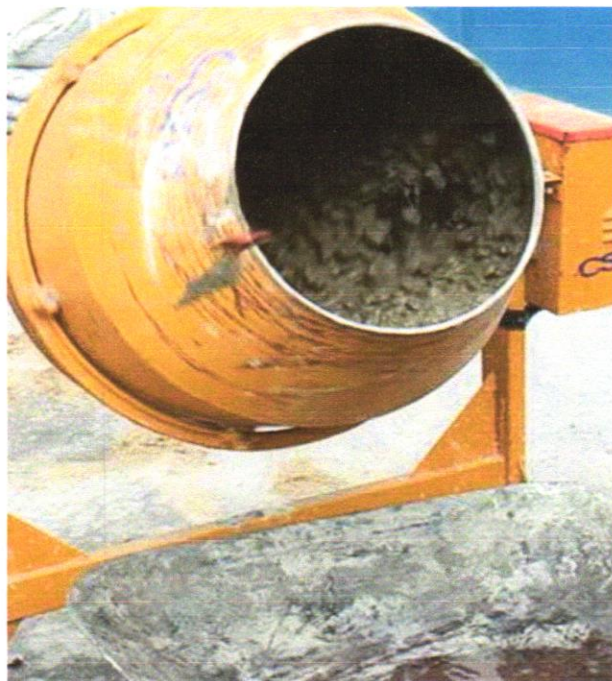


Foto 20 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF\_05/2021

