



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 173 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1346 Data do Sub-Empenho: 29/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R ALTO DA CHACRINHA, 25	Complemento:	CASA
Bairro:	CONTORNO	Cidade:	
CNPJ:	19.650.110/0001-27 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta Corrente:	39975113-4 Agência: 0001	Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Estado:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho:	29/05/2024
Reduzido:	1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função:	12- Educação		
Sub-Função:	365- Educação Infantil		
Programa:	004- EDUCALUZ		
Ação:	1.001- Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil		
Elemento:	4.4.90.51.00- Obras e Instalações		
Fonte:	1542- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.:	008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	255-2022	696.988,20	133.798,91	563.189,29
Patrimônio:						

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC, OBRA Nº 047/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 16. PERÍODO DE MEDIÇÃO 14/05/2024 À 18/05/2024. NFS-e 202416.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	133.798,91	133.798,91	0,00

Data do Empenho: 29/05/2024 Data do Liquidação: 29/05/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542	8.830,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	1.605,59
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	4.013,97
Valor Retido		14.450,29
Valor Líquido		119.348,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	23/05/2024	202416	U			133.798,91
Quantidade: 1					Total:	133.798,91

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	133.798,91

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/05/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/05/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 04/06/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021
SIAFIC -





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 173 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1346 Data do Sub-Empenho: 29/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
 Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
 CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 29/05/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12- Educação
 Sub-Função: 365- Educação Infantil
 Programa: 004- EDUCALUZ
 Ação: 1.001- Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 Elemento: 4.4.90.51.00- Obras e Instalacoes
 Fonte: 1542- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 255-2022	696.988,20	133.798,91	563.189,29
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
133.798,91	133.798,91	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	133.798,91	133.798,91

Cento e trinta e três mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos


133.798,91

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 29/05/2024.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 29/05/2024

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matricula: 6408





PREFEITURA DE QUEIMADAS FLOR PRIMEIRA DO SISAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202416
Data da Competência: Maio/2024
Data e Hora da Emissão: 23/05/2024 17:10:00
Código Verificação: 02F17AFD9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Inscrição Municipal: 154100189
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Inscrição Municipal:
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 255/2022 SENDO 60% SERVIÇOS (RS 80.279,35) E 40% MATERIAIS (RS 53.519,56) PERIODO DE 14/05/2024 A 18/05/2024 BM 16.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
[X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
[] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
[] A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 23.05.2024 Tony Felix Andrade Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.052.179

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 133.798,91

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG

Table with 8 columns: VALOR SERVIÇOS, VALOR DEDUÇÃO, DESC. INCOND, ALÍQUOTA, VALOR ISS, VALOR ISS RETIDO, VALOR PIS, VALOR COFINS, VALOR IR, VALOR INSS, VALOR CSLL, OUTRAS RETENÇÕES, VALOR LÍQUIDO. Includes QR code.

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRITICAS

Table with 6 columns: EXIGIBILIDADE ISS, REGIME TRIBUTAÇÃO, SIMPLES NACIONAL, LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO, LOCAL INCIDÊNCIA, ISS Retido.

Observação: - ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396274	CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: Alto da Chacrinha				NÚMERO: 25
COMPLEMENTO:	BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 19.650.110/0001-27	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 80.279,34	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 4.013,97	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 4.013,97
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 29/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 29/05/2024 09:34:58	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-16 - DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.013,97
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.013,97



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8175000040 . 8 13973906202 . 0 40630010500 . 3 00039627412 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000040 . 8 13973906202 . 0 40630010500 . 3 00039627412 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396274	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 29/05/2024 09:34:58	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.013,97
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.013,97





I.R.R.F

Nº DAM: 396272	CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli	INSCRIÇÃO: 20260	
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA Alto da Chacrinha			NÚMERO: 25
COMPLEMENTO:	BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 19.650.110/0001-27
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Calculo: 1.605,59	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.605,59
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 1.605,59	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 29/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 29/05/2024 09:32:55
			DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.605,59
Valor do Tributo: 1.605,59	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.605,59	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Calculo: 1.605,59	Vlr. Devido com Desconto: 1.605,59	(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2024-16 - Data de emissão: 23/05/2024.		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.605,59



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000016 . 4 05593906202 . 6 40630010100 . 2 00039627207 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000016 . 4 05593906202 . 6 40630010100 . 2 00039627207 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396272	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 29/05/2024 09:32:55	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 20260			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.605,59
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.605,59



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO

Santaluz,23/05/2024

A empresa:


ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ sob nº19.650.110/0001-27

Endereço:

RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25, BAIRRO CENTRO, CIDADE: QUEIMADAS

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Processo Licitatório: RDC: 008/2022
Contrato: 255/2022 Processo administrativo: 215/2022 Nº da obra: 047/2023 Nº da Nota Fiscal (Matricula): 202416 VALOR DA NOTA: R\$ 133.798,91 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/05/2024 A 18/05/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP.
Recurso – FUNDEB

Atenciosamente,



Taty Felix Alves
19/05/2024
021.210.110/0001-27





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 44/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIRELI		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.

Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
25/01/2024

Código de Controle da Certidão:

31680.44.20240125.S302.539

Certidão Válida até:23/07/2024





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:35:52 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **3EC3.10ED.20E0.A98D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241819498

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 29442725/2024
Expedição: 29/04/2024, às 07:53:22
Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27
Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051019444709071772

Informação obtida em 20/05/2024 14:50:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 End.: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 19.650.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022
 P. ADM: 215/2022
 N DA OBRA: 047/2022



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL


OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba

B.D.I.
 23,54%

PERÍODO: 14/05/2024 A 18/05/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO						MEDIÇÃ 16		ACUMULADO		SALDO		%
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SERVICIOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94		R\$ -	6,00	R\$ 2.498,94	0,00	R\$ -	100%
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40		R\$ -	320,00	R\$ 27.654,40	0,00	R\$ -	100%
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76		R\$ -	1,00	R\$ 1.398,76	0,00	R\$ -	100%
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31		R\$ -	1,00	R\$ 1.096,31	0,00	R\$ -	100%
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66		R\$ -	1,00	R\$ 809,66	0,00	R\$ -	100%
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58		R\$ -	2,52	R\$ 2.895,58	0,00	R\$ -	100%
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40		R\$ -	20,00	R\$ 26.245,40	0,00	R\$ -	100%
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42		R\$ -	891,68	R\$ 6.063,42	0,00	R\$ -	100%
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575,00	R\$ 0,23	R\$ 362,25		R\$ -	1575,00	R\$ 362,25	0,00	R\$ -	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							0,00				
2.1	EDIFICAÇÃO							0,00				
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95		R\$ -	713,77	R\$ 75.002,95	0,00	R\$ -	100%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14		R\$ -	174,70	R\$ 15.639,14	0,00	R\$ -	100%
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98		R\$ -	93,47	R\$ 758,98	0,00	R\$ -	100%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09		R\$ -	129,38	R\$ 5.386,09	0,00	R\$ -	100%
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS							0,00				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67		R\$ -	15,68	R\$ 1.403,67	0,00	R\$ -	100%
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62		R\$ -	13,87	R\$ 112,62	0,00	R\$ -	100%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41		R\$ -	11,42	R\$ 475,41	0,00	R\$ -	100%
2.3	CASTELO D'ÁGUA							0,00				
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75		R\$ -	3,65	R\$ 326,75	0,00	R\$ -	100%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30		R\$ -	4,84	R\$ 39,30	0,00	R\$ -	100%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20		R\$ -	1,23	R\$ 51,20	0,00	R\$ -	100%
3	FUNDAÇÕES							0,00				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS							0,00				
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68		R\$ -	46,65	R\$ 1.594,68	0,00	R\$ -	100%
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66		R\$ -	131,71	R\$ 22.145,66	0,00	R\$ -	100%

Tony Fix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.009.677.8




3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	317,20	R\$ 19,21	R\$ 6.092,94	R\$ -	317,20	R\$ 6.092,94	0,00	R\$ -	100%
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	41,25	R\$ 18,03	R\$ 743,85	R\$ -	41,25	R\$ 743,85	0,00	R\$ -	100%
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	366,94	R\$ 16,11	R\$ 5.911,14	R\$ -	366,94	R\$ 5.911,14	0,00	R\$ -	100%
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12.5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	225,00	R\$ 13,58	R\$ 3.055,77	R\$ -	225,00	R\$ 3.055,77	0,00	R\$ -	100%
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 5.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	134,38	R\$ 20,38	R\$ 2.738,12	R\$ -	134,38	R\$ 2.738,12	0,00	R\$ -	100%
3.1.9	CONCRETO BOMBEADO FCK=25 MPA: INCLUIDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,55	R\$ 680,42	R\$ 10.580,53	R\$ -	15,55	R\$ 10.580,53	0,00	R\$ -	100%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00				
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	60,44	R\$ 33,31	R\$ 2.013,26	R\$ -	60,44	R\$ 2.013,26	0,00	R\$ -	100%
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	55,45	R\$ 735,61	R\$ 40.789,57	R\$ -	55,45	R\$ 40.789,57	0,00	R\$ -	100%
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55	R\$ 90,76	R\$ 31.725,16	R\$ -	349,55	R\$ 31.725,16	0,00	R\$ -	100%
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,10	R\$ 17,62	R\$ 11.630,96	R\$ -	660,10	R\$ 11.630,96	0,00	R\$ -	100%
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,60	R\$ 15,65	R\$ 1.777,84	R\$ -	113,60	R\$ 1.777,84	0,00	R\$ -	100%
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,41	R\$ 13,11	R\$ 346,24	R\$ -	26,41	R\$ 346,24	0,00	R\$ -	100%
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,91	R\$ 20,55	R\$ 7.334,50	R\$ -	356,91	R\$ 7.334,50	0,00	R\$ -	100%
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	24,18	R\$ 636,71	R\$ 15.395,65	R\$ -	24,18	R\$ 15.395,65	0,00	R\$ -	100%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA						0,00				
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	R\$ 81,63	R\$ 2.857,05	R\$ -	35,00	R\$ 2.857,05	0,00	R\$ -	100%
3.3.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,38	R\$ 111,90	R\$ -	5,00	R\$ 111,90	0,00	R\$ -	100%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 33,31	R\$ 161,22	R\$ -	4,84	R\$ 161,22	0,00	R\$ -	100%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,40	R\$ 105,02	R\$ 462,09	R\$ -	4,40	R\$ 462,09	0,00	R\$ -	100%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 15,65	R\$ 1.824,95	R\$ -	116,61	R\$ 1.824,95	0,00	R\$ -	100%
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 13,11	R\$ 1.098,36	R\$ -	83,78	R\$ 1.098,36	0,00	R\$ -	100%
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	R\$ 13,30	R\$ 184,47	R\$ -	13,87	R\$ 184,47	0,00	R\$ -	100%
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	R\$ 20,55	R\$ 268,79	R\$ -	13,08	R\$ 268,79	0,00	R\$ -	100%
3.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	13,50	R\$ 645,38	R\$ 8.712,63	R\$ -	13,50	R\$ 8.712,63	0,00	R\$ -	100%
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS						0,00				

Tony Feil Andrade
Engenheiro Civil
CREA RA. 052.000/77.8



3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	R\$ 144,77	R\$ 2.533,48	R\$ -	17,50	R\$ 2.533,48	0,00	R\$ -	100%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 33,31	R\$ 41,64	R\$ -	1,25	R\$ 41,64	0,00	R\$ -	100%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	R\$ 105,02	R\$ 525,10	R\$ -	5,00	R\$ 525,10	0,00	R\$ -	100%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 20,55	R\$ 209,40	R\$ -	10,19	R\$ 209,40	0,00	R\$ -	100%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	0,63	R\$ 645,38	R\$ 406,59	R\$ -	0,63	R\$ 406,59	0,00	R\$ -	100%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME						0,00				
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 33,31	R\$ 403,72	R\$ -	12,12	R\$ 403,72	0,00	R\$ -	100%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	R\$ 735,61	R\$ 831,24	R\$ -	1,13	R\$ 831,24	0,00	R\$ -	100%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	R\$ 90,76	R\$ 4.036,10	R\$ -	44,47	R\$ 4.036,10	0,00	R\$ -	100%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,20	R\$ 17,62	R\$ 1.483,60	R\$ -	84,20	R\$ 1.483,60	0,00	R\$ -	100%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,64	R\$ 645,38	R\$ 2.349,18	R\$ -	3,64	R\$ 2.349,18	0,00	R\$ -	100%
4	SUPERESTRUTURA						0,00				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES						0,00				
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 63,75	R\$ 21.250,43	R\$ -	333,34	R\$ 21.250,43	0,00	R\$ -	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 16,41	R\$ 13.773,41	R\$ -	839,33	R\$ 13.773,41	0,00	R\$ -	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 13,66	R\$ 4.273,94	R\$ -	312,88	R\$ 4.273,94	0,00	R\$ -	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 22,34	R\$ 10.057,91	R\$ -	450,22	R\$ 10.057,91	0,00	R\$ -	100%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 604,92	R\$ 11.039,79	R\$ -	18,25	R\$ 11.039,79	0,00	R\$ -	100%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS						0,00				
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	344,10	R\$ 98,83	R\$ 34.007,40	R\$ -	344,10	R\$ 34.007,40	0,00	R\$ -	100%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 18,65	R\$ 12.605,72	R\$ -	675,91	R\$ 12.605,72	0,00	R\$ -	100%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	R\$ 16,41	R\$ 158,19	R\$ -	9,64	R\$ 158,19	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.005.577.8



4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 13,66	R\$ 4.990,13	R\$ -	365,31	R\$ 4.990,13	0,00	R\$ -	100%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	R\$ 584,99	R\$ 14.361,50	R\$ -	24,55	R\$ 14.361,50	0,00	R\$ -	100%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						0,00				
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	124,12	R\$ 73,23	R\$ 9.089,31	R\$ -	124,12	R\$ 9.089,31	0,00	R\$ -	100%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES						0,00				
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	R\$ 63,75	R\$ 1.147,50	R\$ -	18,00	R\$ 1.147,50	0,00	R\$ -	100%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	R\$ 18,65	R\$ 254,76	R\$ -	13,66	R\$ 254,76	0,00	R\$ -	100%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 22,34	R\$ 981,17	R\$ -	43,92	R\$ 981,17	0,00	R\$ -	100%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	R\$ 604,92	R\$ 459,74	R\$ -	0,76	R\$ 459,74	0,00	R\$ -	100%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE						0,00				
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 63,75	R\$ 1.226,55	R\$ -	19,24	R\$ 1.226,55	0,00	R\$ -	100%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 20,40	R\$ 311,30	R\$ -	15,26	R\$ 311,30	0,00	R\$ -	100%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 18,65	R\$ 362,74	R\$ -	19,45	R\$ 362,74	0,00	R\$ -	100%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 16,41	R\$ 459,64	R\$ -	28,01	R\$ 459,64	0,00	R\$ -	100%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 22,34	R\$ 381,12	R\$ -	17,06	R\$ 381,12	0,00	R\$ -	100%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$ 604,92	R\$ 744,05	R\$ -	1,23	R\$ 744,05	0,00	R\$ -	100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						0,00				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS						0,00				
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$ 145,28	R\$ 886,21	R\$ -	6,10	R\$ 886,21	0,00	R\$ -	100%
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						0,00				
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 58,12	R\$ 33.289,39	R\$ -	572,77	R\$ 33.289,39	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.577.8




5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$ 94,87	R\$ 15.210,51	R\$ -	160,33	R\$ 15.210,51	0,00	R\$ -	100%	
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,91	R\$ 78,32	R\$ 38.917,99	R\$ -	496,91	R\$ 38.917,99	0,00	R\$ -	100%	
5.1.2.4	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$ 102,11	R\$ 992,51	R\$ -	9,72	R\$ 992,51	0,00	R\$ -	100%	
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$ 29,16	R\$ 9.092,09	R\$ -	311,80	R\$ 9.092,09	0,00	R\$ -	100%	
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$ 471,07	R\$ 3.796,82	8,06	R\$ 3.796,82	8,06	R\$ 3.796,82	0,00	R\$ -	100%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$ 195,51	R\$ 703,84	R\$ -	3,60	R\$ 703,84	0,00	R\$ -	100%	
5.3	ALVENARIA DA MURETA							0,00				
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$ 78,32	R\$ 4.930,24	R\$ -	62,95	R\$ 4.930,24	0,00	R\$ -	100%	
6	ESQUADRIAS							0,00				
6.1	PORTAS DE MADEIRA							0,00				
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.091,40	R\$ 6.548,40	R\$ -	6,00	R\$ 6.548,40	0,00	R\$ -	100%	
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 2.019,92	R\$ 6.059,76	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 6.059,76	0%	
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.139,29	R\$ 6.835,74	R\$ -	6,00	R\$ 6.835,74	0,00	R\$ -	100%	
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.139,29	R\$ 9.114,32	R\$ -	8,00	R\$ 9.114,32	0,00	R\$ -	100%	
6.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$ 847,60	R\$ 2.034,24	R\$ -	0,00	R\$ -	2,40	R\$ 2.034,24	0%	
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS							0,00				
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 332,16	R\$ 2.657,28	R\$ -	8,00	R\$ 2.657,28	0,00	R\$ -	100%	
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 57,82	R\$ 231,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 231,28	0%	
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	R\$ 147,23	R\$ 1.884,54	R\$ -	0,00	R\$ -	12,80	R\$ 1.884,54	0%	
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO							0,00				
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	2,10	R\$ 528,40	R\$ 1.109,64	2,10	R\$ 1.109,64	2,10	R\$ 1.109,64	0,00	R\$ -	100%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,68	R\$ 528,40	R\$ 887,71	1,68	R\$ 887,71	1,68	R\$ 887,71	0,00	R\$ -	100%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	3,36	R\$ 528,40	R\$ 1.775,42	3,36	R\$ 1.775,42	3,36	R\$ 1.775,42	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.033/77-8



6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$ 493,20	R\$ 41.172,34	15,00	R\$ 7.398,00	83,48	R\$ 41.172,34	0,00	R\$ -	100%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 638,33	R\$ 1.302,19	2,04	R\$ 1.302,19	2,04	R\$ 1.302,19	0,00	R\$ -	100%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV							0,00				
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	R\$ 1.648,75	R\$ 1.648,75		R\$ -	1,00	R\$ 1.648,75	0,00	R\$ -	100%
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA							0,00				
6.5.1	JA - 01, 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$ 834,69	R\$ 734,53		R\$ -	0,00	R\$ -	0,88	R\$ 734,53	0%
6.5.2	JA - 02, 1,10M X1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	R\$ 834,69	R\$ 1.794,58		R\$ -	0,00	R\$ -	2,15	R\$ 1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03, 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	R\$ 478,30	R\$ 770,06	1,61	R\$ 770,06	1,61	R\$ 770,06	0,00	R\$ -	100%
6.5.4	JA - 04, 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	R\$ 834,69	R\$ 2.278,70		R\$ -	0,00	R\$ -	2,73	R\$ 2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05, 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 478,30	R\$ 1.033,13	2,16	R\$ 1.033,13	2,16	R\$ 1.033,13	0,00	R\$ -	100%
6.5.6	JA - 06, 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	1,05	R\$ 493,69	1,05	R\$ 493,69	0,00	R\$ -	100%
6.5.7	JA - 07, 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	R\$ 470,18	R\$ 5.924,27	12,60	R\$ 5.924,27	12,60	R\$ 5.924,27	0,00	R\$ -	100%
6.5.8	JA - 08, 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	R\$ 470,18	R\$ 3.949,51	8,40	R\$ 3.949,51	8,40	R\$ 3.949,51	0,00	R\$ -	100%
6.5.9	JA - 09, 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	R\$ 470,18	R\$ 2.962,13	6,30	R\$ 2.962,13	6,30	R\$ 2.962,13	0,00	R\$ -	100%
6.5.10	JA - 10, 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	1,05	R\$ 493,69	1,05	R\$ 493,69	0,00	R\$ -	100%
6.5.11	JA - 11, 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	R\$ 470,18	R\$ 2.468,45	5,25	R\$ 2.468,45	5,25	R\$ 2.468,45	0,00	R\$ -	100%
6.5.12	JA - 12, 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20	R\$ 470,18	R\$ 1.974,76	4,20	R\$ 1.974,76	4,20	R\$ 1.974,76	0,00	R\$ -	100%
6.5.13	JA - 13, 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80	R\$ 470,18	R\$ 7.899,02	16,80	R\$ 7.899,02	16,80	R\$ 7.899,02	0,00	R\$ -	100%
6.5.14	JA - 14, 1,60MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,72	R\$ 478,30	R\$ 1.300,98		R\$ -	2,72	R\$ 1.300,98	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
 Proprietário
 C.P.F. 052.111.178




6.5.15	Tela de nylon para proteção-fixada na esquadria	m²	10,28	R\$ 33,05	R\$ 339,75		R\$ -	0,00	R\$ -	10,28	R\$ 339,75	0%
6.6	VIDROS							0,00				
6.6.1	JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,33	R\$ 225,10	R\$ 3.000,58		R\$ -	13,33	R\$ 3.000,58	0,00	R\$ -	100%
6.6.2	BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,20	R\$ 350,96	R\$ 2.526,91		R\$ -	0,00	R\$ -	7,20	R\$ 2.526,91	0%
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,50	R\$ 706,17	R\$ 5.296,28	7,50	R\$ 5.296,28	7,50	R\$ 5.296,28	0,00	R\$ -	100%
6.6.4	INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P" FACHADA"	m²	68,22	R\$ 433,72	R\$ 29.588,38		R\$ -	0,00	R\$ -	68,22	R\$ 29.588,38	0%
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO							0,00				
6.7.1	GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA	m²	95,08	R\$ 346,12	R\$ 32.909,09		R\$ -	95,08	R\$ 32.909,09	0,00	R\$ -	100%
6.7.2	Gradil telado para substaco, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m²	6,72	R\$ 346,12	R\$ 2.325,93		R\$ -	6,72	R\$ 2.325,93	0,00	R\$ -	100%
7	SISTEMAS DE COBERTURA							0,00				
7.1.1	Estrutura Metlica p/ Cobertura c/Vigas-Trelia Pratt e teras em UDC 127, 2 guas, sem lanternim, vos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	965,43	R\$ 223,07	R\$ 215.358,47		R\$ -	965,43	R\$ 215.358,47	0,00	R\$ -	100%
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METLICA TERMOACSTICA E = 30 MM, COM AT 2 GUAS, INCLUSIVE IAMENTO. AF_07/2019	m²	965,41	R\$ 261,07	R\$ 252.039,59		R\$ -	965,41	R\$ 252.039,59	0,00	R\$ -	100%
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AO GALVANIZADO NMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	95,15	R\$ 105,47	R\$ 10.035,47		R\$ -	95,15	R\$ 10.035,47	0,00	R\$ -	100%
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AO GALVANIZADO NMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,60	R\$ 61,43	R\$ 5.749,85		R\$ -	93,60	R\$ 5.749,85	0,00	R\$ -	100%
7.1.5	RUFO EM CHAPA DE AO GALVANIZADO NMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,70	R\$ 61,43	R\$ 2.807,35		R\$ -	45,70	R\$ 2.807,35	0,00	R\$ -	100%
7.1.6	RUFO EM CHAPA DE AO GALVANIZADO NMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	167,85	R\$ 61,43	R\$ 10.311,03		R\$ -	167,85	R\$ 10.311,03	0,00	R\$ -	100%
7.1.7	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,60	R\$ 46,68	R\$ 10.904,45		R\$ -	233,60	R\$ 10.904,45	0,00	R\$ -	100%
7.1.8	Revestimento metlico em alumnio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metlica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem	m²	51,96	R\$ 493,50	R\$ 25.642,26		R\$ -	0,00	R\$ -	51,96	R\$ 25.642,26	0%
8	IMPERMEABILIZACO							0,00				
8.1	IMPERMEABILIZACO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	394,06	R\$ 14,65	R\$ 5.772,98		R\$ -	394,06	R\$ 5.772,98	0,00	R\$ -	100%
8.2	IMPERMEABILIZACO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	125,46	R\$ 55,81	R\$ 7.001,92		R\$ -	125,46	R\$ 7.001,92	0,00	R\$ -	100%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							0,00				
9.1	EDIFICACO							0,00				
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2569,60	R\$ 5,23	R\$ 13.439,01		R\$ -	2569,60	R\$ 13.439,01	0,00	R\$ -	100%
9.1.2	EMBOO, PARA RECEBIMENTO DE CERMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM REA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1589,78	R\$ 37,28	R\$ 59.267,00		R\$ -	1589,78	R\$ 59.267,00	0,00	R\$ -	100%
9.1.3	EMBOO OU MASSA NICA EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENA DE VOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	979,82	R\$ 44,69	R\$ 43.788,16		R\$ -	979,82	R\$ 43.788,16	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA. 05266-0/77.8



9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$ 25,48	R\$ 26.111,14		R\$ -	1024,77	R\$ 26.111,14	0,00	R\$ -	100%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	376,80	R\$ 66,26	R\$ 24.966,77		R\$ -	376,80	R\$ 24.966,77	0,00	R\$ -	100%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, excludive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	176,57	R\$ 58,34	R\$ 10.301,09		R\$ -	120,96	R\$ 7.056,81	55,61	R\$ 3.244,29	69%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, excludive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	33,90	R\$ 58,34	R\$ 1.977,73		R\$ -	20,90	R\$ 1.219,31	13,00	R\$ 758,42	62%
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$ 21,40	R\$ 2.722,08		R\$ -	127,20	R\$ 2.722,08	0,00	R\$ -	100%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	965,43	R\$ 56,16	R\$ 54.218,55		R\$ -	965,43	R\$ 54.218,55	0,00	R\$ -	100%
9.2	MURETA							0,00				
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 5,23	R\$ 512,80		R\$ -	98,05	R\$ 512,80	0,00	R\$ -	100%
9.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 37,28	R\$ 3.655,30		R\$ -	98,05	R\$ 3.655,30	0,00	R\$ -	100%
10	SISTEMAS DE PISOS							0,00				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							0,00				
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	R\$ 43,59	R\$ 17.801,28	204,00	R\$ 8.892,36	408,38	R\$ 17.801,28	0,00	R\$ -	100%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	R\$ 34,15	R\$ 4.444,96	73,36	R\$ 2.505,24	130,16	R\$ 4.444,96	0,00	R\$ -	100%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	668,14	R\$ 40,27	R\$ 26.906,00	611,34	R\$ 24.618,66	668,14	R\$ 26.906,00	0,00	R\$ -	100%
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$ 61,18	R\$ 2.289,36		R\$ -	0,00	R\$ -	37,42	R\$ 2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$ 50,09	R\$ 7.460,91		R\$ -	148,95	R\$ 7.460,91	0,00	R\$ -	100%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,90	R\$ 88,67	R\$ 3.803,94		R\$ -	42,90	R\$ 3.803,94	0,00	R\$ -	100%
10.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	R\$ 16,14	R\$ 1.097,52		R\$ -	68,00	R\$ 1.097,52	0,00	R\$ -	100%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	R\$ 65,45	R\$ 3.498,30		R\$ -	53,45	R\$ 3.498,30	0,00	R\$ -	100%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	R\$ 94,54	R\$ 165,45		R\$ -	1,75	R\$ 165,45	0,00	R\$ -	100%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							0,00				
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	R\$ 138,78	R\$ 35.361,14	70,13	R\$ 9.732,64	254,80	R\$ 35.361,14	0,00	R\$ -	100%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,38	R\$ 455,75	R\$ 7.920,94		R\$ -	17,38	R\$ 7.920,94	0,00	R\$ -	100%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	905,92	R\$ 71,35	R\$ 64.637,39		R\$ -	656,97	R\$ 46.874,8	248,95	R\$ 17.762,58	73%

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 032.046.778




10.2.4	DIRECIONAL -PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,50	R\$ 120,42	R\$ 903,15		R\$ -	0,00	R\$ -	7,50	R\$ 903,15	0%
10.2.5	ALERTA - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	R\$ 120,42	R\$ 587,65		R\$ -	0,00	R\$ -	4,88	R\$ 587,65	0%
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	m²	21,96	R\$ 10,67	R\$ 234,31		R\$ -	21,96	R\$ 234,31	0,00	R\$ -	100%
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	R\$ 13,15	R\$ 4.534,25		R\$ -	0,00	R\$ -	344,81	R\$ 4.534,25	0%
10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	30,21	R\$ 35,61	R\$ 1.075,78		R\$ -	30,21	R\$ 1.075,78	0,00	R\$ -	100%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS							0,00				
11.1	EDIFICAÇÃO							0,00				
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2004,59	R\$ 20,91	R\$ 41.915,98		R\$ -	2004,59	R\$ 41.916,03	0,00	R\$ 0,00	100%
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1902,96	R\$ 15,46	R\$ 29.419,76		R\$ -	1511,40	R\$ 23.366,24	391,56	R\$ 6.053,52	79%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	965,43	R\$ 14,66	R\$ 14.153,20		R\$ -	965,43	R\$ 14.153,20	0,00	R\$ -	100%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	965,43	R\$ 14,73	R\$ 14.220,78		R\$ -	826,77	R\$ 12.178,32	138,66	R\$ 2.042,46	86%
11.1.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$ 31,05	R\$ 3.838,09	123,61	R\$ 3.838,09	123,61	R\$ 3.838,09	0,00	R\$ -	100%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	R\$ 26,77	R\$ 11.276,33	421,23	R\$ 11.276,33	421,23	R\$ 11.276,33	0,00	R\$ -	100%
11.1.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$ 30,95	R\$ 393,68	12,72	R\$ 393,68	12,72	R\$ 393,68	0,00	R\$ -	100%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92	172,13	R\$ 4.607,92	172,13	R\$ 4.607,92	0,00	R\$ -	100%
11.1.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$ 54,20	R\$ 5.508,35		R\$ -	0,00	R\$ -	101,63	R\$ 5.508,35	0%
11.1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92	172,13	R\$ 4.607,92	172,13	R\$ 4.607,92	0,00	R\$ -	100%
11.2	MURETA							0,00				
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,05	R\$ 20,91	R\$ 2.050,23		R\$ -	98,05	R\$ 2.050,23	0,00	R\$ -	100%
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 15,46	R\$ 1.515,85		R\$ -	98,05	R\$ 1.515,85	0,00	R\$ -	100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							0,00				
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO							0,00				
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,60	R\$ 9,10	R\$ 251,16		R\$ -	27,60	R\$ 251,16	0,00	R\$ -	100%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,90	R\$ 5,76	R\$ 961,34		R\$ -	166,90	R\$ 961,34	0,00	R\$ -	100%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,05	R\$ 20,07	R\$ 1.626,67		R\$ -	81,05	R\$ 1.626,67	0,00	R\$ -	100%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 33,05	R\$ 363,55		R\$ -	11,00	R\$ 363,55	0,00	R\$ -	100%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	134,60	R\$ 54,57	R\$ 7.345,12		R\$ -	0,00	R\$ -	134,60	R\$ 7.345,12	0%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,55	R\$ 67,89	R\$ 3.703,40		R\$ -	0,00	R\$ -	54,55	R\$ 3.703,40	0%

Tony Feli An Grada
Engenheiro Civil
CREA BA. 0320/1778




12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 38,30	R\$ 114,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 114,90	0%
12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 243,73	R\$ 1.462,38	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 330,49	R\$ 660,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,55	R\$ 18,20	R\$ -	4,00	R\$ 18,20	0,00	R\$ -	100%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$ 4,32	R\$ 311,04	R\$ -	72,00	R\$ 311,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$ 12,25	R\$ 490,00	R\$ -	40,00	R\$ 490,00	0,00	R\$ -	100%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 34,03	R\$ 204,18	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 49,86	R\$ 99,72	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 99,72	0%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 22,87	R\$ 137,22	R\$ -	6,00	R\$ 137,22	0,00	R\$ -	100%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$ 31,16	R\$ 62,32	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)	UN	4,00	R\$ 38,79	R\$ 155,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 155,16	0%
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 12,81	R\$ 384,30	R\$ -	30,00	R\$ 384,30	0,00	R\$ -	100%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ -	1,00	R\$ 14,55	0,00	R\$ -	100%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)	UN	5,00	R\$ 29,58	R\$ 147,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 147,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 6,17	R\$ 18,51	R\$ -	3,00	R\$ 18,51	0,00	R\$ -	100%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,92	R\$ 35,84	R\$ -	2,00	R\$ 35,84	0,00	R\$ -	100%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 97,39	R\$ 779,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 152,90	R\$ 305,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,51	R\$ 34,04	R\$ -	4,00	R\$ 34,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	R\$ 10,11	R\$ 889,68	R\$ -	88,00	R\$ 889,68	0,00	R\$ -	100%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 15,70	R\$ 439,60	R\$ -	28,00	R\$ 439,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 41,29	R\$ 165,16	R\$ -	4,00	R\$ 165,16	0,00	R\$ -	100%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 54,56	R\$ 1.418,56	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 1.418,56	0%
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 152,90	R\$ 917,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 16,87	R\$ 792,89	R\$ -	47,00	R\$ 792,89	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA. 092.000/7.9




12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 16,87	R\$ 202,44		R\$ -	12,00	R\$ 202,44	0,00	R\$ -	100%
12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 14,05	R\$ 238,85		R\$ -	17,00	R\$ 238,85	0,00	R\$ -	100%
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 24,64	R\$ 344,96		R\$ -	14,00	R\$ 344,96	0,00	R\$ -	100%
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 96,69	R\$ 676,83		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 676,83	0%
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 148,06	R\$ 592,24		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 592,24	0%
12.1.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 23,16	R\$ 231,60		R\$ -	10,00	R\$ 231,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 83,40	R\$ 166,80		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 166,80	0%
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 83,40	R\$ 1.084,20		R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.084,20	0%
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 83,40	R\$ 250,20		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 250,20	0%
12.1.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9,00	R\$ 26,28	R\$ 236,52		R\$ -	9,00	R\$ 236,52	0,00	R\$ -	100%
12.1.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8,00	R\$ 26,28	R\$ 210,24		R\$ -	8,00	R\$ 210,24	0,00	R\$ -	100%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS							0,00				
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 289,97	R\$ 869,91	2,00	R\$ 579,94	2,00	R\$ 579,94	1,00	R\$ 289,97	67%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 352,10	R\$ 352,10		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 83,01	R\$ 166,02		R\$ -	2,00	R\$ 166,02	0,00	R\$ -	100%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 167,14	R\$ 1.337,12		R\$ -	8,00	R\$ 1.337,12	0,00	R\$ -	100%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 94,47	R\$ 2.834,10		R\$ -	30,00	R\$ 2.834,10	0,00	R\$ -	100%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 89,77	R\$ 538,62		R\$ -	6,00	R\$ 538,62	0,00	R\$ -	100%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							0,00				
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC							0,00				
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,60	R\$ 34,17	R\$ 8.426,32		R\$ -	246,60	R\$ 8.426,32	0,00	R\$ -	100%
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00	R\$ 66,60	R\$ 3.596,40		R\$ -	54,00	R\$ 3.596,40	0,00	R\$ -	100%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 27,17	R\$ 298,87		R\$ -	11,00	R\$ 298,87	0,00	R\$ -	100%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 27,24	R\$ 1.280,28		R\$ -	47,00	R\$ 1.280,28	0,00	R\$ -	100%
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 83,82	R\$ 335,28		R\$ -	4,00	R\$ 335,28	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA: 052.066.677-8




13.1.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 66,37	R\$ 66,37	R\$ -	1,00	R\$ 66,37	0,00	R\$ -	100%
13.2	ACESSÓRIOS							0,00			
13.2.1	Ralo hemisférico em P.F. tipo abacaxi Ø 100mm	un	11,00	R\$ 46,01	R\$ 506,11	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 506,11	0%
13.2.2	CAIXA DE AREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20	R\$ -	9,00	R\$ 1.078,20	0,00	R\$ -	100%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							0,00			
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,30	R\$ 63,96	R\$ 9.549,23	R\$ -	149,30	R\$ 9.549,23	0,00	R\$ -	100%
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,30	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57	R\$ -	115,30	R\$ 2.581,57	0,00	R\$ -	100%
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,10	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38	R\$ -	173,10	R\$ 5.705,38	0,00	R\$ -	100%
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33	R\$ -	0,00	R\$ -	69,55	R\$ 3.240,33	0%
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 27,17	R\$ 163,02	R\$ -	6,00	R\$ 163,02	0,00	R\$ -	100%
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00	R\$ -	9,00	R\$ 198,00	0,00	R\$ -	100%
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00	R\$ 12,88	R\$ 399,28	R\$ -	31,00	R\$ 399,28	0,00	R\$ -	100%
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	R\$ 8,32	R\$ 266,24	R\$ -	32,00	R\$ 266,24	0,00	R\$ -	100%
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 27,24	R\$ 326,88	R\$ -	12,00	R\$ 326,88	0,00	R\$ -	100%
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 31,14	R\$ 871,92	R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 871,92	0%
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 12,21	R\$ 219,78	R\$ -	18,00	R\$ 219,78	0,00	R\$ -	100%
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	106,00	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08	R\$ -	106,00	R\$ 1.185,08	0,00	R\$ -	100%
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08	R\$ -	14,00	R\$ 1.109,08	0,00	R\$ -	100%
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 50,31	R\$ 402,48	R\$ -	8,00	R\$ 402,48	0,00	R\$ -	100%
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ -	1,00	R\$ 53,33	0,00	R\$ -	100%
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 23,79	R\$ 214,11	R\$ -	9,00	R\$ 214,11	0,00	R\$ -	100%
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ -	1,00	R\$ 29,99	0,00	R\$ -	100%
14.19	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 66,93	R\$ 267,72	R\$ -	4,00	R\$ 267,72	0,00	R\$ -	100%
14.20	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 66,93	R\$ 803,16	R\$ -	12,00	R\$ 803,16	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.000.577.8




14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 21,85	R\$ 284,05		R\$ -	13,00	R\$ 284,05	0,00	R\$ -	100%
14.22	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 45,47	R\$ 45,47		R\$ -	1,00	R\$ 45,47	0,00	R\$ -	100%
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36		R\$ -	12,00	R\$ 246,36	0,00	R\$ -	100%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$ 37,66	R\$ 715,54		R\$ -	19,00	R\$ 715,54	0,00	R\$ -	100%
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 179,93	R\$ 719,72		R\$ -	4,00	R\$ 719,72	0,00	R\$ -	100%
14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	R\$ 314,08	R\$ 3.768,96		R\$ -	12,00	R\$ 3.768,96	0,00	R\$ -	100%
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 12,14	R\$ 182,10		R\$ -	15,00	R\$ 182,10	0,00	R\$ -	100%
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	R\$ 94,14	R\$ 282,42		R\$ -	3,00	R\$ 282,42	0,00	R\$ -	100%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	R\$ 12,03	R\$ 108,27	9,00	R\$ 108,27	9,00	R\$ 108,27	0,00	R\$ -	100%
14.30	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN	9,00	R\$ 13,15	R\$ 118,35		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 118,35	0%
14.31	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	R\$ 3.570,15	R\$ 3.570,15		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.570,15	0%
14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1,00	R\$ 8.367,68	R\$ 8.367,68		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 8.367,68	0%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							0,00				
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 272,64	R\$ 1.090,56		R\$ -	4,00	R\$ 1.090,56	0,00	R\$ -	100%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 456,55	R\$ 4.108,95		R\$ -	9,00	R\$ 4.108,95	0,00	R\$ -	100%
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	9,70	R\$ 108,45	R\$ 1.051,97		R\$ -	0,00	R\$ -	9,70	R\$ 1.051,97	0%
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 347,93	R\$ 4.523,09		R\$ -	13,00	R\$ 4.523,09	0,00	R\$ -	100%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 130,08	R\$ 1.691,04		R\$ -	13,00	R\$ 1.691,04	0,00	R\$ -	100%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 202,92	R\$ 1.217,52		R\$ -	6,00	R\$ 1.217,52	0,00	R\$ -	100%
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 423,60	R\$ 2.118,00	2,00	R\$ 847,20	3,00	R\$ 1.270,80	2,00	R\$ 847,20	60%
15.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 260,39	R\$ 260,39		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 260,39	0%
15.9	banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm	un	2,00	R\$ 325,13	R\$ 650,26	2,00	R\$ 650,26	2,00	R\$ 650,26	0,00	R\$ -	100%
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	3,00	R\$ 414,90	3,00	R\$ 414,90	0,00	R\$ -	100%
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	3,00	R\$ 414,90	3,00	R\$ 414,90	0,00	R\$ -	100%
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 783,52	R\$ 2.350,56		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.350,56	0%
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 89,41	R\$ 715,28		R\$ -	8,00	R\$ 715,28	0,00	R\$ -	100%
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 32,23	R\$ 290,07		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 290,07	0%
15.15	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	107,00	R\$ 14,87	R\$ 1.591,09		R\$ -	0,00	R\$ -	107,00	R\$ 1.591,09	0%

Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.003.077.8



15.16	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	3,00	R\$ 66,57	R\$ 199,71		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,71	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,55	R\$ 931,95	9,00	R\$ 931,95	9,00	R\$ 931,95	0,00	R\$ -	100%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16	7,00	R\$ 370,16	7,00	R\$ 370,16	0,00	R\$ -	100%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 59,63	R\$ 954,08	16,00	R\$ 954,08	16,00	R\$ 954,08	0,00	R\$ -	100%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 59,63	R\$ 178,89	3,00	R\$ 178,89	3,00	R\$ 178,89	0,00	R\$ -	100%
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 69,07	R\$ 966,98		R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 966,98	0%
15.24	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 67,82	R\$ 678,20	10,00	R\$ 678,20	10,00	R\$ 678,20	0,00	R\$ -	100%
15.25	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	R\$ 45,79	R\$ 641,06		R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 360,56	R\$ 2.523,92		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 349,21	R\$ 1.746,05		R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 332,16	R\$ 2.989,44		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,87	R\$ 1.027,87		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.027,87	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							0,00				
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,14	R\$ 482,23	R\$ 549,74	1,14	R\$ 549,74	1,14	R\$ 549,74	0,00	R\$ -	100%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 638,33	R\$ 153,20	0,24	R\$ 153,20	0,24	R\$ 153,20	0,00	R\$ -	100%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$ 50,37	R\$ 1.893,91	37,60	R\$ 1.893,91	37,60	R\$ 1.893,91	0,00	R\$ -	100%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$ 18,46	R\$ 694,10	37,60	R\$ 694,10	37,60	R\$ 694,10	0,00	R\$ -	100%
16.5	Fita antecorroziva	Un	4,00	R\$ 8,20	R\$ 32,80		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,80	0%
16.6	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 159,05	R\$ 159,05		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 159,05	0%
16.7	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$ 45,98	R\$ 91,96		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 408,53	R\$ 408,53		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo infimável	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							0,00				
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 227,04	R\$ 1.362,24		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 761,41	R\$ 1.522,82		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 132,05	R\$ 924,35		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 140,35	R\$ 140,35		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 140,35	0%
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,55	R\$ 169,10		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 169,10	0%
17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,90	R\$ 735,60		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 735,60	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.063.577.8



17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$ 147,13	R\$ 9.269,19	R\$ -	0,00	R\$ -	63,00	R\$ 9.269,19	0%
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.525,01	R\$ 3.050,02	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 3.050,02	0%
17.9	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 370,36	R\$ 370,36	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 370,36	0%
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 289,97	R\$ 1.449,85	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.449,85	0%
17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 191,86	R\$ 575,58	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 575,58	0%
17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 179,17	R\$ 716,68	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 716,68	0%
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$ 24,70	R\$ 889,20	R\$ -	0,00	R\$ -	36,00	R\$ 889,20	0%
17.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10,00	R\$ 18,46	R\$ 184,60	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 184,60	0%
17.15	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a	un	1,00	R\$ 2.826,84	R\$ 2.826,84	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.826,84	0%
17.16	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 219,18	R\$ 219,18	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 219,18	0%
17.17	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$ 219,18	R\$ 438,36	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 438,36	0%
17.18	Placa de sinalizacao de seguranga contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	R\$ 27,31	R\$ 928,54	R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 928,54	0%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						0,00				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						0,00				
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 597,68	R\$ 597,68	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 597,68	0%
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 769,98	R\$ 1.539,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.539,96	0%
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 883,24	R\$ 2.649,72	R\$ -	2,00	R\$ 1.766,48	1,00	R\$ 883,24	67%
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 99,54	R\$ 99,54	R\$ -	1,00	R\$ 99,54	0,00	R\$ -	100%
18.2	DISJUNTORES						0,00				
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$ 11,69	R\$ 771,54	R\$ -	20,00	R\$ 233,80	46,00	R\$ 537,74	30%
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	R\$ -	3,00	R\$ 37,17	0,00	R\$ -	100%
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,39	R\$ 24,78	R\$ -	2,00	R\$ 24,78	0,00	R\$ -	100%
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$ 13,67	R\$ 218,72	R\$ -	12,00	R\$ 164,04	4,00	R\$ 54,68	75%
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 15,23	R\$ 60,92	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 60,92	0%
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 22,11	R\$ 22,11	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 22,11	0%
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 73,28	R\$ 146,56	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 146,56	0%
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 81,82	R\$ 327,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 327,28	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA: 052.052/77.8



18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 89,46	R\$ 178,92		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 178,92	0%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 99,19	R\$ 198,38		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 198,38	0%
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 132,13	R\$ 264,26		R\$ -	2,00	R\$ 264,26	0,00	R\$ -	100%
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 569,56	R\$ 1.139,12		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.139,12	0%
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 132,81	R\$ 132,81		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 132,81	0%
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2,00	R\$ 248,90	R\$ 497,80		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 497,80	0%
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	R\$ 132,81	R\$ 398,43		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 398,43	0%
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	24,00	R\$ 104,15	R\$ 2.499,60		R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 2.499,60	0%
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8,00	R\$ 104,15	R\$ 833,20		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 833,20	0%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							0,00				
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630,30	R\$ 9,84	R\$ 6.202,15		R\$ -	630,30	R\$ 6.202,15	0,00	R\$ -	100%
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,40	R\$ 12,81	R\$ 2.234,06		R\$ -	174,40	R\$ 2.234,06	0,00	R\$ -	100%
18.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,90	R\$ 17,40	R\$ 5.827,26		R\$ -	0,00	R\$ -	334,90	R\$ 5.827,26	0%
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,20	R\$ 25,44	R\$ 259,49		R\$ -	0,00	R\$ -	10,20	R\$ 259,49	0%
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 42,95	R\$ 1.718,00		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 1.718,00	0%
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,80	R\$ 22,66	R\$ 675,27		R\$ -	0,00	R\$ -	29,80	R\$ 675,27	0%
18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 244,68	R\$ 2.691,48		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 2.691,48	0%
18.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00	R\$ 16,01	R\$ 2.721,70	30,00	R\$ 480,30	150,00	R\$ 2.401,50	20,00	R\$ 320,20	88%
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$ 10,97	R\$ 1.097,00		R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 1.097,00	0%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)							0,00				
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6583,30	R\$ 4,26	R\$ 28.044,86		R\$ -	6583,30	R\$ 28.044,86	0,00	R\$ -	100%
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	371,90	R\$ 6,88	R\$ 2.558,67		R\$ -	371,90	R\$ 2.558,67	0,00	R\$ -	100%
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1798,40	R\$ 9,37	R\$ 16.851,01		R\$ -	1798,40	R\$ 16.851,01	0,00	R\$ -	100%
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,50	R\$ 23,52	R\$ 6.126,96		R\$ -	260,50	R\$ 6.126,96	0,00	R\$ -	100%
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	R\$ 27,00	R\$ 1.574,10		R\$ -	0,00	R\$ -	58,30	R\$ 1.574,10	0%
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,60	R\$ 36,28	R\$ 3.214,41		R\$ -	0,00	R\$ -	88,60	R\$ 3.214,41	0%
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,80	R\$ 78,17	R\$ 22.106,48		R\$ -	0,00	R\$ -	282,80	R\$ 22.106,48	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
C.R.C.A. DA: 052.059.577.8




18.4.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	40,00	R\$	94,31	R\$	3.772,40	R\$	-	0,00	R\$	-	40,00	R\$	3.772,40	0%
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	159,80	R\$	162,56	R\$	25.977,09	R\$	-	0,00	R\$	-	159,80	R\$	25.977,09	0%
18.5	ELETROCALHAS															
18.5.1	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,20	R\$	100,10	R\$	7.527,52	R\$	-	0,00	R\$	-	75,20	R\$	7.527,52	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS															
18.6.1	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	95,00	R\$	30,71	R\$	2.917,45	R\$	614,20	95,00	R\$	2.917,45	0,00	R\$	-	100%
18.6.2	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	23,00	R\$	32,41	R\$	745,43	R\$	550,97	23,00	R\$	745,43	0,00	R\$	-	100%
18.6.3	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	3,00	R\$	43,10	R\$	129,30	R\$	129,30	3,00	R\$	129,30	0,00	R\$	-	100%
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	34,00	R\$	45,20	R\$	1.536,80	R\$	-	34,00	R\$	1.536,80	0,00	R\$	-	100%
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	3,00	R\$	25,33	R\$	75,99	R\$	75,99	3,00	R\$	75,99	0,00	R\$	-	100%
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	2,00	R\$	59,75	R\$	119,50	R\$	119,50	2,00	R\$	119,50	0,00	R\$	-	100%
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	1,00	R\$	54,43	R\$	54,43	R\$	54,43	1,00	R\$	54,43	0,00	R\$	-	100%
18.6.8	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	10,00	R\$	30,71	R\$	307,10	R\$	307,10	10,00	R\$	307,10	0,00	R\$	-	100%
18.6.9	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_022020	UN	8,00	R\$	221,24	R\$	1.769,92	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.769,92	0%
18.6.10	LUMINARIA FLORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11,00	R\$	102,83	R\$	1.131,13	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	1.131,13	0%
18.6.11	LUMINARIA FLORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	UN	78,00	R\$	118,28	R\$	9.225,84	R\$	-	78,00	R\$	9.225,84	0,00	R\$	-	100%
18.6.12	LUMINARIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO PUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO	UN	25,00	R\$	165,86	R\$	4.146,50	R\$	-	0,00	R\$	-	25,00	R\$	4.146,50	0%
18.6.13	LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO	UN	17,00	R\$	205,96	R\$	3.501,32	R\$	-	8,00	R\$	1.647,68	9,00	R\$	1.853,64	47%
18.6.14	PROLETOR EM ALUMINIO, C/LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA ATE 400W	UN	4,00	R\$	410,44	R\$	1.641,76	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	1.641,76	0%
18.6.15	PROLETOR EM ALUMINIO, C/LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA ATE 400W	UN	1,00	R\$	410,44	R\$	410,44	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	410,44	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELTROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8,00	R\$	152,18	R\$	1.217,44	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.217,44	0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO															
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	63,90	R\$	15,20	R\$	971,28	R\$	-	63,90	R\$	971,28	0,00	R\$	-	100%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUVAADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	12,00	R\$	6,17	R\$	74,04	R\$	-	12,00	R\$	74,04	0,00	R\$	-	100%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	14,00	R\$	5,75	R\$	80,50	R\$	-	14,00	R\$	80,50	0,00	R\$	-	100%
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	3,00	R\$	9,10	R\$	27,30	R\$	-	3,00	R\$	27,30	0,00	R\$	-	100%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA															
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS															
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_112019	UN	3,00	R\$	948,33	R\$	2.844,99	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.844,99	0%
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	R\$	507,92	R\$	507,92	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	507,92	0%
20.1.3	GUIA DE CABOS SIMPLES	UN	2,00	R\$	41,83	R\$	83,66	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	83,66	0%
20.1.4	GUIA DE CABOS DE VERTICAL FECHADO	UN	1,00	R\$	41,83	R\$	41,83	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	41,83	0%

Tony Felix
Engenheiro Civil
CREA/BA, 052.0. - 5778




20.15	GUIA DE CABO VERTICAL	UN	2,00	R\$	41,83	R\$	83,66	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	83,66	0%
20.16	GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO	UN	1,00	R\$	41,83	R\$	41,83	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	41,83	0%
20.17	BANDEJA MOVEL, PADRAO 19"	UN	2,00	R\$	65,67	R\$	131,34	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	131,34	0%
20.18	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	R\$	726,43	R\$	726,43	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	726,43	0%
20.19	ACESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300 MPBS	UN	2,00	R\$	634,89	R\$	1.269,78	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	1.269,78	0%
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS	M	579,00	R\$	14,57	R\$	8.436,03	R\$	-	0,00	R\$	-	579,00	R\$	8.436,03	24%
20.21	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	113,00	R\$	13,66	R\$	1.543,58	R\$	-	0,00	R\$	-	113,00	R\$	1.543,58	0%
20.22	CABO LOGICO VIDEO COAXIAL 50 (OMHS)	M	19,00	R\$	17,77	R\$	337,63	R\$	-	0,00	R\$	-	19,00	R\$	337,63	0%
20.23	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ45/RJ45 DE 2,50m	UN	19,00	R\$	39,49	R\$	750,31	R\$	-	0,00	R\$	-	19,00	R\$	750,31	0%
20.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_112019	UN	19,00	R\$	39,49	R\$	750,31	R\$	-	0,00	R\$	-	19,00	R\$	750,31	0%
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	R\$	72,64	R\$	581,12	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	581,12	0%
20.3.3	Conector de medição em bronze c/d parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref./TEL-560 (gáta-raio)	Un	10,00	R\$	42,93	R\$	429,30	R\$	-	0,00	R\$	-	10,00	R\$	429,30	0%
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$	244,68	R\$	978,72	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	978,72	0%
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	27,00	R\$	16,01	R\$	432,27	R\$	-	0,00	R\$	-	27,00	R\$	432,27	100%
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122015	UN	27,00	R\$	16,01	R\$	432,27	R\$	-	0,00	R\$	-	27,00	R\$	432,27	100%
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	M	15,20	R\$	10,38	R\$	157,78	R\$	-	0,00	R\$	-	15,20	R\$	157,78	100%
20.5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122015	M	112,05	R\$	9,84	R\$	1.102,57	R\$	-	0,00	R\$	-	112,05	R\$	1.102,57	100%
20.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1,44"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122015	M	4,80	R\$	18,01	R\$	86,45	R\$	-	0,00	R\$	-	4,80	R\$	86,45	100%
20.5.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1,44"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122015	M	55,20	R\$	28,10	R\$	1.551,12	R\$	-	0,00	R\$	-	55,20	R\$	1.551,12	0%
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_112016 P	M	51,65	R\$	57,43	R\$	2.966,26	R\$	-	0,00	R\$	-	51,65	R\$	2.966,26	0%
20.5.5	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm	M	1,00	R\$	1.920,13	R\$	1.920,13	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.920,13	0%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA	UN	1,00	R\$	1.468,08	R\$	1.468,08	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.468,08	0%
21.1	Coleta em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	UN	1,00	R\$	1.468,08	R\$	1.468,08	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.468,08	0%
21.2	EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUSTRIAL D=400MM	UN	1,00	R\$	1.468,08	R\$	1.468,08	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.468,08	0%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	UN	1,00	R\$	113,47	R\$	113,47	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	113,47	0%
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122017	M	108,60	R\$	11,47	R\$	1.245,64	R\$	-	0,00	R\$	-	108,60	R\$	1.245,64	100%
22.2	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122017	UN	11,00	R\$	24,49	R\$	269,39	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	269,39	0%
22.4	Abracadela-guia reforçada 2"	un	4,00	R\$	9,62	R\$	38,48	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	38,48	0%
22.5	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122017	UN	33,00	R\$	24,49	R\$	808,17	R\$	-	0,00	R\$	-	33,00	R\$	808,17	0%
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	R\$	307,60	R\$	307,60	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	307,60	0%
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_022021	m³	28,18	R\$	89,52	R\$	2.343,63	R\$	-	0,00	R\$	-	28,18	R\$	2.343,63	0%
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	28,18	R\$	41,63	R\$	1.089,87	R\$	-	0,00	R\$	-	28,18	R\$	1.089,87	0%
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122017	UN	11,00	R\$	94,61	R\$	1.040,71	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	1.040,71	0%
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122017	M	26,00	R\$	35,07	R\$	911,82	R\$	-	0,00	R\$	-	26,00	R\$	911,82	0%
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122017	M	261,00	R\$	63,70	R\$	16.625,70	R\$	-	0,00	R\$	-	261,00	R\$	16.625,70	0%
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_122017	M	174,50	R\$	82,38	R\$	14.375,31	R\$	-	0,00	R\$	-	174,50	R\$	14.375,31	0%
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLILETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_122020	UN	11,00	R\$	45,07	R\$	495,77	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	495,77	0%
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM²	UN	251,00	R\$	13,53	R\$	3.396,03	R\$	-	0,00	R\$	-	251,00	R\$	3.396,03	0%

Tony Ferraz Ardele
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 058.665.878




22.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22,00	R\$ 37,07	R\$ 815,54	R\$ -	0,00	R\$ -	22,00	R\$ 815,54	0%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00				
23.1	GERAIS						0,00				
23.1.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.036,44	R\$ 2.036,44	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.036,44	0%
23.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	38,34	R\$ 357,31	R\$ 13.699,27	R\$ -	38,34	R\$ 13.699,27	0,00	R\$ -	100%
23.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	R\$ 357,31	R\$ 9.608,07	R\$ -	26,89	R\$ 9.608,07	0,00	R\$ -	100%
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	30,15	R\$ 126,19	R\$ 3.804,63	R\$ -	0,00	R\$ -	30,15	R\$ 3.804,63	0%
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	R\$ 205,07	R\$ 1.911,25	R\$ -	9,32	R\$ 1.911,25	0,00	R\$ -	100%
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	79,65	R\$ 92,81	R\$ 7.392,32	R\$ -	79,65	R\$ 7.392,32	0,00	R\$ -	100%
23.1.7	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	148,00	R\$ 34,77	R\$ 5.145,96	R\$ -	0,00	R\$ -	148,00	R\$ 5.145,96	0%
23.1.8	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 3.819,30	R\$ 3.819,30	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.819,30	0%
23.1.9	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 12.775,93	R\$ 12.775,93	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 12.775,93	0%
23.1.10	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	R\$ 1.271,21	R\$ 1.271,21	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.271,21	0%
23.1.11	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 732,57	R\$ 732,57	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 732,57	0%
23.1.12	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	19,00	R\$ 184,29	R\$ 3.501,51	R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 3.501,51	0%
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L						0,00				
23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00	R\$ 46.413,61	R\$ 46.413,61	R\$ -	1,00	R\$ 46.413,61	0,00	R\$ -	100%
23.2.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,00	R\$ 106,31	R\$ 425,24	R\$ -	4,00	R\$ 425,24	0,00	R\$ -	100%
23.2.4	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	101,80	R\$ 58,96	R\$ 6.002,13	R\$ -	101,80	R\$ 6.002,13	0,00	R\$ -	100%
23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,90	R\$ 12,08	R\$ 614,87	R\$ -	50,90	R\$ 614,87	0,00	R\$ -	100%
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						0,00				
24.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	139,00	R\$ 151,29	R\$ 21.029,31	R\$ -	135,00	R\$ 20.424,15	4,00	R\$ 605,16	97%
25	SERVIÇOS FINAIS						0,00				
25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	891,68	R\$ 2,18	R\$ 1.942,96	R\$ -	0,00	R\$ -	891,68	R\$ 1.942,96	0%
25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R\$ 1.751,58	R\$ 1.751,58	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.751,58	0%
26	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO						0,00				
26.1	EDIFICAÇÃO						0,00				
26.1.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	5,88	R\$ 604,92	R\$ 3.556,93	R\$ -	5,88	R\$ 3.556,93	0,00	R\$ -	100%
26.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,80	R\$ 18,65	R\$ 1.768,02	R\$ -	94,80	R\$ 1.768,02	0,00	R\$ -	100%
26.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	30,90	R\$ 94,87	R\$ 2.931,48	R\$ -	30,90	R\$ 2.931,48	0,00	R\$ -	100%
26.1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	61,80	R\$ 5,23	R\$ 323,21	R\$ -	61,80	R\$ 323,21	0,00	R\$ -	100%
26.1.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	61,80	R\$ 25,48	R\$ 1.574,66	R\$ -	61,80	R\$ 1.574,66	0,00	R\$ -	100%

Tony F. de Almeida
Eng. Civil
CREA-BA: 052.018.577-8



26.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	46,35	R\$ 20,91	R\$ 969,18		R\$ -	46,35	R\$ 969,18	0,00	R\$ -	100%
26.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,35	R\$ 15,46	R\$ 716,57		R\$ -	46,35	R\$ 716,57	0,00	R\$ -	100%
VALOR POR EXTENSO: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS					R\$ 2.480.828,62		R\$ 133.798,91		R\$ 2.079.270,78		R\$ 401.557,83	83,81%


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ:19.650.110/0001-27
 Fabio da Silva Oliveira
 Sócio Administrador

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Tony Felix 
 Engenheiro Civil
 CRC-BA-13200-1/7.8





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4FXJJ-NHD8F-8CJB4-CZXWV

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/4FXJJ-NHD8F-8CJB4-CZXWV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000227185192
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 15:49:28	Identificação da Apuração de Débitos	72522509062 / eSocial 72353647 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			
Código	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Saldo Devedor	444,27	Valor Original	444,27
Saldo Devedor Vinculados	444,27	Valor Original Vinculados	444,27
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			
Código	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Saldo Devedor	1.055,88	Valor Original	1.055,88
Saldo Devedor Vinculados	1.055,88	Valor Original Vinculados	1.055,88
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			
Código	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Saldo Devedor	131,98	Valor Original	131,98
Saldo Devedor Vinculados	131,98	Valor Original Vinculados	131,98
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00
Código	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Saldo Devedor	10,55	Valor Original	10,55
Saldo Devedor Vinculados	10,55	Valor Original Vinculados	10,55
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00
Código	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Saldo Devedor	52,79	Valor Original	52,79
Saldo Devedor Vinculados	52,79	Valor Original Vinculados	52,79
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00
Código	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Saldo Devedor	79,19	Valor Original	79,19
Saldo Devedor Vinculados	79,19	Valor Original Vinculados	79,19
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00
Código	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Saldo Devedor	31,67	Valor Original	31,67
Saldo Devedor Vinculados	31,67	Valor Original Vinculados	31,67
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00

Grupo: IRRF			
Código	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Saldo Devedor	39,44	Valor Original	39,44
Saldo Devedor Vinculados	39,44	Valor Original Vinculados	39,44
Saldo Devedor	0,00	Valor Original	0,00
Saldo Devedor Vinculados	0,00	Valor Original Vinculados	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000227185192
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 15:49:28	Identificação da Apuração de Débitos	25522509062 / eSocial 72353647 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	9.375,24	1.885,52	7.489,72



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
Nome	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25522509062 / eSocial 72353647 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 444,27	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.135,07	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 306,18	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 39,44	R\$ 39,44
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.924,96	R\$ 39,44

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF	997.255.335-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/05/2024 15:49:28
Nº do recibo de entrega	0000050000227185192
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	552.207.625-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000227185192
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 15:49:28	Identificação da Apuração de Débitos	25522509062 / eSocial 72353647 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,27	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL


Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,88	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	04/2024	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000227185192
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 15:49:28	Identificação da Apuração de Débitos	25522509062 / eSocial 72353647 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral	Número do Recibo da Declaração Retificada	50000225856285
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo	Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	QUEIMADAS	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF		CRC	
UF		Telefone	
Correio Eletrônico			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	444,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 444,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.055,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.055,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	79,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,19		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	0561-07
Período Apuração	04/2024
Débito	
Débito Apurado	39,44
Deduções	39,44
Saldo a Pagar	39,44
Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1200-01
Período Apuração	04/2024
Débito	
Débito Apurado	31,67
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,67
Saldo a Pagar	0,00
Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1184-01
Período Apuração	04/2024
Débito	
Débito Apurado	79,19
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,19
Saldo a Pagar	0,00
Descrição	CP TERCEIROS - SESI

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1181-01
Período Apuração	04/2024
Débito	
Débito Apurado	52,79
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,79
Saldo a Pagar	0,00
Descrição	CP TERCEIROS - SENAI

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1176-01
Período Apuração	04/2024
Débito	
Débito Apurado	10,55
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,55
Saldo a Pagar	0,00
Descrição	CP TERCEIROS - INCRA

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1170-01
Período Apuração	04/2024
Débito	
Débito Apurado	131,98
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 131,98
Saldo a Pagar	0,00
Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	7	024.624.575-18	101	20/05/2024	Mensal	3.049,82	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
04/2024		DENIS MARIO DA SILVA BORGES	15	026.886.915-46	101	20/05/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
Total do Tomador							Sem Tomador	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	422,34
Total do Estabelecimento							19.650.110/0001-27	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	422,34
Total da Guia								5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	422,34



Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Estabelecimento: 19.650.110/0001-27

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34
		Total da Guia	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cesalonário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	19.650.110/0001-27	2	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34
		Total da Guia	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.650.110/0001-27

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34
		Total da Guia	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.650.110 **Nome Empregador:** ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	2	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34	
	Total da Guia	5.279,40	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34	




MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFAAS EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 04/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JsafG5uvIgr0000-6
 N° CONTROLE: CtK01HoIDXg0000-3 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	1.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,71
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,71

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 16/05/2024 HORA: 09:57:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2024

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

6 - VALOR DO INSS(+) 1.671,71

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.671,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000162

717102702100

019650110006

012720240496

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 16/05/2024 HORA: 09:57:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2024

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

6 - VALOR DO INSS(+) 1.671,71

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.671,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000162

717102702100

019650110006

012720240496



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: JsafG5uvIgR0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 04/2024 N° CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3

TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: ANxhkaHCOlX0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.279,40	REM SEM 13° SALÁRIO	5.279,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.279,40	REM SEM 13° SALÁRIO	5.279,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	457,45	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.671,71	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 04/2024

Nº ARQUIVO: JsafG5uvIgR0000-6
Nº CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.279,40	REM SEM 13º SALÁRIO	5.279,40
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	457,45	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.671,71	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2
		TOTAL A RECOLHER	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/05/2024
 HORA: 09:57:37
 PAG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	0,00	0,00	128.02888.07-4	0,00	01/02/2019	01	01	01	01	01/02/2019	0,00	07102
3.049,82			0,00		274,97							0,00
DENIS MARIO DA SILVA BORGES	0,00	0,00	203.63232.16-2	0,00	03/02/2021	01	03	02	2021	03/02/2021	0,00	07152
2.229,58			0,00		182,48							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.279,40 0,00 457,45 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/05/2024
HORA: 09:57:37
PAG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA N° ARQUIVO: JsafG5uvIgr0000-6
COMP: 04/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA N° DE CONTROLE: ANxhkaHCO1X0000-7 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25
CIDADE: QUEIMADAS

UF: BA CEP: 48860-000
BAIRRO: CONTORNO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.279,40	0,00	5.279,40	0,00
TOTALS:	2	5.279,40	0,00	5.279,40	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: JsafG5uvIgR0000-6
COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: ANxhkaHCOLX0000-7 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.671.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 457.45
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0





CAJ	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	5.279,40	0,00	5.279,40	0,00
TOTALS:	2	5.279,40	0,00	5.279,40	0,00

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA
COMP: 04/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507
Nº DE CONTROLE: CTK01H0IDXg0000-3
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
RAT: 3.00
FAP: 1.00
RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25
BAIRRO: CONTORNO
CNAE PREPONENTE: 4120400
CNAE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS
UF: BA
CEP: 48860-000

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 16/05/2024
HORA: 09:57:37
PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/05/2024
HORA: 09:57:37
PÁG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Ctk01HoIDXg00000-3 N° ARQUIVO: JsafG5uvIgr00000-6
COMP: 04/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 UF: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS CNAE: 4120400

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.279,40
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3 N° ARQUIVO: JsafG5uvIgr0000-6
COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.671.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 457.45
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 16/05/2024
HORA: 09:57:37
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.214,26	0,00	19.650.110/0001-27	0,00	0,00	2100
457,45	1.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,71
						507
						0,00





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/05/2024 09:58:26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JsafG5uvlgR00006.SFP é:

568cf6f4-a13a-48cb-a918-853b3ab74b7b

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO LTDA:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 04/2024

NRA: JsafG5uvlgR00006

Base de Processamento: Queimadas / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	560
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	14/05/2024
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS DE LÓGICA)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO
 INÍCIO DA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (CONTRAPISO E PISO CIMENTADO)

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	6
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	2
Geleiro	0
Pintor	2
TOTAL	18

ASSINATURAS:

Tony Felício
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.960-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ **CONTRATO:** 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA **RDC:** 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA **CONTRATADA:** ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **561**

ANOTAÇÕES

Período: 15/05/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS DE LÓGICA)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (CONTRAPISO E PISO CIMENTADO)
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DOS ESPELHOS

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
Tarde
 Bom Chuva Não Operável
Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	6
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
Pintor	2
TOTAL	19

ASSINATURAS:

Tony F. Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 C.P. Nº. 05200000/78



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	562
------------	------------

ANOTAÇÕES

Período:	16/05/2024
-----------------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	6
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
Pintor	2
TOTAL	19

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS DE LÓGICA)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (CONTRAPISO E PISO CIMENTADO)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS ESPELHOS
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS DE LOUÇA E INOX

ASSINATURAS:

Tony Felício Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 C.P. Nº. 032.01.377-8



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **563**

ANOTAÇÕES

Período: 17/05/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS DE LÓGICA)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (CONTRAPISO E PISO CIMENTADO)
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS ESPELHOS
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS DE LOUÇA E INOX

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	6
Armador	0
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
Pintor	2
TOTAL	19

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Contato: 052100000077.8



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		N°:	564
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
ANOTAÇÕES				Período:	18/05/2024
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, CABOS DE LÓGICA) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO CONCLUSÃO DA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO CONCLUSÃO DA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (CONTRAPISO E PISO CIMENTADO) CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS METAIS (TORNEIRAS)				Condição do Tempo	
				Manhã	
				<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
				Tarde	
				<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
				Noite	
				<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
				EFETIVO DA OBRA	
				ARCO	
				Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1				
Administrativo	1				
Mestre de Obras	1				
Pedreiro	6				
Ajudante Comum	6				
Amador	0				
Serralheiro	0				
Eletricista	2				
Geleiro	0				
Pintor	2				
TOTAL					
16					

ASSINATURAS:

Tony Felipe Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CPF: 04.852.111-78



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADA/BA



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 87W2R-HSX48-YFYMX-QWXCG

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/87W2R-HSX48-YFYMX-QWXCG>


Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 16ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA, CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

DATA: 18/05/2024

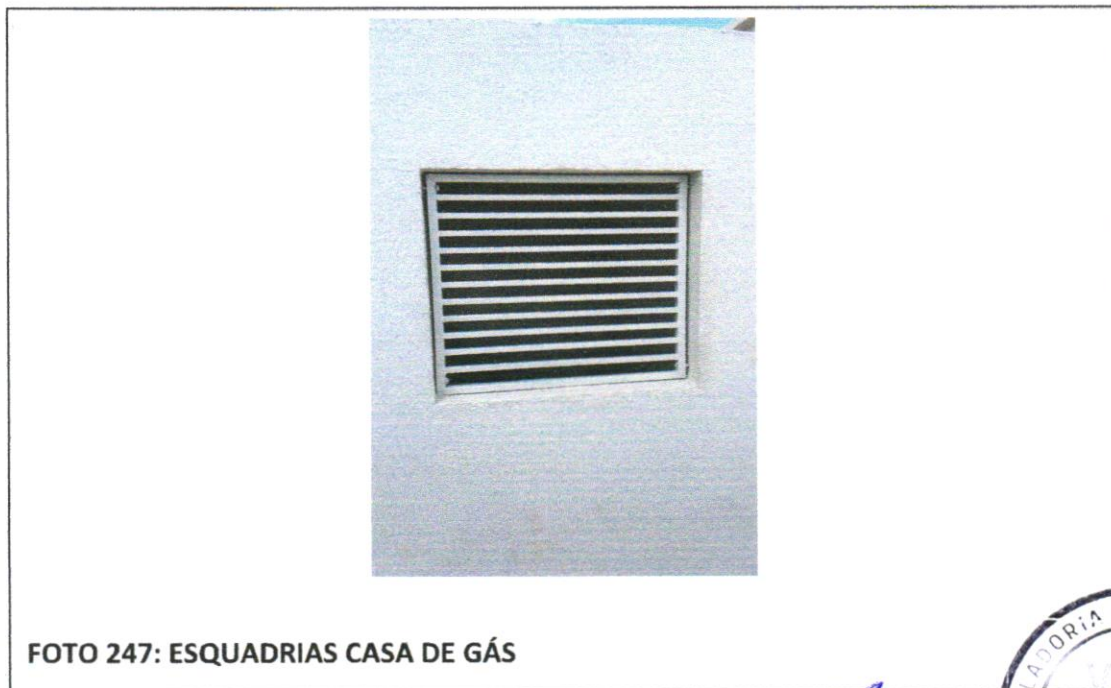



Tony Felix Andre
Engenheiro
CREMOP 0340/2017/8






Tony F. de Almeida
Corretor de Imóveis
CRECIAB 04.032.001/177.8



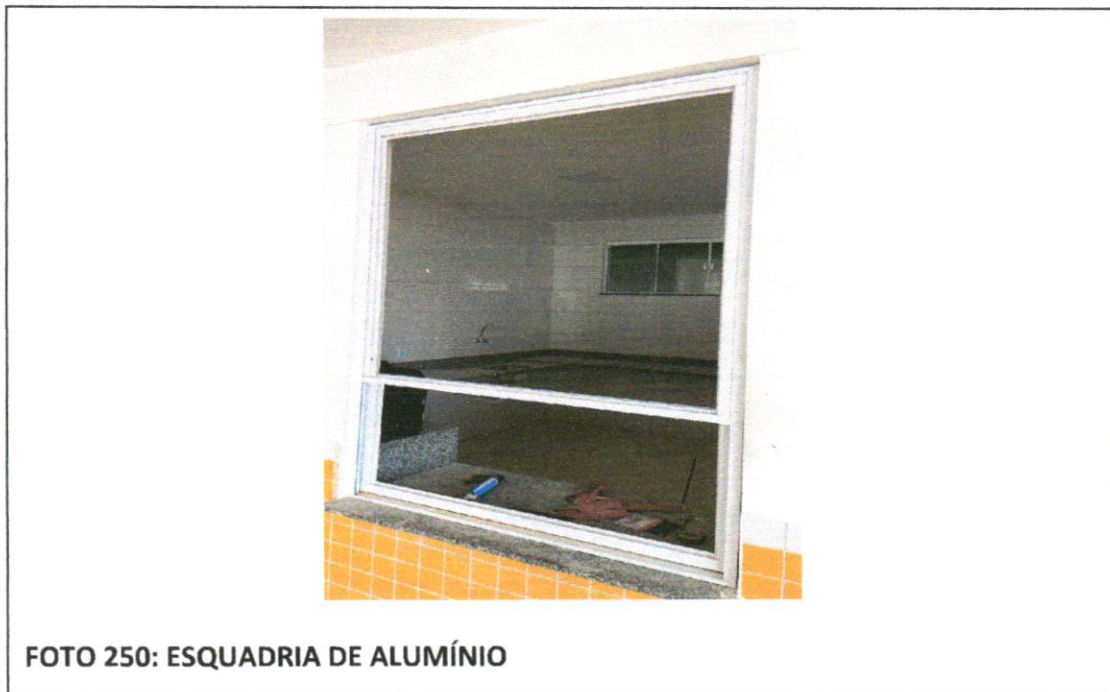

Tony Felix
Engenheiro
C.R.C. 052.003.178





Tony Ferraz de Andrade
Engenheiro Civil
C.R.C. 010.123/78





FOTO 254: CONTRAPISO



FOTO 255: CONTRAPISO





Tony Ferraz
Engenheiro Civil
CREMBA: 061





Tony Fe...
C...
C...



Tony F. A. K...
Controlador
CNPJ 07.083.000/0001-78



FOTO 262: PASSEIO



FOTO 263: PASSEIO

Tony Ferraz
Engenheiro
C.R.C.A. 0827/170







FOTO 264: PASSEIO



FOTO 265: PASSEIO



Tony F. A. [Signature]
[Faint text]

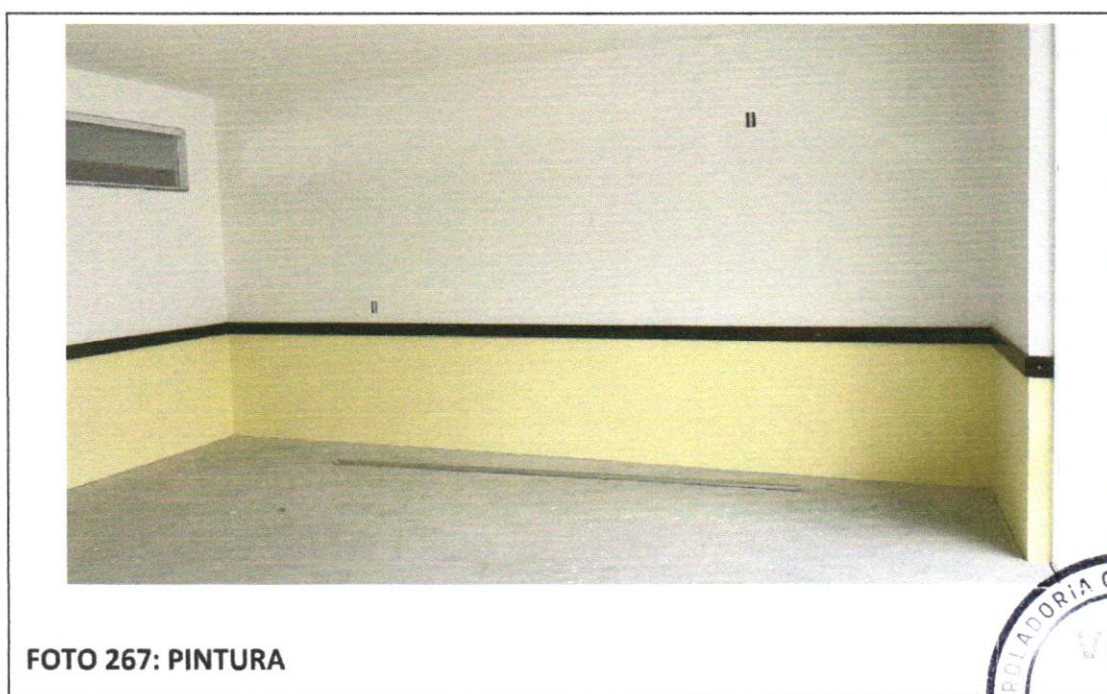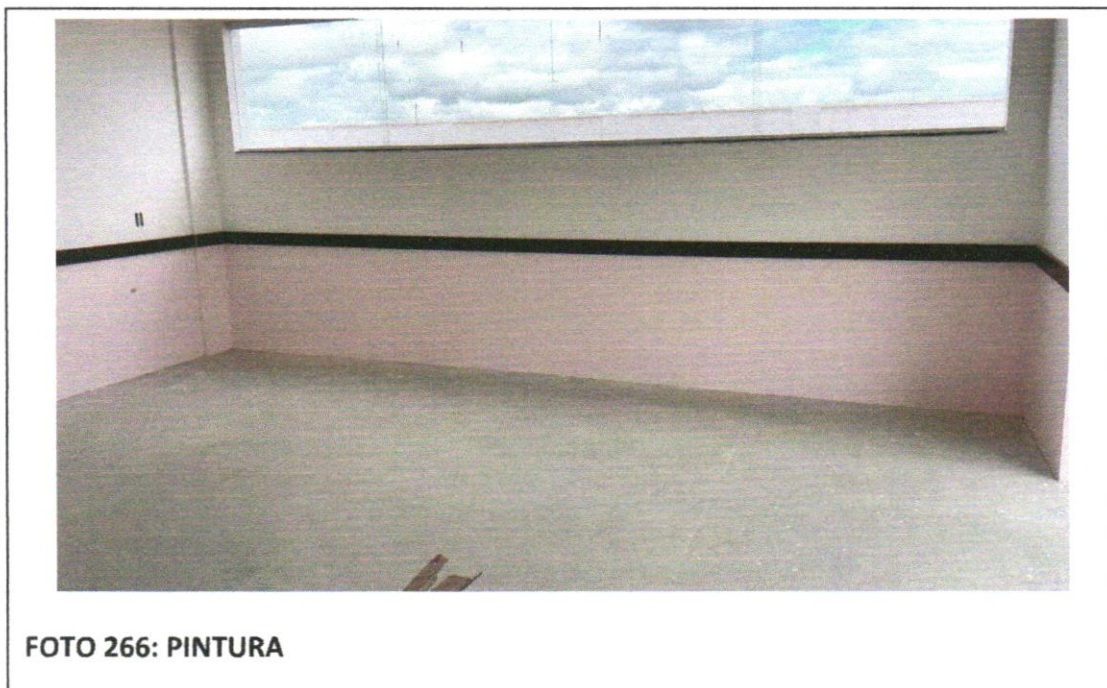

Tony P. ...
CNPJ: ...



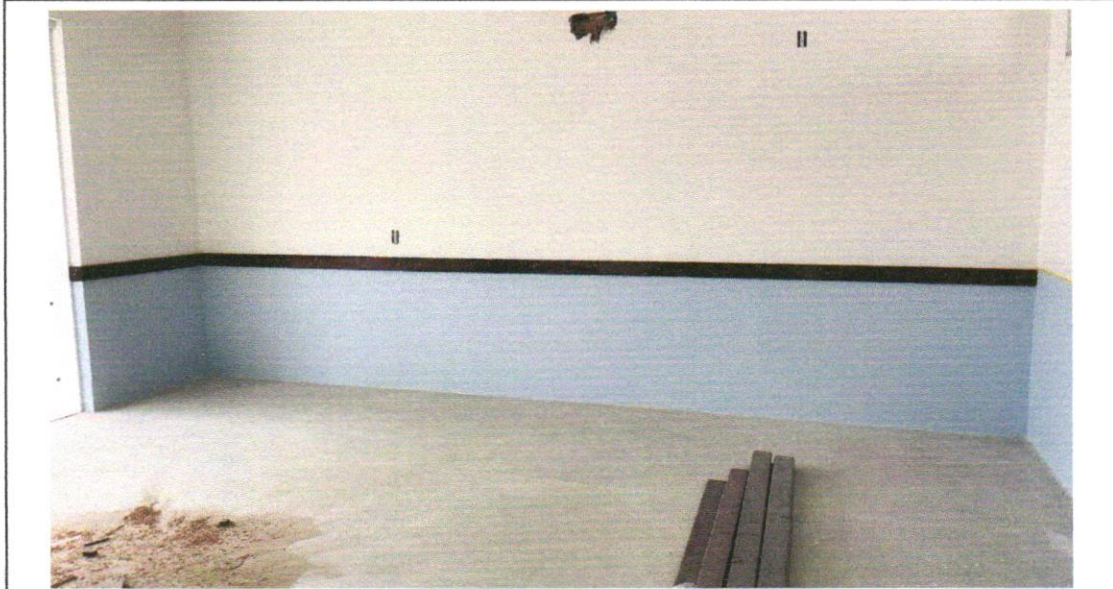


FOTO 268: PINTURA

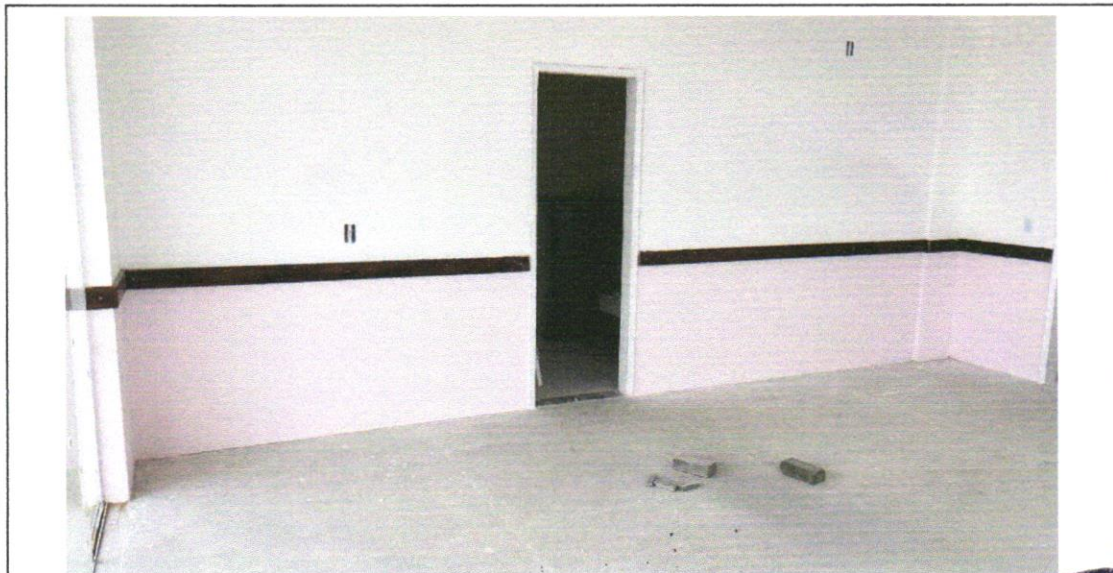


FOTO 269: PINTURA



Tony Ferraz
Coordenador
CNPJ 06.908.970



THIAGO ALVES
Imobiliária C&C
Cidade, 052.066.111





FOTO 272: CUBAS, BANCADAS E TORNEIRAS



FOTO 273: DUCHA HIGIÊNICA

Tony F. de Almeida
Especialista em Imóveis
CRP 0304/032010-79






Tracy Ed. Ar...
...
... 173



FOTO 276: BANHEIRAS



FOTO 277: BANHEIRAS



Tony Felício

 Engenheiro

 CREA/SP 071.13



FOTO 278: TUBULAÇÃO GÁS (COZINHA)



FOTO 279: TUBULAÇÃO GÁS (CASA DE GÁS)



Tony Felício
Engenheiro Civil
C.Régua, 032.000-113



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UZKU7-FJCRH-S7AMS-LP6GB

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/UZKU7-FJCRH-S7AMS-LP6GB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

