



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 165 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1316 Data do Sub-Empenho: 06/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 08/02/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15- Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari. Nº Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 176-2023	6.142.048,76	1.016.151,76	5.125.897,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023. OBRA Nº 090/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 28/05/2024. NFS-e 512.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	302.029,13	302.029,13	0,00

Data do Empenho: 08/02/2024 Data do Liquidação: 06/06/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	19.933,92
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.624,35
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	9.060,87
## Duzentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos ##		Valor Retido
		Valor Liquidado
		32.619,14
		269.409,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/06/2024	512	U			302.029,13
Total:						302.029,13

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	302.029,13

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/06/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matricula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/06/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matricula: 6408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 06/06/2024

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 165 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1316 Data do Sub-Empenho: 06/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:

CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: **08/02/2024**

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia. Nº Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: - Contrato: 176-2023	6.142.048,76	1.016.151,76	5.125.897,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	302.029,13	302.029,13	0,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	302.029,13	302.029,13


Trezentos e dois mil e vinte e nove reais e treze centavos ## 302.029,13

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 06/06/2024.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matricula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 06/06/2024



NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matricula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 06/06/2024

A EMPRESA:

MP2 CONSTRUÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO:

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2539. ED. CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING. CAMINHO DAS ÁRVORES. CEP 41820-021. SALVADOR/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO: FINISA
HISTÓRICO: CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: Concorrência Pública 003/2023
Contrato: 176/2023 Processo administrativo: 094/2023 Nº da obra: 090/2023
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 512 VALOR DA NOTA: R\$ 302.029,13 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2024 A 28/05/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFI, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000512
Data e Hora de Emissão:
05/06/2024 17:05:19
Código de Verificação:
FHVÑ-YG7C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
E-mail: dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail: ----

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
OBRA Nº: 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 Nº DO CONTRATO: 176-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023
EM 5 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2024 a 28/05/2024
VALOR TOTAL R\$ 302.029,13
VALOR DO MATERIAL 40% R\$ 120.811,65. BASE DE CALCULO DO INSS 60%: R\$ 181.217,48 X 11% INSS: R\$ 19.933,92
VALOR DO ISS 5% R\$ 9.060,87
RETENÇÃO IR - ALIQUOTA (1,2%) VALOR RETIDO R\$ 3.624,35
DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AG: 3673 / CC:67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$302.029,13

CNAE				
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
Item da Lista de Serviços				
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
120.811,65	181.217,48	5,00%	9.060,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$)
19.933,92	0,00	0,00	3.624,35	0,00	9.060,87	269.409,99

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 05/06/2024
 Assinado por:
 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396536		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
181.217,47	5,000	9.060,87		9.060,87		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 06/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 06/06/2024 11:39:46	DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 512 - DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.060,87		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.060,87		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000090 . 5 60873906202 . 4 40710010500 . 3 00039653612 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000090 . 5 60873906202 . 4 40710010500 . 3 00039653612 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 396536	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 06/06/2024 11:39:46	DATA VENCIMENTO: 10/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.060,87
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.060,87





I.R.R.F

Nº DAM: 396534	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO: 30349		
TIPO / NOME LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 3.624,35	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 3.624,35	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.624,35
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 06/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 06/06/2024 11:37:51	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.624,35	
Valor do Tributo:	3.624,35	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	3.624,35		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Cálculo:	3.624,35	Vlr. Devido com Desconto:	3.624,35	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	3.624,35	
4) NF-e Nº512 - Data de emissão: 05/06/2024					



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8174000036 . 7 24353906202 . 2 40630010100 . 2 00039653407 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000036 . 7 24353906202 . 2 40630010100 . 2 00039653407 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396534	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 06/06/2024 11:37:51	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.624,35
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.624,35






Estado de Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2023 a 16/05/2024
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
EMPRESA: MP2 Construções EIRELI/EP
CNPJ: 24.597.344/0001-96
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO R\$ 302.029,13

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
Nº DO CONTRATO: 176/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023
OBRA Nº: 006/2023

CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
OBS: 11/2022 - Siqueira
Banco: SBCBP - 11/2022 - Bahia
R.D.I: 23,54%
Energia Social: R\$ 292.944,20
Risco Democrático: R\$ 495,10
Honorários: R\$ 143,03
Mortobrás: R\$ 71.515,00
R\$ 8.176,15
R\$ 45.700,00
R\$ 74,86
R\$ 371,25
R\$ 14.923,93
R\$ 2.096,00
R\$ 42.411,13
R\$ 104.755,27
R\$ 333.666,23
R\$ 73.408,97
R\$ 1.319,37
R\$ 9.471,52
R\$ 3.439,59

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IPI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
										QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	51	ORSE	Fluxo de obra em chapas galvanizadas, instalada - Rev 02 - 01/2023	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.970,60	3,64%			6,00	2.970,60	R\$ 0,00	100%
1.2	98459	SIBAP1	TAPINH COM 11310A BERTALCA, AF 05/2018	m²	500,00	R\$ 115,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,89%			500,00	71.515,00	R\$ 0,00	100%
1.4	97622	SIBAP1	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	122,90	R\$ 54,52	R\$ 66,17	R\$ 8.176,15	0,10%			122,90	8.176,14	R\$ 0,00	100%
1.5	100938	SIBAP1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERMUNICIPAL DO CARTEIRO - UNIDADE: MIXERAL AF 07/2020	M3XK M	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%			4925,04	45.014,82	R\$ 685,18	99%
1.6	97644	SIBAP1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%			6,71	74,76	R\$ 0,10	100%
1.7	97645	SIBAP1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	9,00	R\$ 33,29	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%			9,00	371,25	R\$ 0,00	100%
1.8	97647	SIBAP1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%			3596,13	14.923,93	R\$ 0,00	100%
1.9	9742	ORSE	Restauração de armadores de concreto armado, incluindo fletamento e proteção com fita bituminosa Rev. 01 - 01/2022	m	32,00	R\$ 55,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%			32,00	2.096,00	R\$ 0,00	100%
1.10	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.411,13	0,53%			3155,59	42.411,12	R\$ 0,00	100%
1.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre base de concreto - Rev 01	m²	3596,13	R\$ 27,58	R\$ 29,13	R\$ 104.755,27	1,30%			3596,13	104.755,27	R\$ 0,00	100%
2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO												
2.1	96358	SIBAP1	PARDEL COM PLACAS DE GESSO ACABAMENTO (DIPYVAL), PARA USO INTERNO, COM BARRAS SÔMBRES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS SIBAP15, SEM VIGOS. AF 06/2017 P5.	m²	519,93	R\$ 114,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,97	0,91%			0,00	0,00	R\$ 73.408,97	0%
2.2	87593	SIBAP1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X30X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,9M² SEM VIGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM TORNEIRA. AF 06/2014	m²	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%			2282,08	225.971,56	R\$ 0,00	100%
2.4	1988	ORSE	Perfuração granito cinco-poleiros, 2" diâmetro x 17 cm, emp - 2 cm	m	57,07	R\$ 306,70	R\$ 113,82	R\$ 7.527,97	0,09%			0,00	0,00	R\$ 7.527,97	0%
2.4	13318	ORSE	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, incluindo montagem com ferragens.	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,08	R\$ 24.767,78	0,31%			0,00	0,00	R\$ 24.767,78	0%
3			ESCALARIAS												
3.1	90850	SIBAP1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-ME, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (WC PCD)	UN	1,00	R\$1.001,97	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,07%			0,00	0,00	R\$ 1.319,37	0%
3.2	91341	SIBAP1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VITRAMA COM GUARNIÇÃO, TIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 (BOX WC FERRAGEM E MASSA ÚMIDA)	m²	10,20	R\$ 751,64	R\$ 928,58	R\$ 9.471,52	0,12%			0,00	0,00	R\$ 9.471,52	0%
3.3	90822	SIBAP1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LIVRE OU MÉDIA), BOX/BOX DE ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (WV, TIPO E ADM 1º ANDAR)	UN	7,00	R\$ 397,74	R\$ 491,37	R\$ 3.439,59	0,04%			0,00	0,00	R\$ 3.439,59	0%



Av. Tancredo Neves, 2555, Edif. Coo. Saúde, Terr. Leste, Sala 913
CEP: 41.870-071 - Santaluz-BA
CNPJ: 20.151.999/0001-03

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Patricia C Mendes
CPF: 030025294
Socia Administradora



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PLANO ORÇAMENTÁRIO		MEDIDA DE		ACUMULADO		SALDO	%
		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
3.5	17989	ORSE	36,00	R\$ 709,36	R\$ 876,34	R\$ 31.548,24	0,00	R\$ 31.548,24	0%
3.6	1857	ORSE	991,66	R\$ 211,30	R\$ 261,04	R\$ 258.862,93	0,00	R\$ 258.862,93	0%
3.7	1989	ORSE	4,00	R\$ 137,60	R\$ 169,99	R\$ 781,95	0,00	R\$ 781,95	0%
3.8	100758	SINAPI	991,66	R\$ 50,90	R\$ 67,88	R\$ 62.355,58	0,00	R\$ 62.355,58	0%
3.9	12183	ORSE	419,72	R\$ 475,20	R\$ 587,06	R\$ 246.400,82	0,00	R\$ 246.400,82	0%
4									
4.1	11890	ORSE	18,00	R\$ 1.718,98	R\$ 2.123,63	R\$ 41.239,60	0,00	R\$ 38.225,34	0%
4.2	91305	SINAPI	10,00	R\$ 113,07	R\$ 139,69	R\$ 1.396,90	0,00	R\$ 1.396,90	0%
4.3	91306	SINAPI	8,00	R\$ 183,65	R\$ 202,17	R\$ 1.617,36	0,00	R\$ 1.617,36	0%
5									
5.1	94570	SINAPI	5,28	R\$ 215,91	R\$ 266,74	R\$ 1.408,39	0,00	R\$ 1.408,39	0%
6									
6.1	103980	SINAPI	4,00	R\$ 17,48	R\$ 21,59	R\$ 86,36	4,00	R\$ 86,36	100%
6.2	103993	SINAPI	4,00	R\$ 9,64	R\$ 11,91	R\$ 47,64	4,00	R\$ 47,64	100%
6.3	103999	SINAPI	1,00	R\$ 12,37	R\$ 15,28	R\$ 15,28	1,00	R\$ 15,28	100%
6.4	94789	SINAPI	1,00	R\$ 240,74	R\$ 297,41	R\$ 297,41	1,00	R\$ 297,41	100%
6.5	89376	SINAPI	1,00	R\$ 5,56	R\$ 6,87	R\$ 6,87	1,00	R\$ 6,87	100%
6.6	103947	SINAPI	9,00	R\$ 6,16	R\$ 7,61	R\$ 68,49	9,00	R\$ 68,49	100%
6.7	103977	SINAPI	9,00	R\$ 6,94	R\$ 8,57	R\$ 77,13	9,00	R\$ 77,13	100%
6.8	103958	SINAPI	5,00	R\$ 9,89	R\$ 12,22	R\$ 61,10	5,00	R\$ 61,10	100%
6.9	103962	SINAPI	7,00	R\$ 6,42	R\$ 7,93	R\$ 55,51	7,00	R\$ 55,51	100%
6.10	103964	SINAPI	14,00	R\$ 8,15	R\$ 10,07	R\$ 140,98	14,00	R\$ 140,98	100%
6.11	103969	SINAPI	1,00	R\$ 19,86	R\$ 24,54	R\$ 24,54	1,00	R\$ 24,54	100%
6.12	103972	SINAPI	1,00	R\$ 29,25	R\$ 36,14	R\$ 36,14	1,00	R\$ 36,14	100%
6.13	90373	SINAPI	16,00	R\$ 13,05	R\$ 16,12	R\$ 257,92	16,00	R\$ 257,92	100%
6.14	89358	SINAPI	175,00	R\$ 7,78	R\$ 9,61	R\$ 1.681,75	175,00	R\$ 1.681,75	100%



Av. Taumaturbo, 2519, Jd. São Sebastião, Torre Lanchonete, Est. 911
 CEP: 41.120-001, Salvador-BA
 CNPJ: 28.115.999/0001-53

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

PLANILHA ORÇAMENTARIA									MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
NUM. ORÇ.	NUM. PROJ.	NUM. ITEM.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL			
6.38	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 17,91	R\$ 22,13	R\$ 110,65	0,00%	5,00	R\$ 110,65	5,00	110,65	R\$ 0,00	100%
6.39	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 18,73	R\$ 23,14	R\$ 46,28	0,00%	2,00	R\$ 46,28	2,00	46,28	R\$ 0,00	100%
6.40	104007	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 21,86	R\$ 27,01	R\$ 594,22	0,01%	22,00	R\$ 594,22	22,00	594,22	R\$ 0,00	100%
6.41	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,11	R\$ 24,84	R\$ 24,84	0,00%	1,00	R\$ 24,84	1,00	24,84	R\$ 0,00	100%
6.42	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 30,25	R\$ 37,37	R\$ 74,74	0,00%	2,00	R\$ 74,74	2,00	74,74	R\$ 0,00	100%
6.43	89630	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 61,76	R\$ 76,30	R\$ 152,60	0,00%	2,00	R\$ 152,60	2,00	152,60	R\$ 0,00	100%
6.44	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 20,62	R\$ 25,47	R\$ 76,41	0,00%	3,00	R\$ 76,41	3,00	76,41	R\$ 0,00	100%
6.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 18,82	R\$ 23,25	R\$ 186,00	0,00%	8,00	R\$ 186,00	8,00	186,00	R\$ 0,00	100%
6.46	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	426,00	R\$ 20,20	R\$ 24,96	R\$ 10.632,96	0,13%	426,00	R\$ 10.632,96	426,00	10.632,96	R\$ 0,00	100%
6.47	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	282,00	R\$ 23,28	R\$ 28,76	R\$ 8.110,32	0,10%	282,00	R\$ 8.110,32	282,00	8.110,32	R\$ 0,00	100%
6.48	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	R\$ 32,26	R\$ 39,85	R\$ 2.151,90	0,03%	54,00	R\$ 2.151,90	54,00	2.151,90	R\$ 0,00	100%
6.49	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,00	R\$ 17,23	R\$ 21,29	R\$ 1.405,14	0,02%	66,00	R\$ 1.405,14	66,00	1.405,14	R\$ 0,00	100%
6.50	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	238,00	R\$ 19,05	R\$ 23,53	R\$ 5.600,14	0,07%	238,00	R\$ 5.600,14	238,00	5.600,14	R\$ 0,00	100%
6.51	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	R\$ 49,79	R\$ 61,51	R\$ 3.690,60	0,05%	60,00	R\$ 3.690,60	60,00	3.690,60	R\$ 0,00	100%
6.52	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,14	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0,00%	1,00	R\$ 15,00	1,00	15,00	R\$ 0,00	100%
6.54	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 680,82	R\$ 841,09	R\$ 4.205,45	0,05%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.205,45	0%
6.55	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 4.619,68	0,06%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.619,68	0%
6.58	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	106,00	R\$ 21,76	R\$ 26,88	R\$ 2.849,28	0,04%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.849,28	0%
6.59	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 40,50	R\$ 50,03	R\$ 1.701,02	0,02%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.701,02	0%
6.60	104035	SINAPI	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 52,26	R\$ 64,56	R\$ 64,56	0,00%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 64,56	0%
6.61	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 1.421,44	0,02%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.421,44	0%
6.62	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 54,41	R\$ 67,22	R\$ 1.277,18	0,02%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.277,18	0%
6.63	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	64,00	R\$ 58,54	R\$ 72,32	R\$ 4.628,48	0,06%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.628,48	0%
6.66	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 152,81	R\$ 188,78	R\$ 755,12	0,01%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 755,12	0%





CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PLANO ORÇAMENTÁRIO										ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
			QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
6.67	SINAPI	94499	UN	1,00	R\$ 348,47	R\$ 348,47	R\$ 348,47	R\$ 348,47	R\$ 348,47	0,00%	R\$ 348,47	0,00%	R\$ 348,47	0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,47	0%
6.68	SINAPI	89987	UN	4,00	R\$ 91,59	R\$ 366,36	R\$ 113,15	R\$ 452,60	R\$ 452,60	0,01%	R\$ 452,60	0,01%	R\$ 452,60	0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,60	0%
6.69	SINAPI	103043	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 29,15	R\$ 36,01	R\$ 36,01	R\$ 36,01	0,00%	R\$ 36,01	0,00%	R\$ 36,01	0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,01	0%
6.70	SINAPI	94792	UN	4,00	R\$ 137,85	R\$ 551,40	R\$ 137,85	R\$ 551,40	R\$ 551,40	0,01%	R\$ 551,40	0,01%	R\$ 551,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,40	0%
6.71	SINAPI	94793	UN	4,00	R\$ 188,78	R\$ 755,12	R\$ 188,78	R\$ 755,12	R\$ 755,12	0,01%	R\$ 755,12	0,01%	R\$ 755,12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 755,12	0%
6.72	SINAPI	89986	UN	63,00	R\$ 95,51	R\$ 6.017,13	R\$ 95,51	R\$ 6.017,13	R\$ 6.017,13	0,08%	R\$ 6.017,13	0,08%	R\$ 6.017,13	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.017,13	0%
6.73	SINAPI	89987	UN	59,00	R\$ 113,15	R\$ 6.675,85	R\$ 113,15	R\$ 6.675,85	R\$ 6.675,85	0,08%	R\$ 6.675,85	0,08%	R\$ 6.675,85	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.675,85	0%
6.74	SINAPI	94705	UN	4,00	R\$ 47,11	R\$ 188,44	R\$ 47,11	R\$ 188,44	R\$ 188,44	0,00%	R\$ 188,44	0,00%	R\$ 188,44	0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,44	0%
6.75	SINAPI	100866	UN	2,00	R\$ 401,47	R\$ 802,94	R\$ 401,47	R\$ 802,94	R\$ 802,94	0,01%	R\$ 802,94	0,01%	R\$ 802,94	0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,94	0%
6.77	SINAPI	100874	UN	1,00	R\$ 401,47	R\$ 401,47	R\$ 401,47	R\$ 401,47	R\$ 401,47	0,00%	R\$ 401,47	0,00%	R\$ 401,47	0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,47	0%
6.79	SINAPI	93396	UN	9,80	R\$ 746,29	R\$ 7.313,64	R\$ 746,29	R\$ 7.313,64	R\$ 7.313,64	0,07%	R\$ 7.313,64	0,07%	R\$ 7.313,64	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.313,64	0%
6.80	SINAPI	86931	UN	11,00	R\$ 582,71	R\$ 6.409,81	R\$ 582,71	R\$ 6.409,81	R\$ 6.409,81	0,08%	R\$ 6.409,81	0,08%	R\$ 6.409,81	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.409,81	0%
6.80	ORSE	2097	un	48,00	R\$ 976,24	R\$ 46.859,52	R\$ 976,24	R\$ 46.859,52	R\$ 46.859,52	0,58%	R\$ 46.859,52	0,58%	R\$ 46.859,52	0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.859,52	0%
6.81	SINAPI	95472	UN	1,00	R\$ 896,01	R\$ 896,01	R\$ 896,01	R\$ 896,01	R\$ 896,01	0,01%	R\$ 896,01	0,01%	R\$ 896,01	0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,01	0%
6.82	ORSE	2066	un	11,00	R\$ 63,64	R\$ 700,04	R\$ 63,64	R\$ 700,04	R\$ 700,04	0,01%	R\$ 700,04	0,01%	R\$ 700,04	0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,04	0%
7						R\$ 94.584,71		R\$ 94.584,71		3,17%							
7.1	SINAPI	104009	UN	22,00	R\$ 16,10	R\$ 354,20	R\$ 16,10	R\$ 354,20	R\$ 354,20	0,00%	R\$ 354,20	0,00%	R\$ 354,20	22,00	R\$ 112,70	R\$ 0,00	100%
7.2	SINAPI	98105	UN	16,00	R\$ 782,49	R\$ 12.519,84	R\$ 782,49	R\$ 12.519,84	R\$ 12.519,84	0,16%	R\$ 12.519,84	0,16%	R\$ 12.519,84	16,00	R\$ 12.519,84	R\$ 0,00	100%
7.3	SINAPI	101806	UN	17,00	R\$ 679,30	R\$ 11.548,10	R\$ 679,30	R\$ 11.548,10	R\$ 11.548,10	0,14%	R\$ 11.548,10	0,14%	R\$ 11.548,10	17,00	R\$ 2.037,90	R\$ 0,00	100%
7.4	SINAPI	101804	UN	11,00	R\$ 1.614,95	R\$ 17.764,45	R\$ 1.614,95	R\$ 17.764,45	R\$ 17.764,45	0,22%	R\$ 17.764,45	0,22%	R\$ 17.764,45	11,00	R\$ 17.764,45	R\$ 0,00	100%
7.5	SINAPI	89707	UN	49,00	R\$ 53,79	R\$ 2.635,71	R\$ 53,79	R\$ 2.635,71	R\$ 2.635,71	0,03%	R\$ 2.635,71	0,03%	R\$ 2.635,71	49,00	R\$ 2.635,71	R\$ 0,00	100%
7.6	SINAPI	104329	UN	15,00	R\$ 84,96	R\$ 1.274,40	R\$ 84,96	R\$ 1.274,40	R\$ 1.274,40	0,02%	R\$ 1.274,40	0,02%	R\$ 1.274,40	15,00	R\$ 1.274,40	R\$ 0,00	100%



Av. Tancredo Neves, 2939, Jd. Casa Suburbana, Torre Landeira, Sala 913
 CEP: 91.684-021 - São João del-Rei
 CNPJ: 20.113.999/0001-03

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



		PLANO ORÇAMENTARIA												MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
		QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
7.7	10063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, COQUE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETORES PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 73,78	R\$ 91,15	0,00%	R\$ 91,15	R\$ 91,15	1,00	R\$ 91,15	1,00	R\$ 91,15	1,00	R\$ 91,15	1,00	R\$ 91,15	100%
7.8	1545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâmetro = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 57,75	R\$ 71,34	0,00%	R\$ 71,34	R\$ 71,34	1,00	R\$ 71,34	1,00	R\$ 71,34	1,00	R\$ 71,34	1,00	R\$ 71,34	100%
7.9	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido de anéis, diâmetro = 50mm - Rev.01 - 10/2022	un	15,00	R\$ 14,52	R\$ 17,94	0,00%	R\$ 17,94	R\$ 269,10	15,00	R\$ 269,10	15,00	R\$ 269,10	15,00	R\$ 269,10	15,00	R\$ 269,10	100%
7.10	1620	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido de anéis, diâmetro = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 28,28	R\$ 34,94	0,00%	R\$ 34,94	R\$ 34,94	1,00	R\$ 34,94	1,00	R\$ 34,94	1,00	R\$ 34,94	1,00	R\$ 34,94	100%
7.11	89728	SINAPI	JUNTA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	79,00	R\$ 12,89	R\$ 15,92	0,00%	R\$ 15,92	R\$ 1.257,68	79,00	R\$ 1.257,68	79,00	R\$ 1.257,68	79,00	R\$ 1.257,68	79,00	R\$ 1.257,68	100%
7.12	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 32,48	R\$ 40,13	0,00%	R\$ 40,13	R\$ 120,39	3,00	R\$ 120,39	3,00	R\$ 120,39	3,00	R\$ 120,39	3,00	R\$ 120,39	100%
7.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 10,27	R\$ 12,63	0,00%	R\$ 12,63	R\$ 151,56	12,00	R\$ 151,56	12,00	R\$ 151,56	12,00	R\$ 151,56	12,00	R\$ 151,56	100%
7.14	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 15,65	R\$ 19,33	0,00%	R\$ 19,33	R\$ 270,62	14,00	R\$ 270,62	14,00	R\$ 270,62	14,00	R\$ 270,62	14,00	R\$ 270,62	100%
7.15	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 21,69	R\$ 26,80	0,00%	R\$ 26,80	R\$ 214,40	8,00	R\$ 214,40	8,00	R\$ 214,40	8,00	R\$ 214,40	8,00	R\$ 214,40	100%
7.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 9,99	R\$ 12,24	0,00%	R\$ 12,24	R\$ 271,48	22,00	R\$ 271,48	22,00	R\$ 271,48	22,00	R\$ 271,48	22,00	R\$ 271,48	100%
7.17	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	54,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	0,01%	R\$ 18,44	R\$ 995,76	54,00	R\$ 995,76	54,00	R\$ 995,76	54,00	R\$ 995,76	54,00	R\$ 995,76	100%
7.18	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 22,63	R\$ 27,96	0,00%	R\$ 27,96	R\$ 55,92	2,00	R\$ 55,92	2,00	R\$ 55,92	2,00	R\$ 55,92	2,00	R\$ 55,92	100%
7.19	1672	ORSE	Joelho de 90° com bolta para anel, em pvc rígido de anéis, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	57,00	R\$ 15,79	R\$ 19,51	0,01%	R\$ 19,51	R\$ 1.112,07	57,00	R\$ 1.112,07	57,00	R\$ 1.112,07	57,00	R\$ 1.112,07	57,00	R\$ 1.112,07	100%
7.20	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 31,65	R\$ 39,30	0,01%	R\$ 39,30	R\$ 742,90	19,00	R\$ 742,90	19,00	R\$ 742,90	19,00	R\$ 742,90	19,00	R\$ 742,90	100%
7.21	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	0,00%	R\$ 18,44	R\$ 73,76	4,00	R\$ 73,76	4,00	R\$ 73,76	4,00	R\$ 73,76	4,00	R\$ 73,76	100%
7.22	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	un	15,00	R\$ 49,25	R\$ 60,84	0,01%	R\$ 60,84	R\$ 912,60	15,00	R\$ 912,60	15,00	R\$ 912,60	15,00	R\$ 912,60	15,00	R\$ 912,60	100%
7.23	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 78,99	R\$ 97,58	0,00%	R\$ 97,58	R\$ 292,74	3,00	R\$ 292,74	3,00	R\$ 292,74	3,00	R\$ 292,74	3,00	R\$ 292,74	100%
7.24	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 26,54	R\$ 32,79	0,00%	R\$ 32,79	R\$ 229,53	7,00	R\$ 229,53	7,00	R\$ 229,53	7,00	R\$ 229,53	7,00	R\$ 229,53	100%
7.25	1634	ORSE	Junção simples em pvc rígido de anéis, para esgoto primário, diâmetro = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	15,00	R\$ 29,45	R\$ 36,38	0,01%	R\$ 36,38	R\$ 545,70	15,00	R\$ 545,70	15,00	R\$ 545,70	15,00	R\$ 545,70	15,00	R\$ 545,70	100%
7.26	89754	SINAPI	LULA DE CORREIA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 20,87	R\$ 25,78	0,01%	R\$ 25,78	R\$ 670,28	26,00	R\$ 670,28	26,00	R\$ 670,28	26,00	R\$ 670,28	26,00	R\$ 670,28	100%
7.27	97994	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALUMINIAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TEMPÃO. AF_13/2020_PA	UN	1,00	R\$ 2.408,45	R\$ 3.222,48	0,04%	R\$ 3.222,48	R\$ 3.222,48	1,00	R\$ 3.222,48	1,00	R\$ 3.222,48	1,00	R\$ 3.222,48	1,00	R\$ 3.222,48	100%
7.28	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 762,78	R\$ 942,34	0,01%	R\$ 942,34	R\$ 942,34	1,00	R\$ 942,34	1,00	R\$ 942,34	1,00	R\$ 942,34	1,00	R\$ 942,34	100%



Av. Tancredo Neves, 2319, Jd. Cos Nobre, Terra Lençóis, São 913
 CEP: 41.824-021 - Salvador/BA
 CNPJ: 26.135.999/0001-53

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Patrícia C. Mander
 CPF 96.902.902-01
 Diretora Administrativa



Nº	CÓDIGO	PLANO DE OBRAS	PLANO ORÇAMENTARIA										ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
			UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL				
													QUANT.	PREÇO TOTAL		
7.29	89549	SINAPI	UN	16,00	R\$ 19,11	R\$ 316,16	R\$ 316,16	0,00%	16,00	R\$ 316,16	R\$ 316,16	16,00	R\$ 316,16	R\$ 0,00	100%	
7.30	1583	ORSE	un	2,00	R\$ 22,94	R\$ 45,88	R\$ 45,88	0,00%	2,00	R\$ 45,88	R\$ 45,88	2,00	R\$ 45,88	R\$ 0,00	100%	
7.31	89557	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0,00%	1,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	1,00	R\$ 31,62	R\$ 0,00	100%	
7.32	104344	SINAPI	UN	28,00	R\$ 40,74	R\$ 1.140,72	R\$ 1.140,72	0,02%	28,00	R\$ 40,74	R\$ 1.140,72	28,00	R\$ 1.140,72	R\$ 0,00	100%	
7.33	89784	SINAPI	UN	28,00	R\$ 24,21	R\$ 677,88	R\$ 677,88	0,01%	28,00	R\$ 24,21	R\$ 677,88	28,00	R\$ 677,88	R\$ 0,00	100%	
7.34	1659	ORSE	un	4,00	R\$ 30,90	R\$ 123,60	R\$ 123,60	0,00%	4,00	R\$ 30,90	R\$ 123,60	4,00	R\$ 123,60	R\$ 0,00	100%	
7.35	89848	SINAPI	M	294,00	R\$ 27,32	R\$ 8.031,68	R\$ 8.031,68	0,12%	294,00	R\$ 27,32	R\$ 8.031,68	294,00	R\$ 8.031,68	R\$ 0,00	100%	
7.36	89849	SINAPI	M	78,00	R\$ 56,10	R\$ 4.375,80	R\$ 4.375,80	0,07%	78,00	R\$ 56,10	R\$ 4.375,80	78,00	R\$ 4.375,80	R\$ 0,00	100%	
7.37	89711	SINAPI	M	72,00	R\$ 21,09	R\$ 1.518,48	R\$ 1.518,48	0,02%	72,00	R\$ 21,09	R\$ 1.518,48	72,00	R\$ 1.518,48	R\$ 0,00	100%	
7.38	89772	SINAPI	M	396,00	R\$ 26,78	R\$ 10.605,08	R\$ 10.605,08	0,16%	396,00	R\$ 26,78	R\$ 10.605,08	396,00	R\$ 10.605,08	R\$ 0,00	100%	
7.39	89773	SINAPI	M	67,00	R\$ 33,37	R\$ 2.231,49	R\$ 2.231,49	0,03%	67,00	R\$ 33,37	R\$ 2.231,49	67,00	R\$ 2.231,49	R\$ 0,00	100%	
8						R\$ 172.300,94	R\$ 172.300,94	3,14%								
8.1	5970	ORSE	un	17,00	R\$ 1.290,03	R\$ 21.930,51	R\$ 21.930,51	0,34%	17,00	R\$ 1.290,03	R\$ 21.930,51	17,00	R\$ 21.930,51	R\$ 0,00	100%	
8.2	11524	ORSE	un	2,00	R\$ 6.835,50	R\$ 13.671,00	R\$ 13.671,00	0,21%	2,00	R\$ 6.835,50	R\$ 13.671,00	2,00	R\$ 13.671,00	R\$ 0,00	100%	
8.3	89709	SINAPI	UN	10,00	R\$ 18,54	R\$ 185,40	R\$ 185,40	0,00%	10,00	R\$ 18,54	R\$ 185,40	10,00	R\$ 185,40	R\$ 229,00	0%	
8.4	104064	SINAPI	UN	6,00	R\$ 180,33	R\$ 1.081,98	R\$ 1.081,98	0,02%	6,00	R\$ 180,33	R\$ 1.081,98	6,00	R\$ 1.081,98	R\$ 0,00	100%	
8.5	89591	SINAPI	UN	12,00	R\$ 129,13	R\$ 1.549,56	R\$ 1.549,56	0,02%	12,00	R\$ 129,13	R\$ 1.549,56	12,00	R\$ 1.549,56	R\$ 0,00	100%	
8.6	83335	SINAPI	UN	4,00	R\$ 605,30	R\$ 2.421,20	R\$ 2.421,20	0,04%	4,00	R\$ 605,30	R\$ 2.421,20	4,00	R\$ 2.421,20	R\$ 0,00	100%	
8.7	1209	ORSE	un	8,00	R\$ 86,64	R\$ 693,12	R\$ 693,12	0,01%	8,00	R\$ 86,64	R\$ 693,12	8,00	R\$ 693,12	R\$ 0,00	100%	
8.8	104166	SINAPI	M	180,00	R\$ 73,51	R\$ 13.231,80	R\$ 13.231,80	0,20%	180,00	R\$ 73,51	R\$ 13.231,80	180,00	R\$ 13.231,80	R\$ 0,00	100%	
8.9	90696	SINAPI	M	144,00	R\$ 147,34	R\$ 21.216,96	R\$ 21.216,96	0,33%	144,00	R\$ 147,34	R\$ 21.216,96	144,00	R\$ 21.216,96	R\$ 0,00	100%	
8.10	90697	SINAPI	M	48,00	R\$ 227,63	R\$ 10.926,24	R\$ 10.926,24	0,17%	48,00	R\$ 227,63	R\$ 10.926,24	48,00	R\$ 10.926,24	R\$ 0,00	100%	
8.11	6339	ORSE	m	24,00	R\$ 371,33	R\$ 8.911,92	R\$ 8.911,92	0,13%	24,00	R\$ 371,33	R\$ 8.911,92	24,00	R\$ 8.911,92	R\$ 0,00	100%	
8.12	7113	ORSE	m	66,00	R\$ 526,89	R\$ 34.794,74	R\$ 34.794,74	0,54%	66,00	R\$ 526,89	R\$ 34.794,74	66,00	R\$ 34.794,74	R\$ 0,00	100%	
8.13	90699	SINAPI	M	18,00	R\$ 487,35	R\$ 8.772,30	R\$ 8.772,30	0,13%	18,00	R\$ 487,35	R\$ 8.772,30	18,00	R\$ 8.772,30	R\$ 0,00	100%	
8.14	9276	ORSE	un	18,00	R\$ 52,10	R\$ 937,80	R\$ 937,80	0,01%	18,00	R\$ 52,10	R\$ 937,80	18,00	R\$ 937,80	R\$ 1.158,48	100%	



Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 01602579


Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Cos. Salvador, Terra Luminosa, Sáb. 913
CNPJ: 41.228.021 - ISENTA
CNPJ: 28.113.999/0001-03

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Patricia C. Monteiro
CPF: 940.002.51-91
Bairro: Administradores



9	PLANO ORÇAMENTARIA										MEDICAO 05		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14			9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.21	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
9.1	12018	ORSE	SISTEMA DE INCÊNDIO	un	169,00	R\$ 229,64	R\$ 283,70	R\$ 47,945,30	R\$ 126,915,69	1,58%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 47,945,30	0%
9.2	12017	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VEBIM ou similar	un	30,00	R\$ 229,64	R\$ 283,70	R\$ 8.511,00	R\$ 8.511,00	0,11%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.511,00	0%
9.3	7883	ORSE	Detector de temperatura termoelementar endereçável, modelo VRE-T, marca VEBIM ou similar	un	10,00	R\$ 230,76	R\$ 285,08	R\$ 2.850,80	R\$ 2.850,80	0,04%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.850,80	0%
9.4	11820	ORSE	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Voz, p/incluido, ref Gevi Gamma ou similar	un	1,00	R\$ 5.672,59	R\$ 7.007,97	R\$ 7.007,97	R\$ 7.007,97	0,09%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 7.007,97	0%
9.5	8693	ORSE	Central de alarme endereçável de incêndio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcalem Verm ou similar, Modelo VRE-250 C/ bateria de 12V e /Alarmpes	un	1,00	R\$ 309,00	R\$ 381,74	R\$ 381,74	R\$ 381,74	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 381,74	0%
9.6	11829	ORSE	Bateria industrial para acionamento de sirene (p/penitenciaría)	un	10,00	R\$ 152,57	R\$ 186,48	R\$ 1.864,80	R\$ 1.864,80	0,02%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.864,80	0%
9.7	650	ORSE	Acionador manual (botoneira) "aperte aqui", p/instal. Incêndio - endereçável	un	27,00	R\$ 70,35	R\$ 86,91	R\$ 2.346,57	R\$ 2.346,57	0,03%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.346,57	0%
9.8	4178	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	4,00	R\$ 1,58	R\$ 1,95	R\$ 7,80	R\$ 7,80	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 7,80	0%
9.9	8975	ORSE	Abrazadeira em aço inox, tipo "D", 1" - fornecimento	un	619,00	R\$ 5,48	R\$ 7,21	R\$ 4.462,99	R\$ 4.462,99	0,06%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.462,99	0%
9.10	10277	ORSE	Abrazadeira em aço inox, tipo "D", 3/4" - fornecimento	un	98,00	R\$ 5,45	R\$ 6,73	R\$ 659,54	R\$ 659,54	0,01%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 659,54	0%
9.11	91880	SINAPI	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 9,92	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 12,26	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 12,26	0%
9.12	91882	SINAPI	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	123,00	R\$ 7,92	R\$ 9,78	R\$ 1.202,94	R\$ 1.202,94	0,01%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.202,94	0%
9.13	91884	SINAPI	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	R\$ 9,06	R\$ 11,19	R\$ 246,18	R\$ 246,18	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 246,18	0%
9.14	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	R\$ 15,39	R\$ 19,01	R\$ 342,18	R\$ 342,18	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 342,18	0%
9.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	783,00	R\$ 9,18	R\$ 11,34	R\$ 8.879,22	R\$ 8.879,22	0,11%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.879,22	0%
9.16	91865	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 10,87	R\$ 13,43	R\$ 1.611,60	R\$ 1.611,60	0,02%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.611,60	0%
9.17	95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 1/1	UN	5,00	R\$ 31,74	R\$ 39,21	R\$ 196,05	R\$ 196,05	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 196,05	0%
9.18	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,00	R\$ 29,44	R\$ 36,37	R\$ 1.454,80	R\$ 1.454,80	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.454,80	0%
9.19	73861/001	SINAPI	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	R\$ 21,71	R\$ 26,82	R\$ 5.364,00	R\$ 5.364,00	0,07%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.364,00	0%
9.21	649	ORSE	Fio rígido isolado em PVC 1,5mm2 - 450V/50x7/70°C	m	4000,00	R\$ 5,80	R\$ 7,17	R\$ 31.548,00	R\$ 31.548,00	0,39%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 31.548,00	0%
10.1	94473	SINAPI	HIDRANTE	UN	14,00	R\$ 107,25	R\$ 137,50	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00	0,02%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.855,00	0%
10.2	8612	ORSE	COTVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 6.773,85	R\$ 8.368,41	R\$ 8.368,41	R\$ 8.368,41	0,10%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.368,41	0%
10.3	72803	SINAPI	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 4 CV, Schneider mod BC-21R ou similar	UN	1,00	R\$ 228,30	R\$ 282,04	R\$ 282,04	R\$ 282,04	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 282,04	0%
10.4	83633	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL LONGO COM FLANGES LARGOS PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMx1,2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.936,57	R\$ 3.936,57	R\$ 3.936,57	R\$ 3.936,57	0,05%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.936,57	0%
10.5	92778	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	R\$ 93,87	R\$ 115,91	R\$ 115,91	R\$ 115,91	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 115,91	0%
10.6	92777	SINAPI	LÚVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 84,61	R\$ 104,53	R\$ 104,53	R\$ 104,53	0,00%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 104,53	0%
10.7	1517	ORSE	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 258,15	R\$ 258,15	0,01%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 258,15	0%
10.7	1517	ORSE	Fornecimento e instalação de redução fio tipo Smart para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)	un	4,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	R\$ 1.032,60	0,01%												0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.032,60	0%



Camilla Ribeiro Corr
Eng. Civil - CREA/ES 01682378


Av. Tancredo Neves, 2319, JdF. Coo. Suburb. Trs. Lankler, Sáb 913
CEP: 41.420-911 - Vitória/ES
CNPJ: 20.113.999/0001-55

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Patrícia C. Mendes
CPF: 90.402.082/01-1
Engenheira Administradora



Item	Descrição	Quantidade	MEDIDAÇÃO 09		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
			QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
10.8	Registo globo angular 45° para hidrante, 4" x 1/2", exclusive tampão com corrente	un	4,00	R\$ 241,12	R\$ 297,88	R\$ 1.191,52	R\$ 1.191,52	0%
10.9	Abriço para fechadura com mangueira e espelho, de embudo/interior, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilação, visor com inscrição "incendio", suporte/costa interna para mangueira, pintura eletrostática vermelha - ferreç. E instal	un	1,00	R\$ 1.881,03	R\$ 2.323,82	R\$ 2.323,82	R\$ 2.323,82	0%
10.10	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Start para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	4,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	R\$ 1.032,60	0%
10.11	Especho jato regulável de 1 1/2" para combata a incendio - Rev. 01	un	4,00	R\$ 189,65	R\$ 233,06	R\$ 932,24	R\$ 932,24	0%
10.12	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Start para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	4,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	R\$ 1.032,60	0%
10.13	Fornecimento e instalação de tampão de lãdo, cobre ou bronze, juntas soldadas 66mm (2 1/2")	un	4,00	R\$ 12,36	R\$ 15,27	R\$ 61,08	R\$ 61,08	0%
10.14	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão para incendio 1/2" com 15m	un	8,00	R\$ 579,42	R\$ 715,82	R\$ 5.726,56	R\$ 5.726,56	0%
10.15	Fornecimento e assentamento de nipple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	R\$ 64,18	R\$ 78,29	R\$ 317,16	R\$ 317,16	0%
10.16	Fornecimento e instalação de adaptador storr para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incendio)	un	4,00	R\$ 309,58	R\$ 382,46	R\$ 1.529,84	R\$ 1.529,84	0%
10.17	Hidrante de recarique incluído caixa em alumínio de tipos maiores esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 x fundo com brta	un	1,00	R\$ 896,13	R\$ 1.109,53	R\$ 1.109,53	R\$ 1.109,53	0%
10.18	TAMPA PARA CAIXA TIPO RL EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 404,48	R\$ 499,69	R\$ 499,69	R\$ 499,69	0%
10.19	Registo globo angular 30° para hidrante, 4" x 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00	R\$ 135,14	R\$ 166,95	R\$ 166,95	R\$ 166,95	0%
10.20	GURVA 45 GRAUS EM AÇO, CONEXÃO BARRILADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 204,52	R\$ 252,66	R\$ 252,66	R\$ 252,66	0%
10.21	Especho jato regulável, tipo alhart, engate rapido 2 1/2", para combata a incendio - Rev. 01	un	1,00	R\$ 370,99	R\$ 458,32	R\$ 458,32	R\$ 458,32	0%
10.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 461,21	R\$ 569,78	R\$ 569,78	R\$ 569,78	0%
11	ROTA DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					R\$ 13.374,85		
11.1	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc., com logotipo "Alarme sonoro" - Placa E1	un	10,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 256,00	R\$ 256,00	0%
11.2	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incendio Modelo BLD-1, marca VERIM ou similar	un	10,00	R\$ 133,28	R\$ 164,65	R\$ 1.646,50	R\$ 1.646,50	0%
11.3	Placa de indicativas de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	10,00	R\$ 22,00	R\$ 27,18	R\$ 271,80	R\$ 271,80	0%
11.4	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc., com logotipo "Abriço de mangueira e hidrante" - Placa E7	un	4,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 102,40	R\$ 102,40	0%
11.5	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc., com logotipo "Abriço de mangueira e hidrante" - Placa E7	un	2,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 51,20	R\$ 51,20	0%
11.6	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc. com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	10,00	R\$ 23,14	R\$ 28,90	R\$ 289,90	R\$ 289,90	0%
11.7	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc. com logotipo "hidrante de incendio" - Placa E9	un	2,00	R\$ 16,07	R\$ 19,85	R\$ 39,70	R\$ 39,70	0%
11.8	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc., com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E5	un	2,00	R\$ 17,41	R\$ 21,51	R\$ 43,02	R\$ 43,02	0%
11.9	Luminária de emergência, de soborop, tipo balizamento com bloco autónomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FE, da KBR ou similar	un	10,00	R\$ 210,85	R\$ 260,48	R\$ 2.604,80	R\$ 2.604,80	0%
11.10	Estimador de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m., tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6,00	R\$ 254,52	R\$ 314,43	R\$ 1.886,58	R\$ 1.886,58	0%
11.11	Estimador de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	5,00	R\$ 241,20	R\$ 297,98	R\$ 1.489,90	R\$ 1.489,90	0%
11.12	Estimador de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Norma NBR9444 e 11716	un	5,00	R\$ 760,41	R\$ 939,41	R\$ 4.697,05	R\$ 4.697,05	0%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.233.257,73		
12.1	Armação de peneiras 1/4"	un	3054,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 1.710,24	R\$ 1.710,24	0%
12.2	Parafuso com bucha 5-10	un	639,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.667,79	R\$ 1.667,79	0%
12.3	Parafuso com bucha 5-10	un	639,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.667,79	R\$ 1.667,79	0%
12.4	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	888,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 436,24	R\$ 436,24	0%
12.5	Fornecimento e instalação de vergalhão (traste c/ rosca d=1/4" x 3000mm (manivela ref. 1431 ou similar)	un	379,80	R\$ 17,16	R\$ 21,20	R\$ 8.051,76	R\$ 8.051,76	0%
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,67/0,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R\$ 112,82	R\$ 139,38	R\$ 5.575,20	R\$ 5.575,20	0%



Handwritten signature and initials

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coo Sabauker, Torre Lankers, Sala 913
CPF: 41.824.021 - Subalterna
CNPJ: 20.153.999/0001-53

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Patrícia C. Mendes
CPF: 90.801.9825-91
Secretaria Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO		MEDIDAÇÃO R\$		ACUMULADO		SALDO		% EXECUTADO						
QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL					
12.7	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 650/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1170,00	R\$ 21,59	R\$ 26,67	R\$ 31.203,90	R\$ 31.203,90	0,39%	0,00	0,00	R\$ 31.203,90	0%
12.8	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6500,00	R\$ 3,31	R\$ 4,09	R\$ 26.585,00	R\$ 26.585,00	0,33%	0,00	0,00	R\$ 26.585,00	0%
12.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46300,00	R\$ 9,08	R\$ 11,22	R\$ 519.486,00	R\$ 519.486,00	6,45%	0,00	0,00	R\$ 519.486,00	0%
12.10	10620	ORSE	Parafuso com bucha 5-8	un	12,00	R\$ 4,54	R\$ 5,61	R\$ 67,32	R\$ 67,32	0,00%	0,00	0,00	R\$ 67,32	0%
12.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7100,00	R\$ 4,42	R\$ 5,46	R\$ 38.766,00	R\$ 38.766,00	0,48%	0,00	0,00	R\$ 38.766,00	0%
12.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	R\$ 6,46	R\$ 7,98	R\$ 5.586,00	R\$ 5.586,00	0,07%	0,00	0,00	R\$ 5.586,00	0%
12.13	10992	ORSE	Parafuso com bucha 5-6 (fornecimento)	un	369,00	R\$ 0,14	R\$ 0,17	R\$ 61,20	R\$ 61,20	0,08%	0,00	0,00	R\$ 61,20	0%
12.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 387,50	R\$ 454,01	R\$ 4.540,10	R\$ 4.540,10	0,06%	0,00	0,00	R\$ 4.540,10	0%
12.15	92668	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	889,00	R\$ 14,75	R\$ 18,22	R\$ 16.197,58	R\$ 11.332,84	0,20%	622,00	11.332,84	R\$ 4.864,74	70%
12.16	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 10,92	R\$ 13,49	R\$ 134,90	R\$ 134,90	0,00%	0,00	0,00	R\$ 134,90	0%
12.17	4185	ORSE	Caixa de alumínio 40 x 40 x 12 cm, fornecimento	un	2,00	R\$ 475,30	R\$ 587,19	R\$ 1.174,38	R\$ 1.174,38	0,01%	0,00	0,00	R\$ 1.174,38	0%
12.18	8633	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SKI ou similar.	un	12,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 264,48	R\$ 264,48	0,00%	0,00	0,00	R\$ 264,48	0%
12.19	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SKI ou similar.	un	342,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 7.537,68	R\$ 7.537,68	0,09%	0,00	0,00	R\$ 7.537,68	0%
12.20	9518	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SKI ou similar.	un	3,00	R\$ 19,28	R\$ 23,82	R\$ 71,46	R\$ 71,46	0,00%	0,00	0,00	R\$ 71,46	0%
12.21	10315	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	306,00	R\$ 21,01	R\$ 25,96	R\$ 7.943,76	R\$ 7.943,76	0,10%	0,00	0,00	R\$ 7.943,76	0%
12.22	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	28,00	R\$ 116,62	R\$ 144,07	R\$ 4.033,96	R\$ 4.033,96	0,05%	0,00	0,00	R\$ 4.033,96	0%
12.23	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	280,00	R\$ 64,27	R\$ 79,40	R\$ 22.232,00	R\$ 22.232,00	0,28%	0,00	0,00	R\$ 22.232,00	0%
12.24	11558	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	R\$ 2.035,60	R\$ 2.514,78	R\$ 2.514,78	R\$ 2.514,78	0,03%	0,00	0,00	R\$ 2.514,78	0%
12.25	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.SSM1312-OMB, Siemens ou similar	un	153,00	R\$ 185,04	R\$ 203,89	R\$ 31.195,17	R\$ 31.195,17	0,39%	0,00	0,00	R\$ 31.195,17	0%
12.26	12968	ORSE	SupORTE vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	74,00	R\$ 19,97	R\$ 24,67	R\$ 1.825,58	R\$ 1.825,58	0,02%	0,00	0,00	R\$ 1.825,58	0%
12.27	12574	ORSE	SupORTE vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	19,00	R\$ 29,36	R\$ 36,27	R\$ 689,13	R\$ 689,13	0,01%	0,00	0,00	R\$ 689,13	0%
12.28	7879	ORSE	SupORTE vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	113,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 2.005,75	R\$ 2.005,75	0,02%	0,00	0,00	R\$ 2.005,75	0%
12.29	7881	ORSE	SupORTE vertical 50 x 50mm para fixação de eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	96,00	R\$ 13,38	R\$ 16,53	R\$ 1.586,88	R\$ 1.586,88	0,02%	0,00	0,00	R\$ 1.586,88	0%
12.30	12573	ORSE	SupORTE vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	17,00	R\$ 22,69	R\$ 28,03	R\$ 476,51	R\$ 476,51	0,01%	0,00	0,00	R\$ 476,51	0%
12.30	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar) - Ver 01	un	82,00	R\$ 5,95	R\$ 7,35	R\$ 602,70	R\$ 602,70	0,01%	0,00	0,00	R\$ 602,70	0%
12.32	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar) - Ver 01	un	140,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 898,80	R\$ 898,80	0,01%	0,00	0,00	R\$ 898,80	0%
12.33	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodinha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.: Moapa ou similar)	m	210,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 9.895,20	R\$ 9.895,20	0,12%	0,00	0,00	R\$ 9.895,20	0%
12.34	4533	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodinha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.: Moapa ou similar)	un	33,00	R\$ 141,30	R\$ 174,56	R\$ 5.760,48	R\$ 5.760,48	0,07%	0,00	0,00	R\$ 5.760,48	0%
12.35	3399	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodinha perfurada 300 x 75 x 3000 mm (ref.: Moapa ou similar)	m	39,00	R\$ 83,30	R\$ 102,91	R\$ 4.013,49	R\$ 4.013,49	0,05%	0,00	0,00	R\$ 4.013,49	0%
12.36	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodinha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref.: Valermam ou similar)	un	186,00	R\$ 62,39	R\$ 77,08	R\$ 14.336,88	R\$ 14.336,88	0,18%	0,00	0,00	R\$ 14.336,88	0%
12.38	12600	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	210,00	R\$ 48,53	R\$ 59,95	R\$ 12.589,50	R\$ 12.589,50	0,16%	0,00	0,00	R\$ 12.589,50	0%
12.39	12580	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para T8 horizontal, zincada, para eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	33,00	R\$ 25,33	R\$ 31,29	R\$ 1.032,57	R\$ 1.032,57	0,01%	0,00	0,00	R\$ 1.032,57	0%
12.39	12804	ORSE	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	39,00	R\$ 116,34	R\$ 143,73	R\$ 5.605,47	R\$ 5.605,47	0,07%	0,00	0,00	R\$ 5.605,47	0%
12.41	12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrodinha metálica (ref.: Moapa ou similar)	un	156,00	R\$ 175,74	R\$ 217,11	R\$ 33.869,16	R\$ 33.869,16	0,42%	0,00	0,00	R\$ 33.869,16	0%



Caixa de Registro Civil
Eng. Civil - CREA/RN 011625378
Eng. Civil - CREA/RN 011625378

Av. Tancredo Neves, 2919, Jd. (do) Subúrbio, Torre Lanchas, Sub. 911
CEP: 41.840-211, Itaipava/RS
CNPJ: 20.151.999/0001-55

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Pedro C. Mendes
CPF: 9640.8025-01
Sócio Administrador



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FAMILIA ORÇAMENTARIA										MEDICÃO US		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
		QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
12.42	12579	ORSE	un	186,00	R\$ 39,11	R\$ 48,32	R\$ 8.987,52	0,11%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.987,52	0%			
12.43	371	ORSE	un	325,00	R\$ 2,23	R\$ 2,75	R\$ 893,75	0,01%	R\$ 893,75	R\$ 893,75	325,00	0,00	R\$ 0,00	100%			
12.44	372	ORSE	un	272,00	R\$ 3,43	R\$ 4,24	R\$ 1.153,28	0,01%	R\$ 1.153,28	R\$ 1.153,28	272,00	0,00	R\$ 0,00	100%			
12.46	373	ORSE	un	5,00	R\$ 5,03	R\$ 6,21	R\$ 31,05	0,00%	R\$ 31,05	R\$ 31,05	5,00	0,00	R\$ 0,00	100%			
12.47	8100	ORSE	m	156,00	R\$ 150,86	R\$ 186,37	R\$ 29.073,72	0,36%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 29.073,72	0%			
12.48	375	ORSE	un	13,00	R\$ 8,45	R\$ 10,44	R\$ 135,72	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 135,72	0%			
12.49	376	ORSE	un	10,00	R\$ 17,91	R\$ 22,13	R\$ 221,30	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 221,30	0%			
12.50	4234	ORSE	un	141,00	R\$ 23,52	R\$ 29,06	R\$ 4.097,46	0,05%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.097,46	0%			
12.51	13178	ORSE	un	3,00	R\$ 68,52	R\$ 84,65	R\$ 253,95	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 253,95	0%			
12.52	12971	ORSE	un	245,00	R\$ 67,21	R\$ 83,03	R\$ 20.342,35	0,25%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20.342,35	0%			
12.53	11994	ORSE	un	24,00	R\$ 606,53	R\$ 749,31	R\$ 17.983,44	0,22%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17.983,44	0%			
12.54	91864	SINAPI	M	1350,00	R\$ 15,73	R\$ 19,43	R\$ 26.230,50	0,33%	R\$ 14.572,50	R\$ 14.572,50	1350,00	26.230,50	R\$ 0,00	100%			
12.55	91865	SINAPI	M	24,00	R\$ 19,48	R\$ 24,07	R\$ 577,68	0,01%	R\$ 577,68	R\$ 577,68	24,00	577,68	R\$ 0,00	100%			
12.56	93009	SINAPI	M	57,00	R\$ 24,69	R\$ 30,50	R\$ 1.738,50	0,02%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.738,50	0%			
12.57	93010	SINAPI	M	39,00	R\$ 34,31	R\$ 42,39	R\$ 1.653,21	0,02%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.653,21	0%			
12.58	91863	SINAPI	M	3729,00	R\$ 11,99	R\$ 14,81	R\$ 55.276,49	0,69%	R\$ 33.011,49	R\$ 33.011,49	3729,00	55.276,49	R\$ 0,00	100%			
12.59	93012	SINAPI	M	141,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 11.006,46	0,14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.006,46	0%			
12.60	100619	SINAPI	UN	7,00	R\$ 607,58	R\$ 750,60	R\$ 5.254,20	0,07%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.254,20	0%			
12.61	12910	ORSE	un	14,00	R\$ 2.882,49	R\$ 3.313,95	R\$ 46.395,30	0,58%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 46.395,30	0%			
12.62	97360	SINAPI	UN	13,00	R\$ 6.326,46	R\$ 7.815,71	R\$ 101.604,23	1,26%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 101.604,23	0%			
12.63	101879	SINAPI	UN	1,00	R\$ 594,78	R\$ 734,79	R\$ 734,79	0,01%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 734,79	0%			
12.64	12222	ORSE	un	152,00	R\$ 138,21	R\$ 170,74	R\$ 25.952,48	0,32%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25.952,48	0%			
12.65	101881	SINAPI	UN	1,00	R\$ 983,86	R\$ 1.215,46	R\$ 1.215,46	0,02%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.215,46	0%			
12.66	101882	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.395,69	R\$ 1.724,24	R\$ 1.724,24	0,02%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.724,24	0%			
12.67	91953	SINAPI	UN	170,00	R\$ 23,48	R\$ 29,01	R\$ 4.931,70	0,06%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.931,70	0%			
12.68	91981	SINAPI	UN	2,00	R\$ 40,06	R\$ 49,49	R\$ 98,98	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 98,98	0%			
12.69	91992	SINAPI	UN	681,00	R\$ 37,87	R\$ 46,78	R\$ 31.857,18	0,40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.857,18	0%			
13							R\$ 181.399,44	2,23%									
13.1	101553	SINAPI	UN	3,00	R\$ 22,00	R\$ 27,18	R\$ 81,54	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 81,54	0%			



Av. Tancredo Neves, 2519, Jd. Coo Suburbão, Torr. Lombari, Sab 911
 CEP: 41.834-021 - Salvador-BA
 CNPJ: 26.131.999/0001-53


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Patricio C Mendes
 CPF: 940.802.51-91
 Sec. Administrativa

Camilla Ribeiro Cruz
 Fig. Cont. - CDBA/RN 61602378



PLANOILHA ORÇAMENTARIA		MEDIÇÃO R\$		ACUMULADO		SALDO		% EXECUTADO		
		QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
13.2	98111	SINAPI	UN	1,00	R\$ 54,95	R\$ 54,95	0,00%	0,00	R\$ 54,95	0%
13.3	72253	SINAPI	M	100,00	R\$ 44,48	R\$ 4.448,00	0,00%	0,00	R\$ 4.448,00	0%
13.4	72254	SINAPI	M	20,00	R\$ 44,57	R\$ 891,40	0,00%	0,00	R\$ 891,40	0%
13.5	2858	ORSE	UN	3,00	R\$ 386,10	R\$ 1.158,30	0,00%	0,00	R\$ 1.158,30	0%
13.6	72272	SINAPI	M	6,00	R\$ 18,64	R\$ 111,84	0,00%	0,00	R\$ 111,84	0%
13.7	68069	SINAPI	UN	3,00	R\$ 112,39	R\$ 337,17	0,00%	0,00	R\$ 337,17	0%
13.8	3338	ORSE	UN	3,00	R\$ 34,90	R\$ 104,70	0,00%	0,00	R\$ 104,70	0%
13.9	4141	ORSE	UN	6,00	R\$ 281,36	R\$ 1.688,16	0,00%	0,00	R\$ 1.688,16	0%
13.10	93026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 73,62	R\$ 294,48	0,00%	0,00	R\$ 294,48	0%
13.11	93026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 73,62	R\$ 294,48	0,00%	0,00	R\$ 294,48	0%
13.12	93870	SINAPI	M	6,00	R\$ 11,29	R\$ 67,74	0,00%	0,00	R\$ 67,74	0%
13.13	93012	SINAPI	M	51,00	R\$ 63,19	R\$ 3.222,69	0,00%	0,00	R\$ 3.222,69	0%
13.14	91863	SINAPI	M	3,00	R\$ 11,99	R\$ 35,97	0,00%	0,00	R\$ 35,97	0%
13.15	4135	ORSE	UN	3,00	R\$ 21,55	R\$ 64,65	0,00%	0,00	R\$ 64,65	0%
13.16	3766	ORSE	UN	5,00	R\$ 133,66	R\$ 668,30	0,00%	0,00	R\$ 668,30	0%
13.17	3066	ORSE	UN	6,00	R\$ 107,91	R\$ 647,46	0,00%	0,00	R\$ 647,46	0%
13.18	93017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 45,01	R\$ 180,04	0,00%	0,00	R\$ 180,04	0%
13.19	98274	ORSE	KG	1,00	R\$ 32,26	R\$ 32,26	0,00%	0,00	R\$ 32,26	0%
13.20	2884	ORSE	UN	4,00	R\$ 14,85	R\$ 59,40	0,00%	0,00	R\$ 59,40	0%
13.21	2918	ORSE	UN	7,00	R\$ 25,74	R\$ 180,18	0,00%	0,00	R\$ 180,18	0%
13.22	12876	ORSE	UN	3,00	R\$ 182,53	R\$ 547,59	0,00%	0,00	R\$ 547,59	0%
13.23	101546	SINAPI	UN	6,00	R\$ 46,50	R\$ 279,00	0,00%	0,00	R\$ 279,00	0%
13.24	100612	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.302,57	R\$ 1.302,57	0,00%	0,00	R\$ 1.302,57	0%
13.25	100602	SINAPI	UN	1,00	R\$ 967,90	R\$ 967,90	0,00%	0,00	R\$ 967,90	0%
13.26	2955	ORSE	UN	2,00	R\$ 251,33	R\$ 502,66	0,00%	0,00	R\$ 502,66	0%
13.27	102107	SINAPI	UN	1,00	R\$ 43.266,71	R\$ 43.266,71	0,00%	0,00	R\$ 43.266,71	0%
13.28	93000	SINAPI	M	150,00	R\$ 230,23	R\$ 34.534,50	0,00%	0,00	R\$ 34.534,50	0%
13.29	92994	SINAPI	M	50,00	R\$ 117,34	R\$ 5.867,00	0,00%	0,00	R\$ 5.867,00	0%
13.30	11558	ORSE	UN	1,00	R\$ 2.514,78	R\$ 2.514,78	0,00%	0,00	R\$ 2.514,78	0%
13.31	9480	ORSE	UN	1,00	R\$ 63.711,46	R\$ 63.711,46	0,00%	0,00	R\$ 63.711,46	0%
14	9816	ORSE	UN	432,00	R\$ 0,45	R\$ 194,40	0,00%	0,00	R\$ 194,40	0%
14.1	11039	ORSE	UN	432,00	R\$ 0,78	R\$ 337,76	0,00%	0,00	R\$ 337,76	0%
14.3	11036	ORSE	UN	432,00	R\$ 0,59	R\$ 255,76	0,00%	0,00	R\$ 255,76	0%
14.4	9831	ORSE	UN	432,00	R\$ 0,39	R\$ 168,96	0,00%	0,00	R\$ 168,96	0%



Caullia Ribeiro Cruz
CPF: 41.824.021 - São Sebastião
Eng. Civil - CREA/RN 01602579

Av. Tancredo Neves, 2339, Jd. Coo. Subsanar, Torre Lanchas, Sub 913
CEP: 41.824-021 - São Sebastião
CNPJ: 20.133.999/0001-53

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Patricia C. Mendler
CPF: 048.0825-91
Secretaria Administrativa




PLANTILHA ORÇAMENTARIA		MEDIDA DE		ACUMULADO		% EXECUTADO		
		QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	SALDO	% EXECUTADO	
14.5	12740	ORSE	Forneçimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	2400,00	R\$ 17.18	R\$ 21,22	R\$ 50.928,00	0%
14.6	8082	ORSE	Cabo de cobre nu 50 mm² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	1250,00	R\$ 137,51	R\$ 169,88	R\$ 212.350,00	0%
14.7	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	4,00	R\$ 559,50	R\$ 691,21	R\$ 2.764,84	0%
14.8	96985	SINAPI	MASTE DE ATENUEAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAO.	73,00	R\$ 101,80	R\$ 125,76	R\$ 9.180,48	0%
14.9	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAO.	2,00	R\$ 119,24	R\$ 147,31	R\$ 794,62	0%
14.10	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FICAO H = 30CM	129,00	R\$ 35,44	R\$ 43,78	R\$ 5.647,62	0%
14.11	12993	ORSE	Piso-raio tipo Franklin 350mm, lado cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro apo galv.3mmx1,7" e 3mmx2" e base e sinalizador duplo	1,00	R\$ 1.511,95	R\$ 1.867,86	R\$ 1.867,86	0%
14.12	101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 08/2020	1,00	R\$ 33,93	R\$ 41,97	R\$ 41,97	0%
15			CABEAMENTO ESTRUTURADO					
15.1	9816	ORSE	Armeia lisa zincada d=1/2"	1623,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 312.234,57	3,88%
15.2	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo stp 4 pares cat 6	9980,00	R\$ 12,27	R\$ 15,16	R\$ 908,88	0%
15.3	12890	ORSE	Cabo de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzal Mod: Cp-3030-12 ou similar.	135,00	R\$ 244,99	R\$ 302,66	R\$ 150.084,00	0%
15.4	8997	ORSE	Condutete em pvc rígido, p/eletróduto d=1", sem tampa (modelos: C.E.LULLRI, Tigre ou similar)	151,00	R\$ 25,04	R\$ 30,93	R\$ 40.859,10	0%
15.5	11214	ORSE	Tomada para lâmpada r45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	151,00	R\$ 62,92	R\$ 77,73	R\$ 4.670,43	0%
15.6	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. Mopa ou similar)	156,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 11.737,23	0%
15.7	3400	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. Mopa ou similar)	9,00	R\$ 56,68	R\$ 70,02	R\$ 7.350,72	0%
15.8	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. Valermat ou similar)	246,00	R\$ 62,39	R\$ 77,06	R\$ 630,18	0%
15.09	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2015	1344,00	R\$ 15,73	R\$ 19,43	R\$ 18.961,68	0%
15.10	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2021	51,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 26.113,92	0%
15.11	91885	SINAPI	LUMEA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2015	150,00	R\$ 10,62	R\$ 13,12	R\$ 3.981,06	0%
15.12	93017	SINAPI	LUMEA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2021	24,00	R\$ 45,01	R\$ 55,61	R\$ 1.968,00	0%
15.13	369	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, ângulo = 110mm (47)	4,00	R\$ 89,00	R\$ 109,95	R\$ 1.334,64	0%
15.14	91919	SINAPI	LUMEA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2015	16,00	R\$ 19,15	R\$ 23,66	R\$ 439,80	0%
15.15	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	400,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 378,56	0%
15.16	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	411,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 192,00	0%
15.17	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	122,00	R\$ 1,91	R\$ 2,46	R\$ 1.072,71	0%
15.18	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	78,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 2.886,28	0%
15.19	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	123,00	R\$ 22,69	R\$ 28,03	R\$ 1.384,50	0%
15.20	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	123,00	R\$ 13,38	R\$ 16,53	R\$ 3.447,69	0%
15.21	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Bevo1	4,00	R\$ 5,95	R\$ 7,35	R\$ 2.033,19	0%
15.22	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Bevo1	96,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 19,40	0%
15.23	12600	ORSE	Tampa de encaixe 100 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	156,00	R\$ 48,53	R\$ 59,95	R\$ 616,32	0%
15.24	12586	ORSE	Tampa de encaixe para Cruzeta 200mm, zincada, para eletrocalha metálica	9,00	R\$ 15,67	R\$ 19,36	R\$ 9.352,20	0%
15.25	12579	ORSE	Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	246,00	R\$ 39,11	R\$ 48,32	R\$ 174,24	0%
							R\$ 11.886,72	0%





PLANO DE OBRAS		FAMILIA ORÇAMENTARIA										MEDICAO US			ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
ITEM	UNID	DESCRICOES	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
15.26	7384	ORSE	m	276,00	R\$ 28,83	R\$ 35,62	R\$ 9.831,12	0,12%	R\$ 9.831,12	0,12%	R\$ 9.831,12	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.831,12	0%	
16																		
16.1	9816	ORSE	un	352,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 62.528,40	0,78%	R\$ 62.528,40	0,78%	R\$ 62.528,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.528,40	0%	
16.2	9811	ORSE	un	176,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 84,48	0,00%	R\$ 84,48	0,00%	R\$ 84,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,48	0%	
16.3	12559	ORSE	un	250,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 652,50	0,01%	R\$ 652,50	0,01%	R\$ 652,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,50	0%	
16.4	9832	ORSE	un	176,00	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 415,36	0,01%	R\$ 415,36	0,01%	R\$ 415,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,36	0%	
16.5	7384	ORSE	m	76,00	R\$ 28,83	R\$ 35,62	R\$ 2.707,12	0,03%	R\$ 2.707,12	0,03%	R\$ 2.707,12	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.707,12	0%	
16.6	8997	ORSE	un	29,00	R\$ 25,04	R\$ 30,93	R\$ 896,97	0,01%	R\$ 896,97	0,01%	R\$ 896,97	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,97	0%	
16.7	10909	ORSE	un	29,00	R\$ 7,06	R\$ 8,72	R\$ 252,88	0,00%	R\$ 252,88	0,00%	R\$ 252,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,88	0%	
16.8	7879	ORSE	un	38,00	R\$ 34,37	R\$ 17,75	R\$ 674,50	0,01%	R\$ 674,50	0,01%	R\$ 674,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,50	0%	
16.9	8687	ORSE	un	1,00	R\$ 83,28	R\$ 102,88	R\$ 102,88	0,00%	R\$ 102,88	0,00%	R\$ 102,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,88	0%	
16.10	9524	ORSE	un	44,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 282,48	0,00%	R\$ 282,48	0,00%	R\$ 282,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,48	0%	
16.11	12530	ORSE	un	1,00	R\$ 15,03	R\$ 18,57	R\$ 18,57	0,00%	R\$ 18,57	0,00%	R\$ 18,57	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,57	0%	
16.12	762	ORSE	m	57,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 2.685,84	0,03%	R\$ 2.685,84	0,03%	R\$ 2.685,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.685,84	0%	
16.13	12526	ORSE	un	57,00	R\$ 38,65	R\$ 23,04	R\$ 1.333,28	0,00%	R\$ 1.333,28	0,00%	R\$ 1.333,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,28	0%	
16.14	12500	ORSE	un	38,00	R\$ 8,42	R\$ 10,40	R\$ 395,20	0,00%	R\$ 395,20	0,00%	R\$ 395,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,20	0%	
16.15	12140	ORSE	un	15,00	R\$ 5,85	R\$ 7,23	R\$ 108,45	0,00%	R\$ 108,45	0,00%	R\$ 108,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,45	0%	
16.16	7750	ORSE	un	15,00	R\$ 7,65	R\$ 9,45	R\$ 141,75	0,00%	R\$ 141,75	0,00%	R\$ 141,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,75	0%	
16.17	95806	SINAPI	UN	293,00	R\$ 23,33	R\$ 28,82	R\$ 8.386,62	0,10%	R\$ 8.386,62	0,10%	R\$ 8.386,62	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.386,62	0%	
16.18	95785	SINAPI	UN	21,00	R\$ 40,53	R\$ 50,07	R\$ 1.051,47	0,01%	R\$ 1.051,47	0,01%	R\$ 1.051,47	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,47	0%	
16.19	7138	ORSE	m	1400,00	R\$ 12,27	R\$ 15,16	R\$ 21.224,00	0,26%	R\$ 21.224,00	0,26%	R\$ 21.224,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.224,00	0%	
16.20	11520	ORSE	un	29,00	R\$ 578,01	R\$ 714,07	R\$ 20.708,03	0,26%	R\$ 20.708,03	0,26%	R\$ 20.708,03	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.708,03	0%	
16.21	724	ORSE	un	21,00	R\$ 8,82	R\$ 10,90	R\$ 228,90	0,00%	R\$ 228,90	0,00%	R\$ 228,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,90	0%	
17																		
17.1																		
42736	96525	SINAPI	m²	16,81	R\$ 50,70	R\$ 62,63	R\$ 1.052,81	0,01%	R\$ 1.052,81	0,01%	R\$ 1.052,81	12,81	R\$ 0,00	802,29	R\$ 290,52	76%		
42737	96617	SINAPI	m²	88,50	R\$ 20,36	R\$ 25,15	R\$ 2.225,78	0,03%	R\$ 2.225,78	0,03%	R\$ 2.225,78	68,50	R\$ 0,00	1.722,78	R\$ 503,00	77%		
42738	95957	SINAPI	m³	7,00	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 29.933,75	0,37%	R\$ 29.933,75	0,37%	R\$ 29.933,75	5,25	R\$ 0,00	22.450,32	R\$ 7.483,43	75%		
42739	11322	ORSE	m	983,30	R\$ 38,67	R\$ 23,06	R\$ 22.674,90	0,28%	R\$ 22.674,90	0,28%	R\$ 22.674,90	725,15	R\$ 0,00	16.721,95	R\$ 5.952,95	74%		
42740	96557	SINAPI	m²	462,15	R\$ 46,51	R\$ 57,46	R\$ 26.555,14	0,33%	R\$ 26.555,14	0,33%	R\$ 26.555,14	351,07	R\$ 0,00	20.172,49	R\$ 6.382,65	76%		
42741	95957	SINAPI	m³	0,06	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 256,58	0,00%	R\$ 256,58	0,00%	R\$ 256,58	0,00	R\$ 0,00	0,01	R\$ 256,57	0%		
17.2																		
42767	92761	SINAPI	KG	2867,00	R\$ 14,83	R\$ 18,32	R\$ 52.523,44	0,65%	R\$ 52.523,44	0,65%	R\$ 52.523,44	600,00	R\$ 10.992,00	50.993,72	R\$ 1.531,44	97%		
42768	95957	SINAPI	m³	12,77	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 54.807,71	0,68%	R\$ 54.807,71	0,68%	R\$ 54.807,71	10,50	R\$ 0,00	44.900,62	R\$ 9.907,09	82%		
42769	95957	SINAPI	m³	21,89	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 102.159,61	1,27%	R\$ 102.159,61	1,27%	R\$ 102.159,61	21,95	R\$ 0,00	93.842,30	R\$ 8.317,31	92%		
18																		





ID	CATEGORIA	PLANTILHA ORÇAMENTARIA	MEDIDAÇÃO R\$										ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
			QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL				
18.1	87879	SINAPI	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COQUE DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_01/2022	m²	8854,96	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 50,827,47	0,61%	3000,00	R\$ 11.480,00	7500,00	43.050,00	R\$ 7.777,47	85%	
18.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 289.114,44	3,59%	6590,00	R\$ 0,00	6590,00	215.163,50	R\$ 73.950,84	79%	
18.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril	m²	3596,13	R\$ 47,92	R\$ 59,20	R\$ 212.890,90	2,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 212.890,90	0%	
18.4	2259	ORSE	Revestimento cerâmico, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m	545,00	R\$ 18,91	R\$ 23,36	R\$ 12.731,20	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.731,20	0%	
18.5	2262	ORSE	Revestimento cerâmico, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m	13,17	R\$ 116,13	R\$ 143,47	R\$ 1.889,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.889,50	0%	
18.12	94993	SINAPI	EXEÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO IN LOCO, USUANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	255,00	R\$ 81,35	R\$ 100,50	R\$ 25.627,50	0,32%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25.627,50	0%	
18.13	12443	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Elicare, linha (merit) white, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	244,70	R\$ 178,20	R\$ 220,15	R\$ 53.870,71	0,67%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 53.870,71	0%	
19			PINTURA													
19.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	2257,40	R\$ 3,62	R\$ 4,47	R\$ 10.090,58	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.090,58	0%	
19.2	86484	SINAPI	DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 3,42	R\$ 4,23	R\$ 37.456,48	0,46%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 37.456,48	0%	
19.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 16,23	R\$ 20,05	R\$ 177.541,95	2,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 177.541,95	0%	
19.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8358,19	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 150.865,33	1,87%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 150.865,33	0%	
19.6	9484	ORSE	Pintura de acabamento com liamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Sinalil ou similar)	m²	13,65	R\$ 20,56	R\$ 25,40	R\$ 346,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 346,71	0%	
20			COBERTURA													
20.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	1328,98	R\$ 46,00	R\$ 56,83	R\$ 75.325,93	0,94%	660,98	R\$ 37.563,49	660,98	37.563,49	R\$ 37.967,44	50%	
20.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FRAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	43,53	R\$ 106,43	R\$ 131,48	R\$ 5.723,32	0,07%	43,53	R\$ 0,00	43,53	5.723,32	R\$ 0,00	100%	
20.4	12729	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, Fisp - não pintada, Fitr - filme Alum. lco, T940 - 2 x 0,43mm, Kingspan licoeste ou similar	m²	3766,25	R\$ 302,59	R\$ 250,28	R\$ 817.477,05	10,15%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 817.477,05	100%	
20.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3366,25	R\$ 58,96	R\$ 72,84	R\$ 237.913,65	2,95%	-3266,25	-R\$ 237.913,65	0,00	0,00	R\$ 237.913,65	0%	
20.7	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,48	R\$ 58,96	R\$ 72,84	R\$ 15.841,24	0,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15.841,24	0%	
20.8	12736	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Mex. 01 - FECHAMENTO LATERAL	m²	217,48	R\$ 117,37	R\$ 145,00	R\$ 31.534,60	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.534,60	0%	
20.9	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (plataforma)	m²	197,37	R\$ 500,20	R\$ 617,95	R\$ 121.964,79	1,51%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 121.964,79	0%	
20.10	108742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A BOLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3266,25	R\$ 25,44	R\$ 31,43	R\$ 102.658,24	1,27%	3266,25	R\$ 0,00	3266,25	102.658,23	R\$ 0,01	100%	
21			ESTACIONAMENTO													
21.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	44,24	R\$ 97,90	R\$ 120,95	R\$ 188.156,57	2,34%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 188.156,57	0%	
21.2	10224	ORSE	Grama esmeralda com placas, fornecimento e plantio	m²	206,22	R\$ 24,15	R\$ 29,83	R\$ 6.151,54	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.151,54	0%	
21.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	100,00	R\$ 53,76	R\$ 66,42	R\$ 6.642,00	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.642,00	0%	
21.4	87583	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ENFUNDADOS NA HORIZONTAL DE 30X30X15 (RESPONSA PELA) DE PAREDES COM ÁGUA LEQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MF SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	152,96	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 15.146,10	0,19%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15.146,10	0%	
21.5	87879	SINAPI	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COQUE DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_01/2022	m²	305,92	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 1.755,98	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.755,98	0%	



Handwritten signature in blue ink



Item	Descrição	Unidade	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO										SALDO	% EXECUTADO
			QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
21.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TIPO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 300L, APLICADA MANUAISMENTE EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES, ESPOSSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALOCOS. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 9.988,29	0,12%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 9.988,29	0%
21.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 2,95	R\$ 3,64	R\$ 1.113,55	0,01%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.113,55	0%
21.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 5.521,86	0,07%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.521,86	0%
21.9	PINTURA ACRÍLICA DE FACHOS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	235,00	R\$ 13,75	R\$ 16,99	R\$ 3.992,65	0,05%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.992,65	0%
21.10	POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO CURVO DUPLI, FIANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 4.237,07	R\$ 5.228,30	R\$ 20.913,20	0,26%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.913,20	0%
21.11	Jeveira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (postal), FIBERGLASS, REF. CLPDI085 ou similar	un	3,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 1.720,19	0,02%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.720,19	0%
21.12	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERCEIA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,50	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 2.138,13	0,03%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.138,13	0%
21.13	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. 6cm, NBR5781, Fck(min)-35MPa, sob cam. areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	952,16	R\$ 71,75	R\$ 88,64	R\$ 84.399,46	1,05%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 84.399,46	0%
21.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	190,43	R\$ 101,26	R\$ 125,10	R\$ 23.822,79	0,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00	12.510,00	R\$ 11.312,79	53%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

(Handwritten signature)





22	PLANILHA ORÇAMENTARIA										MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
22.1																	
44562	SINAPI																
44563	SINAPI																
44564	SINAPI																
44565	ORSE																
44566	SINAPI																
22.2																	
44589	SINAPI																
44594	SINAPI																
44595	SINAPI																
22.3																	
44621	SINAPI																
44622	SINAPI																
44623	SINAPI																
22.4																	
44652	SINAPI																
44653	SINAPI																
44654	ORSE																
44655	SINAPI																
22.5																	
44682	SINAPI																
44683	ORSE																
44684	Próprio																
22.6																	
44713	ORSE																
44714	SINAPI																
44716	ORSE																
44717	ORSE																
44718	SINAPI																
22.7																	
44743	SINAPI																

Av. Tancredi Neves, 2339, Edif. Coo. Saneador, Torre Lanchon, Sala 813
 CEP: 41.870-021 - Borinópolis/BA
 CNPJ: 20.153.999/0001-55

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Patricia C. Mendes
 CPF: 90.481.9022-91
 Sec. Administrativa



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PLANO DE OBRAS										QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUTADO
			QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			
44744	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇOS PARA TELHADOS DE MASE QUE 2 ÁGUILAS PARA TESSA CEBÁRICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100,44	R\$ 103,76	R\$ 120,19	R\$ 12.875,40	0,16%	100,44	R\$ 12.875,40	100,44	R\$ 12.875,40	100%			
44745	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5	m²	67,50	R\$ 106,43	R\$ 131,48	R\$ 8.874,90	0,11%	67,50	R\$ 8.874,90	0,00	R\$ 8.874,90	0%			
22.8	ACESSÓRIOS					R\$ 23.634,21	0,29%								
44774	FECHADURA DE EMBUIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 163,65	R\$ 202,17	R\$ 1.819,53	0,02%	9,00	R\$ 1.819,53	0,00	R\$ 1.819,53	0%			
44775	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 120,81	R\$ 149,25	R\$ 1.343,25	0,02%	9,00	R\$ 1.343,25	0,00	R\$ 1.343,25	0%			
44777	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIBREGLASS, REF. CLPDI085 ou similar	un	9,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 3.660,57	0,05%	9,00	R\$ 3.660,57	0,00	R\$ 3.660,57	0%			
44777	Iscaçada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,40	R\$ 444,62	R\$ 549,28	R\$ 10.656,03	0,13%	19,40	R\$ 10.656,03	0,00	R\$ 10.656,03	0%			
44778	Cubo de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/árvula cromada 3/16", ref. 94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	9,00	R\$ 553,56	R\$ 683,87	R\$ 6.154,83	0,08%	9,00	R\$ 6.154,83	0,00	R\$ 6.154,83	0%			
23	PLACA					R\$ 596.736,79	7,41%								
23.1	Fornimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	37,91	R\$ 97,90	R\$ 120,95	R\$ 4.852,21	0,06%	37,91	R\$ 4.852,21	0,00	R\$ 4.852,21	0%			
23.2	PLANTIO DE ARBUSTO DO CERCA-VIVA. AF_05/2018	UN	130,00	R\$ 55,76	R\$ 66,42	R\$ 9.963,00	0,12%	130,00	R\$ 9.963,00	0,00	R\$ 9.963,00	0%			
23.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR DO IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	50,00	R\$ 152,05	R\$ 187,84	R\$ 9.392,00	0,12%	50,00	R\$ 9.392,00	0,00	R\$ 9.392,00	0%			
23.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	185,56	R\$ 24,15	R\$ 29,83	R\$ 5.654,57	0,07%	185,56	R\$ 5.654,57	0,00	R\$ 5.654,57	0%			
23.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	84,28	R\$ 47,74	R\$ 58,98	R\$ 4.970,83	0,06%	84,28	R\$ 4.970,83	74,00	R\$ 606,31	88%			
23.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	177,80	R\$ 35,80	R\$ 44,23	R\$ 7.864,09	0,10%	177,80	R\$ 7.864,09	138,00	R\$ 1.790,35	78%			
23.7	Fornecimento em bloco de concreto vibrado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, NBR781, Fck(mín)=35MPa, sob contenção aérea grossa compactada c/ placa vibratória, eicomp, h=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m³	777,14	R\$ 71,45	R\$ 95,68	R\$ 74.356,76	0,92%	432,00	R\$ 41.333,76	0,00	R\$ 74.356,76	0%			
23.7	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ANILDO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m²	63,12	R\$ 107,26	R\$ 125,10	R\$ 78.953,11	0,98%	63,12	R\$ 78.953,11	600,00	R\$ 75.060,00	95%			
23.8	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, natural, 10x20cm, e=6cm, NBR781, Fck(mín)=35MPa, sob contenção aérea grossa compactada c/ placa vibratória, eicomp, h=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	988,93	R\$ 71,75	R\$ 88,64	R\$ 87.858,76	1,09%	800,00	R\$ 70.912,00	800,00	R\$ 16.746,76	81%			
23.9	POSTE DE AÇO CONCO CONTÍNUO CURVO DUPL. ELANGADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	R\$ 4.322,07	R\$ 5.278,30	R\$ 52.283,00	0,65%	10,00	R\$ 52.283,00	0,00	R\$ 52.283,00	0%			
23.9	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUSIVE TELA DE AÇO SOLDADA MERVINDADA CADA, QUÍM (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa	m²	1389,52	R\$ 147,43	R\$ 182,14	R\$ 253.087,17	3,14%	300,00	R\$ 54.642,00	300,00	R\$ 54.642,00	22%			
23.10	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. MCL1066, da Nitto ou similar	un	10,00	R\$ 546,23	R\$ 674,81	R\$ 6.748,10	0,08%	10,00	R\$ 6.748,10	0,00	R\$ 6.748,10	0%			
23.11	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIBREGLASS, REF. CLPDI085 ou similar	un	3,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 1.220,19	0,07%	3,00	R\$ 1.220,19	0,00	R\$ 1.220,19	0%			
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 351.188,00	4,36%								
24.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	R\$ 106,23	R\$ 131,24	R\$ 115.491,20	1,43%	110,00	R\$ 14.436,40	462,00	R\$ 54.658,32	53%			
24.2	ENGENHEIRO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2220,00	R\$ 34,62	R\$ 42,77	R\$ 94.849,40	1,18%	277,50	R\$ 11.868,67	2037,50	R\$ 7.805,53	97%			
24.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4440,00	R\$ 25,66	R\$ 31,70	R\$ 140.748,00	1,75%	555,00	R\$ 17.593,50	2315,00	R\$ 67.362,50	53%			
25	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 35.526,59	0,44%								
25.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7773,87	R\$ 3,70	R\$ 4,57	R\$ 35.526,59	0,44%	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 35.526,59	0%			
			Total obra BN			R\$ 6.520.064,42		MEDIÇÕES			302.028,13	RECEBIDO TOTAL	2.945.336,07	SAÍDO TOTAL	
			Total do BO			R\$ 3.185.299,43									
			Total Geral			R\$ 8.037.384,03									



Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Cov. Sabankur, Torre Lancher, Sala 913
 CEP: 41.424-021 - Salvador/BA
 CNPJ: 28.133.958/0001-05

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Patricia C. Mendes
 CPF: 9048.0825-01
 Secretária Administrativa



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 1054158

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:50:43 horas do dia 02/05/2024.
Válida até dia 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **09E0.85DA.952C.EA0C.1AE0.0694.92D3.DAB1**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241911674

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:38:11 do dia 09/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2024.

Código de controle da certidão: **113E.4F15.5319.B2D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 22399262/2024

Expedição: 03/04/2024, às 10:03:08

Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602080023763150

Informação obtida em 15/05/2024 10:10:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CNPJ
24.597.344/0001-98

Razão Social
MP2 CONSTRUCOES LTDA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24131.4492282-5

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229955166

Valor Total do Documento

2.882,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	788,62			788,62
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.179,77			1.179,77
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	705,30			705,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	149,05			149,05
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.27652/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	59,62			59,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.27652/75				
Totais		2.882,36			2.882,36



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000028 8 82360385241 6 41071624131 8 44922825468 8



CNPJ: 24.597.344/0001-98

Número: 07.16.24131.4492282-5

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 2.882,36

Pague com o PIX





bradesco

net empresa

Data da Transação: 20/05/2024 - 17h57

Nº Controle: 746.756.575.280.060.515

Empresa: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 024.597.344/0001-98

Agência de Débito: 3231

Conta de Débito: 393153-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858800000288 823603852416 410716241318 449228254688

Data do Pagamento: 20/05/2024

Número do Documento: 0716241314492282-5

Valor Total: R\$ 2.882,36

Autenticação Bancária: 99875247

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente MP2 CONSTRUCOES EIRELI, junto à Agência 3231, na data de pagamento.

Autenticação

ntfQtqEr Bor7pgcL 2hgkzMjU P5Rp4btP ?S6d1G2v Iy*X4V#F od#WPRgm hVI**Gao
 A36nd4*E DXjZT#3n cugz@ba2 a3tJ0fwk F89TnsrW oRC1UGZr tRW4FgZC pnmCd9Kq
 WSu8e0s hXmAK4y ykIYsLCA lgm2RRHo6 OM0JVfW9 TtwVKwBQ 00502024 00820082

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	73491742 / Reinf CP 25846952017 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.333,45	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 49.835,29	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.980,76	R\$ 2.177,06
IRRF	R\$ 705,30	R\$ 705,30
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.854,80	R\$ 2.882,36

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

- Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:
- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
 - incluídos em parcelamento deferido;
 - que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/05/2024 13:29:46
Nº do recibo de entrega	0000050000229955166



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000229955166
Data/Hora da Transmissão	10/05/2024 13:29:46	Identificação da Apuração de Débitos	73491742 / Reinf CP 25846952017 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	248,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 248,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	99,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	149,05		
Saldo a Pagar	149,05		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	19,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	59,62		
Saldo a Pagar	59,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	338,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 338,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.987,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.987,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.915,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.915,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.966,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.966,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.949,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.160,81		
Saldo a Pagar	788,62		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	393,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 393,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.179,77		
Saldo a Pagar	1.179,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	6.701,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.701,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	39.325,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39.325,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.482,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	16.518,13		
Deduções	Salário Família: 684,51 Retenção Lei 9711/98: 15.833,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	705,30		
Saldo a Pagar	705,30		



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 20/05/2024 - 17h49

Nº de controle: 746.756.575.280.060.515

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/05/2024**Valor: **R\$ 15.863,23**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 15.863,23**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 15.863,23**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202405202048I323174J0Ag**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		ELISEU PEREIRA COSTA	71	613.253.925-53	101	20/05/2024	Mensal	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15	
							Total do Tomador	90.004.55801/71	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
							Total do Estabelecimento	24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	15.068,30
							Total da Guia		198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento:				24.597.344/0001-98				Tomador:				90.007.05281/79			
04/2024				ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	063	090.198.535-03	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024				RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	88	054.455.675-59	101	20/05/2024	Mensal	3.733,00	298,64	0,00	0,00	0,00	298,64
04/2024				REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	061	079.315.675-01	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
Total do Tomador									90.007.05281/79	8.584,56	686,76	0,00	0,00	0,00	686,76
Total do Estabelecimento									24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total da Guia										198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23




Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 97 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADAILTON DO CARMO SANTOS	240	059.224.325-75	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	248	906.029.785-72	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	151	431.938.975-15	101	20/05/2024	Mensal	2.115,16	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21
04/2024		ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	23	069.936.775-12	101	20/05/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
04/2024		ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	154	792.961.575-87	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		AMAURI DOS SANTOS BARBOZA	183	045.146.935-61	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ANDRE LUIZ ALVES REIS	267	041.573.257-37	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	192	046.699.345-54	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		AUGUSTO CESAR SANTANA BISPO	214	069.052.335-10	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		BERNARDO SILVA BRITTO	232	065.634.245-54	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		BRAZ DIAS DOS SANTOS	224	501.122.875-49	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	126	576.963.495-20	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		CASSIANO DOS SANTOS BATISTA	273	552.198.705-30	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		COSME SANTOS MARQUES	212	459.294.325-20	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	149	019.088.445-23	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		EDSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR	208	833.611.385-15	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		ELTON SANTOS DA CONCEICAO	204	850.811.245-91	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ERIK SANTOS CHAVES	296	088.545.015-55	101	20/05/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
04/2024		ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	146	860.528.565-64	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ERNANDES DA COSTA	268	081.040.375-79	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		EVANDRO BRAS LEAL	264	885.438.895-53	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		FABRICIO FERREIRA NEVES	269	100.035.275-73	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	195	056.883.065-21	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	187	040.084.945-37	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		GABRIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO	242	116.043.775-00	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		GEAN PEREIRA DOS SANTOS	277	105.143.455-60	101	20/05/2024	Mensal	1.377,76	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22
04/2024		GENIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA	237	037.335.855-50	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		GILBERTO DE JESUS SILVA	226	389.383.028-65	101	20/05/2024	Mensal	2.270,60	181,64	0,00	0,00	0,00	181,64
04/2024		GILEAN ALMEIDA SANTOS	190	023.722.555-76	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		GIVANILDO CARVALHO SILVA	233	069.490.165-22	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		HELEN CAILANE SANTOS GOES	278	104.717.955-50	101	20/05/2024	Mensal	1.720,70	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65
04/2024		ISAIAS OLIVEIRA	189	619.175.085-49	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		IVAN LUIZ DE SOUZA MATOS	193	906.749.955-20	101	20/05/2024	Mensal	3.318,20	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45
04/2024		IVANILDO SANTOS DE JESUS	246	101.107.365-08	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JAIR RODRIGUES PIMENTEL VIEIRA	231	098.400.645-17	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA	276	060.723.775-99	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JOANDERSON DE MORAIS SILVA	197	862.032.175-73	101	20/05/2024	Mensal	2.270,60	181,64	0,00	0,00	0,00	181,64
04/2024		JOANDRESSON FRANCA DOS SANTOS	217	068.237.675-29	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		JONATHAS SILVA SANTOS	256	096.705.855-46	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67



Detalhe da Guia Emitida


Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 97 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA CEZAR	271	606.796.545-34	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE CICERO DE LIMA E SILVA JUNIOR	211	046.869.155-38	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE CRUZ DE OLIVEIRA	249	685.305.715-15	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS	239	058.965.185-44	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE MARTINS DE CARVALHO	179	379.422.045-53	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	174	043.467.815-51	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE QUIRINO DOS SANTOS CRUZ	280	006.052.355-70	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		JOSE RALFE SILVA SANTOS	265	034.797.105-90	101	20/05/2024	Mensal	1.824,49	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
04/2024		JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	173	042.817.385-90	101	20/05/2024	Mensal	2.186,47	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
04/2024		JOSIAS DA SILVA SANTOS	227	095.668.545-52	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		JULIO DA CONCEICAO	205	898.536.015-91	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		LEONARDO MATOS LIMA	279	098.819.595-00	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		LUCAS DA SILVA DIAS	194	038.392.235-63	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUCIVAN DE LIMA BARRETO	270	081.161.195-75	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO	202	029.835.435-79	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	141	968.062.655-53	101	20/05/2024	Mensal	2.684,70	214,77	0,00	0,00	0,00	214,77
04/2024		LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIV	238	030.927.645-44	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		LUIZ GONZAGA DE JESUS	230	038.148.615-07	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	168	124.161.289-73	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		MAICON CARVALHO DOS SANTOS	229	075.211.995-88	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MANOEL REIS DOS ANJOS	169	860.220.245-87	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCELO FERREIRA DA PAZ	138	807.970.755-34	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCIO PIRES XAVIER	150	055.034.795-05	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		MARCONE LIMA SANTOS	228	071.093.685-05	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MARCOS JOSE DE SANTANA	216	019.576.815-94	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91
04/2024		MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	24	077.351.585-88	101	20/05/2024	Mensal	2.764,68	221,17	0,00	0,00	0,00	221,17
04/2024		MISAEEL DA SILVA PEREIRA	258	927.755.435-53	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		NEI PIMENTA LEAL	186	215.802.885-34	101	20/05/2024	Mensal	3.733,00	298,64	0,00	0,00	0,00	298,64
04/2024		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	235	095.569.215-67	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		PAULO DOS SANTOS NUNES	166	668.578.645-00	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	191	062.238.685-96	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		RAFAEL DA SILVA	181	854.440.905-97	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
04/2024		RAIMUNDO DE FRANCA ALMEIDA	222	148.756.068-00	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	266	031.809.825-35	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	274	783.375.425-00	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		REINAN DE JESUS SANTOS	175	081.916.125-00	101	20/05/2024	Mensal	1.785,65	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
04/2024		RODRIGO DE JESUS SANTOS	263	024.292.085-39	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		ROMARIO DE JESUS SANTOS	261	052.183.325-69	101	20/05/2024	Mensal	1.823,61	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
04/2024		RONALDO JESUS DA SILVA	244	045.773.135-45	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:			24.597.344/0001-98			Tomador:			Sem Tomador						
04/2024			SILVIO SOUZA DE SANTANA	221	041.344.825-85	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
04/2024			TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	145	858.597.495-89	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67	
04/2024			VAGNER DA SILVA SANTOS	275	029.700.165-59	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91	
04/2024			VALBER DE SOUZA SILVA	220	062.478.685-45	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
04/2024			VALCI SILVA BRITTO	234	069.279.385-24	101	20/05/2024	Mensal	1.608,44	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67	
04/2024			VANEZIO CONCEICAO FREITAS	144	512.920.505-78	101	20/05/2024	Mensal	1.954,95	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39	
04/2024			VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	196	029.911.495-31	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
04/2024			WELINGTON DE FREITAS SILVA DE JESUS	198	034.371.775-16	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
04/2024			WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	139	087.985.945-83	101	20/05/2024	Mensal	1.473,96	117,91	0,00	0,00	0,00	117,91	
04/2024			WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	252	490.827.438-09	101	20/05/2024	Mensal	2.193,01	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44	
Total do Tomador									Sem Tomador	177.897,40	14.231,39	0,00	0,00	0,00	14.231,39
Total do Estabelecimento									24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total da Guia										198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:			90.016.27652/75			Tomador:			Sem Tomador						
04/2024			DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS	257	644.275.525-87	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
04/2024			DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	247	861.346.355-02	101	20/05/2024	Mensal	1.329,66	106,37	0,00	0,00	0,00	106,37	
04/2024			ELSON SILVA DE CARVALHO	251	029.178.985-42	101	20/05/2024	Mensal	2.425,90	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07	
04/2024			JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO	245	052.382.845-43	101	20/05/2024	Mensal	1.329,66	106,37	0,00	0,00	0,00	106,37	
04/2024			LUCIANO SANTANA BARRETO	259	022.903.725-95	101	20/05/2024	Mensal	2.425,78	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
Total do Tomador								Sem Tomador	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	794,93	
Total do Estabelecimento								90.016.27652/75	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	794,93	
Total da Guia									198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasilia)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	92	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	5	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total da Guia			198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 9.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.950/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	24.597.344/0001-98	92	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30
04/2024	90.016.2765275	5	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total da Guia			198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	92	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	188.358,88	15.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,30

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	5	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	9.936,78	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
Total da Guia			198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 97 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308627131-0 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 13/05/2024 10:32:50 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.004.55801/71

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
Total do Tomador	90.004.55801/71	1.876,92	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15

Tomador: 90.007.05281/79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	3	8.584,56	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,76
Total do Tomador	90.007.05281/79	8.584,56	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,76

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	93	187.834,18	15.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,32
Total do Tomador	Sem Tomador	187.834,18	15.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,32
Total da Guia		198.295,66	15.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,23



CPF/CNPJ do Empregador 24.597.344	Nome/Razão Social do Empregador MP2 CONSTRUCOES LTDA
--------------------------------------	---------------------------------------------------------

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051308627131-0	Tag 13/05/2024 10:32
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
15.863,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	97	15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23
Total Geral:		15.863,23	0,00	0,00	0,00	15.863,23



Data de geração da Guia: 13/05/2024 às 10:32:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bab.pix2568pix-graode.caixa.gov.br/api/v2/aobv/ae963a75b0da4351bf5289e3dda2f207a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008Bcaes11a62070503***63047CB4

Payload Location:

pix-graode.caixa.gov.br/api/v2/aobv/ae963a75b0da4351bf5289e3dda2f207a

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/04/2024
Número de Controle: 37.19.91.49.22
Número da Declaração: 37199.14922.170424.1.3.15-0773

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 00126.05812.260124.1.3.15-9919
Crédito de Sucédida: Não
Competência: 12/2022
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 25.853,38

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	29.677,09

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Telefone: (19)3471-0670
Celular:
Correio Eletrônico: lista-dp@visualassessoria.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/04/2024 às 18:55:22
66268917

37.19.91.49.22

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 26/04/2024
Número de Controle: 41.14.09.90.71
Número da Declaração: 41140.99071.260424.1.3.15-7024

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 02291.15044.200224.1.3.15-0017
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 03/2023
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 19.123,93

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	12.351,44
CP PATRONAL	9.025,29

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 26/04/2024 às 09:06:54
2250676663

Versão: 8.20

41.14.09.90.71

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220823080
Data/Hora da Transmissão	08/04/2024 08:13:26	Identificação da Apuração de Débitos	70299317 / Reinf CP 25269606036 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.GEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	217,37		
Saldo a Pagar	217,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	86,95		
Saldo a Pagar	86,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	130,42		
Saldo a Pagar	130,42		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,39		
Saldo a Pagar	17,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	52,17		
Saldo a Pagar	52,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	296,33		
Saldo a Pagar	296,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.739,03		
Saldo a Pagar	1.739,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.020,12		
Saldo a Pagar	5.020,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.008,04		
Saldo a Pagar	2.008,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.012,07		
Saldo a Pagar	3.012,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	401,60		
Saldo a Pagar	401,60		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.204,82		
Saldo a Pagar	1.204,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.843,43		
Saldo a Pagar	6.843,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	40.160,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.944,47		
Saldo a Pagar	28.216,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Saldo a Pagar	1.482,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	16.541,71		
Deduções	Salário Família: 1.052,61 Retenção Lei 9711/98: 15.489,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	739,69		
Saldo a Pagar	739,69		





Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 23/04/2024 - 09h03
Nº de controle: 329.638.606.097.154.964

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**
Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **23/04/2024**
Valor: **RS 15.747,17**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **RS 15.747,17**
Juros **RS 0,00**
Multa **RS 0,00**
Abatimento **RS 0,00**
Desconto **RS 0,00**
Valor final **RS 15.747,17**
Tarifa: **RS 0,00**
Identificação: **E60746948202404231202I3231A4xsc8**
Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CPF/CNPJ do Empregador 24.597.344	Nome/Razão Social do Empregador MP2 CONSTRUCOES LTDA
--------------------------------------	---------------------------------------------------------

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042305134569-5	Tag 24597344 03/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
23/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
15.747,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	99	14.926,26	0,00	0,00	820,91	15.747,17
Total Geral:		14.926,26	0,00	0,00	820,91	15.747,17



Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 08:23:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data: 02/02/2024

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

EFETIVO PESSOAL

CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 063/2023 RDO: 149

CATEGORIA QTDE

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

MÃO DE OBRA INDIRETA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO

Engenheiro 1

Tec. de Segurança

Aux Adm 1

Mestre de obra 1

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro 20

Ajudante Geral 25

Calçeteiro

Carpinteiro 3

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira 1

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba 1

Plintor

Armador 2

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:
Data: 02/02/2024

FISCALIZAÇÃO:
Data: 02/02/2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data 04/02/2024 S T Q Q S S D X

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 083/2023 RDO: 151

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Armador

Hh DO DIA

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 04/02/2024

Data: 04/02/2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						05/02/2024								X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL									
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 152		CATEGORIA				QTDE			
SÍMBOLOGIA		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro				1			
		EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA						Tec. de Segurança							
		EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS						Aux Adm				1			
		EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						Mestre de obra				1			
		EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS						Encarregado geral							
		EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA													
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO													
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO													
								Hh DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topógrafo							
								Auxiliar de topografia							
								Pedreiro				20			
								Ajudante Geral				25			
								Cajeteiro							
								Carpinteiro				3			
								Operador de Motosserra							
								Motorista							
								Montador							
								Montador/Eletricista							
								Eletricista							
								Operador de Patrol							
								Operador de Escavadeira				1			
								Operador de Pá carregadeira							
								Motorista de caçamba				1			
								Pintor							
								Armador				2			
								Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
								JORNADA DE TRABALHO							
								Hh DO DIA							
								Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO				QTDE.			
								Veículo Leve							
								Caminhão Munck							
								Caminhão Toco							
								Escavadeira							
								Pá carregadeira							
								Caçamba							
								Patrol							
								PC 200							
								Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 05/02/2024				Data: 05/02/2024											


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				06/02/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 063/2023 RDO: 153						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2 Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: Data: 06/02/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 06/02/2024						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				09/02/2024						
				S	T	Q	O	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2023 RDE: 156						
Condições Climáticas: Nome: 1 Tipo: 1 1. Tempo Bom 2. Chuva liq. cond. Trab. 3. Chuva liq. cond. Trab.				CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Insp. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO				Mão de obra Hs do dia						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alugador Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Marfleteiro Motorista Motorista Elétrica Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador						
				Hs do dia						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs do dia Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Trator Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 260 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 09/02/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/02/2024						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				11/02/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	D	Q	S	S	X
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR										
CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2023			RDO: 108			
CATEGORIA				EFTIVO PESSOAL						
CONDIÇÕES CONTRATUAIS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLO DA OBRA				OTDE						
SÍMBOLO DA OBRA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
CONSIDERAÇÕES				RESULTADO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
DATA: 11/02/2024				DATA: 11/02/2024						
				Bem da Obra Engenheiro Técnico Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carreiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Motorista Elétrica Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P3 carregadeira Motorista de caminhão Fonei Armador RESULTADO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO OTDE Veículo Leve Caminhão 3 eixos Caminhão Toca Escavadeira P3 carregadeira Cação Patrol PC 200 Placa Vibratória						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023				13/02/2024						
				S	T	O	C	S	S	D
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				R.D.O.: 180						
Condições Climáticas: Simbologia:				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA: OTDE:						
1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou Neb. 3- Chuva e/ou Neb. e Vent. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra: Engenheiro: Fc. de Segurança: Aux. Adm.: Almotço: Encarregado geral:						
SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA DIRETA: Topografo: Auxiliar de topografia: Pedreiro: Ajudante Geral: Canteiro: Carpinteiro: Operador de Sítoserra: Motorista: Motorista Elétrico: Eletricista: Operador de Patrol: Operador de Escavadeira: Operador de Pá carregadeira: Motorista de cangalha: Fone: Am. Ser:						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA: JORNADA DE TRABALHO: Hrs DO DIA: Hrs ACUMULADO:						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO: OTDE: Valado Leve: Caminhão Horta: Caminhão Terc: Escavadeira: Pá carregadeira: Cangalha: Patrol: PC 200: Plataforma:						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/02/2024				Data: 13/02/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 1763423					14/02/2024						
					CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 RDO: 181						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva e com. Trab. 3- Chuva e sem Trab.					CATEGORIA		EFETIVO PESSOAL				
SÍMBOLOGIA					MÃO DE OBRA DIRETA		OTDE				
SEM SERVIÇOS					SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		Gerente da Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA				
					MÃO DE OBRA DIRETA		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caldeiro Carpinteiro Operador de fitoserra Serralista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P3 carregadeira Serralista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO OTDE Trator Leve Caminhão Lâmina Caminhão Tavo Escavadeira P3 carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Máquina Vibratória				
GERENTE DE OBRA					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/02/2024					Data: 14/02/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Dias								
				15/02/2024	S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 1762602				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2020		RDO: 162		EFETIVO PESSOAL				
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 SIMBOLOGIA: 1-Tempo Bom 2-Chuva e cont.Trab. 3-Chuva e cont.Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS		OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hr DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de fibroseca Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Armador Hr DO DIA				
CONSIDERAÇÕES								REBUNDO DO EFETIVO				
OBSERVAÇÕES								EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO				
								EFETIVO EQUIPAMENTOS				
								TIPO Veículo Leve Caminhão Tanque Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol Pá 300 Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/02/2024				Data: 16/02/2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																				
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 179/2023				17/02/2024																				
				S	T	Q	Q	S	S	D														
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				EFETIVO PESSOAL																				
RDO: 164				CATEGORIA																				
SIMBOLOGIA: <table border="1"> <tr> <td>Condições Climáticas</td> <td>Manhã</td> <td>1</td> <td>Tarde</td> <td>1</td> <td>Noite</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1. Tempo Bom 2. Chuva o cond. Trab. 3. Chuva o cond. Trab.</td> </tr> </table> SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				Condições Climáticas	Manhã	1	Tarde	1	Noite	1	1. Tempo Bom 2. Chuva o cond. Trab. 3. Chuva o cond. Trab.							MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas	Manhã	1	Tarde	1	Noite	1																		
1. Tempo Bom 2. Chuva o cond. Trab. 3. Chuva o cond. Trab.																								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA E VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO MEIO FIO DA PRAÇA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral																				
				Hs DO DIA																				
				MÃO DE OBRA DIRETA																				
				Topógrafo																				
				Auxiliar de topografia 20																				
				Pedreiro 25																				
				Ajudante Geral 3																				
				Carpinteiro 3																				
				Operador de Motosserra																				
				Materiais																				
				Mecânico																				
				Mecânico Elétrico																				
				Eletroscista																				
				Operador de Parol																				
				Operador de Escavadeira 1																				
Operador de Pa carregadeira 1																								
Motorista de caminhão 2																								
Pintor																								
Armador																								
Hs DO DIA																								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																				
				EFETIVO DO DIA																				
				JORNADA DE TRABALHO																				
				Hs DO DIA																				
OBSERVAÇÕES				Hs ACUMULADO																				
				EFETIVO EQUIPAMENTOS																				
				TIPO																				
				Veículo Leve																				
				Caminhão Munck																				
				Caminhão Toco																				
				Escavadeira																				
				Pa carregadeira																				
				Caminhão																				
				Parol																				
				PC 200																				
Placa Vibratória																								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																				
Data: 17/02/2024				Data: 17/02/2024																				


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				18.02.2024						
				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023						
Cotações Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1				RDC: 186						
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Tráb. 3- Chuva e cond. Tráb.				CATEGORIA: NÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS				Gerente da Obra Engenheiro Tc. de Segurança Aux. Adm. Insp. de obra Encarregado geral HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				NÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Lixadeira Motorista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador HR DO DIA						
OBSERVAÇÕES				RESULTADO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
GERENTES DE OBRA				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO OTDE Valado Leve Caminhão Tanca Caminhão Toca Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Fica Vibratória						
Data: 18.02.2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 18.02.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				19/02/2024	X							
				S	T	O	Q	S	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 178/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2023 RDO: 198								
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () EMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA OTDE:								
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO MEIO FIO DA PRAÇA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral								
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 20 Canteiro Carpinteiro 3 Operador de fitoserra Motorista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Furo Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de cangamba 1 Puxar Armador 2								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HN DO DIA HN ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO OTDE Veículo Leve Caminhão Marca Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangamba Furo Pá 200 Pá a Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 19/02/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/02/2024								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 21/02/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATEGORIA							
CONTRATO N° 176/2023				CONCURRENCIA PÚBLICA N° 005/2023							
RDO: 188				QTDE							
SÍMBOLOGIA				NÃO DE OBRA INDIRETA							
1 - Tempo Bom 2 - Chuva e cond. Trab. 3 - Chuva e cond. Trab.				NÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA LÚMICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO MEIO FIO DA PRAÇA				Garanta de Obra							
				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm							1
				Bombeiro							1
				Encarregado geral							
				Tecnógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							20
				Ajudante Geral							20
				Canteiro							
				Carpinteiro							3
				Operador de Máscara							
				Motorista							
				Montador							
Montador Elétrica											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira							1				
Operador de PA carregadeira											
Motorista de capamba							1				
Purcar											
Armador							2				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Médio							
				Caminhão Trator							
				Escavadeira							
				PA Carregadeira							
				Capamba							
				Patrol							
PC 200											
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/02/2024				Data: 21/02/2024							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				22/02/2024						
				S	T	Q	X	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176-2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 188						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA OTOR MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA:				Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tal. de Segurança 1 Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS: EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO MEIO FIO DA PRAÇA				HR DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topógrafo 20 Pedreiro 25 Ajudante Geral 25 Calceiro Carpinteiro 3 Operador de libroseira Apontador Apontador Elétrico Eletricista Operador de Fatorô Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Apontador de capamba 1 Fencer Armador 2						
				HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Manx Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Fatorô P.C 200 Pista Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/02/2024				Data: 22/02/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				20.02.2024							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176-2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 176							
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA OTDE:							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO MEIO FIO DA PRAÇA				Gerente da Obra Engenheiro 1 T. Ac. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajustador de arço 28 Calculeiro Carpinteiro 3 Operador de Sítio/terra Motorista Montador/Elétrico Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba 1 Pyreor Armador 2							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES:				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				MÃO DE OBRA ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO OTDE							
				Trator Leve							
				Caminhão Manôil							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capambá							
				Patrol							
PC 200											
Pisca Viária											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20.02.2024				Data: 20.02.2024							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 1762603				00/00/2024							
				S	T	O	G	S	S	X	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2023				RDO: 179		EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1- Terço Bom 2- Chuva à cond. Trab. 3- Chuva à cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra					
						Engenheiro					
						Téc. de Segurança					
						Aux. Adm.					
						Mestre de obra					
						Encarregado geral					
						HR DO DIA					
						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topógrafo					
						Auxiliar de topógrafo					
						Pedreiro					
						Ajudante Geral					
						Canteiro					
						Carpinteiro					
						Operador de fitoserra					
						Montador					
						Montador Elétrico					
						Elevador					
						Operador de Fôrtil					
						Operador de Escavadeira					
						Operador de Pá carregadeira					
						Montador de cacamba					
						Pintor					
						Armador					
						HR DO DIA					
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
						EFETIVO DO DIA					
						JORNADA DE TRABALHO					
						HR DO DIA					
						HR ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO					
						OTDE					
						Veículo Leve					
						Caminhão Baixo					
						Caminhão Toco					
						Escavadeira					
						Pá carregadeira					
						Cacamba					
						Patrol					
						PC 200					
						Placa Vibratória					
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 00/00/2024				Data: 00/00/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				04/03/2024	X							
				S	T	D	Q	S	S	D		
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176-2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000-2023 RDO: 180				EFETIVO PESSOAL								
Categorias Códigos: Maná 1 Tarde 1 Noite 1 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab.				CATEGORIA			OTDE					
SINBOLOGIA				NÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUIOSQUE				Gerente da Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral HR DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				NÃO DE OBRA DIRETA								
OBSERVAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Ajudante Geral 3 Carpinteiro Operador de fitoserra Operador de betoneira Motorista Motorista/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Puxor Armador 2 HR DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
OBSERVAÇÕES				TIPO OTDE Veículo Leve Caminhão Médio Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 300 Plataforma Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/03/2024				Data: 04/03/2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data:	06/03/2024						
S	X	T	O	Q	S	S	D

TE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
TD: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
RATO Nº: 176/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023 RDC: 181

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA	OTDE
-----------	------

MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Téc. de Segurança	
Aux. Adm.	1
Mestre de obra	1
Encarregado geral	

MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Padreiro	20
Ajustante Geral	25
Coleteiro	
Carpinteiro	3
Operador de fibroseca	
Hidráulico	
Hidráulico Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	1
Operador de Pí carregadeira	
Hidráulico de caçamba	1
Funer	
Armador	2

HH DO DIA

REBUNDO DO EFETIVO

REBUNDO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HH DO DIA	
HH ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	OTDE
Veículo Leve	
Caminhão Baixo	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pí carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 300	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO: Data: 06/03/2024

SIMBOLOGIA: 1- Terço Bem 2- Obra a cont. Trab. 3- Obra a cont. Trab.
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO
EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUIOSQUE

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data		X						
07/03/2024		S	T	O	Q	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
 CONTRATO Nº 179/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 183

EFETIVO PRESENL

CATEGORIA	QTDE
-----------	------

NÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	1
Engenheiro	
Téc. de Segurança	
Aux. Limp.	1
Mestre de obra	1
Encarregado geral	

HR DO DIA

NÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Patrão	20
Ajuzeiro Oarsi	25
Coleteira	
Carpinteiro	3
Operador de Sotasserra	
Motorista	
Montador Eletrotécnico	
Eletricista	
Operador de Páteo	
Operador de Escavadeira	1
Operador de Tr. Carregadeira	
Motorista de cangamba	1
Plator	
Armador	2

HR DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HR DO DIA	
HR ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE
Veículo Leve	
Caminhão Tanque	
Caminhão Tercel	
Escavadeira	
Pa. Carregadeira	
Cangamba	
Plator	
PC 200	
Placa Vibrosinta	

Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite ()
 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
 EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
 EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
 EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO
 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRÓDUTO
 EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUIOSQUE

CONSIDERAÇÕES


OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA: _____ FISCALIZAÇÃO: _____
 Data: 07/03/2024 Data: 07/03/2024

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

[Handwritten Signature]



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				08/03/2024									
				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 RDO: 184									
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva o com. Trab. 3- Chuva n. com. Trab.				EFETIVO PESSOAL									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA LÍQUIDA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUIOSQUE				CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTD Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral									
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA									
OBSERVAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajustador Geral 25 Canteiro 3 Operador de betoneira Motorista Montador Elétrico Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de cangamba 1 Pintor Armador 2									
				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				Tipo QTD Vaca Leve Caminhão 1420x Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangamba Párol PC 200 Plataforma									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/03/2024				Data: 08/03/2024									


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					08/03/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 176/2023					CATEGORIA							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023					MÃO DE OBRA DIRETA							
RDO: 188					MÃO DE OBRA INDIRETA							
CONDICIONAIS					MÃO DE OBRA							
SINBOLOGIA					MÃO DE OBRA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c. com. Trab. 3- Chuva n. com. Trab.					MÃO DE OBRA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA							
SEM SERVIÇOS					Gerente de Obra							
					Engenheiro							
					Téc. de Segurança							
					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO		
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					MÃO DE OBRA							
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIP							
					OTDE							
					Veículo Leve							
					Caminhão Motor							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá Carregadeira							
					Cajamba							
					Párol							
PC 000												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/03/2024					Data: 08/03/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data													
					10/00/2024	S	T	Q	Q	S	S	X						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 1762603					CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 106							EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					CATEGORIA							MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇOS					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Almoço de obra Encarregado geral							Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de betoneira Motorista Montador Montador Elétrica Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Amseor							Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO ODE							Vacuômetro Caminhão Mixer Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Párol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:													
Data: 10/00/2024					Data: 10/00/2024													


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

 MP2 MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR ORÇAMENTO Nº: 118522		CONCOMPARAÇÃO PÚBLICA Nº 000.000 Nº 01		MOD: 187	
CONDIÇÃO DE OBRA	12/01/2024	1	1	1	1	1	1
DESCRIÇÃO	1- Tempo Bom 2- Chuva e vent. fraco 3- Chuva e vent. fraco SERVIÇOS EXECUTADOS OCCORRÊNCIAS						
EXECUÇÃO DE ARRUMAÇÃO DE PAREDE OU VIGAS DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE REBOCO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTAR COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUOSQUE							


DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11/09/2024										
CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA QTD: 0										
MAO DE OBRA DIRETA 1 sargento Auxiliar esboçador 7 metros Auxiliar obra 28 Carreiros 3 Operador de Motocicla 1 Motorista 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá Carregadeira 1 Motorista de caminhão 1 1 2										
11/09/2024										
11/09/2024										
RESUMO DO DIÁRIO DATA DO DIA: 11/09/2024 JORNADA DE TRABALHO: 08:00 às 17:00 Nº DO DIA: 11 Nº ACUMULADO: 11										
RESUMO DO SERVIÇO DATA DO DIA: 11/09/2024 JORNADA DE TRABALHO: 08:00 às 17:00 Nº DO DIA: 11 Nº ACUMULADO: 11										
TIPO: SERVIÇO EQUIPAMENTOS QTD: 0										
VALORES LÍQUIDOS CANCELADO: 0,00 CANCELADO TOTAL: 0,00 RESERVA: 0,00 P/ ATINGIMENTO: 0,00 CANCELADO: 0,00 P/ 200: 0,00 P/ 1000: 0,00 P/ 10000: 0,00										

GERENTE DE OBRA: _____ DATA: 11/09/2024

REALIZADO: _____ DATA: 11/09/2024


Evoldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				12/03/2024						
				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 188						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou vent. 3- Chuva e/ou vent. e Trb.				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUIOSQUE				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
				Mh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Apoiante Geral 28 Canteiro 3 Carpinteiro Operador de fibrocimento Almotolado Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Fúndão Operador de Escavadeira 1 Operador de PS carregadeira Apoiante de caixa d'água 1 Pintor Armeiro 2						
				Mh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Mh DO DIA Mh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO: OTDE						
				Valículo Leve Caminhão Médio Caminhão Trator Escavadeira PS carregadeira Caixa d'água Fúndão PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/03/2024				Data: 12/03/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023 RDO: 188				13/03/2024						
				S	T	O	X	O	S	D
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA			
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA LÍQUIDA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRÓDUTO EXECUÇÃO DO TELhado DO QUIOSQUE				Gerente da Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
				Hrs DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 28 Canteiro Carpinteiro 3 Operador de fôrma Motorista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de cangamba 1 Pintor Armador 2						
				Hrs DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				RESUMO EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão 15ton Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/03/2024				Data: 13/03/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				14/03/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR										
CONTRATO Nº: 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2023				RDO: 190		
Condições Climáticas				E F T O X S B S D						
SÍMBOLOGIA				CATEGORIA						
				MIO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MIO DE OBRA DIRETA						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA LÚMICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRÓDUTO EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUIOSQUE				Gerente de Obra Engenheiro T. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				MIO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar topógrafo Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Abatedor Montador Elétrico Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá Carregadeira Motorista de Capiamba Pintor Armador						
				MIO DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO MIO DO DIA MIO ACUSALADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO Quantidade Caminhão 16m3 Caminhão Toco Escavadeira Pá Carregadeira Capiamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/03/2024				Data: 14/03/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	O	G	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023 CONC. ORRENCIA PÚBLICA Nº: 003/2023 RBO: 191				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 SÍMBOLO DA: 1 Tempo: 1 2 Chuva: 0 3 Chuva: 0				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS - Ocorrências				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRÓDUTO EXECUÇÃO DO TELHADO DO QUIOSQUE				Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Téc. de Segurança 1 Ass. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1						
				Hs DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Assista de topografia 20						
				Pedreiro 25						
				Carpinteiro 3						
				Operador de Motocreta						
				Montador						
				Montador e elétrica						
Elétrica										
Operador de Patrol 1										
Operador de Escavadeira 1										
Operador de Pá carregadeira 1										
Motorista caminhão										
Plano										
Acendedor 2										
Hs DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hs DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Blauich Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caminhão Plano PC 200 Placa Vitoria						
GERENTE DE OBRA: Data: 15/03/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 15/03/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					X								
					S	T	Q	Q	S	S		D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 176262 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2023 RDO: 194					EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux. Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab. 4- Serviço executado 5- Ocorrências					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 20 Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro 2 Operador de fôrtilseira Motorista Motorista Elétrica Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de P3 carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE					RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HN DO DIA HN ACUMULADO								
					EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Vácuo Leve Caminhão Tanque Caminhão Toco Escavadeira P3 carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
CONSIDERAÇÕES					OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA: Data: 18/03/2024					FISCALIZAÇÃO: Data: 18/03/2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					21/03/2024						
					S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2023 RDO: 18ª					EFETIVO PESSOAL						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					CATEGORIA						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE					NÃO DE OBRA INDIRETA						
					Gerente de Obra Engenheiro T. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
					Quantidade 1 1 1 1						
					EFETIVO DO DIA						
					NÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo Auxiliar de topógrafo Pedreiro Ajuzeiro Geral Canteiro Carpinteiro Operador de fibroseca Montista Montador Montador Baticista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Montista de capamba Pintor Armador						
					Quantidade 20 28 3 1 1 2						
					EFETIVO DO DIA						
					REBUNDO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HN DO DIA HN ACUMULADO						
					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO Quantidade Valor Leve Caminhão 16 toneladas Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PC 300 Plataforma Vibratória						
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA: Data: 21/03/2024					FISCALIZAÇÃO: Data: 21/03/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				24/03/2024	S	T	O	O	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 200				EFETIVO PE SSOAL							
SIMBOLOGIA 1. Tempo Bem 2. Chave o cond. Trab. 3. Chaves/ cond. Trab.				CATE GORIA				OTDE			
SIM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Mão de Obra Direta Gerente de obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hs DO DIA							
				Mão de Obra Indireta Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motoneta Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Prensa Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista/capacista Plator Acendedor Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
				TIPO OTDE Veículo Leve Caminhão Branco Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capacista Prensa PC 200 Placa Vibrotática							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/03/2024				Data: 24/03/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
CONTRATO N.º 118/2023

EMPRESA: MPZ Engenharia e Construção
RDO: 1108 | DDE

1- Tempo Sim 2- Dobra e cont. Trab. 3- Dobra e cont. Trab.
SERVIÇO EXECUTADO: OBRAS DE

EXECUÇÃO DE ARRIMAÇÃO DE PILARES OU VIGAS DE ESTRUTURA
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
TRABALHO DE REVESTIMENTO INTERIORES, INTERIO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELTROCABO
EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE
EXECUÇÃO DA PINGUELA

DATA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	TT	TD	TE	TF	TO	TP	TPD	OTR
<p>Objetos de Obra</p> <p>Engenheiros</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Edm</p> <p>Operários</p> <p>Encarregado (geral)</p>																																		
<p>INDO DIA</p> <p>MAO DE OBRA DIRETA</p> <p>Tenoplasta</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Peonias</p> <p>Auxiliar de obra</p> <p>Caldeira</p> <p>Capataz</p> <p>Operador de Motobomba</p> <p>Operador</p> <p>Operador de Bôlides</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Fôrtil</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de PA carregadora</p> <p>Montador de sapata</p> <p>Pintor</p> <p>Atm. MBP</p>																																		
<p>INDO DIA</p> <p>RESUMO DO DIÁRIO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>INDO DIA</p> <p>NO ACUMULADO</p>																																		
<p>INDO DIA</p> <p>RESUMO DO DIÁRIO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>INDO DIA</p> <p>NO ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>OTR</p> <p>VALORES LEVADOS</p> <p>Combustível Motor</p> <p>Combustível Trator</p> <p>Escavadeira</p> <p>PA Carregadeira</p> <p>Capataz</p> <p>Pintor</p> <p>PC 200</p> <p>Plata Vibratória</p>																																		

GERENTE DE OBRA: _____
DATA: 26/10/2024

REALIZAÇÃO: _____
DATA: 26/10/2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

(Handwritten signature)





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data: 27/05/2024

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
CONTRATO Nº 176/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2023 RDO: 203

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA NAO DE OBRA INDIRETA QTDE

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Téc. de Segurança	
Aux. Adm	1
Motor de obra	1
Encarregado geral	

HR DO DIA

NAO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografo	
Padreiro	20
Ajudante Geral	28
Coleteiro	
Carpinteiro	3
Operador de fotosseta	
Motorista	
Montador	
Montador Elétrico	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	1
Operador de P3 carregadeira	
Motorista de capamba	1
Purificador	
Armador	2

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
HR DO DIA	
HR ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	OTDE
Vacúo Leve	
Caminhão Manak	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
P3 carregadeira	
Capamba	
Patrol	
PC 200	
Piaca Vibratória	

GERENTE DE OBRA

DATA: 27/05/2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					DATA								
					28/08/2024								
					S	T	Q	C	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023					CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2023 RDO: 204								
SINOPSE: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou Trab. 3- Chuva e/ou Trab.					CATEGORIA				OTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADEIRA					Gerente de Obra Engenheiro T. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Serragem Motorista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Fretel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Fisco Armazém								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO QTD								
					Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Trator Escavadeira Pá carregadeira Cadeira Fretel FC 200 Pácar Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 28/08/2024					FISCALIZAÇÃO: Data: 28/08/2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				28-09-2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	D	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº: 176-2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				RDI: 206			
CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA		OTDE					
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
<p>EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA</p> <p>EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS</p> <p>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</p> <p>EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS</p> <p>EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA</p> <p>TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO</p> <p>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</p> <p>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO</p> <p>EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE</p> <p>EXECUÇÃO DA PINGADEIRA</p>				<p>Serviços Executados / Ocorrências</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança 1</p> <p>Aux. Adm. 1</p> <p>Motorista de obra 1</p> <p>Encarregado geral</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 20</p> <p>Ajudante Geral 25</p> <p>Coleteiro</p> <p>Carpinteiro 3</p> <p>Operador de Sítioseira</p> <p>Operador</p> <p>Operador Elétrico</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol 1</p> <p>Operador de Escavadeira 1</p> <p>Operador de P3 carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba 1</p> <p>Pinor</p> <p>Armeador 2</p>							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>HR DO DIA</p> <p>HR ACUMULADO</p>							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				<p>TIPO</p> <p>OTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Manua</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>P3 carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>							
ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28-09-2024				Data: 28-09-2024							

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				30/03/2024							
				S	T	D	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 005/2023 RDC: 204				EFTIVO PEREODAL CATEGORIA OTDE NÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã 1 Tarde 1 Noite 1 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e cond. Trab. 3- Chuva e cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS DEBENES DA OBRA Engenheiro Tm. de Segurança Aux. de Alm. Mestre de obra Encarregado geral HR DO DIA NÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografo Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Alpinista Operador Montador Elétrico Eletricista Operador de Fôrtil Operador de Escavadeira Operador de P3 carregadeira Montador de caçamba Pintor Armador HR DO DIA							
SEM SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO OTDE Veículo Leve Caminhão Marok Caminhão Toco Escavadeira P3 carregadeira Caçamba Fôrtil PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/03/2024				Data: 30/03/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		01.04.2024						
		S T O O S S D						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 208		CATEGORIA			QTD	
SÍMBOLOGIA		Materia: 1		Tarefa: 1		Mão de Obra Indireta		
1. Tempo Base 2. Chave o cond. Trab. 3. Chave o cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		Mão de Obra Direta Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Escarregado geral Hs do Dia						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA		Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Alcega Geral 25 Carpinteiro 3 Operador de Motocerra Motorista Montador Montador Elétrica Elétrica Operador de Parol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Plator Acoplador 2 Hs do Dia						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs do Dia Hs ACUMULADO						
		EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Terc Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Parol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01.04.2024		Data: 01.04.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				04	05	06	07	08	09	10	11	12
				S	T	O	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176-2021				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021								
RDO: 211				CATEGORIA								
Símbolos Clássicos Símbolos 1				MÃO DE OBRA INDIRETA								
1. Tempo Bruto 2. Chave e cond. Trab. 3. Chave e cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRÓDUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBRA				Hrs DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografia Auxiliar de topografia Paquísta 20 Altimetro Geral 25 Cálculo 3 Operador de Máquina Motorista Montador Montador e Laticida Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de P3 carregadeira Motorista de caçamba 1 Placa Armeiro 2								
				Hrs DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Mueca Caminhão Tece Escavadeira P3 carregadeira Caçamba Patrol PC 280 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/04/2021				Data: 04/04/2021								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		05.04.2024						
		S	T	Q	O	X	S	D
Condições climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite:		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 212		EFETIVO PESSOAL		
SIMBOLOGIA: 1. Tempo Básic. 2. Chove o cont. Trab. 3. Chove n/ cont. Trab.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA DIRETA				
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA		GERENTE DE OBRA		OTDE				
		Engenheiro		1				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Téc. de Segurança		1				
		Aux. Adm.		1				
		Mestre de obra		1				
		Encarregado geral						
		H. DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		20				
		Ajudante Geral		25				
Cálculo								
Capoteiro		3						
Operador de Motocreta								
Montador								
Montador Elétrica								
Elétrica								
Operador de Paquí								
Operador de Escavadeira		1						
Operador de P3 carruqueiro								
Moleto de caçamba		1						
Plata								
Armador		2						
H. DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		H. DO DIA						
		H. ACUMULADO						
		EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Válvula Leve						
		Câmbio March						
		Câmbio Terc						
		Escavadeira						
		P3 carruqueiro						
		Cacamba						
		Paquí						
		PC 200						
		Placa Metálica						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05.04.2024		Data: 05.04.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		06/04/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176-2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 213		EFETIVO PESSOAL			
Condições climáticas: Temperatura: 1, Umidade: 1, Vento: 1, Nevoeiro: 1		1. Tempo Bem 2. Chuva e/ou cond. Trab. 3. Chuva e/ou cond. Trab.		Nota: 1		CATEGORIA			
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA			
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escrivão geral			
						MÃO DE OBRA DIRETA			
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alçabateiro Carpinteiro Operário de Montagem Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P2 carregadeira Motorista de caminhão Plator Armeiro			
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO			
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS			
						TIPO Valor de Lave Caminhão Blindado Caminhão Terc Escavadeira P2 carregadeira Caminhão Patrol PC 200 Placa Vibrotática			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data:		06/04/2024			
Data: 06/04/2024		Data:		06/04/2024					


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		08/04/2024						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RPO: 214		EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIA: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA: _____		MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: _____ 1. Tempo Base 2. Chove o cont. Trab. 3. Chove o cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hs do Dia: _____						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Apontador Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador Elétrica Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armeiro						
		Hs do Dia: _____						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs do Dia Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO: _____ OTDE: _____ Vácuo Leve Caminhão Basculante Caminhão Tercer Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 280 Placa Vibrotática						
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/04/2024		Data: 08/04/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data: 08/04/2024													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S T O O S S D													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		EFETIVO PE SOAL													
CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 215		CATEGORIA		QTDE						
Condições Climáticas		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1. Tempo Bem		2. Chuva w/cond. Trab.		3. Chuva w/cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA								Gerente de Obra							
								Engenheiro						1	
								Téc. de Segurança							
								Aux. Adm.						1	
								Mestre de obra						1	
								Encarregado geral							
								HR DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topógrafo							
								Auxiliar de topografia							
								Pedreiro						20	
								Ajudante Geral						25	
								Carpinteiro						3	
								Operador de Motocerra							
								Motorista							
								Montador							
								Montador/Verticista							
								Elétricista							
								Operador de Paquí							
								Operador de Escavadeira						1	
								Operador de PA carregadeira							
								Motorista de caçamba						1	
								Fator							
								Armador						2	
								HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
								JORNADA DE TRABALHO							
								HR DO DIA							
								HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES								EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
								TIPO							
								QTDE							
								Veículo Leve							
								Caminhão Manick							
								Caminhão Toco							
								Escavadeira							
								PA carregadeira							
								Caçamba							
								Paquí							
								PC 200							
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Data: 08/04/2024							
Data: 08/04/2024				Data: 08/04/2024											


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		09/04/2024						
		S	T	O	D	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 216		EFETIVO PESSOAL				
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SÍMBOLOGIA: 1. Tempo Bom 2. Chovia o cont. Trab. 3. Chovia n° cont. Trab.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA		MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra Escrivão geral 1								
		MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Ajudante Geral Carretilho 3 Operador de Motoniveladora Motorista Montador Montador-Elétrico Eletricista Operador de Parol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de capotão 1 Plator Armeiro 2								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO OTDE Valículo Leve Câmbio Manual Câmbio Tron Escavadeira Pá carregadeira Carretilho Parol PC 200 Placa Vibetória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data: 09/04/2024						
Data: 09/04/2024		Data: 09/04/2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 11/04/2024								
				S	T	O	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 218								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1. Tempo Bom 2. Chuva ou cond. Trab. 3. Chuva e cond. Trab.				CATEGORIA				OTDE				
SÍMBOLOGIA:				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS: EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELIFRIGOUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADIEIRA				Gerente de Obra Engenheiro 1				1				
				Téc. de Segurança Aux. Adm. 1 1				1 1				
				Mestre de obra Escavadeira geral				1 1				
				Hs do Dia				Hs do Dia				
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alvenaria Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motocreta Motorista Montador Montador Elétrico Encanheiro Operador de Páteo Operador de Escavadeira Operador de PS Carregadeira Motorista de caminhão Plator Armador				20 25 3 1 1 2				
				Hs do Dia				Hs do Dia				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs do Dia Hs Acumuladas				Hs do Dia Hs Acumuladas				
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS								
				TIPO Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Toco Escavadeira PS Carregadeira Cargueiro Forno PC 280 Placa Vibratória				QTD 1 1 1 1 1 1 1 1				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 11/04/2024				Data: 11/04/2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		12	04	2024	S	T	O	O	S	S	D
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 219		EFETIVO PE SOAL									
CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hs do dia									
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA									
OBSERVAÇÕES		Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motocerra Materialista Montador Montador Elétrico Encarregado Operador de Patrol Operador de Escada rolante 1 Operador de Pó carregadeira Motorista de caminhão 1 Pintor Acendedor 2 Hs do dia									
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs do dia Hs acumuladas									
EQUIPAMENTOS		TIPO Veículo Leve Caminhão Montob Caminhão Terc Escada rolante Pó carregadeira Caminhão Patrol PC 200 Placa Vibrolina									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 12/04/2024		Data: 12/04/2024									


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 13/04/2021						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJ. 10: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2021				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021 RDO: 220						
CATEGORIA: 1 Tabela: 1 Nome:				EFETIVO PESSOAL						
SÍMBOLO DA OBRA: 1 1. Tempo Bom 2. Chover c/ cond. Trab. 3. Chover c/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS				CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA OTDE						
SEM SERVIÇO				Serviços de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Ass. Adm. Mestre de obra Escarregado geral						
				Mão de Obra						
				Mão de Obra Direta						
				Topografia Acoplador de topografia Paquímetro Ajudante Geral Calçadista Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador e Mecânico Eletreletricista Operador de Patrulha Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capanga Plator Armeiro						
				Mão de Obra						
				REUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO Dia Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO OTDE Veículo Lave Caminhão Basculante Caminhão Terc Escavadeira Pá carregadeira Capanga Patrulha PC 200 Placa Metálica						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/04/2021				Data: 13/04/2021						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		14/04/2024						
		S	T	O	O	S	S	D
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0032023 RDO: 221		EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDETERMINADA		OTDE						
Condições Climáticas: Nuvens / 1 / Temperatura: 1 / Umidade: 1 / Nota: / 1		Serviços Executados / Ocorrências: SEM SERVIÇO						
1. Tempo Bom 2. Chuva e/ou vent. 3. Chuva e/ou vent. Trabalho		Gerente de Obras Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
Hs DO DIA		MÃO DE OBRA INDETERMINADA Topógrafo Alcega de topografia Pintor Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Montador Montador Montador-Eletricista Eletricista Operador de Parol Operador de Escavadeira Operador de P3 carregadeira Motorista de caminhão Plator Armeiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO OTDE Varrido Leve Caminhão Bussck Caminhão Toco Escavadeira P3 carregadeira Caminhão Parol PC 280 Placa Vibração						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/04/2024		Data: 14/04/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data: 17/04/2024								
		S	T	Q	O	X	S	D		
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/02/23 RDO: 224	EFETIVO PESSOAL									
	CATEGORIA							QTD		
SIMBOLO DA OBRA: _____ 1. Tempo Bem 2. Chave e cond. Trab. 3. Chave e cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA MOBRUTA								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE MEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINTAGEM EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE		Mão de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral								
		Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 20 Ajudante Geral Calçateiro 3 Carpineteiro Operador de Motocerra Motobista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de P3 carregadeira Motobista/capamba 1 Plator Arrebitador 2								
		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO Dia Hs ACORRELADO								
		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO QTD Valículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira P3 carregadeira Capamba Patrol PC 280 Placa Vibatória								
		GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
		Data: 17/04/2024		Data: 17/04/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				RDO: 226		
				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1. Tempo Bem 2. Chuva e/ou cond. Trab. 3. Chuva e/ou cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Descrição de OBRAS Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Ass. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBRA EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Aljofre Geral 25 Calceiro Carpinteiro 3 Operador de Motocerra Motorista Montador Montador-Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de P3 carregadeira Motorista/capanga 1 Plator Armeiro 2						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/04/2024				Data: 18/04/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				20/04/2024						
				S	T	O	O	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023				EFETIVO PESSOAL						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 983/2023 RDO: 227				CATE.GORIA						
Marca: () Faixa: () 1. Tarefa Brta 2. Obra c/ cond. Trab. 3. Obra ex. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDETERMINADA						
SÍMBOLO DA OBRA:				Controlador de Obra Escrivão Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Capotador Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Escritista Escritista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba Placa Armeiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD.						
				Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Tercer Escavadeira Pá carregadeira Capomba Placa PC 280 Placa Vibrotática						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO						
Data: 20/04/2024				Data: 20/04/2024						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																	
				S	T	Q	Q	S	S	X																											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 220																																	
CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA				EFETIVO PESSOAL																																	
SIMBOLOGIA: <table border="1"> <tr> <td>Monte</td> <td>1</td> <td>Terra</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1. Terra/Beto 2. Chave c/ cond. Trab. 3. Chave c/ cond. Trab.</td> </tr> </table> SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				Monte	1	Terra	1	1. Terra/Beto 2. Chave c/ cond. Trab. 3. Chave c/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																									
Monte	1	Terra	1																																		
1. Terra/Beto 2. Chave c/ cond. Trab. 3. Chave c/ cond. Trab.																																					
SEM SERVIÇO				Encarregado de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Ass. Adm. Mestre de obra Escrivão geral																																	
				MÃO DE OBRA DIRETA																																	
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Aljubeiro Geral Carpinteiro Capoteiro Operador de Motocerra Motocelta Motorador Motorador Especialista Eleticista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de P3 carregadeira Motorista de caminhão Plator Armeiro																																	
				RESUMO DO EFETIVO																																	
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACURRULADO																																	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS																																	
				TIPO: <table border="1"> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td></td> <td>QTD:</td> </tr> <tr> <td>Caminhão 35000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão 15000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P3 carregadeira</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Párol</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibatória</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Veículo Leve		QTD:	Caminhão 35000			Caminhão 15000			Escavadeira			P3 carregadeira			Caminhão			Párol			PC 200			Placa Vibatória		
Veículo Leve		QTD:																																			
Caminhão 35000																																					
Caminhão 15000																																					
Escavadeira																																					
P3 carregadeira																																					
Caminhão																																					
Párol																																					
PC 200																																					
Placa Vibatória																																					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																	
Data: 21/04/2024				Data: 21/04/2024																																	



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 231				EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA				QTD						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Mão de obra						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELIFRÓDUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO				Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES				Mão de obra indireta						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
DATA: 24.04.2024				TIPO QTD						
				Veículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Tator Escavadeira Pá carregadeira Cadeira Patrol PC 200 Placa Vibratória						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		25/04/2024 S T O O S S D						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Temperatura: 1, Umidade: 1, Vento: 1, Nuvem: 1		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 232		EFETIVO PESSOAL		
SIMBOLOGIA		1. Tempo Bruto 2. Chaveir/ com. Trab. 3. Chaveir/ com. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTROTUDO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO		MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		OTDE		
		Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Carpinteiro Carpinteiro 3 Operador de Betoneira Motorista Montador Montador/Elétrico Eleticista Operador de Parrel Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista/cambista 1 Ploteio Arroteador 2		Hs DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO		
CONSIDERAÇÕES		OBSERVAÇÕES		EFETIVO E EQUIPAMENTOS		OTDE		
				Veículo Leve Caminhão March Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capadora Parrel PC 300 Placa Vibrotória				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/04/2024		Data: 25/04/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				26/04/2024						
				S T Q D S S D						
CONC. ORÇ. PÚBLICA Nº 003/2023				EFETIVO PESSOAL						
RPO: 233				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1. Tempo Bom 2. Chovia c. cond. Trab. 3. Chovia n. cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDETERMINADA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Escarregado geral						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELIFRÓDUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO				MÃO DE OBRA DETERMINADA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Alugador Geral 25 Canteiro Carpinteiro 3 Operador de Motoniveladora Montador Montador/Instalador Encanador Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pa carregadeira Motorista de caminhão 1 Plator Armador 2						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HS DO DIA HS ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO Quantidade Valor Caminhão Mercedes Caminhão Teco Escavadeira Pa Carregadeira Canteiro Plator PC 200 Placa Vibretória						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26.04.2024				Data: 26.04.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		27.04.2024						
		S	T	O	O	S	S	D
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 234		CATEGORIA			QTD	
Condições Climáticas: Temperatura: 1, Umidade: 1, Vento: 1, Neve: 1 1. Tempo livre 2. Cheva c/ cont. Trab. 3. Cheva w/ cont. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral H/D DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		Topografia Análise de topografia Padaria Alvenaria Geral Calceado Carpintaria Operador de Motocerra Motorista Montador Montador de betão Elétrica Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Pastor Arreiro						
OBSERVAÇÕES		REUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO H/D DO DIA H/A ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA		EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
Data: 27.04.2024		TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Betão Caminhão Terc Escavadeira Pá carregadeira Carrocinha Párol PC 280 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO:		Data: 27.04.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				28/04/2021						
				S	T	O	O	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 176/2021				CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2021 RDO: 235						
Condições Climáticas: Temperatura: 1, Umidade: 1, Vento: 1, Neve: 1				CATEGORIA: MÃO DE OBRA DIRETA						
SÍMBOLO DA OBRA:				MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS						
				Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral						
				HR DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Apoiante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motobomba Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motobomba caçamba Plator Arrematador						
				HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD. Varrido Leve Caminhão Basculante Caminhão Terc Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/04/2021				Data: 28/04/2021						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		29	04	2024						
		S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 236		EFETIVO PESSOAL				
Condições Climáticas: Temperatura: 1, Umidade: 1, Vento: 1, Neve: 1		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1. Tempo Bruto 2. Chave e/ou com. Trab. 3. Chave e/ou com. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Especie de Obra		MÃO DE OBRA DIRETA						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADOURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO		Engenheiro		1						
		Téc. de Segurança								
		Aux. Adm.		1						
		Mestre de obra		1						
		Encarregado geral								
		RH DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Analisador de topografia		20				
				Pedreiro		25				
		Ajudante Geral		3						
		Carpinteiro		1						
		Operador de Motocicleta								
		Montador								
		Montador-Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira		1						
		Operador de Pá carregadeira		1						
		Monsiteiro caçamba		2						
		Plata								
		Arreio								
		RH DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		RH DO DIA								
		RH ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTD.						
		Veículo Leve								
		Caminhão Básico								
		Caminhão Trator								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Plata Vibetória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/04/2024		Data: 29/04/2024								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176-2023		24/04/2024 S T Q Q S S B						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0032023 RDO: 237		CATEGORIA					QTD	
SIMBOLOGIA: 1. Tempo Bem 2. Chave a/ com. Trab. 3. Chave a/ com. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELIFRÓDUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança Aux. Adm. 1						
		Mestre de obra Encarregado geral 1						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO						QTD
		Válvula Llave						
		Caminhão 30m3						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Cavalo						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/04/2024		Data: 24/04/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	O	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 093/2023 RDO: 238						
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1 1. Tempo Bom 2. Chuva w. cond. Trab. 3. Chuva w. cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: MÁO DE OBRA INDIRETA O/D/E						
SÍMBOLO DA OBRA: SEM SERVIÇO		Serviços de Obra: Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÁO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceado Carpinteiro Operador de Motoniveladora Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Plator Arrepiador						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Nº DO DIA Nº ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO O/D/E Valículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Teco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 01/05/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 01/05/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data: 02/05/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176-2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RPO: 230		CATEGORIA		QTD
Condições climáticas: Nuvens 1 / Temperatura 1 / Umidade 1 / Chuvia 1 / Neve 1 1. Tempo Bom 2. Chuvia e/ou cond. Trab. 3. Chuvia e/ou cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADOURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO		Gênero de Obra		QTD				
		Engenheiro		1				
		Téc. de Segurança		1				
		Aux. Adm.		1				
		Mestre de obra		1				
		Encarregado geral						
		HR DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia		20				
		Pedreiro		25				
		Ajudante Geral		25				
		Carpinteiro		3				
		Operador de Motocerra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador de telefonia						
		Eletricista						
		Operador de Parol						
		Operador de Escavadeira		1				
		Operador de Pá carregadeira		1				
		Motorista caçamba		1				
		Fator		2				
		Armeiro		2				
		HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		HR DO DIA						
		HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTD				
		Veículo Leve						
		Caminhão Branco						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Parol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/05/2024		Data: 02/05/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		03/05/2024							
		S	T	O	O	S	S	D	
CONDIÇÕES GERAIS		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 903/2023					RDO: 240		
SÍMBOLO		1		1		1			
1. Tempo/Bom		2. Chave o cond. Trab.		3. Chave o cond. Trab.					
SÉRVICIOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDETERMINADA							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFOS DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escrivão geral							
		Hs DO DIA							
		MÃO DE OBRA INDETERMINADA							
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor Alcega geral Carretilha Operador de Motocicleta Montador Montador-Eletricista Encaneta Operador de Parol Operador de Escavadeira Operador de P3 carregadeira Montador de caçamba Plator Armeiro							
		Hs DO DIA							
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO					
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA					
				JORNADA DE TRABALHO					
				Hs DO DIA					
		Hs ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		Tipo Valor Carroceria Carroceria Escavadeira P3 carregadeira Caçamba Parol PC 200 Placa Vibrotela							
GERENTE DE OBRA:		REALIZAÇÃO:							
Data: 03/05/2024		Data: 03/05/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE TO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RBO: 241						
Condições climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1. Tempo Bom 2. Chuva ou cond. Trab. 3. Chuva ou cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL MÃO DE OBRA DIRETA Mão de obra Especialista Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral IN DO DIA						
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA Temporária Analista de topografia Pedreiro Alpinista Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Estaleiro Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P3 Carregadeira Motorista/capoteira Pintor Armeiro IN DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO IN DO DIA IN ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO Valor de Lavo Carinhão Bloco Carinhão Teco Escavadeira P3 Carregadeira Capoteira Patrol PC 280 Plataforma						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/05/2024				Data: 04/05/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		05/05/2024						
		S	T	Q	O	S	S	D
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 242		EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: Marca: 1 Tarefa: 1		CATEGORIA			QTD			
1. Tarefa Base 2. Chevo e cond. Trab. 3. Chevo e cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Topografia Analista de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceado Carpineteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Elétrico Elétrica Operador de Parol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista/capamba Pator Armatel						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES		RE SUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
Data: 05/05/2024		TIPO QTD Valcúta Lave Caminhão Bitrick Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Carcinha Parol PC 280 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO:		Data: 05/05/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data: 07/05/2024								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	X	T	O	O	S	S	D	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RPO: 244		MÃO DE OBRA			
Condições Climáticas: Manhã: 1 Tarde: 1 Noite: 1		CATE GOBIA			QTD			MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA: 1. Tempo Bom 2. Choveu com Trab. 3. Choveu com Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELIFRÓDUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADIBRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFOS DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA		Gerente de Obra			Engenheiro			1		
		Téc. de Segurança			Ass. Adm.			1		
		Mestre de obra			Encarregado geral			1		
		RH DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA			Topógrafo					
		Auxiliar de topografia			Pedreiro			20		
		Ajudante Geral			Calceiro			3		
		Carpinteiro			Operador de Motocerra					
		Motorista			Mantenedor					
		Mantenedor Elétrico			Eletrocista					
		Operador de Patrol			Operador de Escavadeira			1		
		Operador de Pá carregadeira			Motorista de caçamba			1		
		Pintor			Armeiro			2		
		RH DO DIA								
		RESUMO DO EFETIVO			EFETIVO DO DIA					
		JORNADA DE TRABALHO			RH DO DIA					
		RH ACUMULADO								
		OBSERVAÇÕES			EFETIVO E EQUIPAMENTOS			TIPO		
								QTD		
					Veículo Leve					
					Caminhão Manick					
					Caminhão Terc					
					Escavadeira					
					Pá carregadeira					
					Caçamba					
					Patrol					
					PC 280					
					Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			Data: 07/05/2024					



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		08/05/2024	S	T	X	O	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 245		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Nuvens 1 Temperatura: 1 Umidade: 1 Velocidade do vento: 1 Direção do vento: 1 Estado do céu: 1 Índice de nebulosidade: 1		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDETERMINADA		QTD			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILETRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORNO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA		1. Tempo Bruto 2. Cheio e cont. Trab. 3. Cheio e cont. Trab.		Descrição de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral		Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Ajudante Geral Calçateiro 3 Carpinteiro Operador de Máquina Montador Montador-Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista capanga 1 Párol Arrastador 2			
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO			
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO			
						EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO QTD Volvo Lave Caminhão Munck Caminhão Trator Escavadeira Pá carregadeira Capanga Párol PC 300 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/05/2024		Data: 08/05/2024							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		18/05/2024						
		S	T	O	O	S	S	B
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RBO: 247		ELETIVO PESSOAL				
SIMBOLOGIA		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
1. Tempo Básico 2. Chove n° cont. Trab. 3. Chove n° cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA		Tac. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA		RESUMO DO EFETIVO				
OBSERVAÇÕES		Topografia Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Alpinista Geral 25 Calceado Carpineteiro 3 Operador de Motocerra Montador Montador de Usineta Elétrica Operador de Parafuso Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Plator Arrebitador 2		ELETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO				
		ELETIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTD.				
		Valcote Leve Caminhão Bitrick Caminhão Toca Escavadeira Pá carregadeira Carpineteiro Parafuso PC 200 Placa Vibretória						
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/05/2024		Data: 18/05/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				11/05/2024						
				S	T	Q	O	S	S	D
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0032023				EFETIVO PESSOAL						
RDO: 248				CATEGORIA			OTDE			
Símbolo: 1 1. Tempo Bem 2. Choveu o cont. Trab. 3. Choveu o cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Apoiador Geral Calceteiro Carpineteiro Operador de Motocerra Motobista Montador Montador/Eltricista Eltricista Operador de Parol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capanga Plator Aceiteiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				ELETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO			OTDE			
				Valículo Leve Caminhão Basculante Caminhão Terc Escavadeira Pá carregadeira Capanga Parol P.C.200 Placa Vibrotática						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/05/2024				Data: 11/05/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				012/05/2024 S T O Q S S D						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 289				EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIA: <input type="checkbox"/> Mão de obra indireta				CATEGORIA: <input type="checkbox"/> Mão de obra indireta						
SIMBOLOGIA: <input type="checkbox"/> Mão de obra indireta				Mão de obra indireta						
1. Tempo Bem 2. Choveu o cont. Trab. 3. Choveu o cont. Trab.				Gerente de obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				HR DO DIA						
SEM SERVIÇO				Mão de obra indireta						
CONSIDERAÇÕES				Topografia Auxiliar de topografia Praticante Altoparlante Geral Calculeiro Carborim Operador de Motocerra Motorista Montador E. Elétrica Elétrica Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Placa Arame						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:				TIPO EFETIVO EQUIPAMENTOS QTD						
FISCALIZAÇÃO:				Vínculo Livre Carimbo Manic Carimbo Teto Escavadeira Pá carregadeira Caminhão Patrol PC 200 Placa Vínculo						
Data: 012/05/2024				Data: 012/05/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	O	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 093/2023 RDO: 250							
CATEGORIA: Mão de Obra Indireta				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRÓDUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORMO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
				Hs DO Dia							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Aljofre Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motoniveladora Motorista Montador Montador: E pericleta Eletricista Operador da Prensa Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista cagamba Plator Anelador							
				Hs DO Dia							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO Dia Hs ACUMULADO							
				OBSERVAÇÕES							
				EFETIVO E OUBRENTOS							
				TIPO Valor de Lote Cambêdo Muro Cambêdo Toco Escavadeira Pá carregadeira Cagamba Plator PC 200 Placa Vibrotática							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13.05.2024				Data: 13.05.2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				14	05	2024	S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				RDO: 251						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1. Tempo Bom 2 - Chuva e/ou vent. 3 - Chuva e/ou vent.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADERA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				Serviços Executados - Ocorrências Encargos de Obra Equipamentos Tráf. de Segurança Aux. Jda Mestre de obra Escorregado geral Início do Dia				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Carpinteiro Carpinteiro 3 Operador de Motocerra Motorista Montador Montador Elétrica Encarregado Operador de Parrel Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de capanga 1 Plator Anunciar 2 Início do Dia						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Início do Dia Início ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS				TIPO Valor de Lave Cantilão Misto Cantilão Teco Escavadeira Pá carregadeira Capanga Parrel PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: _____				FISCALIZAÇÃO: _____				Data: 14.05.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		15/05/2024						
		S	T	X	Q	S	S	D
CONDIÇÕES CENÁRICAS		ELETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 252		CATEGORIA		MÃO DE OBRA OBRETA				
Símbolo: Mapa: 1 1. Tempo Bom 2. Chove e cond. Trab. 3. Chove e cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELIFRIGIDUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBIRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFU DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA		MÃO DE OBRA OBRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Canteiro Carpinteiro 3 Operador de Motocreta Montador Montador de lâmpada Encanador Operador de Parafusadeira Operador de Escavadeira 1 Operador de Pa Carregadeira Motoristas caçamba 1 Plator Armador 2						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HI DO DIA HI ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		ELETIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO Valor de Leve Canteiro Móvel Canteiro Tece Escavadeira Pa Carregadeira Canteiro Parafusadeira PC 200 Placa Vibração						
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO						
Data: 15/05/2024		Data: 15/05/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	O	X	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0032023 RBO: 253						
Condições Climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1. Tempo Bom 2. Chuva e/ou vent. 3. Chuva e/ou vent. Trank.				CATEGORIA: MÃO DE OBRA DIRETA						
SÍMBOLO DA OBRA:				EFETIVO PESSOAL						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADERA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS						
				Mão de Obra Direta						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				RE SUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				EFETIVO PESSOAL						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16.05.2024				Data: 16.05.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data										
					18-08-2024										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	O	Q	S	X					
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR															
CONTRATO N° 176/2023					CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023										
RDO: 206															
Condições Climáticas: Nuvens () 1 () 1 Tarde () 1 () 1 Noite () 1 () 1					EFETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA					CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA							
1 - Tempo Bom 2 - Chuva e cont. Trab. 3 - Chuva e cont. Trab.															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
SEM SERVIÇO					Gerente de Obra										
					Engenheiro										
					Téc. de Segurança										
					Aux. Adm.										
					Mostra de obra										
					Encarregado geral										
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO					
					EFETIVO DO DIA										
					JORNADA DE TRABALHO										
					HR DO DIA										
					HR ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS										
					TIPO										
					DTDE										
					Veículo Leve										
					Caminhão Ikuok										
					Caminhão Toco										
					Escavadeira										
					P3 carregadeira										
					Cajamba										
					Furo										
					PC 200										
					Pisa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:										
Data: 18-08-2024					Data: 18-08-2024										


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				19/05/2024	S	T	Q	Q	S	S	X
				EFETIVO PESSOAL							
				CATE GORIA				OUTRO			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE TO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 983/2023				RBO: 250			
Condições climáticas: Manhã () Tarde () Noite () 1. Tempo Bom 2. Chuva e/ou vent. 3. Chuva e/ou vent. Trub.				MÃO DE OBRA DIRETA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLO DA OBRA: _____ SEM SERVIÇO				Carreiro de Oble Engenheiro Tm. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES				Topografa Analise de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceado Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador/Carreiro Encicobta Operador de Parrel Operador de Escavadeira Operador de P3 carregadeira Montador/capoteiro Plator Arroteiro							
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
EFETIVO E EQUIPAMENTOS				TIPO				QTD.			
GERENTE DE OBRA: _____ Data: 19/05/2024				FISCALIZAÇÃO: _____ Data: 19/05/2024				Valvulo Lave Cambião March Cambião Toco Escavadeira P3 carregadeira Capoteiro Parrel PC 200 Placa Vibreira			


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 20/05/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATE GORNA							
CONTRATO Nº 176/2023				MÃO DE OBRA INDIRETA							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00332023				MÃO DE OBRA DIRETA							
RBO: 257				RESUMO DO EFETIVO							
Composição Classificatória				ELETIVO E EQUIPAMENTOS							
SÍMBOLOGIA				TIPO							
1. Tempo Base				OTDE							
2. Onera de cond. Trab.											
3. Onera v. cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS											
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGUEIRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Ass. Adm.							1
				Mestre de obra							1
				Escarregado geral							
				Hr DO DIA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							20
				Ajudante Geral							25
				Canteiro							
				Carpinteiro							3
				Operador de Motocicleta							
				Montador							
				Montador-Eletricista							
				Eleticista							
				Operador de Parol							
				Operador de Escavadeira							1
				Operador de Pá carregadeira							
				Motociclista capanga							1
Plator											
Armeiro							2				
Hr DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				ELETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				ELETIVO E EQUIPAMENTOS							
				Válvula Leve							
				Carrinho Mecânico							
				Carrinho Toco							
				Escavadeira							
				Pá Carregadeira							
				Caminhão							
				Parol							
				PC 200							
				Placa Vitrearia							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/05/2024				Data: 20/05/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				21	05	2024	S	T	O	O	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178-2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 298									
Condições climáticas: Nuvens () 1 () Temperatura: () Umidade: () Vento: ()				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA									
SÍMBOLO DA OBRA:				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:									
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINTURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Escarregado geral Hs do dia									
CONSIDERAÇÕES:				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Alfaiate Geral 20 Calceado Carpinteiro 3 Operador de Motocerra Motorista Montador de Benelito Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão 1 Plator Armador 2 Hs do dia									
OBSERVAÇÕES:				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs do dia Hs ACUMULADO									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/05/2024				Data: 21/05/2024									
				EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO QTD.									
				Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toca Escavadeira Pá carregadeira Caçambas Párol FC 280 Placa Vibrotela									


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 22/05/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023						
RBO: 259				EFFECTIVO PESSOAL						
CATEGORIA				MAO DE OBRA INDIRÉTA			QTD			
Fundação Clamores: Moradia (1) Turma (1) 1. Trabalho Básico 2. Obra de cond. Trab. 3. Obra de cond. Trab. SÍMBOLO DA OBRA SERVIÇOS EXECUTIVOS - OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRÉTA Engenheiro 1 Tcn. de Segurança 1 Ass. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hr. do dia						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICIDADE EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINTURA BRANCA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				MAO DE OBRA DIRETA Topografia Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Alfaiate Geral 25 Canteiro Carpinteiro 3 Operador de Motoniveladora Motorista Montador/Elétrico Encanador Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de capanga 1 Plator Armador 2 Hr. do dia						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFFECTIVO						
				ERE TIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr. do dia Hr. acumulado						
OBSERVAÇÕES				EFFECTIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD Volvo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Teco Escavadeira Pá carregadeira Canteiro Párol PC 280 Placa Vibrotática						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/05/2024				Data: 22/05/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 23/05/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE TO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 290						
CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA				EFETIVO PESSOAL						
Símbolo OBR:				MÃO DE OBRA DIRETA						
1. Tempo Bruto 2. Chaves e cond. Trab. 3. Chaves e cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Faccaregado geral						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADUBRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Alpendre Geral 25 Calceado Carpinteiro 3 Operador de Motocerra Motorista Montador Montador Elétrico Elétrica Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista caçamba 1 Fleiteiro Acarretar 2						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD Valículo Leve Cambiões Blindado Cambiões Traco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibetória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/05/2024				Data: 23/05/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 093/2023		RPO: 261		EFETIVO PESSOAL			
SIMBOLOGIA: Marca: 1 Tarefa: 1 Nota: 1 1. Tempo Base 2. Cheio o cond. Trab. 3. Cheio e cond. Trab.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA		OTDE			
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELÉTRICODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA		Gerente de Obra							
		Especialista		1					
		Téc. de Segurança							
		Aux. Adm.		1					
		Mestre de obra		1					
		Encarregado geral							
		Hr DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro		26					
		Ajudante Geral		25					
		Carpinteiro							
		Carpinteiro		3					
		Operador de Motocerra							
		Montador							
		Montador-Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Parrel							
		Operador de Escavadeira		1					
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caminhão		1					
		Platao							
		Armeiro		2					
		Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO			
						EFETIVO DO DIA			
						JORNADA DE TRABALHO			
						Hr DO DIA			
						Hr ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES						EFETIVO E EQUIPAMENTOS			
						TIPO		OTDE	
						Veículo Leve			
						Caminhão Mercê			
						Caminhão Trator			
						Escavadeira			
						Pá carregadeira			
						Caminhão			
						Parrel			
						PC 200			
						Placa Vibetória			
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO:		Data: 24.05.2024					
Data: 24.05.2024									


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		25	05	2024				X
		S	T	O	O	S	S	D
MP2 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 118-2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 262						
CATEGORIA: <input type="checkbox"/> OBRAS SÍMBOLO OBRAS: <input type="checkbox"/> 1 1. Trabalho Básico 2. Obras de cond. Trab. 3. Obras de cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATE GORRA: <input type="checkbox"/> OBRAS SÍMBOLO DE OBRA DIRETA: <input type="checkbox"/> OBRAS						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral H/D DO DIA						
		IMO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Apoiador Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motocerra Montador Montador Elétrico Elétrico Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Plator Armeiro H/D DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO H/D DO DIA H/D ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO: <input type="checkbox"/> OBRAS Valor de Levo Câmbio Marcha Câmbio Toco Escavadeira Pá carregadeira Caminhão Fone PC 200 Placa Metálica						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25.05.2024		Data: 25.05.2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				26	05	2024	S	T	Q	Q	S	S	X
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RPO: 263			EFFECTO PESSOAL						
	CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA		QTD								
SIMBOLOGIA: Matéria () 1 () Tiro () 1 () 1. Tempo Base 2. Chegada a cond. Trab. 3. Chegada a cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Ass. Adm. Mestre de obra Escarregado geral Hs DO DIA									
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alarroteiro Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador E. Elétrico Encanador Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba Pintor Armeiro Hs DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFFECTO									
				EFFECTO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFFECTO E EQUIPAMENTOS									
				TIPO					QTD				
				Vinte Leve Caminhão Manick Caminhão Tccc Escavadeira Pá carregadeira Capomba Patrol PC 280 Pista Vitrificada									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 26.05.2024				Data: 26.05.2024									


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 27/05/2024										
				S	T	O	S	S	D					
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE TO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 264										
CATEGORIA: 1 TIPO: 1 NOME:				EFETIVO PESSOAL										
SÍMBOLO OGBA:				CATE OGBA			QTD							
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADURA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RIFLO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Escorregado geral										
				Mão de obra										
				Hs do dia										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Ajudante Geral Canteiro 3 Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Elétrica Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pó carregadeira Motorista de caçamba 1 Piston Armeiro 2										
				Mão de obra										
				Hs do dia										
				CONSIDERAÇÕES				RE SUBRO DO EFETIVO						
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs do dia Hs acumulado						
								EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
TIPO QTD Vitrinho Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pó carregadeira Caçamba Patrol PC 280 Placa Vibração														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 27/05/2024				Data: 27/05/2024										


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 28.05.2024								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 176/2023				CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 003/2023								
CONTRATO Nº 176/2023				RBO: 203								
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
1. Tempo Bom 2. Chove e/ou vent. 3. Chove e/ou vent. Tráf. SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DA PINGADIBRA EXECUÇÃO DA CALHA DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO RUFO DO QUIOSQUE EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO EXECUÇÃO DO CONCRETO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA				Gerente de Obra							1	
				Téc. de Segurança							1	
				Ass. Adm.							1	
				Mestre de obra							1	
				Encarregado geral								
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hr DO DIA								
				Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Válvula Leve								
				Caminhão Municipal								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá Carregadeira								
				Caminhão								
				Panela								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 28.05.2024				Data: 28.05.2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO - SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 01 - EXECUÇÃO DA ALVENARIA E PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO



FOTO 02 - EXECUÇÃO DE CHAPISCO E RESTAURAÇÃO DE VIGAS



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 03 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PAREDE DUPLA E VIGA E PILARES DE CONCRETO ARMADO



FOTO 04 – PASSAGEM DE ELETRODUTOS E TUBOS HIDRÁULICOS E HIDROSSANITÁRIOS



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 05 – EXECUÇÃO DE REBOCO E CONTRAPISO E PASSAGEM DE ELETRODUTO E REDE HIDRÁULICA E HIDROSSANITÁRIA


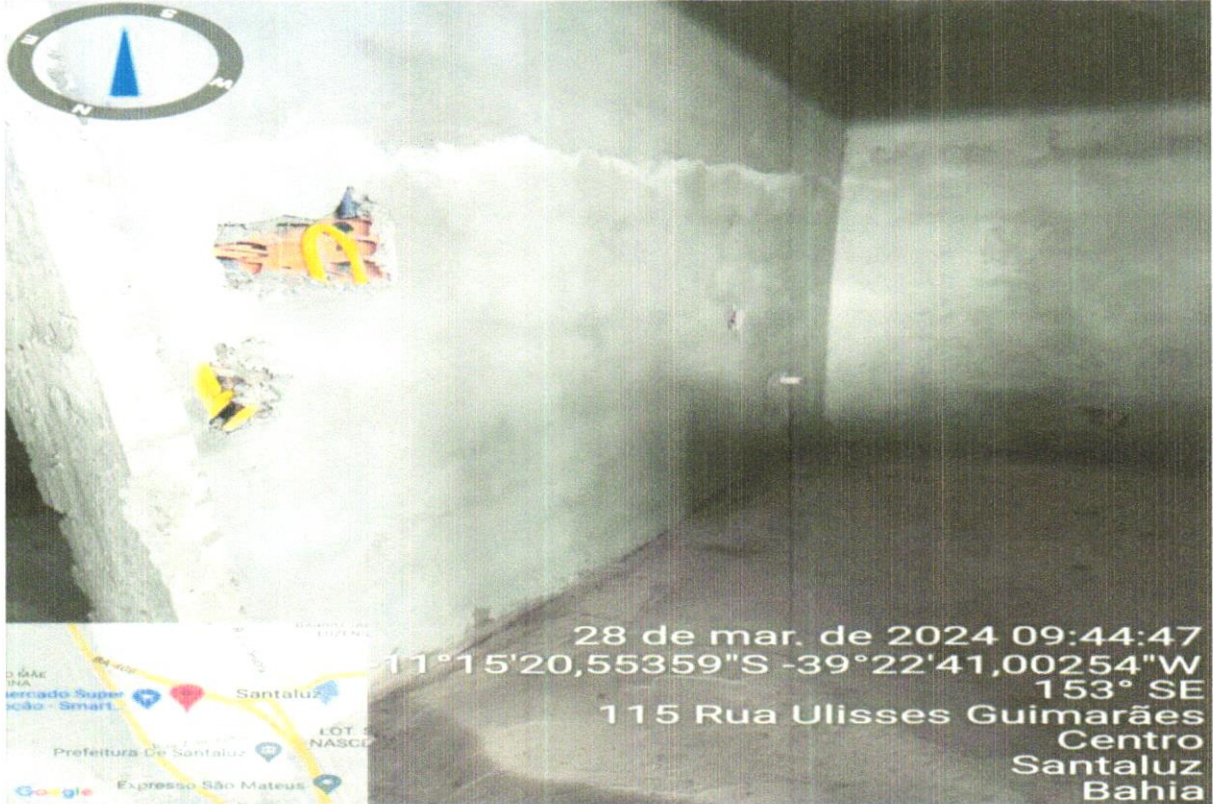


FOTO 06 – EXECUÇÃO DO REBOCO DA ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE

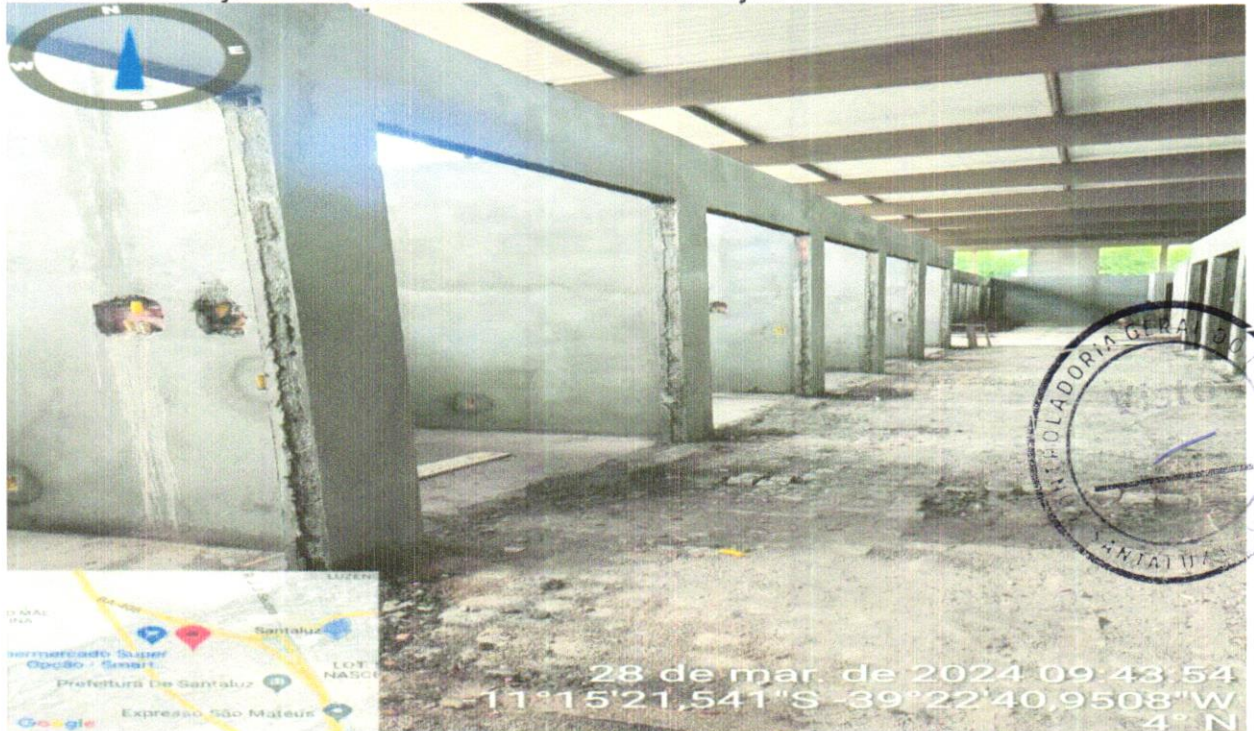


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 07 – EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E PASSAGEM DE ELETRODUTO E REDE HIDROSSANITÁRIA



FOTO 08 – RESTAURAÇÃO DOS PILARES E VIGAS

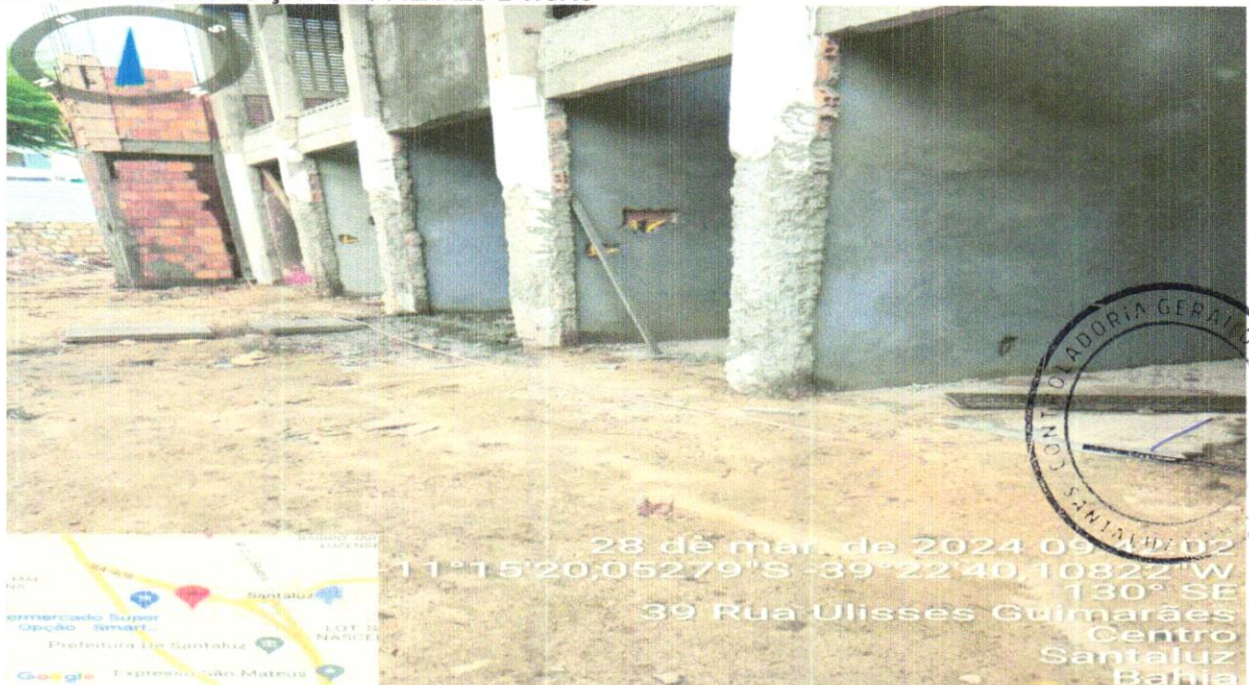

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 09 – PASSAGEM DE ELETRODUTO E REDE HIDROSSANITARIA

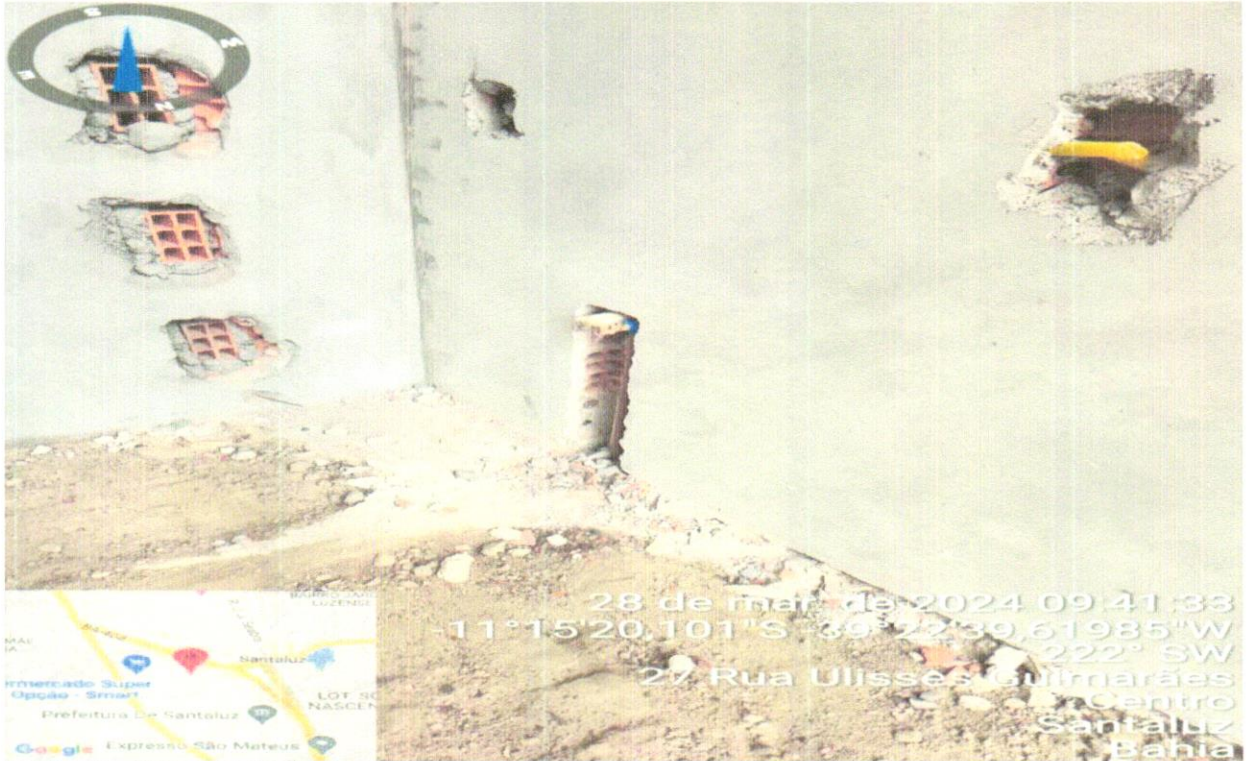


FOTO 10 – RESTAURAÇÃO DOS PILARES E EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 11 – PASSAGEM DE ELETRODUTO RÍGIDO E CORRUGADO



FOTO 12 – EXECUÇÃO DO REVESTIMNETO

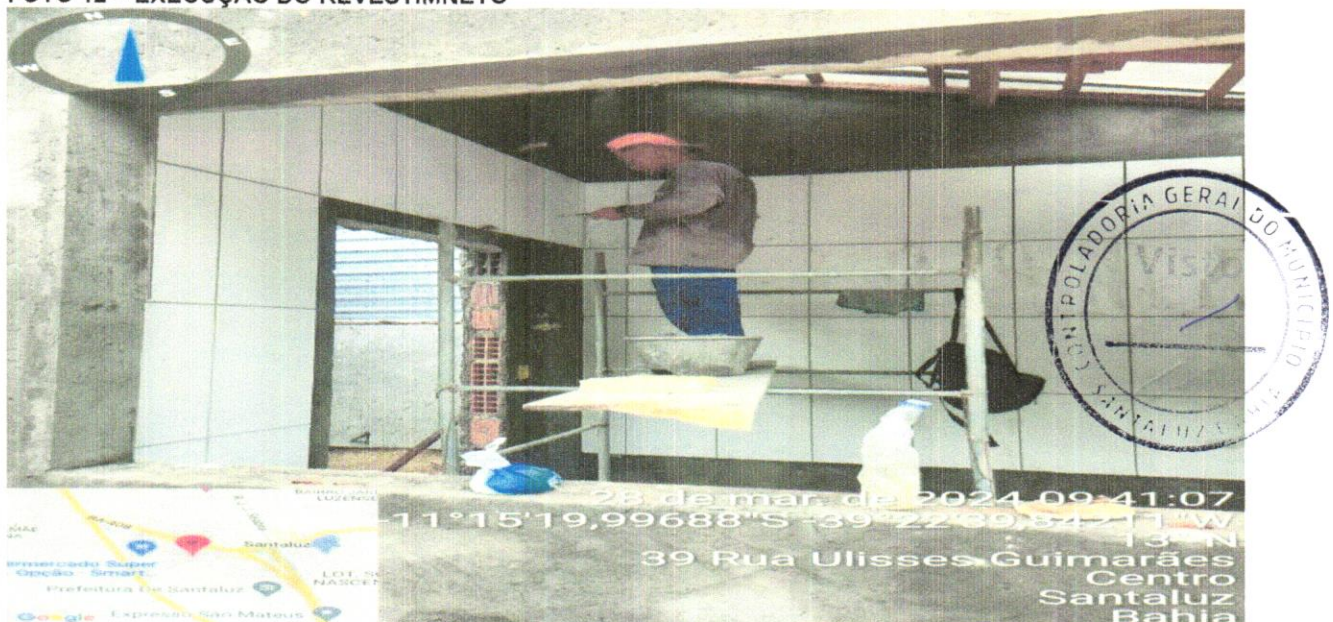

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 13 – EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO


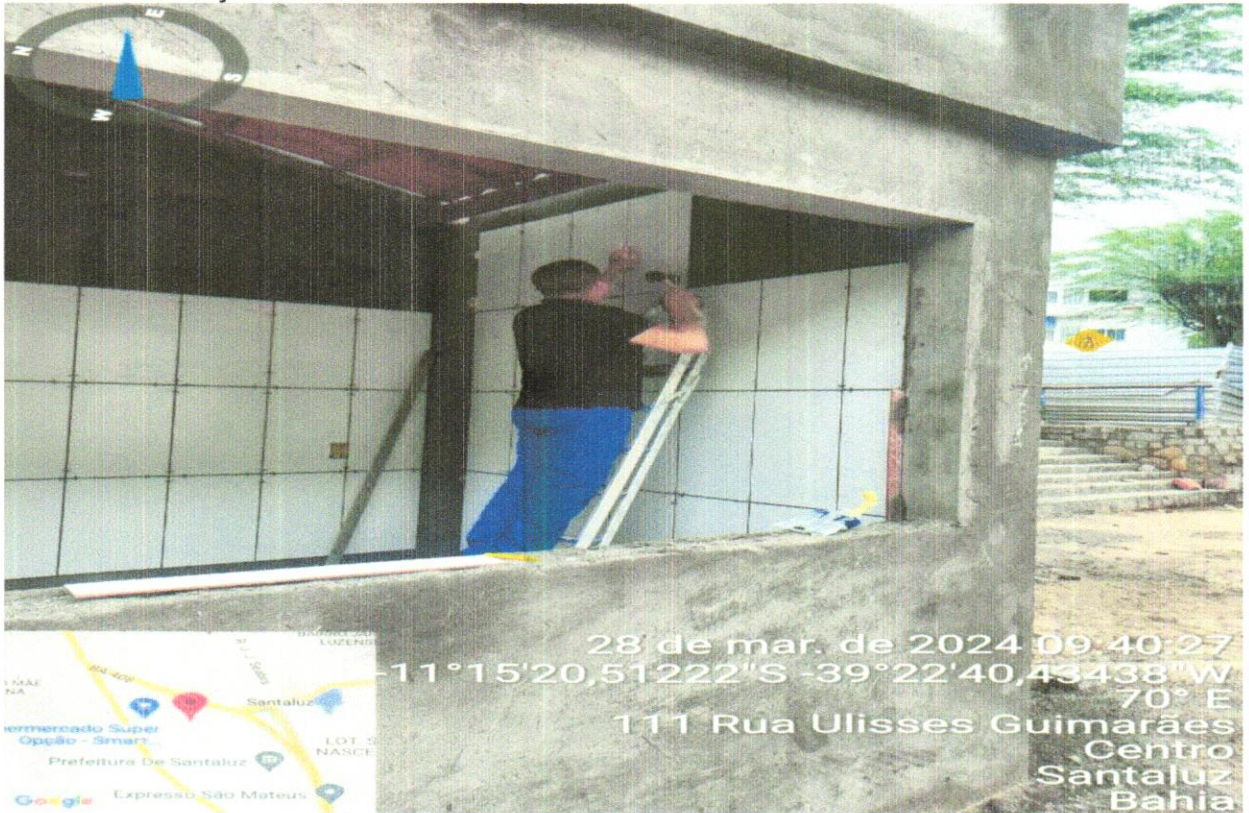


FOTO 14 – EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO

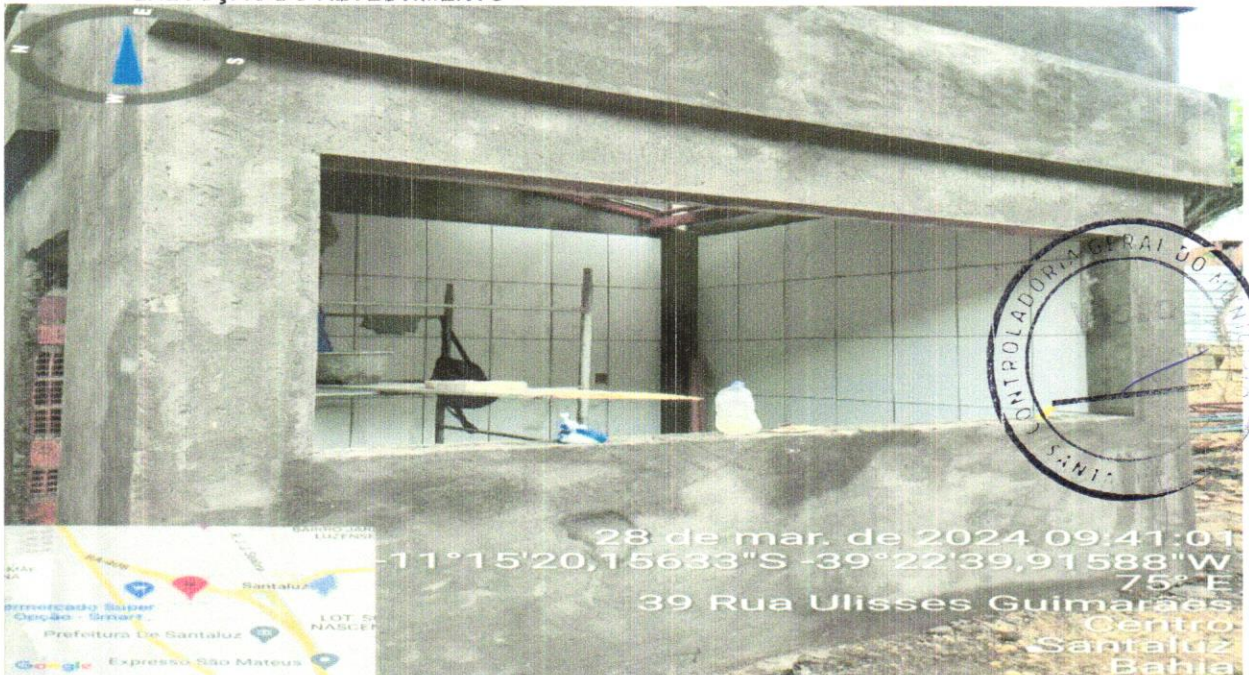


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 15 -EXECUÇÃO DE PINGADEIRA



FOTO 16 -EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA

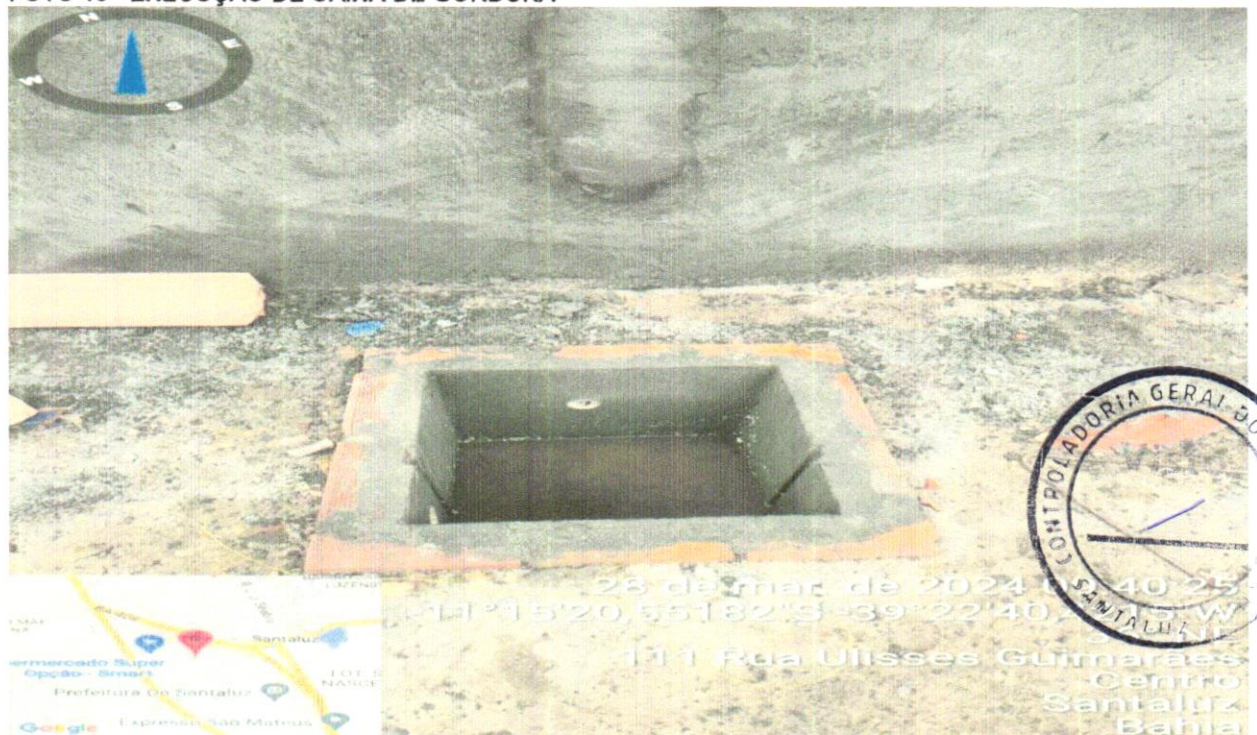

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 17 – EXECUÇÃO DO REBOCO PARA ASSENTAMENTO DE PASTILHAS

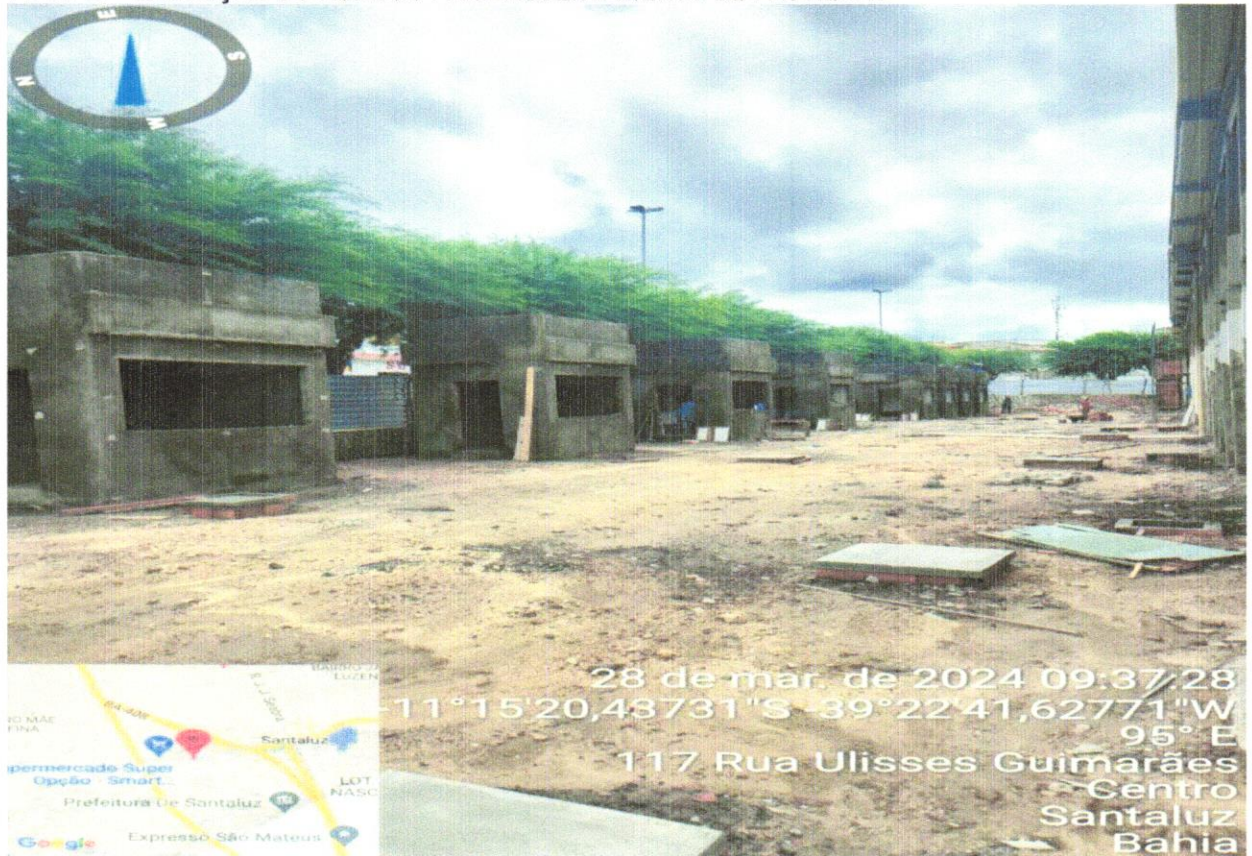



FOTO 18 - CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 19 - CAIXA DE ESGOTO - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M



FOTO 20 - EXECUÇÃO DA ALVENARIA DO BANCO

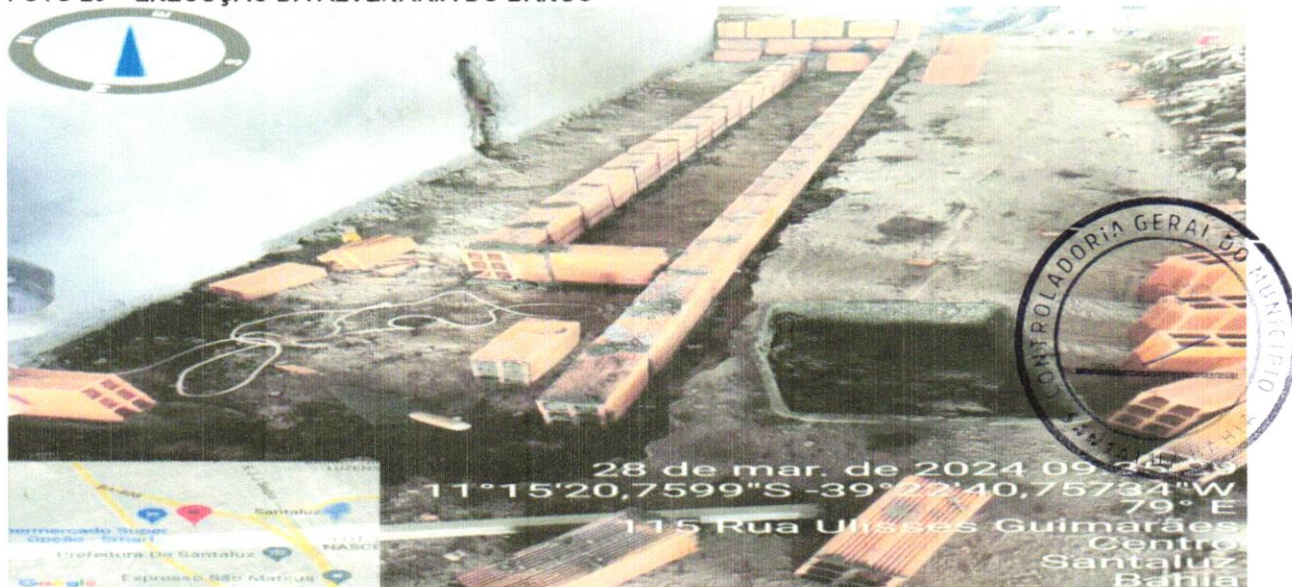

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 21 – EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM



FOTO 22 – ACABAMENTO DO REBOCO DAS PORTAS




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 23 – EXECUÇÃO DE REBOCO



FOTO 24 – EXECUÇÃO DE REBOCO

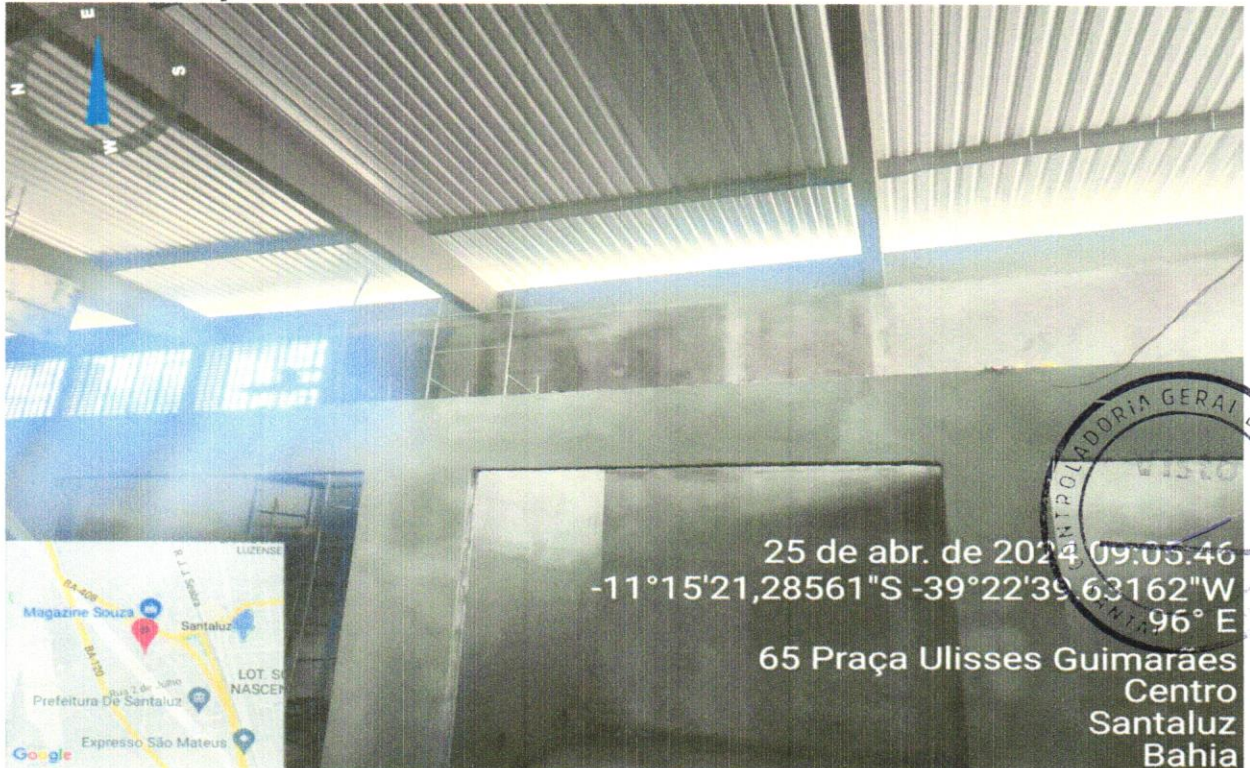

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 25 – EXECUÇÃO DO RUFO DE ZINCO



FOTO 26 – EXECUÇÃO DA CALHA DE ZINCO



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


[Signature]
 28/05/2024

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 27 – EXECUÇÃO DE CHAPISCO DA PAREDE DUPLA



FOTO 28 – EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DOS PILARES

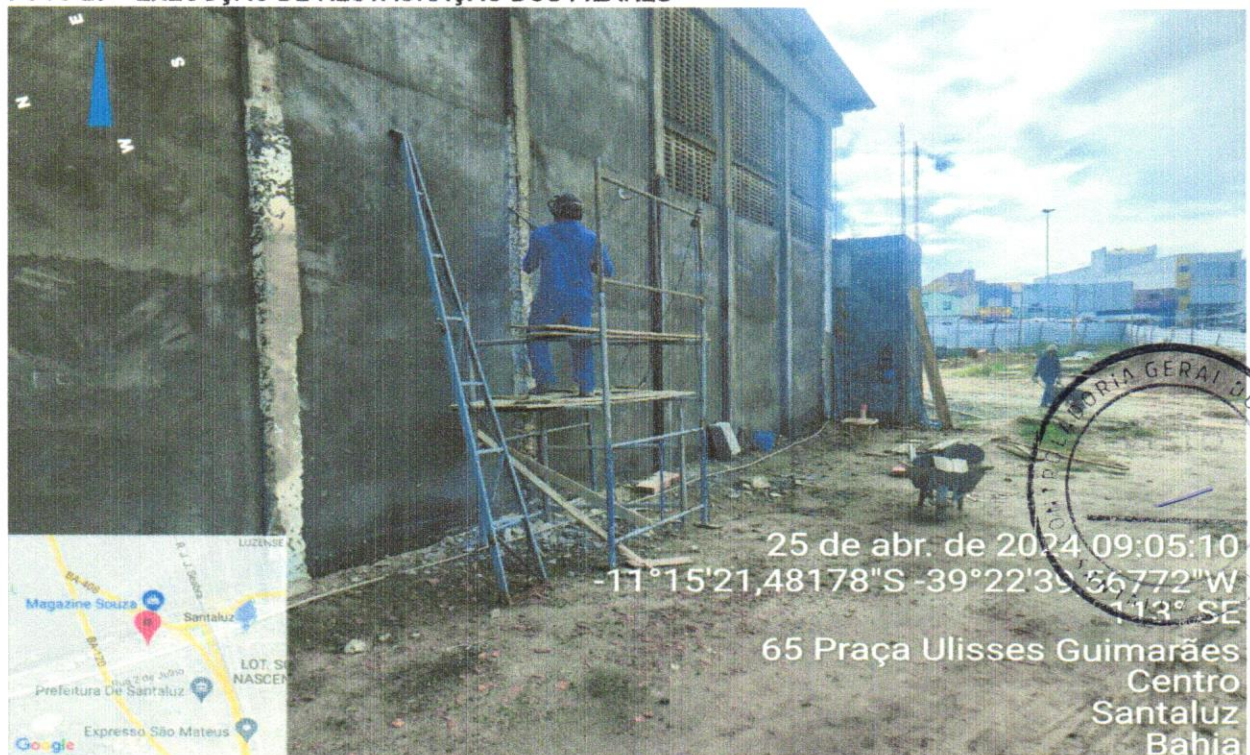

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

[Handwritten Signature]
 28/05/2024

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 29 – EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DOS BANHEIROS



FOTO 30 – EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DOS BANHEIROS




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 31 – EXECUÇÃO DO CHAPISCO DA PAREDE DUPLA



FOTO 32 – CONCRETAGEM DAS VIGAS

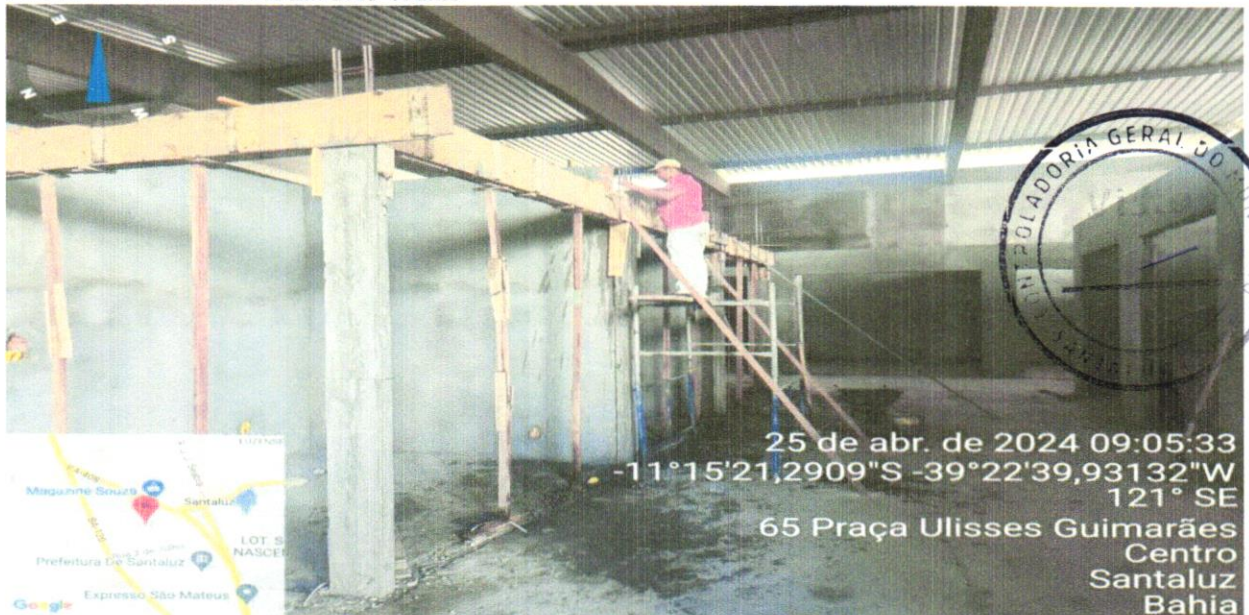

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 33- EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO



FOTO 34- EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 35- EXECUÇÃO DO INTETRAVADO



FOTO 36- EXECUÇÃO DO INTETRAVADO




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 37- EXECUÇÃO DO INTETRAVADO



FOTO 38- EXECUÇÃO DO INTETRAVADO

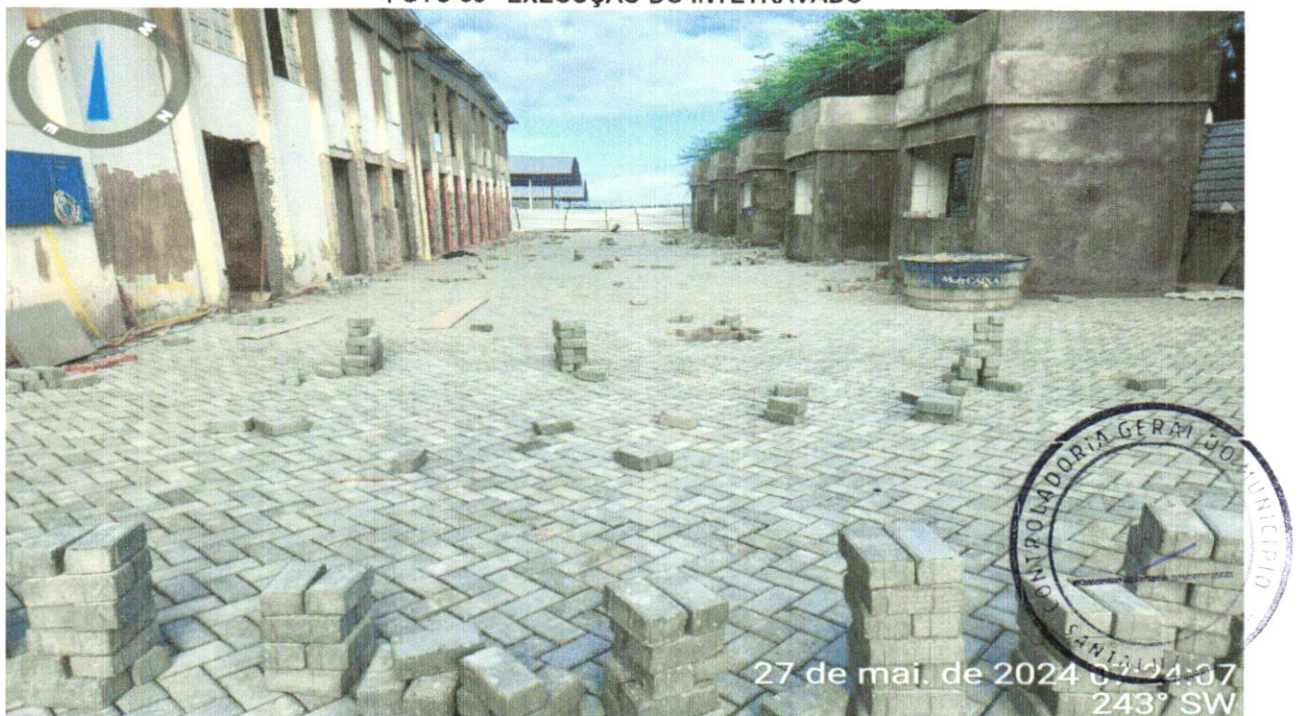

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 39- EXECUÇÃO DO CONCRETO PARA POLIMENTO



FOTO 40- EXECUÇÃO DO CONCRETO PARA POLIMENTO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 41- EXECUÇÃO DO CONCRETO PARA POLIMENTO



FOTO 42- EXECUÇÃO DO CONCRETO PARA POLIMENTO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 43- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GESSO



FOTO 44- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GESSO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 45- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GESSO



FOTO 46- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GESSO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/05/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 46- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GESSO

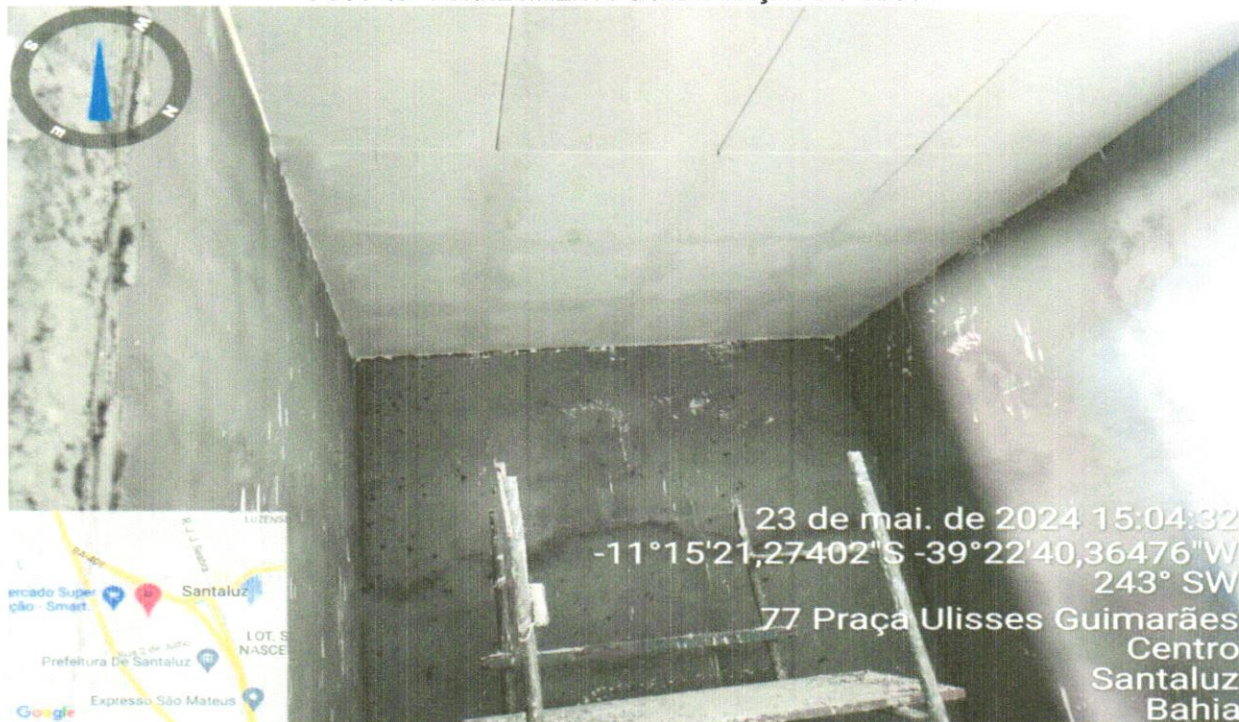


FOTO 47- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GESSO

