



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº-SUB-EMPENHO: 1620 - Data do Sub-Empenho: 19/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23 694 541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4 4 90 51 00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4 4 90 51 01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022 REFERENTE A REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO NO MORRO DOS LOPEZ, OBRA Nº 110/2024 - BM 03 PERIODO DE MEDIÇÃO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - NFS-e 202482

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.191.950,93	458.931,32	733.059,61

Data do Empenho: 19/01/2024 Data do Liquidação: 19/06/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2188101020000057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	9.637,56
2188101040000057	IRRF - Fonte 1754	5.507,18
2188101080000057	ISS - Fonte 1754	13.767,94
## Quatrocentos e trinta mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos ##		Valor Retido 28.912,68
		Valor Líquido 430.018,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/06/2024	202482	U			458.931,32
Quantidade: 1					Total:	458.931,32

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	458.931,32

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/06/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/06/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 20/06/24

Carlos Antônio da Silva Filho
 Controlador Interno
 Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 12/06/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS – MORRO DOS LOPES, MUNICÍPIO DE SANTALUZ – BAHIA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 110/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 202482 VALOR DA NOTA: R\$ 458.931,32 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2024 A 31/05/2024
DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB CP.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil

RNP 051417303-3

Fiscal de Obra



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

202482

Data e Hora de Emissão

12/06/2024 16:35:46

Código de Verificação

291BEF4A2

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual:

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO - MORRO DOS LOPES, MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

N° DA OBRA: 110/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022

BM 03

Período da medição: 01/05/2024 a 31/05/2024

Valor: R\$ 458.931,32

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 275.358,79

VALOR DE MATERIAL 40%: 183.572,53

BC DE INSS 60%: 275.358,79 x 3,5%: 9.637,56

BC DE ISS 60%: 275.358,79 x 2,5%: 6.883,97

VALOR LÍQUIDO: R\$442.409,79

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(ais) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 12/06/24

Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 458.931,32

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
183.572,53	275.358,79	2,50	6883,97	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS


PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	9.637,56	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 442.409,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 06/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 40,0%

Autentique
Via QR Code



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396856		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO 1057	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 275.358,79	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 13.767,94	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 13.767,94		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 19/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:31:36	DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 202482 - DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	13.767,94		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	13.767,94		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000137 . 3 67943906202 . 8 40710010500 . 3 00039685612 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000137 . 3 67943906202 . 8 40710010500 . 3 00039685612 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM 396856	EXERCÍCIO 2024	DATA 19/06/2024 10:31:36	DATA VENCIMENTO: 10/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	13.767,94
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	13.767,94





I.R.R.F

Nº DAM: 396857	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B		NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO: C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Calculo 5.507,18	Quantidade/Aliquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000 Valor R\$ 5.507,18
		Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 5.507,18
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024
		DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:40:05
		DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		 
Valor do Tributo: 5.507,18	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 5.507,18	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	
Valor de Base Calculo: 5.507,18	Vlr. Devido com Desconto: 5.507,18	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2024-82 - Data de emissão: 12/06/2024		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 5.507,18
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 5.507,18

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000055 . 6 07183906202 . 4 40731010100 . 8 00039685707 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000055 . 6 07183906202 . 4 40731010100 . 8 00039685707 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396857	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:40:05	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.507,18
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.507,18





ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			O.S. COMPLEMENTAR			TOTAL			MEDIÇÃO 03			ACUMULADO		
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM) FCK = 14.0 MPA. PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÁZIOS, UTILIZANDO PALHETA. AF. 12/2014	M2	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	2,92	R\$ 65,54	R\$ 191,38	2,92	R\$ 65,54	R\$ 0,00	-	R\$ 65,54	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 191,38	2,92	R\$ 0,00	R\$ 191,38
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PRÉ-FABRICADA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E ÁREA TRACOT 14 (1,5) 1,5X30 C/ MÓDULO 50X60 / 15 PÁRULOS ÁREA DIM. 0,3520/0,50/2,31M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	M3	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5			Sub-total 4			R\$ 191,38			R\$ 191,38			R\$ 191,38			R\$ 0,00			R\$ 191,38	
5.1	87548	SINAPI	REVESTIMENTO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8; PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSOS	M2	171,31	R\$ 31,95	R\$ 5.473,35	395,85	R\$ 31,95	R\$ 12.647,41	567,16	R\$ 31,95	R\$ 18.120,76	395,85	R\$ 31,95	R\$ 12.647,40	567,16	R\$ 18.120,76	R\$ 0,00
6			Sub-total 5			R\$ 5.473,35			R\$ 12.647,41			R\$ 18.120,76			R\$ 12.647,40			R\$ 18.120,76	
6.1	94275	SINAPI	MEIO FIO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	544,08	R\$ 51,39	R\$ 27.960,27	544,08	R\$ 51,39	R\$ 0,00	544,08	R\$ 51,39	R\$ 27.960,27	544,08	R\$ 51,39	R\$ 0,00	544,08	R\$ 27.960,27	R\$ 0,00
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016_P	M	11,29	R\$ 56,38	R\$ 636,53	11,29	R\$ 56,38	R\$ 0,00	11,29	R\$ 56,38	R\$ 636,53	11,29	R\$ 56,38	R\$ 0,00	11,29	R\$ 636,53	R\$ 0,00
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	243,75	R\$ 43,13	R\$ 10.512,94	243,75	R\$ 43,13	R\$ 0,00	243,75	R\$ 43,13	R\$ 10.512,94	243,75	R\$ 43,13	R\$ 0,00	243,75	R\$ 10.512,94	R\$ 0,00
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DN 110 MM (47), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	114,44	R\$ 71,51	R\$ 8.183,60	114,44	R\$ 71,51	R\$ 0,00	114,44	R\$ 71,51	R\$ 8.183,60	114,44	R\$ 71,51	R\$ 0,00	114,44	R\$ 8.183,60	R\$ 0,00
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UND	35,00	R\$ 213,96	R\$ 7.488,60	35,00	R\$ 213,96	R\$ 0,00	35,00	R\$ 213,96	R\$ 7.488,60	35,00	R\$ 213,96	R\$ 0,00	35,00	R\$ 7.488,60	R\$ 0,00
7			Sub-total 6			R\$ 54.781,94			R\$ 0,00			R\$ 54.781,94			R\$ 0,00			R\$ 54.781,94	
7.1			PASSEIO PAVIMENTAÇÃO																
7.1		COMPOSIÇÃO 0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO EM ARGAMASSA DE CONCRETO (HELCOTERMO) INCORPORADA DE ACORDO COM A NBR 14931, CORRE (3,0 CM), DIÂMETRO DE FIOS 0,10 MM, ÁREA 2,143 M, ESPALHAMENTO 0,144 M, 10 X 10 CM, JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	732,86	R\$ 152,96	R\$ 112.113,56	216,68	R\$ 152,96	R\$ 33.143,37	949,64	R\$ 152,96	R\$ 145.256,93	216,68	R\$ 152,96	R\$ 33.143,37	949,64	R\$ 145.256,93	R\$ 0,00
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibratório ensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob cota área grossa compactada c/ placa vibratória, e comp. J=6cm, rejuntado c/ área fina	M2	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibratório ensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob cota área grossa compactada c/ placa vibratória, e comp. J=6cm, rejuntado c/ área fina	M2	982,43	R\$ 97,65	R\$ 95.934,29	300,00	R\$ 97,65	R\$ 0,00	300,00	R\$ 97,65	R\$ 95.934,29	300,00	R\$ 97,65	R\$ 0,00	300,00	R\$ 95.934,29	R\$ 0,00



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Prof. Rogério Ferraz de Almeida
 Representante Legal
 Global Manutenções, Serviços e
 Manutenção LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75.3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO		O.S. COMPLEMENTAR		TOTAL		MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, colorido, 10x20cm, 6cm, NBR781, fck(mín)=35MPa, sob cova area grossa compactada e placa vibratória, eq comp. jf,comp. repunçado e area fina.	M2	291,73	R\$ 116,39	R\$ 33.954,45	R\$ 116,39	R\$ 116,39	R\$ 33.954,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	291,73	R\$ 33.954,45	R\$ 0,00	0%
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO (LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M2	-	R\$ 35,95	R\$ 0,00	R\$ 35,95	R\$ 35,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA-ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2	-	R\$ 117,56	R\$ 0,00	R\$ 117,56	R\$ 117,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.8	87337	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOCHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFONICADO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00	R\$ 53,65	R\$ 53,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.9/14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF. 09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00	R\$ 84,23	R\$ 84,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TEIA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00	R\$ 109,16	R\$ 109,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			Sub-total 7			R\$ 242.002,31		R\$ 33.148,37		R\$ 275.145,68		R\$ 67.027,17		R\$ 275.145,67		
8			DIVERSOS													
8.1	101600	SINAPI	ESCOPIAMENTO DE VAIA, TIPO BUNDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF. 08/2020	M2	-	R\$ 20,77	R\$ 0,00	R\$ 20,77	R\$ 20,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.2	101570	SINAPI	ESCOPIAMENTO DE VAIA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF. 08/2020	M2	-	R\$ 29,07	R\$ 0,00	R\$ 29,07	R\$ 29,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO, REUTILIZADA 07/2015	M2	-	R\$ 84,15	R\$ 0,00	R\$ 84,15	R\$ 84,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMAS PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2021	M2	-	R\$ 156,70	R\$ 0,00	R\$ 156,70	R\$ 156,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	-	R\$ 101,21	R\$ 0,00	R\$ 101,21	R\$ 101,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	-	R\$ 21,97	R\$ 0,00	R\$ 21,97	R\$ 21,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	-	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 20,33	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	-	R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 18,05	R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TEIA Q-138, AF. 09/2021	KG	-	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 35MPa, TRACO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA) DE CIMENTO/AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETENEIRA 600 L, AF. 05/2021	M3	-	R\$ 572,70	R\$ 0,00	R\$ 572,70	R\$ 572,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	R\$ 32,28	R\$ 0,00	R\$ 32,28	R\$ 32,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO TURO GALVANIZADO Ø 1,14" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TURO GALVANIZADO Ø 1,12" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TURO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUROS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	-	R\$ 512,58	R\$ 0,00	R\$ 512,58	R\$ 512,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2	-	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CORMATO DE ZINCO)	M2	-	R\$ 21,14	R\$ 0,00	R\$ 21,14	R\$ 21,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - N3	M2	-	R\$ 24,35	R\$ 0,00	R\$ 24,35	R\$ 24,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO ALVENARIA, REVESTIDA INTERAMENTE, COM GREIHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	-	R\$ 340,81	R\$ 0,00	R\$ 340,81	R\$ 340,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.17/15.6	6386	ORSE	*Casa de passagem (p1:0601) (60x60x60cm)	UNID	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 339,06	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.18	6387	ORSE	*Casa de passagem (p2:080) (60x60x60cm)	UNID	-	R\$ 585,84	R\$ 0,00	R\$ 585,84	R\$ 585,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UNID	-	R\$ 668,92	R\$ 0,00	R\$ 668,92	R\$ 668,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURO CORRUGADO PAREDE DUPLA FEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N. 12	M	-	R\$ 162,99	R\$ 0,00	R\$ 162,99	R\$ 162,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURO CORRUGADO PAREDE DUPLA FEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N. 12	M	-	R\$ 278,72	R\$ 0,00	R\$ 278,72	R\$ 278,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURO CORRUGADO PAREDE DUPLA FEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N. 12	M	-	R\$ 418,55	R\$ 0,00	R\$ 418,55	R\$ 418,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.23	92833	SINAPI	TURO DE CONCRETO PARA REJES COLETORAS DE ESCOTO SANITÁRIO, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	-	R\$ 267,16	R\$ 0,00	R\$ 267,16	R\$ 267,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutencao LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇAO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		O.S. COMPLEMENTAR		TOTAL		MEDIÇÃO B3		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 279,66	R\$ 0,00	R\$ 279,66	-	R\$ 279,66	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 131,77	R\$ 0,00	R\$ 131,77	-	R\$ 131,77	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 150,16	R\$ 0,00	R\$ 150,16	-	R\$ 150,16	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PVC, D = 40 CM	UND	-	R\$ 180,47	R\$ 0,00	R\$ 180,47	-	R\$ 180,47	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PVC, D = 60 CM	UND	-	R\$ 250,37	R\$ 0,00	R\$ 250,37	-	R\$ 250,37	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.29	ORSE		TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND	-	R\$ 54,01	R\$ 0,00	R\$ 54,01	-	R\$ 54,01	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND	-	R\$ 77,77	R\$ 0,00	R\$ 77,77	-	R\$ 77,77	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,07M	UND	-	R\$ 138,27	R\$ 0,00	R\$ 138,27	-	R\$ 138,27	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 396,93	R\$ 0,00	R\$ 396,93	-	R\$ 396,93	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE INCLINADA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	-	R\$ 56,20	R\$ 0,00	R\$ 56,20	-	R\$ 56,20	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ANGUSTA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND	-	R\$ 39,42	R\$ 0,00	R\$ 39,42	-	R\$ 39,42	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	-	R\$ 26,41	R\$ 0,00	R\$ 26,41	-	R\$ 26,41	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	-	R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 25,90	-	R\$ 25,90	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 9,85	-	R\$ 9,85	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAAP PVC ESGOTO 25MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 15,03	R\$ 0,00	R\$ 15,03	-	R\$ 15,03	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 10,64	-	R\$ 10,64	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 11,80	R\$ 0,00	R\$ 11,80	-	R\$ 11,80	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 7,71	R\$ 0,00	R\$ 7,71	-	R\$ 7,71	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.42	89378	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 8,01	-	R\$ 8,01	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 22,38	R\$ 0,00	R\$ 22,38	-	R\$ 22,38	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89393	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 12,44	-	R\$ 12,44	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATAO NA BUCHA CENTRAL PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" - 6094 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 25,91	R\$ 0,00	R\$ 25,91	-	R\$ 25,91	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89395	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 14,88	R\$ 0,00	R\$ 14,88	-	R\$ 14,88	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATAO NA BUCHA CENTRAL PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" - 6094 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	-	R\$ 26,40	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 17,96	R\$ 0,00	R\$ 17,96	-	R\$ 17,96	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 7,32	-	R\$ 7,32	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 8,49	-	R\$ 8,49	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO CANAL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	-	R\$ 72,79	R\$ 0,00	R\$ 72,79	-	R\$ 72,79	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 8				R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00		
9			PARQUE INFANTIL													
9.1	CPU PROPRIA		Fornecimento e assentamento de Calçada do Tarzani em escalegato tratado, com portico de um balcão	UND	-	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	R\$ 6.738,46	-	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	CPU PROPRIA		Fornecimento e assentamento de Balaço em escalegato tratado	UND	-	R\$ 2.995,72	R\$ 0,00	R\$ 2.995,72	-	R\$ 2.995,72	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3	CPU PROPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em escalegato tratado	UND	-	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	R\$ 2.332,78	-	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4	CPU PROPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em escalegato tratado	UND	-	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	R\$ 2.196,74	-	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	




Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO			O.S. COMPLEMENTAR			TOTAL			MEDIDA 03			ACUMULADO	BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL			
9.5			FORNHECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEIZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLI FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-BACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALUMINADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	71,29	R\$ 356,48	R\$ 25.413,46												0%
			FORNHECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEIZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLI FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-BACHA NAS EXTREMIDADES, TORBACOS BEFEGADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	1,00	R\$ 524,82	R\$ 524,82												0%
9.6			Sub-total 9				R\$ 25.938,28										R\$ 25.938,28		
10			PERGOLADO																
10.1		4203	FORNHECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=19A 22CM, L= 4,00 M (MOJURÉS)	PC	4,00	R\$ 598,00	R\$ 2.392,00											0%	
10.2		4244	FORNHECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=16A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PC	5,00	R\$ 283,47	R\$ 1.417,35											0%	
10.3		4453	FORNHECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10A 13CM, L= 4,00 (MIPÉRIJULAS)	PC	11,00	R\$ 83,16	R\$ 914,76											0%	
10.4		9857	Asestamento de peças de eucalipto tratado, d=19 x 22cm para confecção de parafusos (ver tabela de especificações)	M	14,42	R\$ 37,49	R\$ 540,61											0%	
10.5		9858	Asestamento de peças de eucalipto tratado, d=10 x 13cm para confecção de parafusos (ver tabela de especificações)	M	42,90	R\$ 18,78	R\$ 805,66											0%	
10.6		7888	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIESTER-STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAVERLACK OU SIMILAR	M2	91,17	R\$ 20,64	R\$ 1.881,75											0%	
			Sub-total 10				R\$ 7.952,13										R\$ 7.952,13		
11			ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO																
11.1		11115	Fornecimento e asestamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	-	R\$ 76,52	R\$ 0,00											0%	
11.2		9603	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bmg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	-	R\$ 170,00	R\$ 0,00											0%	
11.3		8666	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	-	R\$ 231,72	R\$ 0,00											0%	
			Sub-total 11				R\$ 0,00										R\$ 0,00		
12			PAISAGISMO																
12.1		10234	Grama semeada em placa, fornecimento e plantio	M2	94,62	R\$ 24,32	R\$ 2.301,16											0%	
12.2		COTAÇÃO	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	385,94	R\$ 118,92	R\$ 45.895,98											0%	
12.3		CPU PRÓPRIA	CONJ. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO S05 S04 210 (LUCAR)	UNID	6,00	R\$ 441,43	R\$ 2.648,58											0%	
12.4		CPU PRÓPRIA	Banco de madeira com exciso em eucalipto tratado (2,00x0,50M)	UNID	3,00	R\$ 1.032,05	R\$ 3.096,15											0%	
12.5		CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UNID	5,00	R\$ 2.627,12	R\$ 6.310,60											0%	
			Sub-total 12				R\$ 60.252,47										R\$ 60.252,47		
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA																
13.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e asestamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	-	R\$ 1.101,55	R\$ 0,00											0%	
13.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e asestamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=4,5, H=1,30M)	UNID	-	R\$ 1.232,24	R\$ 0,00											0%	
13.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e asestamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 1.703,51	R\$ 0,00											0%	
13.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e asestamento de Simulador de Cavalgato Simples	UNID	-	R\$ 2.786,87	R\$ 0,00											0%	
13.5		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e asestamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	-	R\$ 2.821,81	R\$ 0,00											0%	
13.6		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e asestamento de Bateria Sentada	UNID	-	R\$ 2.727,53	R\$ 0,00											0%	
13.7		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e asestamento de Multibater citador 7x1	UNID	-	R\$ 2.233,70	R\$ 0,00											0%	
			Sub-total 13				R\$ 0,00										R\$ 0,00		
14			GUARDA POLIESPORTIVA																
14.1		9862	LASTRO DE BRITA GRUINDADA APLICADA E 10CM	M2	145,15	R\$ 30,74	R\$ 4.461,91											0%	
14.2		97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	M2	145,15	R\$ 2,87	R\$ 416,58											0%	

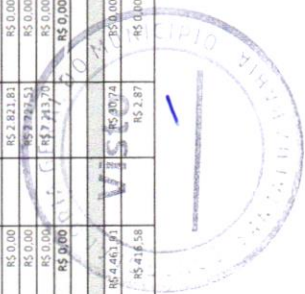


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e Manutenção LTDA



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			O.S. COMPLEMENTAR			TOTAL			MEDIÇÃO 03			ACUMULADO			%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL		QUANT.
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ACROSLIDADA NERURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 3,3MM, PAINEL 2X3M (1,50X3,00M), MALHA POP REFORÇADA GERALDOUS, SIMILAR	M2	145,15	R\$ 35,48	R\$ 5.149,92	R\$ 35,48	R\$ 5.149,92	R\$ 35,48	R\$ 5.149,92	145,15	R\$ 35,48	R\$ 5.149,92	145,15	R\$ 35,48	R\$ 5.149,92	145,15	R\$ 35,48	R\$ 5.149,92	0%
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020 AF. 11/2017	M2	145,15	R\$ 84,23	R\$ 12.225,98	R\$ 84,23	R\$ 12.225,98	R\$ 84,23	R\$ 12.225,98	145,15	R\$ 84,23	R\$ 12.225,98	145,15	R\$ 84,23	R\$ 12.225,98	145,15	R\$ 84,23	R\$ 12.225,98	0%
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO	M2	145,15	R\$ 0,51	R\$ 74,03	R\$ 0,51	R\$ 74,03	R\$ 0,51	R\$ 74,03	145,15	R\$ 0,51	R\$ 74,03	145,15	R\$ 0,51	R\$ 74,03	145,15	R\$ 0,51	R\$ 74,03	0%
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2017	M2	145,15	R\$ 42,10	R\$ 6.110,82	R\$ 42,10	R\$ 6.110,82	R\$ 42,10	R\$ 6.110,82	145,15	R\$ 42,10	R\$ 6.110,82	145,15	R\$ 42,10	R\$ 6.110,82	145,15	R\$ 42,10	R\$ 6.110,82	0%
14.7	102384	SINAPI	ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,5" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWS E MALHA QUADRA DA SPS/CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	195,60	R\$ 280,74	R\$ 54.912,74	R\$ 280,74	R\$ 54.912,74	R\$ 280,74	R\$ 54.912,74	195,60	R\$ 280,74	R\$ 54.912,74	195,60	R\$ 280,74	R\$ 54.912,74	195,60	R\$ 280,74	R\$ 54.912,74	0%
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (corrente g/foral)	PAB	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	0%
14.9	2418	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5", instalada	PAB	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	0%
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autotem, marca G light ou similar	UNID	12,00	R\$ 388,45	R\$ 4.661,40	R\$ 388,45	R\$ 4.661,40	R\$ 388,45	R\$ 4.661,40	12,00	R\$ 388,45	R\$ 4.661,40	12,00	R\$ 388,45	R\$ 4.661,40	12,00	R\$ 388,45	R\$ 4.661,40	0%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UNID	-	R\$ 886,43	R\$ 0,00	R\$ 886,43	R\$ 0,00	R\$ 886,43	R\$ 0,00	R\$ 886,43	-	R\$ 886,43	R\$ 0,00	R\$ 886,43	R\$ 0,00	-	R\$ 886,43	R\$ 0,00	0%
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	145,15	R\$ 12,48	R\$ 1.811,47	R\$ 12,48	R\$ 1.811,47	R\$ 12,48	R\$ 1.811,47	145,15	R\$ 12,48	R\$ 1.811,47	145,15	R\$ 12,48	R\$ 1.811,47	145,15	R\$ 12,48	R\$ 1.811,47	0%
14.13	5932	ORSE	Instalação de tela escuras a rede	M1	145,15	R\$ 16,20	R\$ 2.351,43	R\$ 16,20	R\$ 2.351,43	R\$ 16,20	R\$ 2.351,43	145,15	R\$ 16,20	R\$ 2.351,43	145,15	R\$ 16,20	R\$ 2.351,43	145,15	R\$ 16,20	R\$ 2.351,43	0%
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUI O ELINDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	165,47	R\$ 21,45	R\$ 3.549,33	R\$ 21,45	R\$ 3.549,33	R\$ 21,45	R\$ 3.549,33	165,47	R\$ 21,45	R\$ 3.549,33	165,47	R\$ 21,45	R\$ 3.549,33	165,47	R\$ 21,45	R\$ 3.549,33	0%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE (BARRACÃO) DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E - 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	-	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 4,82	-	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 0,00	-	R\$ 4,82	R\$ 0,00	0%
				Sub-total 14				R\$ 110.369,24				R\$ 110.369,24				R\$ 110.369,24					
15	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				
15.1	9379	ORSE	HASTE COBRADA COPPERWED Z/TABERAMENTO D=5/8" X 2,40M	UNID	36,00	R\$ 48,05	R\$ 1.729,80	R\$ 48,05	R\$ 1.729,80	R\$ 48,05	R\$ 1.729,80	36,00	R\$ 48,05	R\$ 1.729,80	36,00	R\$ 48,05	R\$ 1.729,80	36,00	R\$ 48,05	R\$ 1.729,80	0%
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADO, DN 40 MM (1,1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016, P	M	-	R\$ 58,94	R\$ 0,00	R\$ 58,94	R\$ 0,00	R\$ 58,94	R\$ 0,00	R\$ 58,94	-	R\$ 58,94	R\$ 0,00	R\$ 58,94	R\$ 0,00	-	R\$ 58,94	R\$ 0,00	#DIV/0!
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL COBRIGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	R\$ 9,83	R\$ 1.966,00	R\$ 9,83	R\$ 1.966,00	R\$ 9,83	R\$ 1.966,00	200,00	R\$ 9,83	R\$ 1.966,00	200,00	R\$ 9,83	R\$ 1.966,00	200,00	R\$ 9,83	R\$ 1.966,00	0%
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPF), RIGIDO, 15MM², 1KV/500C	M	-	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 27,75	R\$ 0,00	-	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 27,75	R\$ 0,00	-	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPF), RIGIDO, 35MM², 1KV/500C	M	-	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 55,13	R\$ 0,00	-	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 55,13	R\$ 0,00	-	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.6	6186	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 339,06	R\$ 0,00	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 339,06	R\$ 0,00	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.7	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2020	UNID	-	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 65,86	R\$ 0,00	-	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 65,86	R\$ 0,00	-	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66	R\$ 26,33	R\$ 52,66	R\$ 26,33	R\$ 52,66	2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66	2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66	2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66	0%
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, BVGX1, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INÚF 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, 1600, TEMP COR 5000K, INC-00,70%, V UTIL 50,000H, 120 LM/W GARKS ANOS, MODELO G1216 G LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	42,00	R\$ 705,73	R\$ 29.640,66	R\$ 705,73	R\$ 29.640,66	R\$ 705,73	R\$ 29.640,66	42,00	R\$ 705,73	R\$ 29.640,66	42,00	R\$ 705,73	R\$ 29.640,66	42,00	R\$ 705,73	R\$ 29.640,66	0%
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 SOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UNID	-	R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 115,37	R\$ 0,00	-	R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 115,37	R\$ 0,00	-	R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRE-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 200X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	-	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 28,43	R\$ 0,00	-	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 28,43	R\$ 0,00	-	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR RODANA PORCELANA	UNID	-	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 4,87	R\$ 0,00	-	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 4,87	R\$ 0,00	-	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.13	10331	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATE 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSATICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID	1,00	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	1,00	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	1,00	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	1,00	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	0%
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UNID	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	0%
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	14,00	R\$ 2.123,77	R\$ 29.732,78	R\$ 2.123,77	R\$ 29.732,78	R\$ 2.123,77	R\$ 29.732,78	14,00	R\$ 2.123,77	R\$ 29.732,78	14,00	R\$ 2.123,77	R\$ 29.732,78	14,00	R\$ 2.123,77	R\$ 29.732,78	0%
				Sub-total 15				R\$ 66.003,78				R\$ 66.003,78				R\$ 66.003,78					
16	LIMPEZA E EXPULSO																				
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.786,45	R\$ 4,76	R\$ 8.503,50	R\$ 4,76	R\$ 8.503,50	R\$ 4,76	R\$ 8.503,50	1.786,45	R\$ 4,76	R\$ 8.503,50	1.786,45	R\$ 4,76	R\$ 8.503,50	1.786,45	R\$ 4,76	R\$ 8.503,50	0%
16.2	COMPOSIÇÃO		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	75,90	R\$ 57,86	R\$ 4.391,75	R\$ 57,86	R\$ 4.391,75	R\$ 57,86	R\$ 4.391,75	75,90	R\$ 57,86	R\$ 4.391,75	75,90	R\$ 57,86	R\$ 4.391,75	75,90	R\$ 57,86	R\$ 4.391,75	0%



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051411303-3



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		O.S. COMPLEMENTAR		TOTAL		QUANT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO	BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI					
16.3		COMPOSIÇÃO 18.0	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESENVOL DE 10 M	M3		RS 123,08	RS 0,00	RS 123,08	RS 0,00	RS 123,08	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
16.4		COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	75,90	RS 16,67	RS 1.265,30	RS 16,67	RS 1.265,30	75,90	RS 1.265,30	75,90	RS 1.265,30	0%	
16.5		93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	1.910,90	RS 0,83	RS 1.586,04	RS 0,83	RS 1.586,04	1.910,90	RS 1.586,04	1.910,90	RS 1.586,04	0%	
16.6		12013	PAVIMENTAÇÃO M3 KM, DIRT, ACIMA DE 30CM	T		RS 24,27	RS 0,00	RS 24,27	RS 0,00	RS 24,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
			DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO CINZA E VERMELHO X009B, NESTO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	Sub-total 16		RS 15.746,60	RS 0,00	RS 15.746,60	RS 0,00	RS 15.746,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
17.1		90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	RS 120,65	RS 9.048,75	RS 120,65	RS 9.048,75	75,00	RS 9.048,75	75,00	RS 9.048,75	0%	
17.2		90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	RS 40,53	RS 12.159,00	RS 40,53	RS 12.159,00	300,00	RS 12.159,00	300,00	RS 12.159,00	0%	
17.3		88226	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	225,00	RS 30,71	RS 6.909,75	RS 30,71	RS 6.909,75	225,00	RS 6.909,75	225,00	RS 6.909,75	0%	
			Sub-total 17			RS 28.117,50	RS 0,00	RS 28.117,50	RS 0,00	RS 28.117,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
18			SERVIÇOS EXTRAS												
18.1		9641	Remoção de Risco em Pedra Portuguesa	m²	335,83	RS 27,20	RS 9.136,17	RS 27,20	RS 9.136,17	335,83	RS 9.136,17	335,83	RS 9.136,17	0%	
18.2		2241	Pavimentação ornamental com sebo rolado espalhado	m3	2,70	RS 961,48	RS 2.596,01	RS 961,48	RS 2.596,01	2,70	RS 2.596,01	2,70	RS 2.596,01	0%	
18.3		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND	36,00	RS 69,40	RS 2.498,36	RS 69,40	RS 2.498,36	36,00	RS 2.498,36	36,00	RS 2.498,36	0%	
18.4		12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND	5,00	RS 789,85	RS 3.949,25	RS 789,85	RS 3.949,25	5,00	RS 3.949,25	5,00	RS 3.949,25	0%	
18.5		3242	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und		RS 209,89	RS 0,00	RS 209,89	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	0%	
18.6		100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UM	17,00	RS 3.872,89	RS 65.839,16	RS 3.872,89	RS 65.839,16	17,00	RS 65.839,16	17,00	RS 65.839,16	0%	
18.7		12910	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	19,00	RS 3.252,72	RS 61.801,65	RS 3.252,72	RS 61.801,65	19,00	RS 61.801,65	19,00	RS 61.801,65	0%	
18.8		91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	969,00	RS 8,43	RS 8.170,15	RS 8,43	RS 8.170,15	969,00	RS 8.170,15	969,00	RS 8.170,15	0%	
18.9		101658	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und		RS 955,46	RS 0,00	RS 955,46	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	0%	
18.10		2334	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratop ou similar- 8l	m²	911,74	RS 9,77	RS 8.907,57	RS 9,77	RS 8.907,57	911,74	RS 8.907,57	911,74	RS 8.907,57	0%	
18.11		2200	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	911,74	RS 22,11	RS 20.155,74	RS 22,11	RS 20.155,74	911,74	RS 20.155,74	911,74	RS 20.155,74	0%	
18.12		10453	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	128,00	RS 177,35	RS 22.701,31	RS 177,35	RS 22.701,31	128,00	RS 22.701,31	128,00	RS 22.701,31	0%	
18.13		263	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabalana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	62,76	RS 63,92	RS 4.011,86	RS 63,92	RS 4.011,86	62,76	RS 4.011,86	62,76	RS 4.011,86	0%	
18.14		CPU PRÓPRIA	TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INOX	und	1,00	RS 3.485,86	RS 3.485,86	RS 3.485,86	RS 3.485,86	1,00	RS 3.485,86	1,00	RS 3.485,86	0%	
			Sub-total 18			RS 213.253,08	RS 0,00	RS 213.253,08	RS 0,00	RS 213.253,08	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
			TOTAL GERAL			RS 45.790,78	RS 893.988,92	RS 45.790,78	RS 893.988,92	RS 939.779,70	RS 458.931,32	RS 939.779,70	RS 0,00	0%	



Thayrany Ferreira Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00461290E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 15/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 15 de maio de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 06/05/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 06/05/2024 12:26:07, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000061258120240506

Emitida via Internet, às 12:26:07 hs, do dia 06/05/2024

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241960506

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA**
CNPJ: **23.694.541/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:05:02 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **8BA5.4C09.0A28.FC15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 31384337/2024

Expedição: 06/05/2024, às 12:18:20

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2024 a 19/06/2024

Certificação Número: 2024052106322530992770

Informação obtida em 24/05/2024 11:36:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707840602-9 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 07/05/2024 17:33:01 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/05/2024	Mensal	1.813,44	145,07	0,00	0,00	0,00	145,07
04/2024			ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	20	025.254.805-11	101	20/05/2024	Mensal	2.645,78	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
04/2024			BRUNO SANTOS DA PAIXÃO	9	089.639.685-10	101	20/05/2024	Mensal	1.558,96	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
04/2024			CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	13	121.663.035-60	101	20/05/2024	Mensal	1.558,96	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
04/2024			EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	19	028.587.845-07	101	20/05/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
04/2024			FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/05/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
04/2024			JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/05/2024	Mensal	2.645,78	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
04/2024			JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
04/2024			JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/05/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
04/2024			LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	21	036.390.435-29	101	20/05/2024	Mensal	2.645,78	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
04/2024			MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	20/05/2024	Mensal	852,95	68,23	0,00	0,00	0,00	68,23
04/2024			OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/05/2024	Mensal	4.058,00	324,64	0,00	0,00	0,00	324,64
04/2024			REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/05/2024	Mensal	2.645,78	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
04/2024			ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	23	046.617.945-67	101	20/05/2024	Mensal	2.645,78	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
04/2024			ROBERT OLVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/05/2024	Mensal	1.558,96	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
04/2024			SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	8	097.476.445-09	101	20/05/2024	Mensal	1.558,96	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
Total do Tomador								Sem Tomador	33.553,93	2.684,24	0,00	0,00	0,00	2.684,24
Total do Estabelecimento								23.694.541/0001-62	33.553,93	2.684,24	0,00	0,00	0,00	2.684,24
Total da Guia									40.876,59	3.270,03	0,00	0,00	0,00	3.270,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707840602-9 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 07/05/2024 17:33:01 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/05/2024	Mensal	1.558,96	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
04/2024			GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/05/2024	Mensal	2.645,78	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
04/2024			JOSADARQUE VIANA PEREIRA	16	050.757.845-77	101	20/05/2024	Mensal	1.558,96	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
04/2024			OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	20/05/2024	Mensal	1.558,96	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
Total do Tomador								Sem Tomador	7.322,66	585,79	0,00	0,00	0,00	585,79
Total do Estabelecimento								90.017.87716/72	7.322,66	585,79	0,00	0,00	0,00	585,79
Total da Guia									40.876,59	3.270,03	0,00	0,00	0,00	3.270,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707840602-9 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 07/05/2024 17:33:01 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	16	33.553,93	2.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,24	
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	33.553,93	2.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,24	

Estabelecimento: 90.017.87716/72											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	4	7.322,66	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79	
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.322,66	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79	
Total da Guia			40.876,59	3.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,03	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707840602-9 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 07/05/2024 17:33:01 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	23.694.541/0001-62	16	33.553,93	2.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,24
04/2024	90.017.87716/72	4	7.322,66	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
		Total da Guia	40.876,59	3.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707840602-9 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 07/05/2024 17:33:01 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	16	33.553,93	2.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,24
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	33.553,93	2.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,24

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	7.322,66	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.322,66	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79

Total da Guia **40.876,59** **3.270,03** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **3.270,03**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707840602-9 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 07/05/2024 17:33:01 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	20	40.876,59	3.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,03	
	Total da Guia	40.876,59	3.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,03	



Pix enviado

R\$ 3.270,03

Sobre a transação

Data da transação 20/05/2024

Horário 18h51

Identificador
33aa0a726b784414ae1508601ca90f43

ID da transação
E00416968202405202148bbX6StqIM2r

Quem pagou

Nome GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN

CPF/CNPJ 23.694.541/0001-62

Conta 232663238

Agência 0001

Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Agência 0647

Número da conta 9999000537000360305-5

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000231582100
Data/Hora da Transmissão	14/05/2024 19:51:37	Identificação da Apuração de Débitos	25762424335 / eSocial 74524741 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000228767986
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.306,49		
Deduções	Salário Família: 124,08 Retenção Lei 9711/98: 3.182,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	6.710,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.710,78		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.464,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.464,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	503,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 503,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	109,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 109,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	838,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 838,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	183,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 183,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	67,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,10		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	14,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	335,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 335,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	73,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	503,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 503,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	109,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 109,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	201,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 201,32		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	43,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	438,36		
Saldo a Pagar	438,36		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25762424335 / eSocial 74524741 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.856,49	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.788,44	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.370,77	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 438,36	R\$ 438,36
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.454,06	R\$ 438,36

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2024 19:51:37
Nº do recibo de entrega	0000050000231582100
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz		Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA				
Evento: IRRF		Período: abril/2024 à abril/2024				
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	04/2024	4.260,41	22,50		295,82
GERAL.	OSVALDO BORGES TELES FILHO	04/2024	3.493,20	15,00		142,54
Sub total:					0,00	438,36
Total Geral:					0,00	438,36



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24135.3725957-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000231582100			Valor Total do Documento 438,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	438,36			438,36
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024					
Totais		438,36			438,36



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 38360385241 8 41071624135 0 37259579479 0



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.24135.3725957-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 438,36

Pague com o PIX



Pix enviado

R\$ 438,36

Sobre a transação

Data da transação **16/05/2024**

Horário **09h33**

Identificador **DtWMCFHpJ0Fs4vvHSNcjXaKOoS**

ID da transação
E004169682024051612324ZdRX62WbA0

Quem pagou

Nome **GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN**

CPF/CNPJ **23.694.541/0001-62**

Conta **232663238**

Agência **0001**

Instituição **BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu


Nome **Ministerio Da Economia**

CPF/CNPJ **00.394.460/0058-87**

Agência **1607**

Número da conta **333666-2**

Instituição **BCO DO BRASIL S.A.**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 91		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA ASSENTAMENTO DE POSTES		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/05/2024		Data: 01/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço de
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 92		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA ASSENTAMENTO DE POSTES		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/05/2024		Data: 02/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514117303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 93		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA ASSENTAMENTO DE POSTES		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/05/2024		Data: 03/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	Q	Q	S	X	D
							S	
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 94		EFETIVO PESSOAL		QTDE
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceiteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/05/2024		Data: 04/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 95		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 05/05/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 05/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 96				CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA ASSENTAMENTO DE POSTES				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/05/2024				Data: 06/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 97					CATEGORIA							QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
					Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/05/2024					Data: 07/05/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO GERAL DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E MOBILIÁRIOS SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 RDO: 98 Tarde: () Noite: () Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			EFETIVO PESSOAL						
			CATEGORIA			MÃO DE OBRA DIRETA			
Gerente de Obra							1		
Engenheiro									
Tec. de Segurança									
Aux Adm									
Mestre de obra									
Encarregado geral							1		
Hh DO DIA									
			MÃO DE OBRA DIRETA						
Topografo									
Auxiliar de topografia									
Pedreiro							3		
Ajudante Geral							8		
Calceteiro									
Carpinteiro									
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Serralheiro									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO			QTDE.			
			Veiculo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Piaca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/05/2024			Data: 08/05/2024						

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
 SERVIÇOS DE
 OBJETOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E MOBILIÁRIOS SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
 MARQUE
 NA QUADRA

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 99		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/05/2024		Data: 09/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 100		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ATERRO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/05/2024		Data: 10/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 101		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/05/2024		Data: 11/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 102		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/05/2024		Data: 12/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							Data																				
							X																				
							S	T	Q	Q	S	S	D														
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.							EFETIVO PESSOAL																				
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 103							CATEGORIA							QTDE													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()							MÃO DE OBRA INDIRETA																				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1													
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA							Hh DO DIA																				
							MÃO DE OBRA DIRETA																				
							Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO																				
							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																				
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS																				
							TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																				
GERENTE DE OBRA:							FISCALIZAÇÃO:																				
Data: 13/05/2024							Data: 13/05/2024																				

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	X	Q	Q	S	S	D
		S	T	Q	Q	S	S	D
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 104		EFETIVO PESSOAL				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/05/2024		Data: 14/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	X	Q	Q	S	S	D
		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 105		CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DA ACADEMIA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/05/2024		Data: 15/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 106				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DA ACADEMIA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 16/05/2024				Data: 16/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022			RDO: 107				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DA ACADEMIA				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 3							
				Ajudante Geral 8							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
EFETIVO EQUIPAMENTOS				Hh ACUMULADO							
				TIPO							
				QTDE.							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/05/2024				Data: 17/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 108		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/05/2024		Data: 18/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 109		EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		MÃO DE OBRA DIRETA		QTDE		
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra				
SEM SERVIÇO				Engenheiro				
				Tec. de Segurança				
				Aux Adm				
				Mestre de obra				
				Encarregado geral				
				Hh DO DIA				
				MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topografo				
				Auxiliar de topografia				
				Pedreiro				
				Ajudante Geral				
				Calceiteiro				
				Carpinteiro				
				Operador de Motosserra				
				Motorista				
				Montador				
				Montador/Eletricista				
				Eletricista				
				Operador de Patrol				
				Operador de Escavadeira				
				Operador de Pá carregadeira				
				Motorista de caçamba				
				Pintor				
				Serralheiro				
				Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA				
				JORNADA DE TRABALHO				
				Hh DO DIA				
				Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS				
				TIPO		QTDE.		
				Veiculo Leve				
				Caminhão MuncK				
				Caminhão Toco				
				Escavadeira				
				Pá carregadeira				
				Caçamba				
				Patrol				
				PC 200				
				Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/05/2024		Data: 19/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	X								
		S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 110		CATEGORIA					QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
EXECUÇÃO DE PINTURA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DA ACADEMIA ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1									
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
		Hh DO DIA									
		RESUMO DO EFETIVO									
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO					QTDE.				
		Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 20/05/2024		Data: 20/05/2024									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 111		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Note: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PINTURA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NO PARQUE ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO NA QUADRA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DA ACADEMIA ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA EXECUÇÃO DE CONCRETO		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/05/2024		Data: 21/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 112		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DE PINTURA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DOS JOGOS DE MESA ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
		RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE				
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/05/2024		Data: 22/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 113		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PINTURA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DOS JOGOS DE MESA ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA ASSENTAMENTO DO PORCELANATO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/05/2024		Data: 23/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 114		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
EXECUÇÃO DE PINTURA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DOS JOGOS DE MESA ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA ASSENTAMENTO DO PORCELANATO		Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo 3 Auxiliar de topografia 8 Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calçateiro 8 Carpinteiro 8 Operador de Motoserra 8 Motorista 8 Montador 8 Montador/Eletricista 8 Eletricista 8 Operador de Patrol 8 Operador de Escavadeira 8 Operador de Pá carregadeira 8 Motorista de caçamba 8 Pintor 8 Serralheiro 8										
		Hh DO DIA										
		RESUMO DO EFETIVO										
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE					
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 24/05/2024		Data: 24/05/2024										

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data																								
		S	T	Q	Q	S	X	D																		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL																								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 115		CATEGORIA			QTDE																					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA																								
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO		Hh DO DIA																								
		MÃO DE OBRA DIRETA																								
CONSIDERAÇÕES		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcefeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro																								
		Hh DO DIA																								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																								
		EFETIVO EQUIPAMENTOS																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200	
TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																										
Caminhão Munck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																								
Data: 25/05/2024		Data: 25/05/2024																								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 116		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/05/2024		Data: 26/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514117303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	X								
		S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 117		CATEGORIA		QTDE							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PINTURA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DOS JOGOS DE MESA ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA ASSENTAMENTO DO PORCELANATO		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO		QTDE.							
		Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 27/05/2024		Data: 27/05/2024									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 118				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PINTURA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND INSTALAÇÃO DOS JOGOS DE MESA ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA ASSENTAMENTO DO PORCELANATO INSTALAÇÃO DE BANCOS INSTALAÇÃO DE LIXEIRA				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/05/2024				Data: 28/05/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	X	Q	Q	S	S	D
		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 119		CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
TOTEN DE INAUGURAÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
		RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/05/2024		Data: 29/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 120		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
TOTEN DE INAUGURAÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/05/2024		Data: 30/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA.

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 121				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
TITEN DE INAUGURAÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/05/2024				Data: 31/05/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - MORRO DOS LOPES - no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 01 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS



Foto 02 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 03 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Foto 04 – Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 05 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Foto 06 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 07 - PERGOLADO

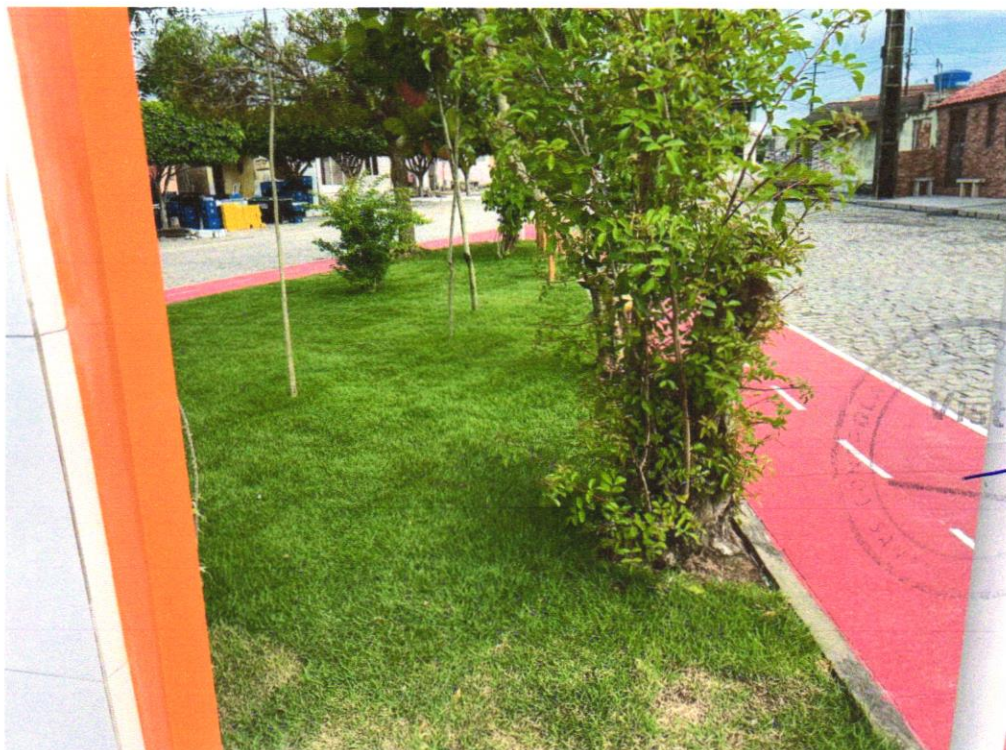


Foto 08 - Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 09 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3

Foto 10 - FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 11 – Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M



Foto 12 – Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 13 – QUADRA POLIESPORTIVA



Foto 14 - QUADRA POLIESPORTIVA

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 15 - Mesa c/ tampo $\varnothing=1,00\text{m}$ em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado $\varnothing=0,40\text{m}$, e 4 bancos em concreto armado $\varnothing=0,40\text{m}$, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Foto 16 – Postes



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/05/2024	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da praça e canteiros - Morro dos Lopes



Foto 17 - Postes



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

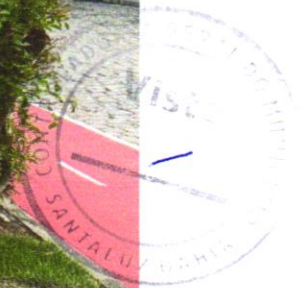


Foto 18 - TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA
