



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 230-2022

EMPENHO: 196 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2003 Data do Sub-Empenho: 03/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: **5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: TV SAO JOSE II, 55 Complemento: GALPAO04  
 Bairro: TIMBO Cidade: ESPLANADA Estado: BA  
 CNPJ: 21.450.165/0001-35 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 39294-4 Agência: 3679 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 Tipo PIX: Nº PIX:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 12/06/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - Educação  
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
 Programa: 004 - EDUCALUZ  
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 009-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 284-2022	288.815,82	288.815,82	0,00
Patrimônio: -			

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, NO POVOADO DE SISALÂNDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº009-2022, CONTRATO Nº284-2022. OBRA Nº 054/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 08. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 30/06/2024. NFS-e 211.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
548.033,27	548.033,27	0,00

Data do Empenho: 12/06/2024

Data do Liquidação: 26/07/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	36.170,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	6.576,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	16.441,00
## Quatrocentos e oitenta e oito mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos ##		Valor Retido
		59.187,60
		Valor Líquido
		488.845,67

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/07/2024	211	U			548.033,27
Quantidade: 1	Total:					548.033,27

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	548.033,27

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/07/2024.

MARLI NUNES LIMA  
Secretária de Educação  
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/07/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

3581903

SIAPFC -





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 230-2022

EMPENHO: 196 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 2003	Data do Sub-Empenho: 03/07/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	TV SAO JOSE II, 55	Complemento: GALPAO04	
Bairro:	TIMBO	Cidade: ESPLANADA	Estado: BA
CNPJ:	21.450.165/0001-35	Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente:	39294-4	Agência: 3679	RG:
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 12/06/2024
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL	Nº Lic.: 009-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 284-2022	288.815,82	288.815,82	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, NO POVOADO DE SISALÂNDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº009-2022, CONTRATO Nº284-2022.	Movimentação Empenho		
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		548.033,27	548.033,27	0,00

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

## Quinhentos e quarenta e oito mil e trinta e três reais e vinte e sete centavos ##	548.033,27
--	------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/07/2024.   <hr/> MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/07/2024   <hr/> NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 24/07/2024

## A EMPRESA:

START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, SOB O CNPJ Nº 21.450.165/0001-35

## ENDEREÇO:

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 316, GALPÃO 04. TIMBÓ. ESPLANADA/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
<b>AÇÃO:</b> FUNDEB
<b>HISTÓRICO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA - POVOADO SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
<b>Processo Licitatório:</b> RDC Nº 009/2022
<b>Contrato:</b> 284/2022 <b>Processo administrativo:</b> 230/2022 <b>Nº da obra:</b> 054/2022
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 211 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 548.033,27 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/06/2024 A 30/06/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0129 C/C: 98658-4 BANCO ITAÚ
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





**Prefeitura Municipal de Esplanada**Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N  
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000  
CNPJ: 13.885.231/0001-71**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota

**00000211**

Data e Hora de Emissão

**24/07/2024 17:02:30**


Data do Fato Gerador

**24/07/2024**

Código de Verificação

**AACGEKAL-AUAEGH****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**Local da Prestação  
**SANTALUZ/BA - BRASIL**Local da Incidência  
**SANTALUZ/BA****Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**  
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**  
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04**  
**TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**  
CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**  
Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM****Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO**  
**CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000**  
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:  
Telefone: E-mail:**Discriminação do(s) Serviço(s)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA - POVOADO SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

OBRA N° 054/2022  
RDC N°009/2022  
CONTRATO N° 284 /2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2022BOLETIM DE MEDIÇÃO - 08  
PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024  
VALOR TOTAL= R\$548.033,27  
MATERIAL 40% R\$219.213,31  
MÃO DE OBRA 60% R\$328.819,96BASE DE CÁLCULO DO INSS 11% - R\$328.819,96 x 11% = R\$36.170,20  
VALOR DO ISS 5% - R\$328.819,96 x 5% = R\$16.441,00  
BASE DE CÁLCULO DO IR 1.2% R\$548.033,27 = R\$6.576,40Assinatura  
**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

\*\*\*Página 1 de 2\*\*\*

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>548.033,27</b>	<b>219.213,31</b>	<b>0,00</b>	<b>328.819,96</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>6.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,20</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>548.033,27</b>	<b>488.845,67</b>

**Outras Informações**O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICÍPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária  
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 101.112,14 - (18,45%) - Fonte: IBPT  
Nota Fiscal substituta da NFS-e n° 208 emitida em 17/07/2024 16:19:49



**Prefeitura Municipal de Esplanada**

Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N  
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000  
CNPJ: 13.885.231/0001-71

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota  
**00000211**

Data e Hora de Emissão  
**24/07/2024 17:02:30**

Data do Fato Gerador  
**24/07/2024**

Código de Verificação  
**AACGEKAL-AUAEGH**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**

Local da Prestação  
**SANTALUZ/BA - BRASIL**

Local da Incidência  
**SANTALUZ/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**  
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**  
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04  
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**

CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**  
Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO  
CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:  
Telefone: E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DADOS BANCÁRIOS ITAÚ - AG: 0129 / CC: 98658-4

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **24/07/24**

Assinatura

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

\*\*\*Página 2 de 2\*\*\*

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>548.033,27</b>	<b>219.213,31</b>	<b>0,00</b>	<b>328.819,96</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>6.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,20</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
<b>548.033,27</b>	<b>488.845,67</b>

**Outras Informações**

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária  
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 101.112,14 - (18,45%) - Fonte: IBPT  
Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 208 emitida em 17/07/2024 16:19:49



Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://esplanada.saatri.com.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397619		CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04					NÚMERO: 04	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: TIMBO	MUNICÍPIO: ESPLANADA	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 21.450.165/0001-35			R.G.:	ORGAO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
328.819,96	5,000	16.441,00		16.441,00		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 26/07/2024	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 26/07/2024 09:41:31	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 211 - Data de emissão: 24/07/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	16.441,00		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	16.441,00		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81790000164 . 2      41003906202 . 2      40831010500 . 7      00039761912 . 3

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000164 . 2      41003906202 . 2      40831010500 . 7      00039761912 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM


# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 397619	EXERCÍCIO: 2024	DATA 26/07/2024 09:41:31	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	16.441,00
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	16.441,00

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



I.R.R.F

Nº DAM: 397620	CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	INSCRIÇÃO: 31069	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Tv SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04		NÚMERO: 04	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: TIMBO	MUNICÍPIO: ESPLANADA UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 21.450.165/0001-35	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>			
Base Cálculo: 6.576,40	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$: 6.576,40 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 6.576,40	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>			
DATA LANÇAMENTO: 26/07/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024 DATA EMISSÃO: 26/07/2024 09:42:44 DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos		  	
Valor do Tributo: 6.576,40	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 6.576,40		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 6.576,40
Taxa de Expediente: 6.576,40	Vlr. do Desconto: 0,00		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 6.576,40	Vlr. Devido com Desconto 6.576,40		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 211 - Data de emissão: 24/07/2024			(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 6.576,40	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000065 . 9      76403906202 . 2      40831010100 . 6      00039762007 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO




8171000065 . 9      76403906202 . 2      40831010100 . 6      00039762007 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397620	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 26/07/2024 09:42:44	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 31069			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.576,40
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.576,40







01/06/2024 a 30/06/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

**PROJETO DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA**

**EMPRESA:** START SOLUCOES INTEGRADAS ERIELI  
 CNPJ: 21.450.165/0001-35  
 R\$ 548.033,27


**OBRA Nº 054/2022**  
**RDC Nº 009/2022**  
**Nº DO CONTRATO: 284/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 230/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 456,76	R\$ 2.740,56		R\$ 0,00	6,00	2.740,56	R\$ -	100%
1.2	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	126,72	R\$ 117,54	R\$ 14.894,67		R\$ 0,00	126,72	14.894,66	R\$ -	100%
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,27	R\$ 7.712,82		R\$ 0,00	400,25	7.712,81	R\$ -	100%
1.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,08	R\$ 7.636,77		R\$ 0,00	400,25	7.636,77	R\$ -	100%
1.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 23,99	R\$ 9.602,00		R\$ 0,00	400,25	9.601,99	R\$ -	100%
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	374,46	R\$ 2,28	R\$ 853,77		R\$ 0,00	374,46	853,76	R\$ -	100%
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,34	R\$ 9,95	R\$ 371,53		R\$ 0,00	37,34	371,53	R\$ -	100%
1.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,58	R\$ 37,44	R\$ 620,76		R\$ 0,00	16,58	620,75	R\$ -	100%
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,93	R\$ 294,84	R\$ 569,04		R\$ 0,00	1,93	569,04	R\$ -	100%
1.10	Remoção de calha de zinco	m	63,44	R\$ 10,71	R\$ 679,44		R\$ 0,00	63,44	679,44	R\$ -	100%
1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	608,00	R\$ 59,86	R\$ 36.273,28		R\$ 0,00	608,00	36.273,27	R\$ -	100%
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,15	R\$ 24,25	R\$ 1.531,39		R\$ 0,00	63,15	1.531,38	R\$ -	100%
1.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	417,53	R\$ 119,59	R\$ 49.932,41		R\$ 0,00	417,53	49.932,40	R\$ -	100%
1.14	Demolição de piso de alta resistência	m²	471,73	R\$ 20,49	R\$ 9.665,75		R\$ 0,00	471,73	9.665,74	R\$ -	100%
1.15	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	160,50	R\$ 12,27	R\$ 1.969,34		R\$ 0,00	160,50	1.969,33	R\$ -	100%
1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	861,80	R\$ 3,34	R\$ 2.878,41		R\$ 0,00	861,80	2.878,40	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 147.931,93</b>						
2.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 152,17	R\$ 6.086,80		R\$ 0,00	40,00	6.086,80	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 6.086,80</b>						





ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
3.0	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>										
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	797,90	R\$ 89,93	R\$ 71.755,15		R\$ 0,00	797,90	71.755,14	R\$ -	100%
3.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	3,66	R\$ 617,03	R\$ 2.258,33		R\$ 2.258,32	3,66	2.258,32	R\$ -	100%
3.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	28,50	R\$ 110,53	R\$ 3.150,11		R\$ 0,00	28,50	3.150,10	R\$ -	100%
3.4	Soleira cimentada traço 1:1 = 15 cm, e = 2 cm	m	82,89	R\$ 20,17	R\$ 1.671,89		R\$ 0,00	82,89	1.671,89	R\$ -	100%
3.5	Bancada de mármore branco	m²	0,70	R\$ 348,66	R\$ 244,06		R\$ 244,06	0,70	244,06	R\$ -	100%
	sub total				<b>R\$ 79.079,54</b>						
4.0	<b>ESQUADRIAS</b>										
4.1	<b>PORTAS</b>										
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.145,24	R\$ 9.161,92		R\$ 0,00	8,00	9.161,92	R\$ -	100%
4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.059,47	R\$ 8.475,76		R\$ 0,00	8,00	8.475,76	R\$ -	100%
4.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	R\$ 739,48	R\$ 2.395,91		R\$ 2.395,91	3,24	2.395,91	R\$ -	100%
4.1.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	15,75	R\$ 571,40	R\$ 8.999,55		R\$ 8.999,55	15,75	8.999,55	R\$ -	100%
4.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.021,60	R\$ 2.043,20		R\$ 0,00	2,00	2.043,20	R\$ -	100%
	sub total				<b>R\$ 31.076,35</b>						
4.2	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>										
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 124,46	R\$ 373,38		R\$ 373,38	3,00	373,38	R\$ -	100%
4.2.2	TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC BRANCA OU VERDE H=1,80	m²	99,63	R\$ 136,14	R\$ 13.563,63		R\$ 13.563,62	99,63	13.563,62	R\$ -	100%
4.2.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 180,23	R\$ 3.244,14		R\$ 0,00	18,00	3.244,14	R\$ -	100%
4.2.4	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	7,68	R\$ 779,20	R\$ 5.984,25		R\$ 5.984,25	7,68	5.984,25	R\$ -	100%
4.2.5	Brinqueado - Gira-gira (camrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipaik ou similar	un	1,00	R\$ 4.417,55	R\$ 4.417,55		R\$ 4.417,55	1,00	4.417,55	R\$ -	100%
4.2.6	Brinqueado - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.333,38	R\$ 2.333,38		R\$ 2.333,38	1,00	2.333,38	R\$ -	100%
4.2.7	Brinqueado - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	R\$ 1.998,49	R\$ 3.998,98		R\$ 3.998,98	2,00	3.998,98	R\$ -	100%
4.2.8	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	un	36,00	R\$ 60,08	R\$ 2.162,88		R\$ 2.162,88	36,00	2.162,88	R\$ -	100%
4.2.9	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	42,00	R\$ 220,88	R\$ 9.276,96		R\$ 9.276,96	42,00	9.276,96	R\$ -	100%
4.2.10	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroelho	m²	1,85	R\$ 536,32	R\$ 992,19		R\$ 992,19	1,85	992,19	R\$ -	100%
4.2.11	CERCA EM MORÕES DE MADEIRA TRATADA	M	32,00	R\$ 38,22	R\$ 1.223,04		R\$ 1.223,04	32,00	1.223,04	R\$ -	100%
	sub total				<b>R\$ 47.570,39</b>						



Evaldo Amador Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 0514173033

ING. CIVIL - CREA/BA 051993251-0




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
4.3	<b>JANELAS</b>										
4.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	38,25	R\$ 533,66	R\$ 20.412,50	38,25	R\$ 20.412,49	38,25	20.412,49	R\$ -	100%
4.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	5,45	R\$ 204,48	R\$ 1.114,42	5,45	R\$ 1.114,41	5,45	1.114,41	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 21.526,91</b>						
5.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>										
5.1	<b>ÁGUA FRIA</b>										
5.1.1	PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	m²	80,84	R\$ 34,87	R\$ 2.818,89		R\$ 0,00	80,84	2.818,89	R\$ -	100%
5.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 1.091,94	R\$ 2.183,88		R\$ 0,00	2,00	2.183,88	R\$ -	100%
5.1.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 165,43	R\$ 4.135,75		R\$ 0,00	25,00	4.135,75	R\$ -	100%
5.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	102,91	R\$ 25,52	R\$ 2.626,26	7,09	R\$ 180,93	102,91	2.626,25	R\$ -	100%
5.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	59,00	R\$ 10,32	R\$ 608,88		R\$ 0,00	59,00	608,88	R\$ -	100%
5.1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 625,60	R\$ 625,60		R\$ 0,00	1,00	625,60	R\$ -	100%
5.1.7	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	20,00	R\$ 11,21	R\$ 224,20		R\$ 0,00	20,00	224,20	R\$ -	100%
5.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R\$ 45,27	R\$ 316,89		R\$ 0,00	7,00	316,89	R\$ -	100%
5.1.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 102,27	R\$ 102,27		R\$ 0,00	1,00	102,27	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 13.642,62</b>						
5.2	<b>ESGOTO</b>										
5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00	R\$ 138,20	R\$ 967,40		R\$ 0,00	7,00	967,40	R\$ -	100%
5.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,93	R\$ 67,26	R\$ 4.098,15		R\$ 0,00	60,93	4.098,14	R\$ -	100%
5.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 22,39	R\$ 291,07		R\$ 0,00	13,00	291,07	R\$ -	100%
5.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ratos sifonados, etc...)	un	23,00	R\$ 88,20	R\$ 2.028,60		R\$ 0,00	23,00	2.028,60	R\$ -	100%
5.2.5	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 48,69	R\$ 292,14		R\$ 0,00	6,00	292,14	R\$ -	100%
5.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,37	R\$ 23,15	R\$ 1.027,17		R\$ 0,00	44,37	1.027,16	R\$ -	100%
5.2.7	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	R\$ 171,52	R\$ 857,60		R\$ 0,00	5,00	857,60	R\$ -	100%
5.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00	R\$ 12,05	R\$ 433,80		R\$ 0,00	36,00	433,80	R\$ -	100%
5.2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 208,02	R\$ 208,02		R\$ 0,00	1,00	208,02	R\$ -	100%
5.2.10	Tê 90º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	9,00	R\$ 14,13	R\$ 127,17		R\$ 0,00	9,00	127,17	R\$ -	100%





ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
5.2.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 15,82	R\$ 142,38	R\$ 0,00	R\$ 142,38	9,00	142,38	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 10.473,50						
<b>6</b>	<b>METAS E ACESSÓRIOS HIDRAULICO</b>										
6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R\$ 312,86	R\$ 1.564,30	R\$ 1.564,30	R\$ 1.564,30	5,00	1.564,30	R\$ -	100%
6.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx descarga de sobrepôr AKRCS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	R\$ 455,73	R\$ 911,46	R\$ 911,46	R\$ 911,46	2,00	911,46	R\$ -	100%
6.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 457,27	R\$ 457,27	R\$ 457,27	R\$ 457,27	1,00	457,27	R\$ -	100%
6.4	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	R\$ 997,84	R\$ 997,84	R\$ 997,84	R\$ 997,84	1,00	997,84	R\$ -	100%
6.5	MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA D PADRÃO ALTO D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 940,17	R\$ 1.880,34	R\$ 1.880,34	R\$ 1.880,34	2,00	1.880,34	R\$ -	100%
6.6	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 648,22	R\$ 6.482,20	R\$ 6.482,20	R\$ 6.482,20	10,00	6.482,20	R\$ -	100%
6.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 414,62	R\$ 829,24	R\$ 829,24	R\$ 829,24	2,00	829,24	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 13.122,65						
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
7.1	<b>QUADROS</b>										
7.1.1	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EDIFICACAO	m²	625,79	R\$ 15,89	R\$ 9.943,80	R\$ 0,00	R\$ 9.943,80	625,79	9.943,80	R\$ -	100%
7.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 103,60	R\$ 103,60	R\$ 0,00	R\$ 103,60	1,00	103,60	R\$ -	100%
7.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 675,59	R\$ 1.351,18	R\$ 0,00	R\$ 1.351,18	2,00	1.351,18	R\$ -	100%
7.1.4	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00	R\$ 502,74	R\$ 502,74	R\$ 0,00	R\$ 502,74	1,00	502,74	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 11.901,32						
<b>7.2</b>	<b>DISJUNTORES</b>										
7.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,26	R\$ 53,04	R\$ 0,00	R\$ 53,04	4,00	53,04	R\$ -	100%
7.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,93	R\$ 55,72	R\$ 0,00	R\$ 55,72	4,00	55,72	R\$ -	100%
7.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	R\$ 15,24	R\$ 213,36	R\$ 0,00	R\$ 213,36	14,00	213,36	R\$ -	100%
7.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 149,75	R\$ 299,50	R\$ 0,00	R\$ 299,50	2,00	299,50	R\$ -	100%
7.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 658,52	R\$ 658,52	R\$ 658,52	R\$ 658,52	1,00	658,52	R\$ -	100%
7.2.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	R\$ 159,07	R\$ 318,14	R\$ 0,00	R\$ 318,14	2,00	318,14	R\$ -	100%
7.2.7	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	R\$ 266,61	R\$ 266,61	R\$ 0,00	R\$ 266,61	1,00	266,61	R\$ -	100%
7.2.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA440V	UN	9,00	R\$ 135,30	R\$ 1.217,70	R\$ 0,00	R\$ 1.217,70	9,00	1.217,70	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 3.082,59						





ITEM	DISCINÇÃO	UNID	QDE	P UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		QUANT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO	PREÇO TOTAL	SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL						
7.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
7.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	349,00	R\$ 10,32	R\$ 3.601,68		R\$ 0,00	349,00	3.601,68			100%	
7.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122021	M	42,00	R\$ 19,14	R\$ 803,88		R\$ 0,00	42,00	803,88			100%	
7.3.3	CARXÁ RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	73,00	R\$ 16,18	R\$ 1.181,14		R\$ 372,14	73,00	1.181,14			100%	
	sub total				R\$ 5.588,70								
7.4	CABOS												
7.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	578,00	R\$ 3,21	R\$ 1.855,38		R\$ 0,00	578,00	1.855,38			100%	
7.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	620,00	R\$ 4,66	R\$ 2.889,20		R\$ 0,00	620,00	2.889,20			100%	
7.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	518,00	R\$ 7,61	R\$ 3.941,98		R\$ 0,00	518,00	3.941,98			100%	
7.4.4	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	120,00	R\$ 26,21	R\$ 3.145,20		R\$ 3.145,20	120,00	3.145,20			100%	
	sub total				R\$ 11.831,76								
7.5	ILUMINAÇÃO E TOMADA												
7.5.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	48,00	R\$ 27,96	R\$ 1.342,08		R\$ 1.342,08	48,00	1.342,08			100%	
7.5.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	2,00	R\$ 31,95	R\$ 63,90		R\$ 63,90	2,00	63,90			100%	
7.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	2,00	R\$ 29,95	R\$ 59,90		R\$ 59,90	2,00	59,90			100%	
7.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	9,00	R\$ 26,54	R\$ 238,86		R\$ 238,86	9,00	238,86			100%	
7.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	13,00	R\$ 62,52	R\$ 812,76		R\$ 812,76	13,00	812,76			100%	
7.5.6	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 600k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	74,00	R\$ 76,21	R\$ 5.639,54		R\$ 5.639,54	74,00	5.639,54			100%	
7.5.7	Luminária c/2 pétalas, c/ alajam, p/ equip, em ch, de alum, pintado c/ epod preto, refletor em ch, alumínio de abó brilho, difusor em vidro temp, incl: suporte p/fixação em poste reto c/2 braços, ref: CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	un	3,00	R\$ 2.115,17	R\$ 6.345,51		R\$ 0,00	3,00	6.345,51			100%	
7.5.8	Projeto Luminí, ref: PL-212/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQ-TS 150W e refletor	Un	6,00	R\$ 1.621,54	R\$ 9.729,24		R\$ 0,00	6,00	9.729,24			100%	
	sub total				R\$ 24.231,79								
7.6	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO												
7.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	58,00	R\$ 15,85	R\$ 919,30		R\$ 0,00	58,00	919,30			100%	
7.6.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	11,00	R\$ 6,59	R\$ 72,49		R\$ 0,00	11,00	72,49			100%	
7.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	14,00	R\$ 6,02	R\$ 84,28		R\$ 0,00	14,00	84,28			100%	
7.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	4,00	R\$ 9,69	R\$ 38,76		R\$ 0,00	4,00	38,76			100%	
	sub total				R\$ 1.114,83								



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 091417903-3



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>										
8.1	<b>INFRAESTRUTURA</b>										
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,40	R\$ 106,63	R\$ 255,91		R\$ 0,00	2,40	255,91	R\$ -	100%
8.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	4,08	R\$ 139,39	R\$ 568,71		R\$ 0,00	4,08	568,71	R\$ -	100%
8.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	22,58	R\$ 22,45	R\$ 506,92		R\$ 0,00	22,58	506,92	R\$ -	100%
8.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ( sapata isolada).	m³	2,40	R\$ 4.153,90	R\$ 9.969,36		R\$ 0,00	2,40	9.969,36	R\$ -	100%
8.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (viga baldrame).	m³	4,08	R\$ 4.153,90	R\$ 16.947,91		R\$ 0,00	4,08	16.947,90	R\$ -	100%
8.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	102,46	R\$ 54,24	R\$ 5.557,43		R\$ 0,00	102,46	5.557,43	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 33.806,25</b>						
8.2	<b>SUPERESTRUTURA</b>										
8.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (pilares).	m³	4,50	R\$ 4.153,90	R\$ 18.692,55		R\$ 0,00	4,50	18.692,55	R\$ -	100%
8.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (vigas).	m³	4,08	R\$ 4.153,90	R\$ 16.947,91		R\$ 0,00	4,08	16.947,91	R\$ -	100%
8.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (laje).	m³	6,00	R\$ 4.153,90	R\$ 24.923,40		R\$ 0,00	6,00	24.923,40	R\$ -	100%
8.2.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,80	R\$ 111,54	R\$ 2.766,19		R\$ 0,00	24,80	2.766,19	R\$ -	100%
8.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,10	R\$ 64,29	R\$ 2.449,45		R\$ 0,00	38,10	2.449,44	R\$ -	100%
8.2.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	38,10	R\$ 115,60	R\$ 4.404,36		R\$ 0,00	38,10	4.404,36	R\$ -	100%
8.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (laje).	m²	40,10	R\$ 54,24	R\$ 2.175,02		R\$ 0,00	40,10	2.175,02	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 72.358,89</b>						
9	<b>REVESTIMENTO</b>										
9.1	<b>PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>										
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.632,73	R\$ 5,06	R\$ 8.261,61		R\$ 0,00	1632,73	8.261,61	R\$ -	100%
9.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.632,73	R\$ 29,25	R\$ 47.757,35		R\$ 0,00	1632,73	47.757,33	R\$ -	100%
9.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	350,24	R\$ 71,76	R\$ 25.133,22		R\$ 0,00	350,24	25.133,22	R\$ -	100%
9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor laranja).	m²	57,53	R\$ 228,30	R\$ 13.134,10	28,73	R\$ 6.559,05	57,53	13.134,09	R\$ -	100%




Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051419303-3

IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	P.UNIT	TOTAL	MEDICÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor amarelo)	m²	48,15	R\$ 228,30	R\$ 10.992,65	45,47	R\$ 10.380,80	48,15	10.992,64	R\$ -	100%
9.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor azul)	m²	124,62	R\$ 228,30	R\$ 28.450,75	102,82	R\$ 23.473,80	124,62	28.450,74	R\$ -	100%
9.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor verde)	m²	43,32	R\$ 228,30	R\$ 9.889,96	18,57	R\$ 4.239,53	43,32	9.889,95	R\$ -	100%
9.1.8	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm; marca ATLAS, série metal, cor cinza escuro, ref. Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	-	R\$ 200,70	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ -	0%
9.1.9	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecogres, linha Biflante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	M²	674,95	R\$ 99,49	R\$ 67.150,78	134,00	R\$ 13.331,66	674,95	67.150,77	R\$ -	100%
9.1.10	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	194,57	R\$ 2,18	R\$ 424,16	-	R\$ 0,00	194,57	424,16	R\$ -	100%
9.1.11	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,3cm, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdaou ou similar	m²	194,57	R\$ 17,32	R\$ 3.369,95	-	R\$ 0,00	194,57	3.369,95	R\$ -	100%
9.1.12	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, Ø=7 a 10cm	m	369,00	R\$ 37,88	R\$ 13.977,72	369,00	R\$ 13.977,72	369,00	13.977,72	R\$ -	100%
	sub total				<b>R\$ 228.542,25</b>						
<b>9.2</b>	<b>PISOS INTERNOS</b>										
9.2.1	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	308,50	R\$ 21,58	R\$ 6.657,43	308,50	R\$ 6.657,43	308,50	6.657,43	R\$ -	100%
9.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	66,40	R\$ 56,08	R\$ 3.723,71	-	R\$ 0,00	66,40	3.723,71	R\$ -	100%
9.2.3	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	-	R\$ 54,53	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ -	0%
9.2.4	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	-	R\$ 24,31	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ -	0%
9.2.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	483,83	R\$ 102,60	R\$ 49.640,96	46,00	R\$ 4.719,60	483,83	49.640,95	R\$ -	100%
	sub total				<b>R\$ 60.022,10</b>						
<b>9.3</b>	<b>PISOS EXTERNOS</b>										
9.3.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	42,03	R\$ 107,50	R\$ 4.518,23	42,03	R\$ 4.518,22	42,03	4.518,22	R\$ -	100%
9.3.2	Grana esmerlada em placas, fornecimento e plantio	m²	114,71	R\$ 25,05	R\$ 2.873,49	114,71	R\$ 2.873,48	114,71	2.873,48	R\$ -	100%
9.3.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borraça e mão de obra especializada	m²	60,00	R\$ 70,31	R\$ 4.218,60	60,00	R\$ 4.218,60	60,00	4.218,60	R\$ -	100%
9.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ( cor laranja)	m²	117,09	R\$ 78,44	R\$ 9.184,54	23,42	R\$ 1.837,05	117,09	9.184,53	R\$ -	100%
9.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ( cor amarelo)	m²	73,68	R\$ 78,44	R\$ 5.779,46	14,74	R\$ 1.156,20	73,68	5.779,45	R\$ -	100%
9.3.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	194,57	R\$ 84,14	R\$ 16.371,12	68,47	R\$ 5.761,06	194,57	16.371,11	R\$ -	100%



Evaldo Aparecido Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051414/2013

JAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDICÃO DE		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
9.3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ( cor azul).	m²	120,05	R\$ 78,44	R\$ 9.416,72	24,01	R\$ 1.883,34	120,05	9.416,71	R\$ -	100%
9.3.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ( cor verde).	m²	80,53	R\$ 78,44	R\$ 6.316,77	16,11	R\$ 1.283,66	80,53	6.316,76	R\$ -	100%
9.3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ( cor natural).	m²	72,33	R\$ 78,44	R\$ 5.673,57		R\$ 0,00	72,33	5.673,56	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 64.352,49</b>						
10	<b>COBERTURA</b>										
10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,28	R\$ 49,15	R\$ 8.565,86		R\$ 0,00	174,28	8.565,86	R\$ -	100%
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,28	R\$ 110,77	R\$ 19.305,00		R\$ 0,00	174,28	19.304,99	R\$ -	100%
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,03	R\$ 119,46	R\$ 12.188,50		R\$ 0,00	102,03	12.188,50	R\$ -	100%
10.4	Ruído em chapa aço galvanizado nº24, com desenvolvimento 25cm	m	45,84	R\$ 47,40	R\$ 2.172,82		R\$ 0,00	45,84	2.172,81	R\$ -	100%
10.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	538,12	R\$ 43,86	R\$ 23.601,94	53,14	R\$ 2.330,72	538,12	23.801,94	R\$ -	100%
10.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	419,18	R\$ 52,08	R\$ 21.830,89	41,10	R\$ 2.140,48	419,18	21.830,88	R\$ -	100%
10.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	419,18	R\$ 26,12	R\$ 10.948,98	41,10	R\$ 1.073,53	419,18	10.948,97	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 98.614,00</b>						
11	<b>PINTURA</b>										
11.1	Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos	m²	1.013,19	R\$ 3,96	R\$ 4.012,23		R\$ 0,00	1.013,19	4.012,23	R\$ -	100%
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.013,19	R\$ 13,05	R\$ 13.222,13	213,19	R\$ 2.782,12	1.013,19	13.222,12	R\$ -	100%
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.013,19	R\$ 16,62	R\$ 16.839,22	1013,19	R\$ 16.839,21	1.013,19	16.839,21	R\$ -	100%
11.4	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinih ou similar)	m²	34,86	R\$ 22,44	R\$ 782,26	14,86	R\$ 333,45	34,86	782,25	R\$ -	100%
11.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	13,01	R\$ 21,40	R\$ 278,41	13,01	R\$ 278,41	13,01	278,41	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 35.134,25</b>						
12	<b>PAISAGISMO</b>										
12.1	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	8,00	R\$ 7,77	R\$ 62,16	8,00	R\$ 62,16	8,00	62,16	R\$ -	100%
12.2	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	6,00	R\$ 1.025,25	R\$ 6.151,50	6,00	R\$ 6.151,50	6,00	6.151,50	R\$ -	100%
12.3	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	R\$ 163,07	R\$ 326,14	2,00	R\$ 326,14	2,00	326,14	R\$ -	100%
	<b>sub total</b>				<b>R\$ 6.539,80</b>						
13	<b>CANTEIRO E BANCOS</b>										
13.1	<b>INFRAESTRUTURA</b>										
13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,07	R\$ 139,39	R\$ 288,54		R\$ 0,00	2,07	288,53	R\$ -	100%
13.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,88	R\$ 22,45	R\$ 311,61		R\$ 0,00	13,88	311,60	R\$ -	100%
13.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,07	R\$ 4.153,90	R\$ 8.598,57		R\$ 0,00	2,07	8.598,57	R\$ -	100%
13.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	41,64	R\$ 54,24	R\$ 2.258,55		R\$ 0,00	41,64	2.258,55	R\$ -	100%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 11.457,27</b>						




**Evaildo Amado Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 0514173033

**JAGO R S BORBA**  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
13.2	ALVENARIA										
13.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	63,69	R\$ 62,68	R\$ 3.992,09		R\$ 0,00	63,69	3.992,08	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 3.992,09						
13.3	REVESTIMENTO										
13.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	127,38	R\$ 5,06	R\$ 644,54		R\$ 0,00	127,38	644,54	R\$ -	100%
13.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	127,38	R\$ 29,25	R\$ 3.725,87		R\$ 0,00	127,38	3.725,87	R\$ -	100%
13.3.3	Soladora em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	106,78	R\$ 129,91	R\$ 13.551,45		R\$ 13.551,44	106,78	13.551,44	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 17.921,86						
13.4	PINTURA										
13.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,46	R\$ 16,62	R\$ 539,49		R\$ 539,48	32,46	539,48	R\$ -	100%
13.4.2	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	32,46	R\$ 22,44	R\$ 728,40		R\$ 728,40	32,46	728,40	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 1.267,89						
13.5	MADEIRA										
13.5.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA MADEIRA DE LEI	m²	-	R\$ 58,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ -	0%
13.5.2	Banco em madeira massaranduba ou pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidos duas demãos de sparklec catcol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento. (Tipo 02)	M²	32,46	R\$ 533,15	R\$ 17.306,05		R\$ 17.306,05	32,46	17.306,05	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 17.306,05						
14	QUADRA ESPORTIVA										
14.1	MANUTENÇÃO										
14.1.1	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DE QUADRAS ESPORTIVAS	M²	-	R\$ 32,15	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ -	0%
14.1.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bvg, malha 2 1/2", revestido em pvc, lhadado com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto murela	M²	485,34	R\$ 241,53	R\$ 117.224,17		R\$ 117.224,17	485,34	117.224,17	R\$ -	100%
14.1.3	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10X10CM	M²	576,00	R\$ 78,69	R\$ 45.325,44		R\$ 45.325,44	576,00	45.325,44	R\$ -	100%
14.1.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	150,00	R\$ 112,03	R\$ 16.804,50		R\$ 0,00	150,00	16.804,50	R\$ -	100%
14.1.5	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	R\$ 323,28	R\$ 5.172,48		R\$ 5.172,48	16,00	5.172,48	R\$ -	100%
14.1.6	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	R\$ 284,29	R\$ 284,29		R\$ 284,29	1,00	284,29	R\$ -	100%
14.1.7	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e	par	1,00	R\$ 3.064,19	R\$ 3.064,19		R\$ 3.064,19	1,00	3.064,19	R\$ -	100%
14.1.8	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	576,00	R\$ 3,96	R\$ 2.280,96		R\$ 2.280,96	576,00	2.280,96	R\$ -	100%
14.1.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	730,62	R\$ 2,69	R\$ 1.965,37		R\$ 0,00	730,62	1.965,36	R\$ -	100%
14.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44	R\$ 10,15	R\$ 1.395,02		R\$ 700,35	137,44	1.395,01	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 193.516,41						
14.2	PINTURA										
14.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	154,62	R\$ 14,68	R\$ 2.269,82		R\$ 0,00	154,62	2.269,82	R\$ -	100%
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	154,62	R\$ 16,62	R\$ 2.569,78		R\$ 2.569,78	154,62	2.569,78	R\$ -	100%
14.2.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	R\$ 18,67	R\$ 3.518,73		R\$ 3.518,73	188,47	3.518,73	R\$ -	100%
14.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	260,28	R\$ 18,67	R\$ 4.859,43		R\$ 4.859,42	260,28	4.859,42	R\$ -	100%




**Evaldo Araújo Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051411303-3

**IAGO R S BORRA**  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDIDAÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
14.2.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	R\$ 18,67	R\$ 2.375,76	127,25	R\$ 2.375,75	127,25	2.375,75	R\$ -	100%
14.2.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branca)	m²	29,18	R\$ 18,67	R\$ 544,79	29,18	R\$ 544,79	29,18	544,79	R\$ -	100%
14.2.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 (Alumbrados , postes e travess)	m²	845,13	R\$ 21,40	R\$ 18.085,78	845,13	R\$ 18.085,78	845,13	18.085,78	R\$ -	100%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 34.224,10</b>						
15	<b>CAIXA D'ÁGUA 15.000 L</b>										
15.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	3,65	R\$ 89,51	R\$ 328,71		R\$ 0,00	3,65	328,71	R\$ -	100%
15.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	4,84	R\$ 8,03	R\$ 38,87	3,84	R\$ 30,83	4,84	38,86	R\$ -	100%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 365,58</b>						
15.2	<b>FUNDAÇÕES</b>										
15.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	R\$ 87,47	R\$ 3.061,45	35,00	R\$ 3.061,45	35,00	3.061,45	R\$ -	100%
15.2.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,00	R\$ 110,00	5,00	R\$ 110,00	5,00	110,00	R\$ -	100%
15.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 35,97	R\$ 174,09	4,84	R\$ 174,09	4,84	174,09	R\$ -	100%
15.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIÓS. AF_10/2015	M	4,40	R\$ 91,34	R\$ 401,90	4,40	R\$ 401,99	4,40	401,89	R\$ -	100%
15.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 17,64	R\$ 2.057,00	116,61	R\$ 2.057,00	116,61	2.057,00	R\$ -	100%
15.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 14,87	R\$ 1.245,81	83,78	R\$ 1.245,80	83,78	1.245,80	R\$ -	100%
15.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,86	R\$ 15,36	R\$ 212,95	13,86	R\$ 212,95	13,86	212,95	R\$ -	100%
15.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	R\$ 22,31	R\$ 291,81	13,08	R\$ 291,81	13,08	291,81	R\$ -	100%
15.2.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA D LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016	m³	2,42	R\$ 744,99	R\$ 1.802,88	2,42	R\$ 1.802,87	2,42	1.802,87	R\$ -	100%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 9.357,89</b>						
15.3	<b>RESERVATORIO</b>										
15.3.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00	R\$ 50.310,61	R\$ 50.310,61	1,00	R\$ 50.310,61	1,00	50.310,61	R\$ -	100%
15.3.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 34"	M	4,00	R\$ 140,94	R\$ 563,76	4,00	R\$ 563,76	4,00	563,76	R\$ -	100%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 50.874,37</b>						
16	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										
16.1	Limpeza geral	m²	1.856,09	R\$ 2,49	R\$ 4.621,66	1.856,09	R\$ 4.621,66	1.856,09	4.621,66	R\$ -	100%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 4.621,66</b>						
	<b>Total</b>				<b>R\$ 1.372.519,01</b>		<b>R\$ 548.033,27</b>		<b>R\$ 1.372.519,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051411303-3

IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



**Prefeitura Municipal de Esplanada**

**Secretaria de Administração**

Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N

Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000

CNPJ: 13.885.231/0001-71

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000319/2024.E

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**  
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**  
Inscrição Municipal: **2721** CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**  
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04**  
**TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 11/07/2024 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **10/08/2024**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600009863800000399325030000319202407110**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://esplanada.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242681602

RAZÃO SOCIAL	
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
121.094.436 - BAIXADO	21.450.165/0001-35

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**  
**CNPJ: 21.450.165/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:07:56 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **1851.B162.8A3A.6428**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.450.165/0001-35  
**Razão Social:** START SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** TV SAO JOSE II 55 GALPAO 04 / TIMBO / ESPLANADA / BA / 48370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/07/2024 a 30/07/2024

**Certificação Número:** 2024070108272236093950

Informação obtida em 05/07/2024 09:32:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.450.165/0001-35  
Certidão n°: 15772584/2024  
Expedição: 07/03/2024, às 14:29:11  
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.450.165/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.450.165/0001-35  
Certidão n°: 15772584/2024  
Expedição: 07/03/2024, às 14:29:11  
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.450.165/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.450.165/0001-35  
**Razão Social:** START SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** TV SAO JOSE II 55 GALPAO 04 / TIMBO / ESPLANADA / BA / 48370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/07/2024 a 30/07/2024

**Certificação Número:** 2024070108272236093950

Informação obtida em 05/07/2024 09:32:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242681602

RAZÃO SOCIAL	
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
121.094.436 - BAIXADO	21.450.165/0001-35

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.450.165 Nome Empregador: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517385055-7 Emitida por: 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES

Qtd. Trabalhadores: 7 Origem: Gestão de Guias  
 Data Emissão: 05/07/2024 18:59:23 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024			CAIO HENRIQUE NOVAES DOS SANTOS	20	859.411.365-01	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024			CARLOS AUGUSTO SANTOS DOS ANJOS	14	973.992.055-15	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
06/2024			ELDER SANTOS SENA	18	105.158.405-13	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
06/2024			GABRIEL TUDES SANTOS	17	102.181.055-09	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
06/2024			JOAO MOREIRA DOS SANTOS	19	045.206.325-80	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024			MARCELO SILVA ALVES	15	862.271.215-09	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
06/2024			RICARDO SANTOS SILVA	16	120.494.055-02	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>11.870,26</b>	<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,57</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>21.450.165/0001-35</b>	<b>11.870,26</b>	<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,57</b>	
<b>Total da Guia</b>									<b>11.870,26</b>	<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,57</b>	



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 21.450.165 **Nome Empregador:** START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517385055-7 **Emitida por:** 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES

**Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 05/07/2024 18:59:23 (Brasília)

#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 21.450.165/0001-35

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	7	11.870,26	949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,57
		<b>Total da Guia</b>	<b>11.870,26</b>	<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,57</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cealonário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alísta não profissional em formação que recebe bolsa







### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 21.450.165 **Nome Empregador:** START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517385055-7 **Emitida por:** 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 18:59:23 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	21.450.165/0001-35	7	11.870,26	949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,57
		Total da Guia	11.870,26	949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,57





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 21.450.165 **Nome Empregador:** START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517385055-7 **Emitida por:** 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 18:59:23 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 21.450.165/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	7	11.870,26	949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,57
		<b>Total da Guia</b>	<b>11.870,26</b>	<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,57</b>







### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 21.450.165 **Nome Empregador:** START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517385055-7 **Emitida por:** 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES

**Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 05/07/2024 18:59:23 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	7	11.870,26	949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,57	
	<b>Total da Guia</b>	<b>11.870,26</b>	<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,57</b>	



CPF/CNPJ do Empregador 21.450.165	Nome/Razão Social do Empregador START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070517385055-7	Tag 21450165 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>949,57</b>
-------------	-----------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	7	949,57	0,00	0,00	0,00	949,57
<b>Total Geral:</b>		<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,57</b>



Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 18:59:23 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







# Pix enviado

## R\$ 949,57

### Sobre a transação

Data da transação 17/07/2024

Horário 16h32

Identificador  
**f1f1b9a264ab4b17ad05e3695186a968**

ID da transação  
**E00416968202407171932AF3yIKLriNH**

### Quem pagou

Nome **START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

CPF/CNPJ **21.450.165/0001-35**

Conta **211771953**

Agência **0001**

Instituição **BANCO INTER S.A.**

### Quem recebeu

Nome **Caixa Economica Federal**

CPF/CNPJ **00.360.305/0001-04**

Agência **0647**

Número da conta **9999000537000360305-5**

Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**



# Relatório de Lançamento de Rubricas

<b>Estabelecimen to</b> START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - Matriz		<b>Tomador:</b> START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI				
<b>Evento:</b> IRRF			<b>Período:</b> junho/2024 à junho/2024			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA	06/2024	3.435,20	15,00		133,84
					<b>Sub total:</b>	0,00 133,84
					<b>Total Geral:</b>	0,00 133,84





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	21.450.165/0001-35
<b>Nome</b>	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
<b>Período de apuração</b>	06/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	26807244652 / eSocial 80203446 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.515,34	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 3.634,50	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 688,46	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 133,84	R\$ 133,84
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.972,14	R\$ 133,84

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
<b>CPF</b>	784.530.465-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/07/2024 19:45:04
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000248508749
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	21.450.165/0001-35



CNPJ <b>21.450.165/0001-35</b>	Razão Social <b>START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24197.7269302-9</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000248508749</b>			Valor Total do Documento <b>133,84</b>

#### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	133,84			133,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>133,84</b>			<b>133,84</b>



SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 15/07/2024 19:45:50

85820000001 5 33840385242 7 01071624197 5 72693029300 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	33840385242 7	01071624197 5	72693029300 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 21.450.165/0001-35  
Número: 07.16.24197.7269302-9  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 133,84

Pague com o PIX







# Pix enviado

## R\$ 133,84

### Sobre a transação

Data da transação 17/07/2024

Horário 16h32

Identificador 07162419772693029042428375

ID da transação  
E00416968202407171931yYYOTI8y3go

### Quem pagou

Nome START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

CPF/CNPJ 21.450.165/0001-35

Conta 211771953

Agência 0001

Instituição BANCO INTER S.A.

### Quem recebeu

Nome Ministerio Da Fazenda

CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87

Agência 1607

Número da conta 333666-2

Instituição BCO DO BRASIL S.A.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ	21.450.165/0001-35
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000248508749
Data/Hora da Transmissão	15/07/2024 19:45:04	Identificação da Apuração de Débitos	26807244652 / eSocial 80203446 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000245421196
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JOSE II	Número	55
Complemento	GALPAO04	Bairro/Distrito	TIMBO
Município	ESPLANADA	UF	BA
CEP	48370000	Telefone	7196421002
Correio Eletrônico	STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA	CPF	78453046549
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	920,02		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 857,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	595,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 595,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.374,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.374,05		
Saldo a Pagar	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.082,40		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.082,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	178,05		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 178,05		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	296,75		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 296,75		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	23,74		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 23,74		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	118,70		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 118,70		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**


<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	178,05		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 178,05		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	71,22		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 71,22		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍSAUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	133,84		
<b>Saldo a Pagar</b>	133,84		





























RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				08/06/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022      LICITAÇÃO N° 809-2022      RDO: 306				EFTIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA      QTDE <b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÃO DE TEKLA GRADIL MORLAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO				Gerente de Obra      1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      8 Ajudante Geral      7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista      1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      5 Encanador						
Evaido Almeida Moraes Engenheiro Civil RUF 091417301-3				IAGO R S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO      QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/06/2024				Data: 08/06/2024						






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				09/06/2024							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA <b>CONTRATO N°:</b> 284/2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 009-2022 <b>RDO:</b> 306							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÃO DE TEKLA GRADIL MORLAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1							
 <b>Eivaldo Araújo Moraes</b> Engenheiro Civil RNP 091429303-3				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      8 Ajudante Geral      7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista      1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      5 Encanador							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 09/06/2024				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 09/06/2024							





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				10/06/2024																
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		EFETIVO PESSOAL																				
CONTRATO N° 284/2022		LICITAÇÃO N° 009-2022		RDO: 306		CATEGORIA							QTDE									
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA														
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva s/ cond. Trab.		3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra														
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									Engenheiro							1						
INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÃO DE TEKLA GRADIL MORLAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO   Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RFP 051419303-3   IAGO R.S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0		Téc. de Segurança																				
		Aux Adm																				
		Mestre de obra																				
		Encarregado geral							1													
		Hh DO DIA																				
		MÃO DE OBRA DIRETA																				
		Topografo																				
		Auxiliar de topografia																				
		Pedreiro							8													
		Ajudante Geral							7													
		Calceteiro																				
		Carpinteiro																				
		Operador de Motosserra																				
		Motorista							1													
		Montador																				
		Montador/Eletricista																				
		Eletricista																				
		Operador de Patrol																				
		Operador de Escavadeira																				
		Operador de Pá carregadeira																				
Motorista de caçamba																						
Pintor							5															
Encanador																						
Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA													
									JORNADA DE TRABALHO													
									Hh DO DIA													
									Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO							QTDE.						
									Veículo Leve													
									Caminhão Munck													
									Caminhão Toco													
									Escavadeira													
									Pá carregadeira													
									Caçamba													
									Patrol													
									PC 200													
									Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																		
Data: 10/06/2024				Data: 10/06/2024																		








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				11/06/2024							
				X							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 306				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM ALTA RESISTÊNCIA LOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				 Evaldo Antônio Moraes Eng. Eletricista Civil RNP 091.479.983-3				 MAGO R S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/06/2024				Data: 11/06/2024							




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				12/06/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
 <b>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</b> <b>OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA</b> <b>CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 308</b>				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) <b>SMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM ALTA RESISTÊNCIA LOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051419303-3				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista 1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 5 Encanador						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO <b>QTDE.</b> Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 12/06/2024				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 12/06/2024						






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				13/06/2024																										
				S	T	Q	Q	S	S	D																				
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA <b>CONTRATO N°:</b> 284/2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 009-2022 <b>RDO:</b> 306																										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b>																										
<b>SIMBOLOGIA</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>																										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																										
INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM ALTA RESISTÊNCIA LOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS MONTAGEM DA ARMADURA DO CASTELO D'ÁGUA   <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               Evaldo Amorim Moraes              Engenheiro Civil              RFP 0724/1903-3           </div> <div style="text-align: center;">               IAGO R S BORBA              ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0           </div> </div>				Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1																										
				<b>Hh DO DIA</b>																										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      8 Ajudante Geral      7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista      1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      5 Encanador																										
				<b>Hh DO DIA</b>																										
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
				TIPO	QTDE.																									
				Veículo Leve																										
				Caminhão Munck																										
				Caminhão Toco																										
				Escavadeira																										
				Pá carregadeira																										
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 13/06/2024				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 13/06/2024																										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																										
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																										








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		14/06/2024    S   T   Q   Q   S   S   D    X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 284/2022    LICITAÇÃO Nº 009-2022    RDO: 306		CATEGORIA    QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA						
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra    1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral    1						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM ALTA RESISTÊNCIA LOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS MONTAGEM DA ARMADURA DO CASTELO DÁGUA		Hh DO DIA  MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro    8 Ajudante Geral    7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista    1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor    5 Encanador						
Eváldo Antônio Moraes Engenheiro Civil RNP 091412303-3		IAGO R S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>		<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>		<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO    QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 260 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 14/06/2024		<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 14/06/2024						






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				15/06/2024																										
				S	T	Q	Q	S	S	D																				
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA <b>CONTRATO N°:</b> 284/2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 009-2022 <b>RDO:</b> 306																										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva e/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>																										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM ALTA RESISTÊNCIA LOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS MONTAGEM DA ARMADURA DO CASTELO D'ÁGUA  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               Evaldo Almeida Moraes              Engenheiro Civil              RNP 0914193033           </div> <div style="text-align: center;">               IAGO R S BORBA              ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0           </div> </div>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1  Hh DO DIA  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      8 Ajudante Geral      7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista      1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      5 Encanador  Hh DO DIA																										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve																														
Caminhão Munck																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 15/06/2024				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 15/06/2024																										



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			16/06/2024	S	T	Q	Q	S	S	D	X
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA			EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 264/2022		LICITAÇÃO N° 008-2022		RDO: 306		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
<b>SMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS LOCAÇÃO DE EUCALIPTOS DO PARQUE LOCAÇÃO DE SOLEIRAS INSTALAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS DA QUADRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA: REFLETORES MONTAGEM DA ARMADURA DO CASTELO D'ÁGUA								
 Evaldo Almeida Moraes Eng. Civil RNP 051.417.303-3				 IAGO P S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0								
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista 1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 5 Encanador								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/06/2024				Data: 16/06/2024								





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			X								
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA			S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 284/2022		LICITAÇÃO Nº 069-2022		RDO: 306		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		CATEGORIA			QTDE			
<b>SMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO COR (LARANJA, VERDE AMARELO E AZUL) INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E BASCULANTES DE VIDRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS LOCAÇÃO DE EUCALIPTOS DO PARQUE LOCAÇÃO DE SOLEIRAS INSTALAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS DA QUADRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA: REFLETORES MONTAGEM DA ARMADURA DO CASTELO D'ÁGUA   Eng. Civil - RFP 051419303-3  ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0				Gerente de Obra			1					
				Engenheiro								
Téc. de Segurança												
Aux Adm												
Mestre de obra												
Encarregado geral						1						
Hh DO DIA												
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
Auxiliar de topografia												
Pedreiro						8						
Ajudante Geral						7						
Calceiteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista						1						
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor						5						
Encanador												
Hh DO DIA												
<b>OBSERVAÇÕES</b>				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
JORNADA DE TRABALHO												
Hh DO DIA												
Hh ACUMULADO												
<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 17/06/2024				Data: 17/06/2024								


















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				21/06/2024																										
				S	T	Q	Q	S	S	D																				
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA <b>CONTRATO N°:</b> 264/2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 009-2022 <b>RDO:</b> 306																										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b>																										
<b>SIMBOLOGIA</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>																										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																										
APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES E TETOS, SELADOR E PINTURA APLICAÇÃO DE MASSA PVA, SELADOR E PINTURA NOS BANCOS DE JARDIM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS LOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA E BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSÃO INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E TELA DA QUADRA   <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               Evoldo Armandino Moraes              Engenheiro Civil              RVP 09141V301-3           </div> <div style="text-align: center;">               IAGO R S BORBA              ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0           </div> </div>				Gerente de Obra      1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1																										
				<b>Hh DO DIA</b>																										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      8 Ajudante Geral      7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista      1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      5 Encanador																										
				<b>Hh DO DIA</b>																										
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
				TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																														
Caminhão Munck																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>																										
Data: 21/06/2024				Data: 21/06/2024																										






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				22/06/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA <b>CONTRATO N°:</b> 284/2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 009-2022 <b>RDO:</b> 306						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>SIMBOLOGIA</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES E TETOS, SELADOR E PINTURA APLICAÇÃO DE MASSA PVA, SELADOR E PINTURA NOS BANCOS DE JARDIM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS LOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA E BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSÃO INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E TELA DA QUADRA   Eivaldo Almeida Moraes Eng. Civil RNF 051419303-3   IAGO R S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0				Gerente de Obra      1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro      8						
				Ajudante Geral      7						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
Motorista      1										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor      5										
Encanador										
Hh DO DIA										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO      QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 22/06/2024				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 22/06/2024						





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			23/06/2024	S	T	Q	Q	S	S	D	X																																	
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA			EFETIVO PESSOAL																																									
	CONTRATO N° 284/2022	LICITAÇÃO N° 089-2022	RDO: 386	CATEGORIA			QTDE																																						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDRETA																																							
SIMBOLOGIA																																													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																													
<p>APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES E TETOS, SELADOR E PINTURA            APLICAÇÃO DE MASSA PVA, SELADOR E PINTURA NOS BANCOS DE JARDIM            INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS            LOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA E BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSÃO            INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E TELA DA QUADRA</p>																																													
Eivaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RFP 091429303-3			IAGO R S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0																																										
MÃO DE OBRA DIRETA																																													
<table border="1"> <tr><td>Topografo</td><td></td></tr> <tr><td>Auxiliar de topografia</td><td></td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Ajudante Geral</td><td>7</td></tr> <tr><td>Cabeleiro</td><td></td></tr> <tr><td>Carpinteiro</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Motosserra</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista</td><td>1</td></tr> <tr><td>Montador</td><td></td></tr> <tr><td>Montador/Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista de caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Pintor</td><td>5</td></tr> <tr><td>Encanador</td><td></td></tr> </table>												Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	8	Ajudante Geral	7	Cabeleiro		Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista	1	Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor	5	Encanador	
Topografo																																													
Auxiliar de topografia																																													
Pedreiro	8																																												
Ajudante Geral	7																																												
Cabeleiro																																													
Carpinteiro																																													
Operador de Motosserra																																													
Motorista	1																																												
Montador																																													
Montador/Eletricista																																													
Eletricista																																													
Operador de Patrol																																													
Operador de Escavadeira																																													
Operador de Pá carregadeira																																													
Motorista de caçamba																																													
Pintor	5																																												
Encanador																																													
Hh DO DIA																																													
RESUMO DO EFETIVO																																													
EFETIVO DO DIA																																													
JORNADA DE TRABALHO																																													
Hh DO DIA																																													
Hh ACUMULADO																																													
OBSERVAÇÕES																																													
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																													
<table border="1"> <tr><th>TIPO</th><th>QTDE.</th></tr> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </table>												TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória															
TIPO	QTDE.																																												
Veículo Leve																																													
Caminhão Munck																																													
Caminhão Toco																																													
Escavadeira																																													
Pá carregadeira																																													
Caçamba																																													
Patrol																																													
PC 200																																													
Placa Vibratória																																													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																																							
Data: 23/06/2024						Data: 23/06/2024																																							



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				24/06/2024																	
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA						EFETIVO PESSOAL																	
CONTRATO N° 284/2022		LICITAÇÃO N° 009-2022		RDO: 306		CATEGORIA				QTDE													
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Nota: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA															
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.																					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																							
<p>APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES E TETOS, SELADOR E PINTURA            APLICAÇÃO DE MASSA PVA, SELADOR E PINTURA NOS BANCOS DE JARDIM            INSTALAÇÕES ELETRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS            LOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA E BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSÃO            INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E TELA DA QUADRA</p> <p style="text-align: center;">               Evoldo Almeida Moraes              Eng. Civil              RFP 0514171013           </p> <p style="text-align: center;">               IAGO R S BORBA              ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0           </p>												Gerente de Obra											
												Engenheiro	1										
												Tec. de Segurança											
												Aux Adm											
												Mestre de obra											
												Encarregado geral	1										
												Hh DO DIA											
												MÃO DE OBRA DIRETA											
												Topografo											
												Auxiliar de topografia											
												Pedreiro	8										
												Ajudante Geral	7										
												Caleteiro											
												Carpinteiro											
												Operador de Motoserra											
												Motorista	1										
												Montador											
												Montador/Eletricista											
												Eletricista											
												Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira																							
Operador de Pá carregadeira																							
Motorista de caçamba																							
Pintor	5																						
Encanador																							
Hh DO DIA																							
RESUMO DO EFETIVO																							
EFETIVO DO DIA																							
JORNADA DE TRABALHO																							
Hh DO DIA																							
Hh ACUMULADO																							
EFETIVO EQUIPAMENTOS																							
TIPO																							
QTDE.																							
Veiculo Leve																							
Caminhão Munck																							
Caminhão Toco																							
Escavadeira																							
Pá carregadeira																							
Caçamba																							
Patrol																							
PC 200																							
Placa Vibratória																							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																			
Data: 24/06/2024				Data: 24/06/2024																			




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X		S		T		Q		Q		S		S		D			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO Nº 284/2022										LICITAÇÃO Nº 098-2022						RDO: 306					
CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										QTDE											
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )										Tarde: ( 1 )						Noite: ( )					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom										2 - Chuva c/ cond. Trab.						3- Chuva s/ cond. Trab.					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																							
<p>APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES E TETOS, SELADOR E PINTURA</p> <p>APLICAÇÃO DE MASSA PVA, SELADOR E PINTURA NOS BANCOS DE JARDIM</p> <p>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS</p> <p>LOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA E BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSÃO</p> <p>INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E TELA DA QUADRA</p> <p>APLICAÇÃO DE VERNIZ IMBUIA NOS BANCOS E EUCALIPTOS DO PARQUE</p>												<p>Gerente de Obra 1</p> <p>Engenheiro</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p>											
<p>Evaldo Almeida Moraes</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>RVP 07.14.17301-3</p>												<p>IAGO R S BORBA</p> <p>ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0</p>											
MÃO DE OBRA DIRETA																							
<p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 8</p> <p>Ajudante Geral 7</p> <p>Calçoteiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista 1</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba</p> <p>Pintor 5</p> <p>Encanador</p>												<p>Hh DO DIA</p>											
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO											
<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>																							
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS											
												TIPO QTDE.											
												<p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Munck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>											
GERENTE DE OBRA:												FISCALIZAÇÃO:											
Data: 25/06/2024												Data: 25/06/2024											










RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				27/06/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 909-2022 RDO: 386				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encanagado geral 1						
APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES E TETOS, SELADOR E PINTURA APLICAÇÃO DE MASSA PVA, SELADOR E PINTURA NOS BANCOS DE JARDIM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES, TOMADA E LUMINÁRIAS LOCAÇÃO GRAMA SINTÉTICA E BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSÃO INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E TELA DA QUADRA APLICAÇÃO DE VERNIZ IMBUÍA NOS BANCOS E EUCALIPTOS DO PARQUE				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
Evaldo Almeida Moraes Eng. Civil RFP 051419303-1				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista 1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 5 Encanador						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toce						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/06/2024				Data: 27/06/2024						









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022      LICITAÇÃO N° 909-2022      RDO: 396				30/06/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL						
SMBOLOGIA				CATEGORIA      QTDE						
1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LIMPEZA GERAL   Evoldo Antonio Moraes Engenheiro Civil CPF: 091429303-3   IAGO R S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0				Gerente de Obra						
				Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      8 Ajudante Geral      7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista      1 Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      5 Encanador						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO      QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/06/2024				Data: 30/06/2024						




**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 8ª MEDIÇÃO - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, no Município de SantaLuz - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

**FOTO 01 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF\_01/2021**



**FOTO 02 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF\_12/2019**

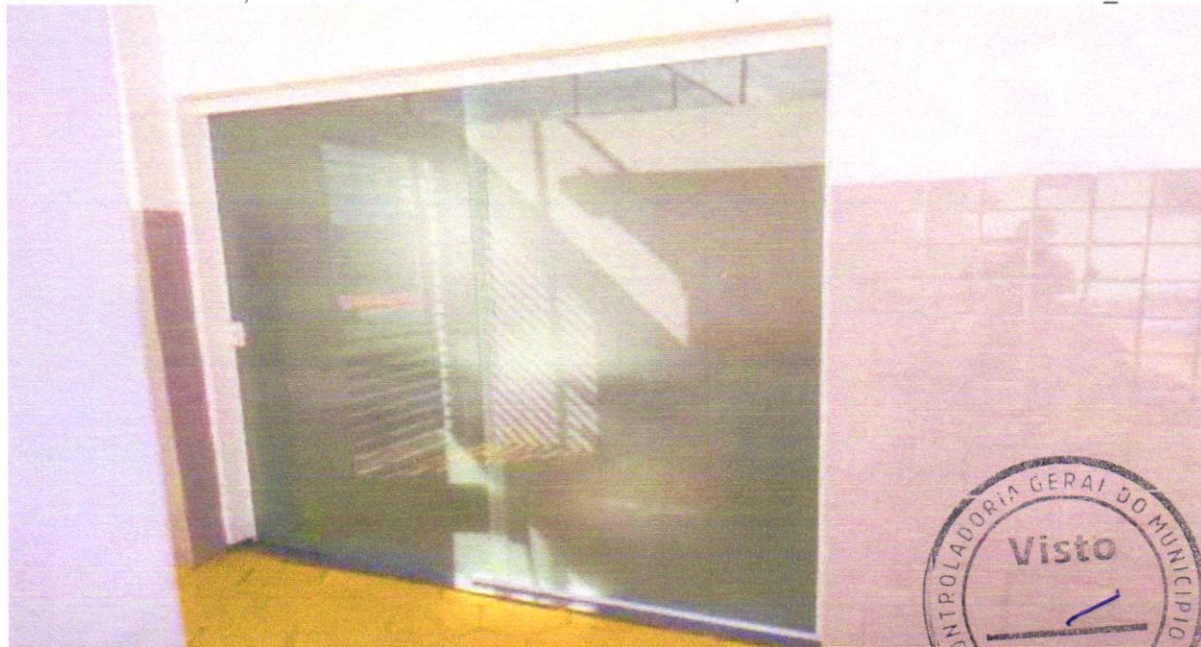




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 03 - TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC, BRANCA OU VERDE H=1,80



FOTO 04 - GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".  
AF\_04/2019

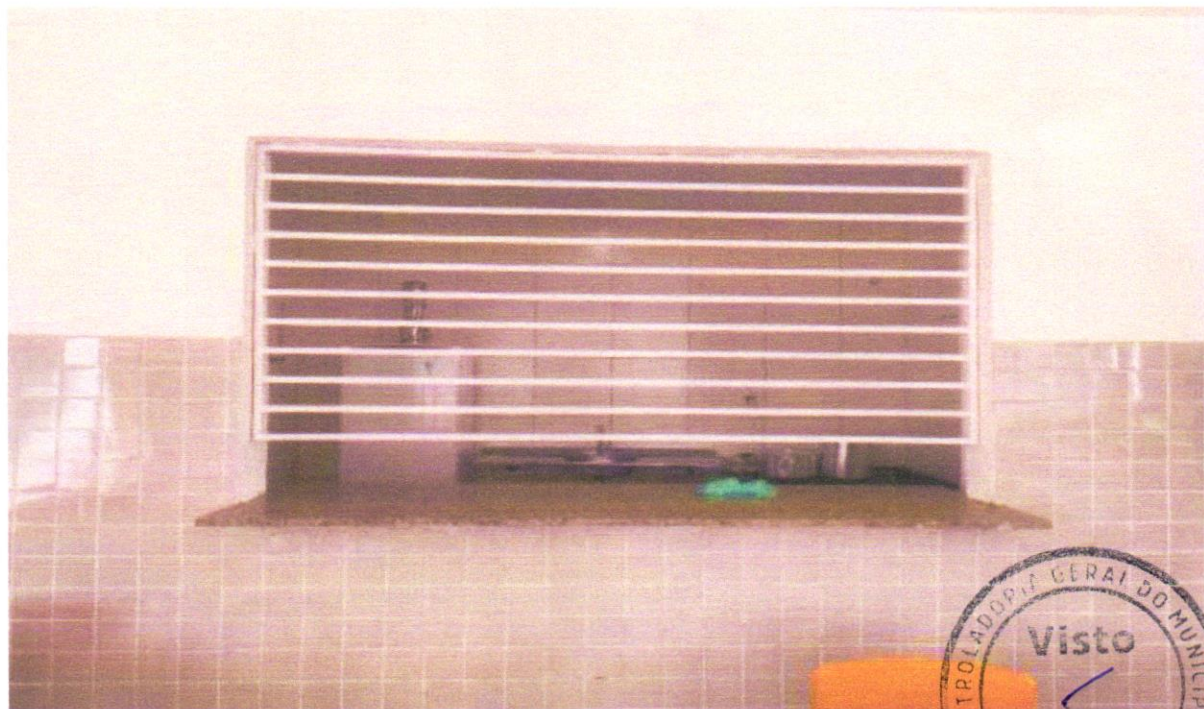



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 05 - Brinquedo - Gira-gira (carrossel  $\varnothing=1,70m$ ), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar. Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar. Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar.



FOTO 06 - Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 07 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019



FOTO 08 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2016





DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARMANDO CORREIA

FOTO 09 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020



FOTO 10 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 11 – INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015



FOTO 12 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF\_06/2014 (cor laranja, amarelo, azul e verde).





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

**FOTO 13 – PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF\_06/2022**



**FOTO 14 - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA. GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO.**





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 15 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_12/2015 ( cor laranja, verde, azul e amarelo).



FOTO 16 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF\_05/2017\_P





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 17 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014



FOTO 18 - PLANTA - CROTON, FORNECIMENTO E PLANTIO. FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA RABO DE PEIXE, H=3M. PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELII), FORNECIMENTO E PLANTIO






DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 19 - SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM



FOTO 20 - BANCO EM MADEIRA MASSARANDUBA OU PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO. (TIPO 02)

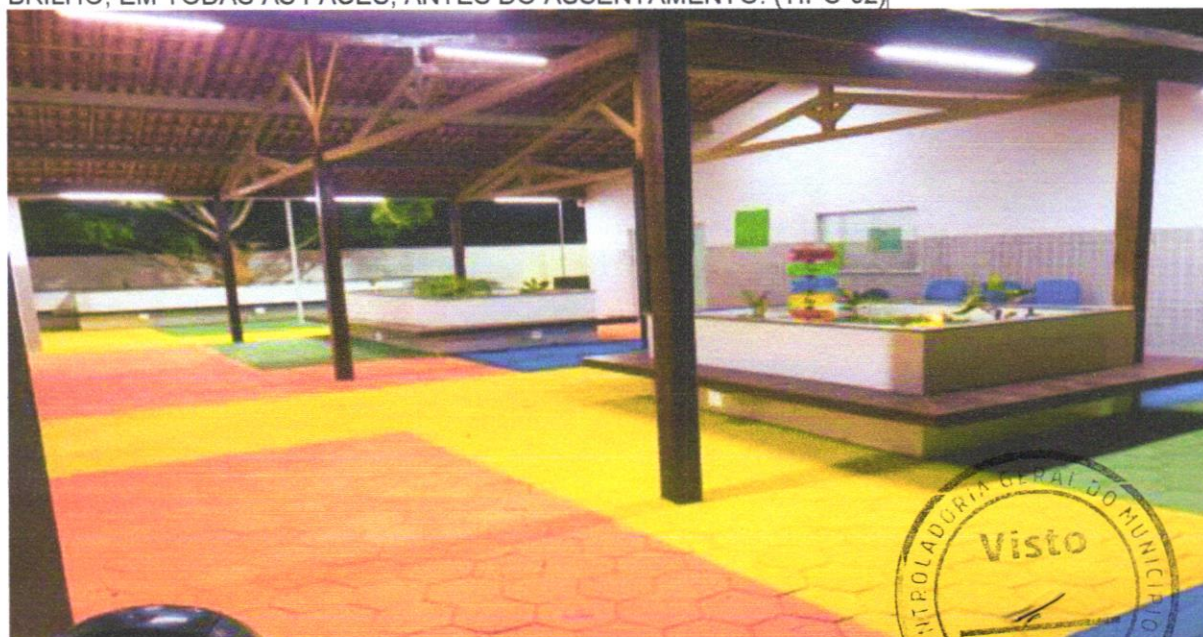




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 21 - ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA.



FOTO 22 - TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM.

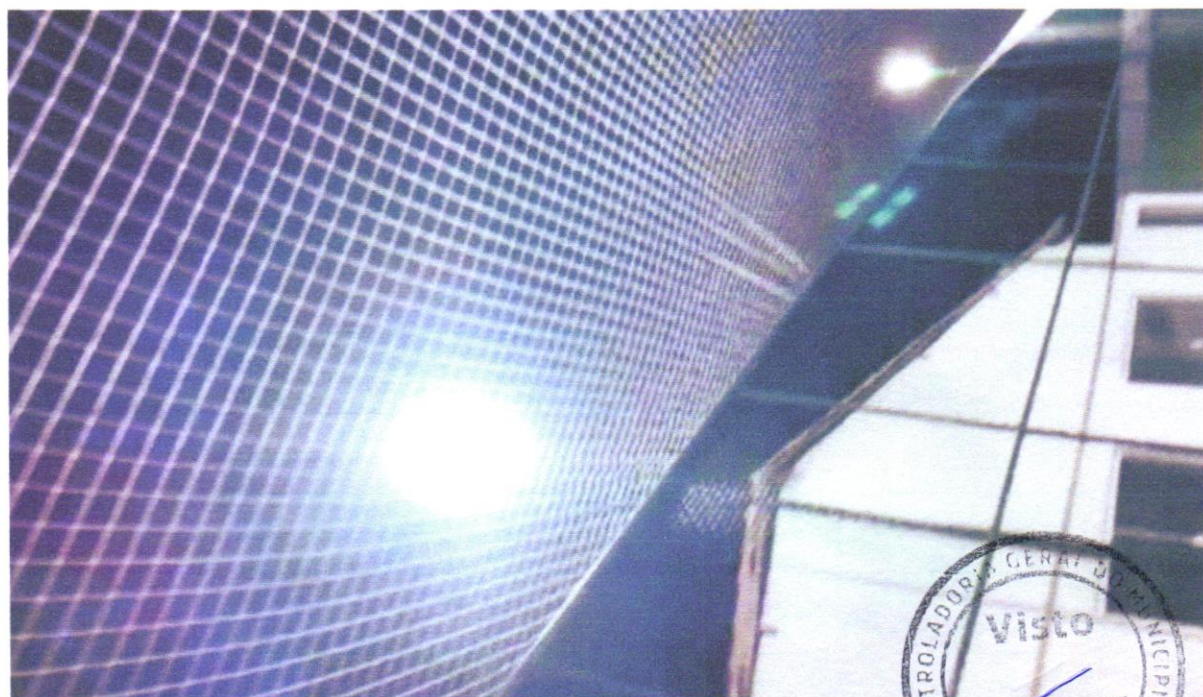



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 23 - REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR



FOTO 24 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIORES - CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MÁQUINA, TONS CLAROS (MARFIM, PÉROLA, ETC) -REV 01 (COR AZUL)





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 25 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM, 12,5 MM E 25 MM E CONCRETAGEM . AF\_12/2015.



FOTO 26 - RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE ANCORAGEM, CONFORME PROJETO.






DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

FOTO 27 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM – INSTALADO. LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM – INSTALADO.



FOTO 28 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 (ALAMBRADOS , POSTES E TRAVES).

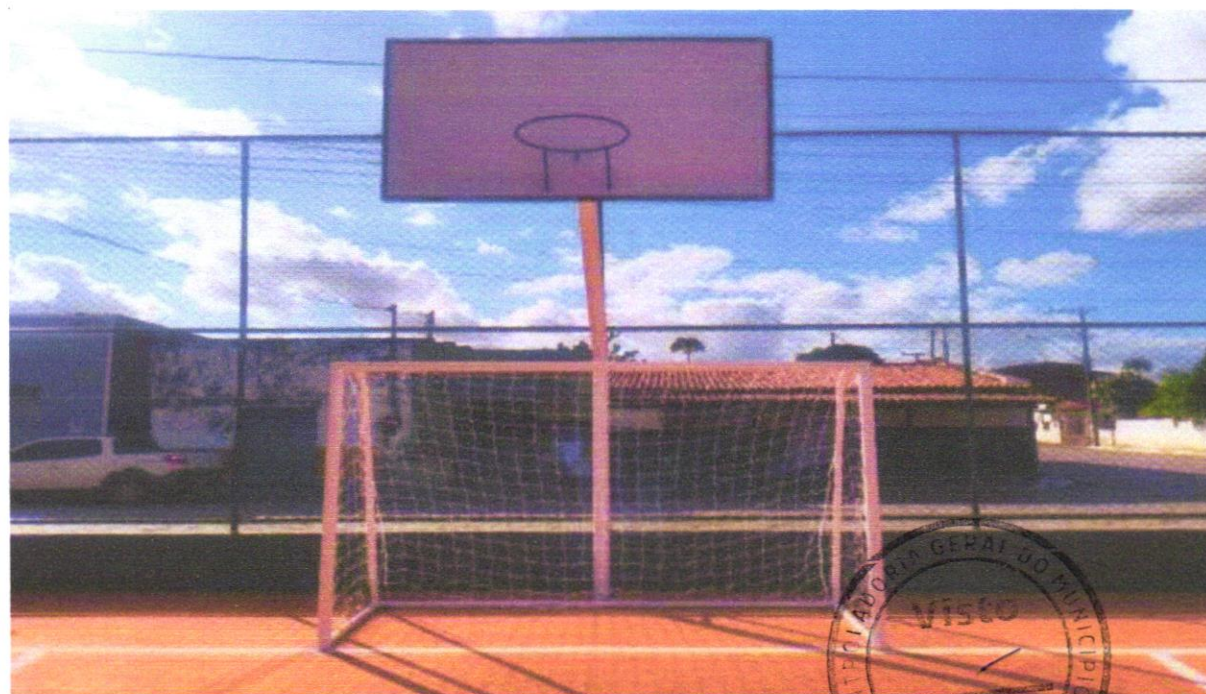



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz-Ba	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARMANDO CORREIA

FOTO 29 – LIMPEZA GERAL.



