



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 165 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2285 Data do Sub-Empenho: 02/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 08/02/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Concorrência para obras e serviços de engenhari.	003-2023CONC	6.142.048,76	1.016.151,76	5.125.897,00
Convênio:	Contrato: 176-2023			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003-2023. OBRA Nº 090/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 07. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/08/2024 À 28/08/2024. NFS-e 529.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
295.524,28	295.524,28	0.00

Data do Empenho: 08/02/2024

Data do Liquidação: 02/09/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	19.504,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.546,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	8.865,73

Duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos ##
 Valor Retido 31.916,62
 Valor Líquido 263.607,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/08/2024	529	U			295.524,28
Quantidade: 1					Total:	295.524,28

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	295.524,28

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/09/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/09/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3602786

*Documentação Conferida
 04/09/2024
 Saqueline Tralucio da Silva
 Controladora Interna
 Portaria 281/2024*

SIARC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 165 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2285 Data do Sub-Empenho: 02/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Tipo PIX: N° PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 08/02/2024

Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari.	N° Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 176-2023	6.142.048,76	1.016.151,76	5.125.897,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	295.524,28	295.524,28	0,00

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	295.524,28	295.524,28

Duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos ## 295.524,28

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/09/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/09/2024 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 29/08/2024

A EMPRESA:

MP2 CONSTRUÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO:

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2539. ED. CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING. CAMINHO DAS ÁRVORES. CEP 41820-021. SALVADOR/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Serviços comuns de Engenharia da Construção do Shopping Popular, no município de Santaluz/BA.
Processo Licitatório: Concorrência Pública nº 003/2023
Contrato: 176/2023 Processo administrativo: 094/2023 Nº da obra: 090/2023
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 529 VALOR DA NOTA: R\$ 295.524,28 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2024 A 28/08/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO
Recurso FINISA

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
0000529
 Data e Hora de Emissão:
29/08/2024 16:19:48
 Código de Verificação:
MUBF-2IS2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
 Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
 CONTRATO: 176-2023 OBRA Nº: 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023
 EM 07 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2024 a 28/08/2024
 Valor total: R\$ 295.524,28
 Valor Material 40%: R\$ 118.209,71. Base de cálculo do INSS 60%: 177.314,57 x 11% R\$: 19.504,60
 Valor do ISS 5%: R\$ 8.865,73
 Retenção IR Aliquota 1,2%: R\$ 3.546,29
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$295.524,28

CNAE

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
118.209,71	177.314,57	5,00%	8.865,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
19.504,60	0,00	0,00	3.546,29	0,00	8.865,73	263.607,66

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 30/08/2024

Evandro Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RMP 051417303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398283		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NUMERO 2539	
COMPLEMENTO: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Calculo: 177.314,56	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 8.865,73	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 8.865,73		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 02/09/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 02/09/2024 11:40:20	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº529 - DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.865,73		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETARIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.865,73		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000088 . 3

65733906202 . 5

40930010500 . 7

00039828312 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000088 . 3

65733906202 . 5

40930010500 . 7

00039828312 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398283	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 02/09/2024 11:40:20	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.865,73
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.865,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 398282	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES		NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
DOCUMENTOS		UF: BA
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 3.546,29	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor RS: 3.546,29
		Taxa Expediente R\$: 3.546,29
		Valor Total R\$: 3.546,29
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 02/09/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024
		DATA EMISSÃO: 02/09/2024 11:38:18
		DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo:	3.546,29	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 3.546,29
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto: 0,00
Valor de Base Calculo:	3.546,29	Vlr. Devido com Desconto: 3.546,29
INSTRUÇÕES:		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 3.546,29
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
3) Juros de mora de 0.33% ao dia após o vencimento.		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
4) NF-e Nº529 - Data de emissão: 29/08/2024.		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 3.546,29



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000035 . 5 46293906202 . 4 40930010100 . 6 00039828207 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000035 . 5 46293906202 . 4 40930010100 . 6 00039828207 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398282	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 02/09/2024 11:38:18	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.546,29
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.546,29





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/08/2024 a 28/08/2024
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 EMPRESA: MP2 Construções EIRELI EPP
 CNPJ: 24.502.344/0003-48
 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 295.524,28

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0037/2023
 Nº DO CONTRATO: 176/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023
 OBRA Nº: 096/2023

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Banco: SMOPI - 11/2022 - Bahia
 OFSE - 11/2022 - Smp2**

B.O.D: Enargos Sociais
 23,34% Não Descontado
 Irtf: 1,515% Mensal
 MRRF: 7,12%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. com IRRF	Valor Unit. sem IRRF	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO 07		ACUMULADO		SALDO (R\$)	EXECUTADO (%)	
										QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 292.944,20	3,64%							
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapisco galvanizado, instalada - Rev. 01/2027	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.403,60	0,04%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.403,60	R\$ 0,00	100%	
1.2	9859	SMAPI	TANQUE COM TUBO METÁLICA, AE 05/2018	m³	500,00	R\$ 135,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,09%	0,00	R\$ 0,00	500,00	R\$ 71.515,00	R\$ 0,00	100%	
1.4	9762	SMAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CIGARRADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROFIAMENTO, AE 12/2017	m³	322,90	R\$ 53,52	R\$ 66,12	R\$ 18.263,15	0,06%	0,00	R\$ 0,00	322,90	R\$ 18.263,15	R\$ 0,00	100%	
1.5	100938	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMBIO/REDE QUARTE DE 10 M³, EM VIA BRITÁNIA (RETRÓ DO CAMITEIRO - ONDEZA: MESMO), AE 07/2020	M30RE	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%	0,00	R\$ 0,00	4925,04	R\$ 45.014,82	R\$ 485,18	99%	
1.6	97644	SMAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROFIAMENTO, AE 12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,72	R\$ 74,76	R\$ 0,10	100%	
1.7	97645	SMAPI	REMOÇÃO DE AMEIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROFIAMENTO, AE 12/2017	m²	9,00	R\$ 33,39	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 371,25	R\$ 0,00	100%	
1.8	97647	SMAPI	REMOÇÃO DE TUBOS, DE BLOCO CIGARRADO, METÁLICA E CERMÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROFIAMENTO, AE 12/2017	m³	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%	0,00	R\$ 0,00	3596,13	R\$ 14.923,93	R\$ 0,00	100%	
1.9	8742	ORSE	Reparo - Recuperação de armaduras de concreto armado, incluído: Escamento e proteção com tinta Mergulmar - Rev. 01/2022	m	32,00	R\$ 53,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%	0,00	R\$ 0,00	32,00	R\$ 2.096,00	R\$ 0,00	100%	
3.10	7989	ORSE	Demolição de pavimento em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.413,13	0,53%	0,00	R\$ 0,00	3355,59	R\$ 42.413,12	R\$ 0,00	100%	
3.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev. 01	m²	3596,13	R\$ 73,58	R\$ 79,15	R\$ 104.758,77	1,04%	0,00	R\$ 0,00	3596,13	R\$ 104.758,77	R\$ 0,00	100%	
2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 331.666,23	4,12%							
2.1	96558	SMAPI	PAREDE COM PRAIAS DE GESSO ALARTONADO (DIPWALL), PARA USO INTERNO, COM DUSTACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIDS SIMPLES, 4 CM VAZOS, AE 06/2017, P5	m²	519,93	R\$ 134,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,97	0,91%	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.408,97	R\$ 0,00	0%
2.2	87403	SMAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CIGARRADOS TORÇADOS NA HORIZONTAL DE 90X20X18 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ABRA INCLINADA MAIOR OU IGUAL A 60º, 4 CM VAZOS, ARGAMASSA DE ASSIAMENTO COM PREPARO EM BITE TORÇADA, AE 06/2014	m³	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%	0,00	R\$ 0,00	2282,08	R\$ 225.971,56	R\$ 0,00	100%	
2.4	1788	ORSE	Perfuração de concreto, 3" largura - 17 cm, esp. - 2 cm	m	57,07	R\$ 306,70	R\$ 331,82	R\$ 19.027,97	0,09%	0,00	R\$ 0,00	57,07	R\$ 19.027,96	R\$ 0,01	100%	
2.5	13328	ORSE	Divisão em granito São Gabriel polido, e - 2cm, incluído: montagem com ferragens	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,08	R\$ 24.762,78	0,31%	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.762,78	R\$ 0,00	0%
3			ESQUADRIAS					R\$ 614.180,00	7,62%							
3.1	90850	SMAPI	RT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA REJE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, BRUNDA, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS: BRILHOS, DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BASTENTE, SEM TECADUBRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 12/2019 (MC PC2)	UN	1,00	R\$ 1.067,57	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,01%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.319,37	R\$ 0,00	100%	
3.2	91341	SMAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VIBRIÇA COM GUARNIÇÃO, TERAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 12/2019 (RDS WC (FIMINHO E MASCULINO))	m²	30,20	R\$ 279,64	R\$ 928,58	R\$ 9.471,52	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.471,52	R\$ 0,00	0%
3.3	90822	SMAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LIVRE OU MÉDIA), BRUNDA, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS: DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 12/2019 (MC TIBBO E ADM 1º ANO/2018)	UN	7,00	R\$ 397,74	R\$ 491,17	R\$ 3.439,50	0,04%	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 3.439,50	R\$ 0,00	100%	
3.5	17969	ORSE	Pintura em ferro, em tubo de aço galv. 7" e tela revestida 1"	m²	36,00	R\$ 409,36	R\$ 876,14	R\$ 31.548,24	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.548,24	R\$ 0,00	0%
3.6	1857	ORSE	Porta em aço, em chapisco galvanizado, m²/21, calada, de entrada	m²	991,66	R\$ 271,30	R\$ 761,04	R\$ 258.862,93	3,27%	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 258.862,93	R\$ 0,00	0%
3.7	1989	ORSE	Perfuração de concreto, 3" largura - 27 cm, esp. - 2 cm (ADM)	m	4,60	R\$ 137,60	R\$ 169,99	R\$ 781,95	0,01%	0,00	R\$ 0,00	4,60	R\$ 781,95	R\$ 0,00	100%	
3.8	100758	SMAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (SMALTE SINTÉTICO) ACETINADO APLICADA A REJO OU PINK 11 SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCELIO PINK 11) EXCETO EM OBRA (02 DE MARÇO), AE 01/2020	m²	993,66	R\$ 50,90	R\$ 62,88	R\$ 62.355,38	0,77%	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.355,38	R\$ 0,00	0%



Carolina Edson Que
 Eng. Civil - CREBA/01602570

Ar. Theodor Heves, 2359, Edif. Oly-Sinaks, 3
 CEP: 41.020-021, Salvador
 CNPJ: 20.115.999/0001-11

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Fátima C. Mendes
 CPF: 94010035-91
 Social Administradora



Item	CORS	PLANO DE ORÇAMENTO	MÉDIA		MÉDIA 07		ACUMULADO		SAÍDA		EMBUENHO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
3.9	12183	ORSE	419,72	RS 475,20	RS 587,06	RS 246.400,82	3,06%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 246.400,82
4	11890	ORSE	18,00	RS 1.713,46	RS 2.123,63	RS 42.239,60	0,53%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 42.239,60
4.1	91305	SMAPI	10,00	RS 117,07	RS 139,69	RS 1.396,90	0,07%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 1.396,90
4.3	91306	SMAPI	8,00	RS 163,65	RS 202,17	RS 1.637,36	0,07%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 1.637,36
5						RS 1.408,39	0,02%				
5.1	94670	SMAPI	5,28	RS 235,91	RS 246,74	RS 1.408,39	0,02%	0,00	RS 0,00	5,28	RS 0,01
6						RS 141.332,47	1,25%				
6.1	103980	SMAPI	4,00	RS 17,48	RS 21,59	RS 86,36	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00	RS 0,00
6.2	103993	SMAPI	4,00	RS 9,64	RS 11,91	RS 47,64	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00	RS 0,00
6.3	103999	SMAPI	1,00	RS 13,37	RS 15,28	RS 15,28	0,00%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00
6.4	94789	SMAPI	1,00	RS 240,74	RS 297,41	RS 297,41	0,00%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00
6.5	89376	SMAPI	1,00	RS 5,36	RS 6,87	RS 6,87	0,00%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00
6.6	103947	SMAPI	9,00	RS 6,36	RS 7,61	RS 68,49	0,00%	0,00	RS 0,00	9,00	RS 0,00
6.7	103977	SMAPI	9,00	RS 6,94	RS 8,57	RS 77,13	0,00%	0,00	RS 0,00	9,00	RS 0,00
6.8	103958	SMAPI	5,00	RS 9,89	RS 12,22	RS 61,10	0,00%	0,00	RS 0,00	5,00	RS 0,00
6.9	103962	SMAPI	7,00	RS 6,42	RS 7,93	RS 55,51	0,00%	0,00	RS 0,00	7,00	RS 0,00
6.10	103964	SMAPI	14,00	RS 8,15	RS 10,07	RS 140,98	0,00%	0,00	RS 0,00	14,00	RS 0,00
6.11	103969	SMAPI	1,00	RS 19,86	RS 24,54	RS 24,54	0,00%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00
6.12	103972	SMAPI	1,00	RS 29,25	RS 36,14	RS 36,14	0,00%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00
6.13	90373	SMAPI	16,00	RS 13,05	RS 16,12	RS 257,92	0,00%	0,00	RS 0,00	16,00	RS 0,00
6.14	89358	SMAPI	175,00	RS 7,78	RS 9,61	RS 1.681,75	0,02%	0,00	RS 0,00	175,00	RS 0,00
6.15	89408	SMAPI	92,00	RS 8,46	RS 10,45	RS 961,40	0,01%	0,00	RS 0,00	92,00	RS 0,00
6.16	89367	SMAPI	8,00	RS 13,86	RS 15,89	RS 127,17	0,00%	0,00	RS 0,00	8,00	RS 0,00
6.17	89413	SMAPI	8,00	RS 11,93	RS 14,74	RS 117,93	0,00%	0,00	RS 0,00	8,00	RS 0,00
6.18	103980	SMAPI	1,00	RS 17,48	RS 21,59	RS 21,59	0,00%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00



Carulla Fidejuss. Orc.
Reg. Conf. ORÇAM.01/007370

Ar. Theodoro Bore, 2339, Ede. Coo. Datas
CEP: 41.800-171
CEP: 20.035-9994

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fabrica C. Mendonça
Rua 11
Cidade Administrativa



6.19		6.20		6.21		6.22		6.23		6.24		6.25		6.26		6.27		6.28		6.29		6.30		6.31		6.32		6.33		6.34		6.35		6.36		6.37		6.38		6.39		6.40		6.41			
SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI		SMAPI			
UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN		UN	
R\$ 19,23		R\$ 105,84		R\$ 20,62		R\$ 19,23		R\$ 10,74		R\$ 14,92		R\$ 21,59		R\$ 16,45		R\$ 5,86		R\$ 5,40		R\$ 32,19		R\$ 60,36		R\$ 10,80		R\$ 12,75		R\$ 17,98		R\$ 25,07		R\$ 44,73		R\$ 25,28		R\$ 14,68		R\$ 17,91		R\$ 18,73		R\$ 23,86		R\$ 20,13			
7,00		4,00		7,00		4,00		4,00		17,00		4,00		71,00		1,00		1,00		2,00		1,00		23,00		23,00		5,00		70,00		4,00		2,00		9,00		5,00		2,00		22,00		1,00			
0,00%		0,01%		0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,01%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,01%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,01%		0,00%		0,00%					
R\$ 146,32		R\$ 523,00		R\$ 1.875,90		R\$ 95,04		R\$ 53,08		R\$ 313,31		R\$ 106,68		R\$ 426,72		R\$ 7,23		R\$ 6,67		R\$ 79,54		R\$ 74,57		R\$ 306,82		R\$ 362,25		R\$ 111,05		R\$ 619,40		R\$ 271,00		R\$ 72,34		R\$ 163,26		R\$ 110,65		R\$ 46,28		R\$ 594,22		R\$ 24,84			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
7,00		4,00		7,00		4,00		4,00		17,00		4,00		21,00		1,00		1,00		2,00		1,00		23,00		23,00		5,00		70,00		4,00		2,00		9,00		5,00		2,00		22,00		1,00			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Camila Roberto Que
Cadastrada
Emp. Com. 032494101003579

Ar. Tereza de Jesus, 2590, Jd. Our. (Bela Vista, Torre Leão)
Cidade de Almeida Moraes, MG
CEP: 31.155-990/000155

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Felipe S. Machado
CPF: 030403005701
Sociedade Administrativa



PLANEJA ORÇAMENTARIA		MEDICÃO 07										ACUMULADO		EXERCÍCIO			
CD	UN	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	00%	01%	02%	03%	04%	05%	06%	07%	08%	09%	10%
6.42	89626	SIBA71	UN	2,00	RS 30,25	RS 37,37	RS 74,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.43	89630	SIBA71	UN	2,00	RS 64,76	RS 76,30	RS 152,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.44	89596	SIBA71	UN	3,00	RS 20,62	RS 25,47	RS 76,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.45	89194	SIBA71	UN	8,00	RS 18,82	RS 23,25	RS 186,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.46	89355	SIBA71	M	406,00	RS 20,70	RS 24,96	RS 10.632,96	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.47	89356	SIBA71	M	782,00	RS 23,78	RS 28,76	RS 8.110,32	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.48	89357	SIBA71	M	54,00	RS 32,76	RS 39,85	RS 2.151,90	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.49	89448	SIBA71	M	66,00	RS 13,23	RS 23,29	RS 1.805,14	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.50	89449	SIBA71	M	738,00	RS 19,05	RS 23,53	RS 5.600,14	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.51	89451	SIBA71	M	64,00	RS 49,79	RS 61,51	RS 3.690,60	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.52	89375	SIBA71	UN	1,80	RS 12,14	RS 15,00	RS 15,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.54	100838	SIBA71	UN	5,00	RS 680,82	RS 341,09	RS 4.205,45	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.55	103038	SIBA71	UN	13,00	RS 282,65	RS 355,36	RS 4.619,68	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.58	88887	SIBA71	UN	106,00	RS 21,76	RS 76,88	RS 2.849,28	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.59	88886	SIBA71	UN	34,00	RS 40,50	RS 50,83	RS 1.701,02	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.60	108075	SIBA71	UN	1,80	RS 52,76	RS 64,56	RS 64,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.61	103038	SIBA71	UN	4,80	RS 282,65	RS 355,36	RS 1.421,44	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.62	88877	SIBA71	UN	19,00	RS 54,41	RS 67,22	RS 1.277,18	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.63	88878	SIBA71	UN	64,00	RS 58,54	RS 72,13	RS 4.628,48	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.66	94793	SIBA71	UN	4,80	RS 152,81	RS 188,78	RS 755,12	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.67	94699	SIBA71	UN	1,80	RS 282,67	RS 348,47	RS 348,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.68	89987	SIBA71	UN	4,80	RS 91,59	RS 113,15	RS 432,60	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.69	103043	SIBA71	UN	1,80	RS 79,15	RS 36,01	RS 36,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.70	94792	SIBA71	UN	4,80	RS 113,58	RS 137,85	RS 551,40	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.71	94793	SIBA71	UN	4,80	RS 152,81	RS 188,78	RS 755,12	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.72	89986	SIBA71	UN	63,00	RS 80,55	RS 99,51	RS 6.269,13	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.73	89987	SIBA71	UN	59,00	RS 91,59	RS 113,15	RS 6.675,85	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Carla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/SC 0160257/0

Ar. Tereza Borelli, 2339, Edif. Coo. Saneat. Três Lanch.
CEP: 41.020-021, Itaboraia
CNPJ: 20.155.999/0001-55

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fátima C. Mendes
CPF: 9040202-01
Socia Administradora



Item	Descrição	Quantidade	FAMÍLIA ORÇAMENTÁRIA										MÉDIA 07	ACUMULADO	SALDO	EXECUTADO
			UN	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS				
6.74	ADAPTADOR COM TUBO LAMELI DE VIDUAÇÃO PVC, SODAVI, DN 40 MM X 3 1/8". INSTALADO EM RESERVOIRIO DE AGUA DE FORNECIMENTO POSSUI RESERVOIRIO DE TUBO/BERCONE DE TUBO FORNECIMENTO E INSTALADO. AT 08/2020.	4,00	UN	RS 38,13	RS 47,11	RS 188,44	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 188,44	0%	
6.75	BARRA DE APOIO DE TUBO EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, ERADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALADO. AT 01/2020	2,00	UN	RS 324,97	RS 401,47	RS 802,94	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 802,94	0%	
6.77	PROTEÇÃO PARA PICO, FERRO NA PORTA. FORNECIMENTO E INSTALADO. AT 01/2020	1,00	UN	RS 374,97	RS 401,47	RS 401,47	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 401,47	0%	
6.79	BANDEIRA BRANCA, 50 X 60 CM, INCL. CURVA DE TUBULÃO OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL PROMADO, SÉRIO FUJITSU PVC, ERGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA COMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNHEC. E INSTALADO. AT 01/2020	4,00	UN	RS 599,23	RS 740,29	RS 5.922,32	0,07%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 5.922,32	0%	
6.80	VASO SANITÁRIO SEMICOMBO COM CARGA ACOPADA LOUCA BRANCA, INCLUIDO ERGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALADO. AT 01/2020	11,00	UN	RS 471,68	RS 582,71	RS 6.409,81	0,08%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 6.409,81	0%	
6.80	Plq de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 03 cuba, vidro cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e apoiada. Rev 01	48,00	un	RS 790,22	RS 976,74	RS 46.859,52	0,58%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 46.859,52	0%	
6.81	VASO SANITÁRIO SEMICOMBO CONVENCIONAL PARA PCD SEM TUBO FRONTAL COM TUBO BRANCA SEM ASSIENTO INCLUIDO CONJUNTO DE REGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ADJUSTÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALADO. AT 01/2020	1,00	UN	RS 725,28	RS 896,01	RS 896,01	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 896,01	0%	
6.82	Apoio plástico, antevered, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	11,00	un	RS 51,51	RS 61,64	RS 700,04	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 700,04	0%	
7	ESGOTO					RS 94.288,71	1,17%									
7.1	REDE DE DRENAÇÃO, CURVA PVC, SODAVI, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALADO. AT 08/2022	22,00	UN	RS 13,03	RS 16,10	RS 354,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	22,00	354,20	RS 0,00	100%	
7.2	CAIXA DE CUMPRIDA BRITA (CAPACIDADE 12x11) BI-TANGENTE EM APOIO BRANCO COM TUBOS, C/ BARRAS METÁLICAS, DIMENSÕES: 100x70x40. ALTURA INTERNA - 0,85M. AT 12/2020	16,00	UN	RS 633,39	RS 782,49	RS 12.519,84	0,16%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	16,00	12.519,84	RS 0,00	100%	
7.3	CAIXA LUTADA (DISTRIBUIDORA DE VÁZIO) SUBMERCIORES (MÚLTIPLOS), METÁLICA, EM ALUMÍNIO COM TUBOS METÁLICOS, DIMENSÕES: 100x60x60 (LxLxAl). AT 12/2020	17,00	UN	RS 549,26	RS 679,30	RS 11.548,10	0,14%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	17,00	11.548,10	RS 0,00	100%	
7.4	CANOTE FLEXÍVEL (TUBO) DE 200x100x100, EM ALUMÍNIO COM TUBOS METÁLICOS, DIMENSÕES: 0,8 X 0,8 X 1,00M, EXCLUIDO ERGATE. AT 12/2022	11,00	UN	RS 1.517,23	RS 1.844,95	RS 17.784,45	0,22%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	11,00	17.784,45	RS 0,00	100%	
7.5	ERGATE SODAVI, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, BARRAS 11x53X4, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	49,00	UN	RS 43,34	RS 53,79	RS 2.635,71	0,03%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	49,00	2.635,71	RS 0,00	100%	
7.6	CARGA SODAVI, COM GELULA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, BARRAS SODAVI, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	15,00	UN	RS 68,77	RS 84,96	RS 1.274,40	0,02%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	15,00	1.274,40	RS 0,00	100%	
7.7	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, OCHE, BARRAS ELÁSTICA, DN 100 MM, PAISA COE TUBO PRELIMINAR DE ESGOTO. AT 08/2022	1,00	UN	RS 73,78	RS 91,15	RS 91,15	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	1,00	91,15	RS 0,00	100%	
7.8	Curva 45º longa em PVC rígido soldável, diam = 100mm Rev. 01 10/2022	1,00	un	RS 57,75	RS 71,14	RS 71,14	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	1,00	71,14	RS 0,00	100%	
7.9	Curva 45º longa em PVC rígido c/ anéis, diam = 50mm Rev 01 10/2022	15,00	un	RS 14,52	RS 17,94	RS 269,10	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	15,00	269,10	RS 0,00	100%	
7.10	Curva 45º longa em PVC rígido c/ anéis, diam = 75mm Rev. 01 10/2022	1,00	un	RS 38,28	RS 34,94	RS 34,94	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	1,00	34,94	RS 0,00	100%	
7.11	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, BARRAS SODAVI, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	79,00	UN	RS 12,89	RS 15,92	RS 1.257,68	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	79,00	1.257,68	RS 0,00	100%	
7.12	BOHEHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, BARRAS ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉRIO DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	3,00	UN	RS 32,48	RS 40,13	RS 120,39	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	3,00	120,39	RS 0,00	100%	
7.13	BOHEHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, BARRAS ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	12,00	UN	RS 10,22	RS 12,63	RS 151,56	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	12,00	151,56	RS 0,00	100%	
7.14	BOHEHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, BARRAS ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	14,00	UN	RS 13,05	RS 19,11	RS 270,62	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	14,00	270,62	RS 0,00	100%	
7.15	BOHEHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, BARRAS ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AT 08/2022	8,00	UN	RS 21,69	RS 26,40	RS 214,40	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	8,00	214,40	RS 0,00	100%	
7.16	BOHEHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, BARRAS SODAVI, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	22,00	UN	RS 9,99	RS 12,54	RS 277,48	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	22,00	277,48	RS 0,00	100%	
7.17	BOHEHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, BARRAS ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AT 08/2022	54,00	UN	RS 14,93	RS 18,44	RS 995,76	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	54,00	995,76	RS 0,00	100%	



Av. Tenente Feres, 2759, Edif. Coo. Sbrade, 7
CEP - 41.020-01 - Sabará
CNPJ: 20.135.999/0001

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fátima C. Múdice
CPF: 9040.8075-94
Banco Administrativo

Carla Isabelino-Oliveira
Eng. Civil - CRÉDITO 016025570



Z.B	SINAPI	FAMÍLIA ORÇAMENTÁRIA	UN	MEDIÇÃO D7										ACUMULADO	SALDO	EXECUTADO
				7,00	RS 22,63	RS 27,96	RS 55,92	0,00%	0,00	RS 0,00	2,00	RS 0,00	55,92			
7.19	ORSE	BOLO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	un	5,00	RS 15,79	RS 19,51	RS 1.112,07	0,01%	0,00	RS 0,00	5,00	RS 0,00	1.112,07	RS 0,00	100%	
7.20	SINAPI	BOLO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOTECTOR ALREDO DO RAMAL DE SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	19,00	RS 33,65	RS 39,10	RS 742,90	0,01%	0,00	RS 0,00	19,00	RS 0,00	742,90	RS 0,00	100%	
7.23	SINAPI	BOLO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	4,00	RS 14,91	RS 18,44	RS 73,76	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00	RS 0,00	73,76	RS 0,00	100%	
7.22	ORSE	brachos simples em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 5mm	un	15,00	RS 49,75	RS 60,84	RS 912,60	0,01%	0,00	RS 0,00	15,00	RS 0,00	912,60	RS 0,00	100%	
7.23	SINAPI	BOLO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA FÚVIA, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AT. 06/2022	UN	3,00	RS 78,99	RS 97,58	RS 292,74	0,00%	0,00	RS 0,00	3,00	RS 0,00	292,74	RS 0,00	100%	
7.24	SINAPI	BOLO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	7,00	RS 26,54	RS 32,79	RS 229,55	0,00%	0,00	RS 0,00	7,00	RS 0,00	229,55	RS 0,00	100%	
7.25	ORSE	brachos simples em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	15,00	RS 29,45	RS 36,38	RS 545,70	0,01%	0,00	RS 0,00	15,00	RS 0,00	545,70	RS 0,00	100%	
7.26	SINAPI	BOLO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	26,00	RS 10,87	RS 27,78	RS 670,28	0,01%	0,00	RS 0,00	26,00	RS 0,00	670,28	RS 0,00	100%	
7.27	SINAPI	BASE PARA PÓCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALUMINUM COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 130 X 130, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPA, AT. 12/2020 PA	UN	1,00	RS 3.222,48	RS 3.222,48	RS 3.222,48	0,04%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00	3.222,48	RS 0,00	100%	
7.28	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO INTERIO = 60 CM, AT. 12/2020	UN	1,00	RS 782,78	RS 942,34	RS 942,34	0,01%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00	942,34	RS 0,00	100%	
7.29	SINAPI	REDUÇÃO CENTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA FÚVIA, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AT. 08/2022	UN	16,00	RS 19,11	RS 23,01	RS 317,76	0,00%	0,00	RS 0,00	16,00	RS 0,00	317,76	RS 0,00	100%	
7.30	ORSE	Redução executada em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	RS 22,94	RS 28,34	RS 56,68	0,00%	0,00	RS 0,00	2,00	RS 0,00	56,68	RS 0,00	100%	
7.31	SINAPI	REDUÇÃO CENTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA FÚVIA, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AT. 08/2022	UN	1,00	RS 31,62	RS 39,06	RS 39,06	0,00%	0,00	RS 0,00	1,00	RS 0,00	39,06	RS 0,00	100%	
7.32	SINAPI	Tubo PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	28,00	RS 40,74	RS 50,33	RS 1.409,24	0,02%	0,00	RS 0,00	28,00	RS 0,00	1.409,24	RS 0,00	100%	
7.33	SINAPI	Tubo PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	28,00	RS 24,71	RS 29,91	RS 837,48	0,01%	0,00	RS 0,00	28,00	RS 0,00	837,48	RS 0,00	100%	
7.34	ORSE	Tubo sanitário em PVC rígido de amês, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	4,00	RS 30,90	RS 38,17	RS 152,68	0,00%	0,00	RS 0,00	4,00	RS 0,00	152,68	RS 0,00	100%	
7.35	SINAPI	Tubo PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOTECTOR ALREDO DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	M	294,00	RS 27,32	RS 33,75	RS 9.922,50	0,12%	0,00	RS 0,00	294,00	RS 0,00	9.922,50	RS 0,00	100%	
7.36	SINAPI	Tubo PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	M	78,00	RS 56,10	RS 69,31	RS 5.406,18	0,07%	0,00	RS 0,00	78,00	RS 0,00	5.406,18	RS 0,00	100%	
7.37	SINAPI	Tubo PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	M	72,00	RS 21,09	RS 26,45	RS 1.875,60	0,02%	0,00	RS 0,00	72,00	RS 0,00	1.875,60	RS 0,00	100%	
7.38	SINAPI	Tubo PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	M	396,00	RS 26,78	RS 33,08	RS 13.099,68	0,16%	0,00	RS 0,00	396,00	RS 0,00	13.099,68	RS 0,00	100%	
7.39	SINAPI	Tubo PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	M	67,00	RS 33,37	RS 41,23	RS 2.782,41	0,03%	0,00	RS 0,00	67,00	RS 0,00	2.782,41	RS 0,00	100%	
8.1	ORSE	ÁGUAS PLUVIAIS	un	17,00	RS 1.202,28	RS 1.403,56	RS 27.760,52	0,34%	0,00	RS 0,00	17,00	RS 0,00	27.760,52	RS 0,00	100%	
8.2	ORSE	Casa de Descarga Tipo 1 - Dimensões: 0,80x0,80x1,00m	un	2,00	RS 4.045,41	RS 8.445,41	RS 16.891,62	0,21%	0,00	RS 0,00	2,00	RS 0,00	16.891,62	RS 0,00	100%	
8.3	SINAPI	RAIO 90 GRAUS, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA VEDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	10,00	RS 18,54	RS 22,90	RS 229,00	0,00%	0,00	RS 0,00	10,00	RS 0,00	229,00	RS 0,00	0%	
8.4	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, DN 150 MM, JUNTA VEDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT. 08/2022	UN	6,00	RS 180,33	RS 222,78	RS 1.336,68	0,02%	0,00	RS 0,00	6,00	RS 0,00	1.336,68	RS 0,00	100%	
8.5	SINAPI	CONECTOR PREDIAL DE ESGOTO, AT. 06/2022	UN	12,00	RS 1,99,33	RS 1,99,33	RS 1,914,36	0,02%	0,00	RS 0,00	12,00	RS 0,00	1,914,36	RS 0,00	100%	





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		MEDICÇÃO 07		ACUMULADO		SALDO EXECUCIONADO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR SALDO
8.6	81535	SINAPI	4,00	R\$ 609,30	R\$ 2.437,20	R\$ 2.437,20	R\$ 0,00
8.7	1709	ORSE	8,00	R\$ 86,64	R\$ 693,12	R\$ 693,12	R\$ 0,00
8.8	100166	SINAPI	180,00	R\$ 73,51	R\$ 13.231,80	R\$ 13.231,80	R\$ 0,00
8.9	90696	SINAPI	144,00	R\$ 147,34	R\$ 21.216,96	R\$ 21.216,96	R\$ 0,00
8.10	90697	SINAPI	48,00	R\$ 277,63	R\$ 13.386,04	R\$ 13.386,04	R\$ 0,00
8.11	6319	ORSE	24,00	R\$ 373,33	R\$ 8.959,92	R\$ 8.959,92	R\$ 0,00
8.12	7113	ORSE	66,00	R\$ 528,89	R\$ 34.916,74	R\$ 34.916,74	R\$ 0,00
8.13	90699	SINAPI	18,00	R\$ 407,35	R\$ 7.332,30	R\$ 7.332,30	R\$ 0,00
8.14	9276	ORSE	18,00	R\$ 521,10	R\$ 9.379,80	R\$ 9.379,80	R\$ 0,00
9							
9.1	12018	ORSE	169,00	R\$ 279,64	R\$ 47.158,96	R\$ 47.158,96	R\$ 0,00
9.2	12017	ORSE	30,00	R\$ 279,64	R\$ 8.389,20	R\$ 8.389,20	R\$ 0,00
9.3	7883	ORSE	10,00	R\$ 230,76	R\$ 2.307,60	R\$ 2.307,60	R\$ 0,00
9.4	11820	ORSE	1,00	R\$ 5.507,26	R\$ 5.507,26	R\$ 5.507,26	R\$ 0,00
9.5	8093	ORSE	1,00	R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ 0,00
9.6	11829	ORSE	10,00	R\$ 152,57	R\$ 1.525,70	R\$ 1.525,70	R\$ 0,00
9.7	650	ORSE	27,00	R\$ 70,35	R\$ 1.900,45	R\$ 1.900,45	R\$ 0,00
9.8	4178	ORSE	4,00	R\$ 138	R\$ 552,00	R\$ 552,00	R\$ 0,00
9.9	9975	ORSE	629,00	R\$ 5,98	R\$ 3.761,42	R\$ 3.761,42	R\$ 0,00
9.10	10277	ORSE	58,00	R\$ 5,85	R\$ 339,30	R\$ 339,30	R\$ 0,00
9.11	91880	SINAPI	1,00	R\$ 9,92	R\$ 9,92	R\$ 9,92	R\$ 0,00
9.12	91887	SINAPI	123,00	R\$ 7,92	R\$ 974,16	R\$ 974,16	R\$ 0,00
9.13	91884	SINAPI	22,00	R\$ 9,06	R\$ 199,32	R\$ 199,32	R\$ 0,00
9.14	91857	SINAPI	18,00	R\$ 13,39	R\$ 241,02	R\$ 241,02	R\$ 0,00
9.15	91853	SINAPI	783,00	R\$ 9,18	R\$ 7.185,54	R\$ 7.185,54	R\$ 0,00
9.16	91855	SINAPI	120,00	R\$ 10,87	R\$ 1.304,40	R\$ 1.304,40	R\$ 0,00
9.17	95280	SINAPI	5,00	R\$ 31,74	R\$ 158,70	R\$ 158,70	R\$ 0,00
9.18	95778	SINAPI	40,00	R\$ 29,44	R\$ 1.177,60	R\$ 1.177,60	R\$ 0,00
9.19	72861/00	SINAPI	200,00	R\$ 31,71	R\$ 6.342,00	R\$ 6.342,00	R\$ 0,00
9.23	649	ORSE	4.000,00	R\$ 5,80	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 0,00
10							
10.1	94473	SINAPI	14,00	R\$ 107,75	R\$ 1.508,50	R\$ 1.508,50	R\$ 0,00
10.2	8012	ORSE	1,00	R\$ 67,08	R\$ 67,08	R\$ 67,08	R\$ 0,00
10.3	72803	SINAPI	1,00	R\$ 228,30	R\$ 228,30	R\$ 228,30	R\$ 0,00
10.4	82633	SINAPI	1,00	R\$ 1.326,41	R\$ 1.326,41	R\$ 1.326,41	R\$ 0,00






		PLANILHA ORÇAMENTARIA										ACUMULADO		LÍQUIDO	
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total		
10.5	9/278	SINAPI	1,00	R\$ 115,91	R\$ 115,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,91	0%		
10.6	9/277	SINAPI	1,00	R\$ 104,53	R\$ 104,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,53	0%		
10.7	1517	ORSE	4,00	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,60	0%		
10.8	7643	ORSE	4,00	R\$ 259,88	R\$ 1.039,52	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039,52	0%		
10.9	12981	ORSE	1,00	R\$ 2.273,82	R\$ 2.273,82	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.273,82	0%		
10.10	1517	ORSE	4,00	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,60	0%		
10.11	12706	ORSE	4,00	R\$ 233,06	R\$ 932,24	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 932,24	0%		
10.12	1517	ORSE	4,00	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,60	0%		
10.13	1024	ORSE	4,00	R\$ 15,77	R\$ 63,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,08	0%		
10.14	1515	ORSE	4,00	R\$ 5.726,56	R\$ 22.906,24	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.906,24	0%		
10.15	7287	ORSE	4,00	R\$ 64,18	R\$ 256,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,72	0%		
10.16	1510	ORSE	4,00	R\$ 302,58	R\$ 1.210,32	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,32	0%		
10.17	11894	ORSE	1,00	R\$ 1.109,53	R\$ 1.109,53	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,53	0%		
10.18	101798	SINAPI	1,00	R\$ 499,69	R\$ 499,69	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,69	0%		
10.19	10896	ORSE	1,00	R\$ 166,95	R\$ 166,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,95	0%		
10.20	97435	SINAPI	1,00	R\$ 252,66	R\$ 252,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,66	0%		
10.21	12885	ORSE	1,00	R\$ 438,32	R\$ 438,32	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,32	0%		
10.22	99624	SINAPI	1,00	R\$ 569,78	R\$ 569,78	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,78	0%		
11				R\$ 13.374,85	R\$ 13.374,85	0,12%									
11.1	12886	ORSE	10,00	R\$ 25,60	R\$ 256,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,00	0%		
11.2	12915	ORSE	10,00	R\$ 1.646,50	R\$ 16.465,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.465,00	0%		
11.3	12718	ORSE	10,00	R\$ 271,80	R\$ 2.718,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.718,00	0%		
11.4	12885	ORSE	4,00	R\$ 102,40	R\$ 409,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,60	0%		
11.5	12885	ORSE	2,00	R\$ 51,20	R\$ 102,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,40	0%		
11.6	12884	ORSE	10,00	R\$ 285,90	R\$ 2.859,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.859,00	0%		
11.7	12894	ORSE	2,00	R\$ 39,70	R\$ 79,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,40	0%		
11.8	12889	ORSE	2,00	R\$ 43,02	R\$ 86,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,04	0%		
11.9	11866	ORSE	10,00	R\$ 2.604,80	R\$ 26.048,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.048,00	0%		
11.10	1511	ORSE	6,00	R\$ 1.886,58	R\$ 11.319,48	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.319,48	0%		
11.11	1503	ORSE	5,00	R\$ 1.889,50	R\$ 9.447,50	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.447,50	0%		
11.12	1504	ORSE	5,00	R\$ 4.091,05	R\$ 20.455,25	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.455,25	0%		
12				R\$ 35.313,18	R\$ 35.313,18	0,31%									
12.1	12738	ORSE	3054,00	R\$ 0,56	R\$ 1.709,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.709,76	0%		
12.2	12559	ORSE	6,29,00	R\$ 2,11	R\$ 13,27	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,27	0%		
12.3	12559	ORSE	6,29,00	R\$ 2,11	R\$ 13,27	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,27	0%		
12.4	9833	ORSE	888,00	R\$ 0,39	R\$ 345,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,12	0%		
12.5	12545	ORSE	379,38	R\$ 1,71	R\$ 648,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 648,75	0%		






		PLANILHA ORÇAMENTARIA										MEDIÇÃO 07		ACUMULADO		SALDO		REQUISITADO		
12.6	101548	SINAPI	40,00	RS 112,80	RS 139,38	RS 5.525,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 5.525,20	0%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 1,20 MM ² , 50x1,0 V, PARA FIDEL ATERRA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA LITRICA DE BANDA LARGA - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.7	91514	SINAPI	3170,00	RS 21,50	RS 26,67	RS 31.203,50	0,30%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 31.203,50	0%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 16 MM ² , ABTI CHAMADA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.8	91925	SINAPI	6500,00	RS 3,31	RS 4,09	RS 26.585,00	0,33%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 26.585,00	0%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 1,5 MM ² , ABTI CHAMADA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.9	91931	SINAPI	46500,00	RS 9,08	RS 11,22	RS 519.488,00	6,45%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 519.488,00	0%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 6 MM ² , ABTI CHAMADA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.10	10620	ORSE	12,00	RS 4,54	RS 5,63	RS 67,32	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 67,32	0%						
Parafuso com bucha 5,8																				
12.11	91927	SINAPI	7100,00	RS 4,42	RS 5,46	RS 38.766,00	0,48%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 38.766,00	0%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 2,5 MM ² , ABTI CHAMADA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.12	91929	SINAPI	700,00	RS 6,46	RS 7,98	RS 5.588,00	0,07%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 5.588,00	0%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 4 MM ² , ABTI CHAMADA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.13	10092	ORSE	360,00	RS 0,14	RS 0,17	RS 61,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 61,20	0%						
Parafuso com bucha 5,6 (homocentrisado)																				
12.14	97897	SINAPI	10,00	RS 367,50	RS 454,01	RS 4.540,10	0,06%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 4.540,10	0%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 1,5 MM ² , ABTI CHAMADA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.15	97868	SINAPI	889,00	RS 14,75	RS 18,22	RS 16.197,58	0,20%	0,00	RS 4.864,74	889,00	16.197,58	0,00	RS 0,00	100%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 1,0 A, padrao DIN (linha branca) curva de disparo 5, corrente de interrupcao 50A, rel.; Siemens 5 SX1 ou similar.																				
12.16	91917	SINAPI	10,00	RS 10,92	RS 13,49	RS 134,90	0,00%	0,00	RS 134,90	10,00	134,90	0,00	RS 0,00	100%						
CABO DE COBRE FLEXIVEL BONDADO 2,5 MM ² , ABTI CHAMADA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNHECIMENTO E INSTALACAO, AT 12/2015																				
12.17	4185	ORSE	2,00	RS 475,20	RS 582,19	RS 1.174,38	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1.174,38	0%						
Cabo de alumínio 40x40x12cm, homocentrisado																				
12.18	8633	ORSE	12,00	RS 17,84	RS 22,04	RS 264,48	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 264,48	0%						
Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrao DIN (linha branca) curva de disparo 5, corrente de interrupcao 50A, rel.; Siemens 5 SX1 ou similar.																				
12.19	8635	ORSE	342,00	RS 17,44	RS 22,04	RS 7.537,68	0,09%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 7.537,68	0%						
Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrao DIN (linha branca) curva de disparo 5, corrente de interrupcao 50A, rel.; Siemens 5 SX1 ou similar.																				
12.20	9518	ORSE	3,00	RS 19,28	RS 23,82	RS 71,46	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 71,46	0%						
Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrao DIN (linha branca) curva de disparo 5, corrente de interrupcao 50A, rel.; Siemens 5 SX1 ou similar.																				
12.21	10313	ORSE	306,00	RS 21,01	RS 25,56	RS 7.843,76	0,10%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 7.843,76	0%						
Disjuntor termomagnético monopolar 37 A, padrao DIN (Europa - linha branca)																				
12.22	452	ORSE	28,00	RS 116,62	RS 144,07	RS 4.033,96	0,05%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 4.033,96	0%						
Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrao DIN (Europa - linha branca)																				
12.23	8894	ORSE	280,00	RS 64,27	RS 79,40	RS 22.322,00	0,28%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 22.322,00	0%						
Dispositivo de protecao contra surto de tensao DPS 40KA, 175kV, curva C																				
12.24	11558	ORSE	1,00	RS 27.050,00	RS 2.514,78	RS 2.514,78	0,03%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 2.514,78	0%						
Disjuntor termomagnético tripolar 300 A, padrao DIN (Europa - linha branca)																				
12.25	7996	ORSE	155,00	RS 105,04	RS 203,89	RS 31.195,17	0,39%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 31.195,17	0%						
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref. SMI317.080, Siemens com similar																				
12.26	17968	ORSE	74,00	RS 15,97	RS 24,67	RS 1.825,58	0,02%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1.825,58	0%						
Suporte vertical 200 x 100 mm para fixacao de eletrodutos metalicos (ref.: Mapa ou similar)																				
12.27	12574	ORSE	19,00	RS 29,36	RS 36,27	RS 689,13	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 689,13	0%						
Suporte vertical 200 x 150 mm para fixacao de eletrodutos metalicos (ref.: Mapa ou similar)																				
12.28	7879	ORSE	113,00	RS 14,37	RS 17,75	RS 2.005,75	0,02%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 2.005,75	0%						
Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacao de eletrodutos metalicos (ref.: Mapa ou similar)																				
12.29	7881	ORSE	96,00	RS 13,34	RS 16,53	RS 1.586,88	0,02%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1.586,88	0%						
Suporte vertical 50 x 50mm para fixacao de eletrodutos metalicos (ref.: Mapa ou similar)																				
12.30	12573	ORSE	17,00	RS 22,69	RS 28,03	RS 476,51	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 476,51	0%						
Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixacao de eletrodutos metalicos (ref.: Mapa ou similar)																				
12.30	9519	ORSE	82,00	RS 5,29	RS 7,25	RS 602,70	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 602,70	0%						
Tubo de aluminio perfilado 100mm para eletrodutos metalicos (ref.: mapa ou similar)																				
12.32	9524	ORSE	140,00	RS 5,20	RS 6,42	RS 898,80	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 898,80	0%						
Tubo de aluminio perfilado 50mm para eletrodutos metalicos (ref.: mapa ou similar)																				
12.33	782	ORSE	210,00	RS 38,14	RS 47,12	RS 9.895,20	0,12%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 9.895,20	0%						
Terminacao e instalacao de eletrodutos perfilado 100 x 50 x 8000 mm (ref. Mapa ou similar)																				
12.34	4533	ORSE	33,00	RS 141,30	RS 174,56	RS 5.760,48	0,07%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 5.760,48	0%						
Terminacao e instalacao de eletrodutos perfilado 200 x 50 x 8000 mm (ref. Mapa ou similar)																				
12.35	3299	ORSE	39,00	RS 83,30	RS 102,91	RS 4.013,49	0,05%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 4.013,49	0%						
Terminacao e instalacao de eletrodutos perfilado 200 x 75 x 8000 mm (ref. Mapa ou similar)																				
12.36	785	ORSE	186,00	RS 62,39	RS 77,08	RS 14.336,88	0,18%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 14.336,88	0%						
Terminacao e instalacao de eletrodutos metalicos 50 x 50 x 1000 mm (ref. Mapa ou similar)																				
12.38	12600	ORSE	210,00	RS 48,53	RS 59,95	RS 12.589,50	0,16%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 12.589,50	0%						
Tubo de aluminio 100 x 3000 mm, rimada, para eletrodutos metalicos (ref.: Mapa ou similar)																				
12.39	12580	ORSE	33,00	RS 25,33	RS 31,29	RS 1.072,57	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1.072,57	0%						
Tubo de aluminio 200mm para 18 horizontal, rimada, para eletrodutos metalicos (ref.: mapa ou similar)																				
12.39	12804	ORSE	29,00	RS 116,34	RS 143,73	RS 5.005,47	0,07%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	RS 5.005,47	0%						
Tubo de aluminio 300 x 3000 mm, rimada, para eletrodutos metalicos (ref.: Mapa ou similar)																				





ITEM		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR ACUMULADO		VALOR RESTANTE	
NUMERO	DESCRICAO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR RESTANTE	VALOR ACUMULADO	VALOR RESTANTE	
12.41	12866	ORSE	156,00	RS 217,11	RS 33.869,16	0,42%	RS 0,00	RS 33.869,16	0,00	RS 33.869,16	
12.42	12579	ORSE	186,00	RS 48,52	RS 8.982,52	0,11%	RS 0,00	RS 8.982,52	0,00	RS 8.982,52	
12.43	317	ORSE	325,00	RS 2,75	RS 893,75	0,01%	RS 0,00	RS 893,75	0,00	RS 893,75	
12.44	312	ORSE	272,00	RS 4,74	RS 1.153,28	0,01%	RS 0,00	RS 1.153,28	0,00	RS 1.153,28	
12.46	373	ORSE	3,00	RS 5,03	RS 15,09	0,00%	RS 0,00	RS 15,09	0,00	RS 15,09	
12.47	8100	ORSE	156,00	RS 136,86	RS 21.261,96	0,26%	RS 0,00	RS 21.261,96	0,00	RS 21.261,96	
12.48	375	ORSE	13,00	RS 8,46	RS 109,98	0,00%	RS 0,00	RS 109,98	0,00	RS 109,98	
12.49	376	ORSE	10,00	RS 17,91	RS 179,10	0,00%	RS 0,00	RS 179,10	0,00	RS 179,10	
12.50	4234	ORSE	141,00	RS 23,52	RS 3.316,80	0,04%	RS 0,00	RS 3.316,80	0,00	RS 3.316,80	
12.51	13178	ORSE	3,00	RS 68,52	RS 205,56	0,00%	RS 0,00	RS 205,56	0,00	RS 205,56	
12.52	12971	ORSE	245,00	RS 67,21	RS 16.466,45	0,20%	RS 0,00	RS 16.466,45	0,00	RS 16.466,45	
12.53	13994	ORSE	24,00	RS 606,53	RS 14.558,72	0,18%	RS 0,00	RS 14.558,72	0,00	RS 14.558,72	
12.54	91864	SMRPI	1.560,00	RS 15,73	RS 24.544,80	0,30%	RS 0,00	RS 24.544,80	24.544,80	0,00	
12.55	91865	SMRPI	24,00	RS 19,48	RS 467,52	0,01%	RS 0,00	RS 467,52	24,00	RS 0,00	
12.56	93009	SMRPI	57,00	RS 24,69	RS 1.404,93	0,02%	RS 0,00	RS 1.404,93	0,00	RS 1.404,93	
12.57	93010	SMRPI	39,00	RS 14,31	RS 558,09	0,01%	RS 0,00	RS 558,09	0,00	RS 558,09	
12.58	91863	SMRPI	3.279,00	RS 11,99	RS 39.318,21	0,49%	RS 0,00	RS 39.318,21	3.279,00	RS 0,00	
12.59	93012	SMRPI	141,00	RS 63,19	RS 8.910,81	0,11%	RS 0,00	RS 8.910,81	0,00	RS 8.910,81	
12.60	130619	SMRPI	7,00	RS 601,58	RS 4.211,06	0,05%	RS 0,00	RS 4.211,06	0,00	RS 4.211,06	
12.61	12910	ORSE	14,00	RS 2.622,86	RS 36.720,04	0,46%	RS 0,00	RS 36.720,04	0,00	RS 36.720,04	
12.62	91860	SMRPI	13,00	RS 15.216,46	RS 197.814,00	2,48%	RS 0,00	RS 197.814,00	13,00	RS 0,00	
12.63	103879	SMRPI	1,00	RS 594,78	RS 594,78	0,00%	RS 0,00	RS 594,78	0,00	RS 594,78	
12.64	12727	ORSE	152,00	RS 138,21	RS 20.917,92	0,26%	RS 0,00	RS 20.917,92	0,00	RS 20.917,92	
12.65	103881	SMRPI	1,00	RS 981,86	RS 981,86	0,01%	RS 0,00	RS 981,86	0,00	RS 981,86	
12.66	103882	SMRPI	1,00	RS 1.704,74	RS 1.704,74	0,02%	RS 0,00	RS 1.704,74	0,00	RS 1.704,74	
12.67	91853	SMRPI	170,00	RS 23,88	RS 4.059,60	0,05%	RS 0,00	RS 4.059,60	0,00	RS 4.059,60	
12.68	91861	SMRPI	2,00	RS 40,06	RS 80,12	0,00%	RS 0,00	RS 80,12	0,00	RS 80,12	
12.69	91992	SMRPI	643,00	RS 17,27	RS 11.065,61	0,14%	RS 0,00	RS 11.065,61	0,00	RS 11.065,61	
13					RS 183.399,44	2,25%					
13.1	103553	SMRPI	3,00	RS 22,00	RS 66,00	0,00%	RS 0,00	RS 66,00	0,00	RS 66,00	
13.2	98111	SMRPI	1,00	RS 64,48	RS 64,48	0,00%	RS 0,00	RS 64,48	0,00	RS 64,48	
13.3	72753	SMRPI	100,00	RS 44,95	RS 4.495,00	0,06%	RS 0,00	RS 4.495,00	0,00	RS 4.495,00	
13.4	72754	SMRPI	20,00	RS 64,57	RS 1.291,40	0,02%	RS 0,00	RS 1.291,40	0,00	RS 1.291,40	
13.5	2858	ORSE	3,00	RS 386,10	RS 1.158,30	0,02%	RS 0,00	RS 1.158,30	0,00	RS 1.158,30	
13.6	72727	SMRPI	6,00	RS 18,64	RS 111,84	0,00%	RS 0,00	RS 111,84	0,00	RS 111,84	
13.7	68962	SMRPI	10,00	RS 112,39	RS 1.123,90	0,01%	RS 0,00	RS 1.123,90	0,00	RS 1.123,90	
13.8	2438	ORSE	3,00	RS 34,90	RS 104,70	0,00%	RS 0,00	RS 104,70	0,00	RS 104,70	





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		MÉDIAÇÃO 07										ACUMULADO	SALDO
14.17	50601	1,00	RS 41,92	RS 41,92	RS 41,92	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 41,92	0%
14.17	50601	1,00	RS 41,92	RS 41,92	RS 41,92	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 41,92	0%
15.1	9816	un	RS 312.234,57	RS 312.234,57	RS 312.234,57	3,88%	3,88%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 988,98	0%
15.1	9816	un	RS 0,46	RS 0,46	RS 0,46	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 150,086(00)	0%
15.2	7130	m	RS 13,16	RS 13,16	RS 13,16	1,86%	1,86%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 40,859(10)	0%
15.3	12890	m	RS 294,99	RS 294,99	RS 294,99	0,33%	0,33%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 4.670,41	0%
15.4	8797	m	RS 75,04	RS 75,04	RS 75,04	0,08%	0,08%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 11.737,73	0%
15.5	12174	m	RS 62,92	RS 62,92	RS 62,92	0,15%	0,15%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 7.350,72	0%
15.6	762	m	RS 38,14	RS 38,14	RS 38,14	0,09%	0,09%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 6.301,18	0%
15.7	3400	m	RS 56,68	RS 56,68	RS 56,68	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 18.961,68	0%
15.8	765	m	RS 62,29	RS 62,29	RS 62,29	0,24%	0,24%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 26.113,92	0%
15.9	91864	m	RS 13,73	RS 13,73	RS 13,73	0,32%	0,32%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 3.981,06	0%
15.10	9817	m	RS 63,19	RS 63,19	RS 63,19	0,65%	0,65%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 1.966,00	0%
15.11	91885	m	RS 10,62	RS 10,62	RS 10,62	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 1.334,64	0%
15.12	9817	m	RS 45,01	RS 45,01	RS 45,01	0,07%	0,07%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 429,80	0%
15.13	369	m	RS 80,00	RS 80,00	RS 80,00	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 378,56	0%
15.14	91919	m	RS 19,15	RS 19,15	RS 19,15	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 192,00	0%
15.15	9811	m	RS 0,39	RS 0,39	RS 0,39	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 1.027,71	0%
15.16	12559	m	RS 2,11	RS 2,11	RS 2,11	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 2.886,28	0%
15.17	9852	m	RS 1,30	RS 1,30	RS 1,30	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 1.384,50	0%
15.18	7679	m	RS 14,37	RS 14,37	RS 14,37	0,07%	0,07%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 3.447,60	0%
15.19	12513	m	RS 21,69	RS 21,69	RS 21,69	0,09%	0,09%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 2.033,10	0%
15.20	7881	m	RS 13,38	RS 13,38	RS 13,38	0,03%	0,03%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 29,40	0%
15.21	9519	m	RS 5,96	RS 5,96	RS 5,96	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 616,32	0%
15.22	9524	m	RS 5,20	RS 5,20	RS 5,20	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 9.352,20	0%
15.23	12600	m	RS 48,53	RS 48,53	RS 48,53	0,12%	0,12%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 174,24	0%
15.24	12686	m	RS 15,67	RS 15,67	RS 15,67	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 11.886,72	0%
15.25	12519	m	RS 93,11	RS 93,11	RS 93,11	0,15%	0,15%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 9.833,12	0%
15.26	7884	m	RS 24,83	RS 24,83	RS 24,83	0,12%	0,12%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 157,12	0%
16						9,78%	9,78%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 84,48	0%
16.1	9816	m	RS 0,45	RS 0,45	RS 0,45	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 652,50	0%
16.2	9813	m	RS 0,39	RS 0,39	RS 0,39	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 415,36	0%
16.3	12559	m	RS 2,11	RS 2,11	RS 2,11	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 2.707,12	0%
16.4	9852	m	RS 1,30	RS 1,30	RS 1,30	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 896,97	0%
16.5	7884	m	RS 24,83	RS 24,83	RS 24,83	0,03%	0,03%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 252,488	0%
16.6	8897	m	RS 25,04	RS 25,04	RS 25,04	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 674,50	0%
16.7	10090	m	RS 7,06	RS 7,06	RS 7,06	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 102,88	0%
16.8	7879	m	RS 14,37	RS 14,37	RS 14,37	0,01%	0,01%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 782,48	0%
16.9	8887	m	RS 43,28	RS 43,28	RS 43,28	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 18,52	0%
16.10	9524	m	RS 5,20	RS 5,20	RS 5,20	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 2.685,84	0%
16.11	12530	m	RS 15,03	RS 15,03	RS 15,03	0,00%	0,00%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 313,28	0%
16.12	762	m	RS 38,14	RS 38,14	RS 38,14	0,03%	0,03%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 2.685,84	0%
16.13	12576	m	RS 18,05	RS 18,05	RS 18,05	0,02%	0,02%	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 313,28	0%



Contabilidade: Ozca
Rég. Civil: 0232616/01605570

Av. Tancredo Neves, 2319 - Bf. Oco Sítio
CEP: 41.020-021 - Itambé
MG - 30.115-9900


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05.1417303-3

Empresa: M&E
CPF: 06.000.007/01-91
Insc. Estadual: 06.000.007/01-91



FANFARIA ORÇAMENTÁRIA										MEDICÃO 07		ACUMULADO		SALDO EM EXECUÇÃO		
ORÇ	ORÇ	ORÇ	ORÇ	ORÇ	ORÇ	ORÇ	ORÇ	ORÇ	ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
16.14	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	RS 325,70	RS 325,70	RS 325,70	RS 325,70	RS 325,70	RS 325,70	0%
16.15	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	RS 108,50	RS 108,50	RS 108,50	RS 108,50	RS 108,50	RS 108,50	0%
16.16	7790	7790	7790	7790	7790	7790	7790	7790	7790	RS 143,25	RS 143,25	RS 143,25	RS 143,25	RS 143,25	RS 143,25	0%
16.17	95806	95806	95806	95806	95806	95806	95806	95806	95806	RS 8.386,62	RS 8.386,62	RS 8.386,62	RS 8.386,62	RS 8.386,62	RS 8.386,62	0%
16.18	95785	95785	95785	95785	95785	95785	95785	95785	95785	RS 1.051,47	RS 1.051,47	RS 1.051,47	RS 1.051,47	RS 1.051,47	RS 1.051,47	0%
16.19	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	RS 21.274,00	RS 21.274,00	RS 21.274,00	RS 21.274,00	RS 21.274,00	RS 21.274,00	0%
16.20	33520	33520	33520	33520	33520	33520	33520	33520	33520	RS 20.708,03	RS 20.708,03	RS 20.708,03	RS 20.708,03	RS 20.708,03	RS 20.708,03	0%
16.21	774	774	774	774	774	774	774	774	774	RS 278,90	RS 278,90	RS 278,90	RS 278,90	RS 278,90	RS 278,90	0%
37										RS 293.989,72	RS 293.989,72	RS 293.989,72	RS 293.989,72	RS 293.989,72	RS 293.989,72	0%
37.3										RS 42.608,96	RS 42.608,96	RS 42.608,96	RS 42.608,96	RS 42.608,96	RS 42.608,96	0%
42736	96225	96225	96225	96225	96225	96225	96225	96225	96225	RS 1.062,41	RS 1.062,41	RS 1.062,41	RS 1.062,41	RS 1.062,41	RS 1.062,41	0,01%
42737	96617	96617	96617	96617	96617	96617	96617	96617	96617	RS 2.225,78	RS 2.225,78	RS 2.225,78	RS 2.225,78	RS 2.225,78	RS 2.225,78	0,07%
42738	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	RS 29.933,75	RS 29.933,75	RS 29.933,75	RS 29.933,75	RS 29.933,75	RS 29.933,75	0,7%
42739	11222	11222	11222	11222	11222	11222	11222	11222	11222	RS 22.674,90	RS 22.674,90	RS 22.674,90	RS 22.674,90	RS 22.674,90	RS 22.674,90	0,28%
42740	98557	98557	98557	98557	98557	98557	98557	98557	98557	RS 26.555,14	RS 26.555,14	RS 26.555,14	RS 26.555,14	RS 26.555,14	RS 26.555,14	0,33%
42741	55957	55957	55957	55957	55957	55957	55957	55957	55957	RS 256,58	RS 256,58	RS 256,58	RS 256,58	RS 256,58	RS 256,58	0%
37.2										RS 209.290,76	RS 209.290,76	RS 209.290,76	RS 209.290,76	RS 209.290,76	RS 209.290,76	2,60%
42767	92761	92761	92761	92761	92761	92761	92761	92761	92761	RS 52.523,44	RS 52.523,44	RS 52.523,44	RS 52.523,44	RS 52.523,44	RS 52.523,44	0,65%
42768	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	RS 54.607,71	RS 54.607,71	RS 54.607,71	RS 54.607,71	RS 54.607,71	RS 54.607,71	0,68%
42769	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	95957	RS 102.159,61	RS 102.159,61	RS 102.159,61	RS 102.159,61	RS 102.159,61	RS 102.159,61	1,27%
38										RS 646.933,77	RS 646.933,77	RS 646.933,77	RS 646.933,77	RS 646.933,77	RS 646.933,77	8,07%
18.1	87879	87879	87879	87879	87879	87879	87879	87879	87879	RS 5,74	RS 5,74	RS 5,74	RS 5,74	RS 5,74	RS 5,74	0,00%
18.2	87547	87547	87547	87547	87547	87547	87547	87547	87547	RS 32,65	RS 32,65	RS 32,65	RS 32,65	RS 32,65	RS 32,65	0,00%
18.3	10169	10169	10169	10169	10169	10169	10169	10169	10169	RS 212.890,90	RS 212.890,90	RS 212.890,90	RS 212.890,90	RS 212.890,90	RS 212.890,90	0%
18.4	2759	2759	2759	2759	2759	2759	2759	2759	2759	RS 12,33,20	RS 12,33,20	RS 12,33,20	RS 12,33,20	RS 12,33,20	RS 12,33,20	0,00%
18.5	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762	RS 1.889,50	RS 1.889,50	RS 1.889,50	RS 1.889,50	RS 1.889,50	RS 1.889,50	0%
18.12	94893	94893	94893	94893	94893	94893	94893	94893	94893	RS 25.627,50	RS 25.627,50	RS 25.627,50	RS 25.627,50	RS 25.627,50	RS 25.627,50	0%
18.13	32443	32443	32443	32443	32443	32443	32443	32443	32443	RS 53.470,71	RS 53.470,71	RS 53.470,71	RS 53.470,71	RS 53.470,71	RS 53.470,71	0%
19.1	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	RS 32,02	RS 32,02	RS 32,02	RS 32,02	RS 32,02	RS 32,02	0,00%
19.2	88484	88484	88484	88484	88484	88484	88484	88484	88484	RS 4,73	RS 4,73	RS 4,73	RS 4,73	RS 4,73	RS 4,73	0,00%
19.3	88497	88497	88497	88497	88497	88497	88497	88497	88497	RS 20,05	RS 20,05	RS 20,05	RS 20,05	RS 20,05	RS 20,05	0,00%
19.5	88489	88489	88489	88489	88489	88489	88489	88489	88489	RS 18,05	RS 18,05	RS 18,05	RS 18,05	RS 18,05	RS 18,05	0,00%
19.6	9484	9484	9484	9484	9484	9484	9484	9484	9484	RS 25,80	RS 25,80	RS 25,80	RS 25,80	RS 25,80	RS 25,80	0,00%
20										RS 3.408.638,82	RS 3.408.638,82	RS 3.408.638,82	RS 3.408.638,82	RS 3.408.638,82	RS 3.408.638,82	17,48%
20.1	96109	96109	96109	96109	96109	96109	96109	96109	96109	RS 56,83	RS 56,83	RS 56,83	RS 56,83	RS 56,83	RS 56,83	0,00%
20.2	96488	96488	96488	96488	96488	96488	96488	96488	96488	RS 1.318,48	RS 1.318,48	RS 1.318,48	RS 1.318,48	RS 1.318,48	RS 1.318,48	0,07%





PLANTIA ORÇAMENTÁRIA		MÉDIA 07										AGUILADO		SALDO		EXECUÇÃO	
CD	ORÇ	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Unitário	Valor Total	%
20.4	12729	ORSE		3366,25	RS 202,59	RS 250,28	RS 817.477,05	10,15%	0,00	RS 0,00	3366,25	817.477,05	RS 0,00	RS 0,00	0%		
20.5	92580	SINAPI		3366,25	RS 58,96	RS 72,84	RS 237.913,65	2,95%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 237.913,65	0%			
20.7	92580	SINAPI		217,48	RS 58,96	RS 72,84	RS 15.801,24	0,20%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 15.801,24	0%			
20.8	32736	ORSE		217,48	RS 317,37	RS 145,00	RS 31.534,60	0,39%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 31.534,60	0%			
20.9	5057	ORSE		197,37	RS 500,30	RS 617,95	RS 121.904,79	1,51%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 121.904,79	0%			
20.10	100742	SINAPI		3366,25	RS 25,44	RS 31,43	RS 102.658,74	1,27%	0,00	RS 0,00	3366,25	102.658,74	RS 0,00	RS 0,00	100%		
21.1	2394	ORSE		44,24	RS 97,90	RS 120,25	RS 3.500,83	0,02%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 3.500,83	0%			
21.2	10734	ORSE		796,27	RS 74,13	RS 29,83	RS 6.131,54	0,08%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 6.131,54	0%			
21.3	98509	SINAPI		130,00	RS 53,26	RS 66,42	RS 6.642,00	0,08%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 6.642,00	0%			
21.4	87503	SINAPI		132,96	RS 80,15	RS 99,02	RS 15.146,10	0,19%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 15.146,10	0%			
21.5	87879	SINAPI		305,92	RS 4,65	RS 5,74	RS 1.755,98	0,02%	305,92	RS 1.755,98	305,92	1.755,98	RS 0,00	RS 0,00	100%		
21.6	87547	SINAPI		305,92	RS 76,43	RS 32,65	RS 9.988,29	0,12%	305,92	RS 9.988,28	305,92	9.988,28	RS 0,00	RS 0,00	100%		
21.7	88885	SINAPI		305,92	RS 2,95	RS 3,64	RS 1.113,55	0,01%	305,92	RS 1.113,54	305,92	1.113,54	RS 0,00	RS 0,00	100%		
21.8	88489	SINAPI		305,92	RS 14,61	RS 18,05	RS 5.521,86	0,07%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 5.521,86	0%			
21.9	43595	SINAPI		235,00	RS 13,75	RS 16,99	RS 3.992,65	0,05%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 3.992,65	0%			
21.10	100623	SINAPI		4,00	RS 4.732,00	RS 5.228,30	RS 20.913,70	0,26%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 20.913,70	0%			
21.11	10536	ORSE		3,00	RS 329,23	RS 406,73	RS 1.220,19	0,01%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 1.220,19	0%			
21.12	95957	SINAPI		0,50	RS 3.461,45	RS 4.276,25	RS 2.138,13	0,03%	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	RS 2.138,13	0%			
21.13	11457	ORSE		952,16	RS 71,75	RS 88,64	RS 84.199,46	1,05%	904,50	RS 80.174,88	904,50	80.174,88	RS 4.274,58	95%			
21.14	94319	SINAPI		190,43	RS 109,26	RS 125,10	RS 23.822,79	0,29%	0,00	RS 0,00	190,43	23.822,79	RS 0,00	RS 0,00	100%		



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



ID	GRUPO QUE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MEDIDA		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE DEDUÇÃO	MÉDIA DE		ACUMULADO		SALDO	EXERCÍCIO
				QUANTIDADE	VALOR				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
221	221	221	REFORMA DE PAVIMENTO											
44662	SIM/PI	44662	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	1,69	R\$ 162,63	R\$ 162,63	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,69	105,84	R\$ 0,00	100%
44663	SIM/PI	44663	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	8,91	R\$ 20,36	R\$ 20,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,91	224,09	R\$ 0,00	100%
44664	SIM/PI	44664	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	0,40	R\$ 1,86	R\$ 1,86	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,40	2,565,75	R\$ 0,00	100%
44665	ORSE	44665	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m	99,00	R\$ 18,67	R\$ 18,67	0,03%	0,00	R\$ 0,00	99,00	2,282,94	R\$ 0,00	100%
44666	SIM/PI	44666	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	46,50	R\$ 46,51	R\$ 46,51	0,03%	0,00	R\$ 0,00	46,50	2,071,89	R\$ 0,00	100%
222	222	222	REFORMA DE PAVIMENTO											
44693	SIM/PI	44693	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	kg	431,20	R\$ 18,32	R\$ 18,32	0,10%	0,00	R\$ 0,00	431,20	7,899,58	R\$ 0,00	100%
44694	SIM/PI	44694	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	2,43	R\$ 3,86	R\$ 3,86	0,13%	0,00	R\$ 0,00	2,43	10,191,29	R\$ 0,00	100%
44695	SIM/PI	44695	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	2,96	R\$ 5,86	R\$ 5,86	0,16%	0,00	R\$ 0,00	2,96	12,657,70	R\$ 0,00	100%
223	223	223	REFORMA DE PAVIMENTO											
44621	SIM/PI	44621	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	262,30	R\$ 80,15	R\$ 99,02	0,33%	0,00	R\$ 0,00	262,30	26,468,05	R\$ 0,00	100%
44622	SIM/PI	44622	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	5,34	R\$ 4,65	R\$ 5,74	0,04%	0,00	R\$ 0,00	5,34	3,068,60	R\$ 0,00	100%
44623	SIM/PI	44623	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	5,34	R\$ 26,43	R\$ 32,65	0,23%	0,00	R\$ 0,00	5,34	17,654,69	R\$ 0,00	100%
224	224	224	REFORMA DE PAVIMENTO											
44652	SIM/PI	44652	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	442,75	R\$ 2,26	R\$ 3,64	0,02%	0,00	R\$ 0,00	442,75	1,011,61	R\$ 1,611,61	0%
44653	SIM/PI	44653	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	442,75	R\$ 16,37	R\$ 20,85	0,13%	0,00	R\$ 0,00	442,75	8,877,14	R\$ 8,877,14	0%
44654	ORSE	44654	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	30,24	R\$ 20,56	R\$ 25,40	0,03%	0,00	R\$ 0,00	30,24	788,10	R\$ 788,10	0%
44655	SIM/PI	44655	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	442,75	R\$ 14,61	R\$ 18,05	0,10%	0,00	R\$ 0,00	442,75	7,991,64	R\$ 7,991,64	0%
225	225	225	REFORMA DE PAVIMENTO											
44682	SIM/PI	44682	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	67,50	R\$ 112,62	R\$ 139,13	0,12%	0,00	R\$ 0,00	67,50	9,391,28	R\$ 9,391,28	0%
44683	ORSE	44683	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	1,36	R\$ 106,29	R\$ 230,14	0,65%	0,00	R\$ 0,00	1,36	36,454,18	R\$ 36,454,18	0%
44684	Proprio	44684	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	91,85	R\$ 27,70	R\$ 34,22	0,04%	0,00	R\$ 0,00	91,85	3,143,11	R\$ 3,143,11	0%
226	226	226	REFORMA DE PAVIMENTO											
44713	ORSE	44713	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	29,70	R\$ 231,30	R\$ 260,04	0,25%	0,00	R\$ 0,00	29,70	7,075,05	R\$ 7,075,05	0%
44714	SIM/PI	44714	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	UN	9,00	R\$ 897,74	R\$ 491,37	0,05%	0,00	R\$ 0,00	9,00	4,427,33	R\$ 4,427,33	0%
44716	ORSE	44716	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m	27,00	R\$ 106,70	R\$ 133,82	0,04%	0,00	R\$ 0,00	27,00	3,559,14	R\$ 3,559,14	0%
44717	ORSE	44717	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m	6,30	R\$ 77,81	R\$ 96,13	0,01%	0,00	R\$ 0,00	6,30	605,62	R\$ 605,62	0%
44718	SIM/PI	44718	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	59,40	R\$ 56,99	R\$ 62,88	0,05%	0,00	R\$ 0,00	59,40	3,375,07	R\$ 3,375,07	0%
227	227	227	REFORMA DE PAVIMENTO											
44743	SIM/PI	44743	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	100,44	R\$ 47,55	R\$ 58,74	0,07%	0,00	R\$ 0,00	100,44	5,899,85	R\$ 5,899,85	100%
44744	SIM/PI	44744	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	100,44	R\$ 105,76	R\$ 128,19	0,16%	0,00	R\$ 0,00	100,44	12,875,40	R\$ 12,875,40	100%
44745	SIM/PI	44745	1.3x1.6m de calçada para obra baldrame com mbr escavadeira (incluindo escavadeira para colocação de forras) at. 06/2017	m²	67,50	R\$ 106,43	R\$ 131,48	0,33%	0,00	R\$ 0,00	67,50	8,874,90	R\$ 8,874,90	100%





228	ACESSÓRIOS	PLANOJA ORÇAMENTARIA										MEDICAO 07	ACUMULADO	SALDO	EXECUTADO
		UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
44774	SINAPI	UN	9,00	RS 165,65	RS 1.490,95	RS 1.490,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 1.490,95	0%
44775	SINAPI	UN	9,00	RS 170,81	RS 1.537,29	RS 1.537,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 1.537,29	0%
44777	ORSE	un	9,00	RS 329,23	RS 2.963,07	RS 2.963,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 2.963,07	0%
44778	ORSE	m²	19,40	RS 444,62	RS 8.625,63	RS 8.625,63	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 8.625,63	0%
44779	ORSE	un	9,00	RS 553,56	RS 4.982,04	RS 4.982,04	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 4.982,04	0%
23	BRACA	m²	37,91	RS 97,90	RS 3.711,38	RS 3.711,38	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 3.711,38	0%
23.1	ORSE	UN	150,00	RS 55,76	RS 8.364,00	RS 8.364,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 8.364,00	0%
23.2	SINAPI	UN	50,00	RS 152,05	RS 7.602,50	RS 7.602,50	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 7.602,50	0%
23.3	ORSE	m²	3.899,56	RS 24,15	RS 94.142,56	RS 94.142,56	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 94.142,56	0%
23.4	SINAPI	m	49,28	RS 41,74	RS 2.051,87	RS 2.051,87	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 2.051,87	0%
23.5	SINAPI	m	377,80	RS 35,80	RS 13.523,20	RS 13.523,20	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 13.523,20	0%
23.6	ORSE	m²	777,14	RS 17,45	RS 13.567,76	RS 13.567,76	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 13.567,76	0%
23.7	SINAPI	m²	633,12	RS 101,26	RS 64.100,19	RS 64.100,19	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 64.100,19	0%
23.8	ORSE	m²	988,93	RS 71,75	RS 70.956,76	RS 70.956,76	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 70.956,76	0%
23.9	SINAPI	UN	30,00	RS 4.332,00	RS 1.299,60	RS 1.299,60	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 1.299,60	0%
23.9	Proprio	m²	1.389,52	RS 147,43	RS 202.831,17	RS 202.831,17	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 202.831,17	95%
23.10	ORSE	un	10,00	RS 546,23	RS 5.462,30	RS 5.462,30	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 5.462,30	0%
23.11	ORSE	un	3,00	RS 329,23	RS 987,69	RS 987,69	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 987,69	0%
24	ADMINISTRACAO DA OBRA				RS 331.188,60	RS 331.188,60	4,80%								
24.1	SINAPI	H	880,00	RS 106,23	RS 93.560,40	RS 93.560,40	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 93.560,40	90%
24.2	SINAPI	H	2.220,00	RS 34,62	RS 76.856,40	RS 76.856,40	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 76.856,40	97%
24.3	SINAPI	H	4.440,00	RS 25,66	RS 113.730,40	RS 113.730,40	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 113.730,40	96%
25	SERVICOS TERCEIROS				RS 35.526,59	RS 35.526,59	0,44%								
25.1	SINAPI	m²	7.773,87	RS 3,70	RS 28.783,33	RS 28.783,33	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 28.783,33	0%
			Total sem RRP		RS 6.802.088,62	RS 6.802.088,62									
			Total do RRP		RS 1.808.296,83	RS 1.808.296,83									
			Total Geral		RS 8.610.385,45	RS 8.610.385,45									

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Handwritten signature and notes in blue ink.





Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 1200567

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:52:42 horas do dia 01/07/2024.

Válida até dia 29/09/2024.

Código de controle da certidão: **6851.9FAA.7445.F67D.EC29.C97E.FDE0.B8A5**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243246502**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:38:11 do dia 09/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2024.

Código de controle da certidão: **113E.4F15.5319.B2D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 52784762/2024

Expedição: 01/08/2024, às 09:58:26

Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082809023146995439

Informação obtida em 28/08/2024 15:50:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00533353E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR, TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP 41820021, SALVADOR-BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.


Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quinta-feira, 1 de agosto de 2024



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/08/2024
Número de Controle: 29.47.96.01.17
Número da Declaração: 29479.60117.190824.1.3.15-3740

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 05154.54888.170724.1.3.15-8934
Crédito de Sucieda: Não
Competência: 05/2024
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 698,19

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CSRF	32,97
IRRF	678,56

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Telefone: (19)3471-0670
Celular:
Correio Eletrônico: lista-dp@visulassessoria.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 19/08/2024 às 10:20:18
2765577099

29.47.96.01.17

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/08/2024
Número de Controle: 15.60.93.95.55
Número da Declaração: 15609.39555.190824.1.3.15-1131

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 05154.54888.170724.1.3.15-8934
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 05/2024
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 5.643,03

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	5.750,81

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Telefone: (19)3471-0670
Celular:
Correio Eletrônico: lista-dp@visulassessoria.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 19/08/2024 às 10:16:58
2277105282

15.60.93.95.55

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	81718989 / Reinf CP 81718999 / Reinf RET 27414159394 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.368,69	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 41.350,19	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 9.878,32	R\$ 5.750,81
IRRF	R\$ 678,56	R\$ 678,56
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 32,97	R\$ 32,97
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 66.308,73	R\$ 6.462,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2024 16:23:28
Nº do recibo de entrega	0000050000255120514



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000255120514
Data/Hora da Transmissão	12/08/2024 16:23:28	Identificação da Apuração de Débitos	81718989 / Reinf CP 81718999 / Reinf RET 27414159394 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	241,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,51		
Saldo a Pagar	130,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	96,76		
Saldo a Pagar	96,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	145,14		
Saldo a Pagar	145,14		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	19,35		
Saldo a Pagar	19,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	58,05		
Saldo a Pagar	58,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	329,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 329,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.935,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.935,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	171,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 171,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	68,58		
Saldo a Pagar	68,58		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	102,87		
Saldo a Pagar	102,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	13,71		
Saldo a Pagar	13,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	41,15		
Saldo a Pagar	41,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	233,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 233,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.371,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.371,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.844,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.844,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.537,82		
Saldo a Pagar	1.537,82		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.306,73		
Saldo a Pagar	2.306,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	307,56		
Saldo a Pagar	307,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	922,69		
Saldo a Pagar	922,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.240,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.240,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	30.756,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30.756,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.482,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	13.553,37		
Deduções	Salário Família: 682,44 Retenção Lei 9711/98: 12.870,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	667,93		
Saldo a Pagar	667,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	10,63		
Saldo a Pagar	10,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	32,97		
Saldo a Pagar	32,97		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 81 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98 **Tomador:** 90.007.05281/79

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024		REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	061	079.315.675-01	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21		
Total do Tomador							90.007.05281/79		2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
Total do Estabelecimento						24.597.344/0001-98		141.415,11	11.312,78	0,00	0,00	0,00	11.312,78		
Total da Guia										157.950,05	12.635,52	0,00	0,00	0,00	12.635,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 81 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADAILTON DO CARMO SANTOS	240	059.224.325-75	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	248	906.029.785-72	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	151	431.938.975-15	101	20/08/2024	Mensal	1.922,87	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
07/2024		ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	23	069.936.775-12	101	20/08/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
07/2024		ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	154	792.961.575-87	101	20/08/2024	Mensal	2.793,22	223,45	0,00	0,00	0,00	223,45
07/2024		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	192	046.699.345-54	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		AUGUSTO CESAR SANTANA BISPO	214	069.052.335-10	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		BERNARDO SILVA BRITTO	232	065.634.245-54	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	126	576.963.495-20	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		CASSIANO DOS SANTOS BATISTA	273	552.198.705-30	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	149	019.088.445-23	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		ELTON SANTOS DA CONCEICAO	204	850.811.245-91	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ERIK SANTOS CHAVES	296	068.545.015-55	101	20/08/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
07/2024		ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	146	860.528.565-64	101	20/08/2024	Mensal	2.793,22	223,45	0,00	0,00	0,00	223,45
07/2024		ERNADES DA COSTA	268	081.040.375-79	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		FABRICIO FERREIRA NEVES	269	100.035.275-73	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	195	056.883.065-21	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	187	040.084.945-37	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		GEAN PEREIRA DOS SANTOS	277	105.143.455-60	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		GENIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA	237	037.335.855-50	101	20/08/2024	Mensal	1.154,38	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35
07/2024		GILBERTO DE JESUS SILVA	226	389.383.028-65	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		GILEAN ALMEIDA SANTOS	190	023.722.555-76	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		GIVANILDO CARVALHO SILVA	233	069.490.165-22	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		HELEN CAILANE SANTOS GOES	278	104.717.955-50	101	20/08/2024	Mensal	1.720,70	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65
07/2024		ISAIAS OLIVEIRA	189	619.175.085-49	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		IVAN LUIZ DE SOUZA MATOS	193	906.749.955-20	101	20/08/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
07/2024		IVANILDO SANTOS DE JESUS	246	101.107.365-08	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		JAIR RODRIGUES PIMENTEL VIEIRA	231	098.400.645-17	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA	276	060.723.775-99	101	20/08/2024	Mensal	1.346,78	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
07/2024		JOANDERSON DE MORAIS SILVA	197	862.032.175-73	101	20/08/2024	Mensal	2.172,50	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80
07/2024		JOANDRESSON FRANCA DOS SANTOS	217	068.237.675-29	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		JONATHAS SILVA SANTOS	256	096.705.855-46	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA CEZAR	271	606.796.545-34	101	20/08/2024	Mensal	2.094,91	167,59	0,00	0,00	0,00	167,59
07/2024		JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS	239	058.965.185-44	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOSE MARTINS DE CARVALHO	179	379.422.045-53	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	174	043.467.815-51	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOSE QUIRINO DOS SANTOS CRUZ	260	006.052.355-70	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOSE RALFE SILVA SANTOS	265	034.797.105-90	101	20/08/2024	Mensal	1.903,09	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
07/2024		JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	173	042.817.365-90	101	20/08/2024	Mensal	2.172,50	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 81 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		JOSIAS DA SILVA SANTOS	227	095.668.545-52	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		JULIO DA CONCEICAO	205	898.536.015-91	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		LEONARDO MATOS LIMA	279	098.819.595-00	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		LUCAS DA SILVA DIAS	194	038.392.235-63	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		LUCIVAN DE LIMA BARRETO	270	081.161.195-75	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	141	968.062.655-53	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIV	238	030.927.645-44	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		LUIZ GONZAGA DE JESUS	230	038.148.615-07	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	168	124.161.289-73	101	20/08/2024	Mensal	1.812,26	144,98	0,00	0,00	0,00	144,98
07/2024		MAICON CARVALHO DOS SANTOS	229	075.211.995-88	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		MANOEL REIS DOS ANJOS	169	860.220.245-87	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		MARCELO FERREIRA DA PAZ	138	807.970.755-34	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		MARCIO PIRES XAVIER	150	055.034.795-05	101	20/08/2024	Mensal	2.793,22	223,45	0,00	0,00	0,00	223,45
07/2024		MARCONE LIMA SANTOS	228	071.093.685-05	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		MARCOS JOSE DE SANTANA	216	019.576.815-94	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	24	077.351.565-88	101	20/08/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
07/2024		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	235	095.589.215-67	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		PAULO DOS SANTOS NUNES	166	668.578.645-00	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	191	062.238.685-96	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	266	031.809.825-35	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		REINAN DE JESUS SANTOS	175	081.916.125-00	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		RODRIGO DE JESUS SANTOS	263	024.292.085-39	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ROMARIO DE JESUS SANTOS	261	052.183.325-69	101	20/08/2024	Mensal	1.903,09	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
07/2024		RONALDO JESUS DA SILVA	244	045.773.135-45	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		SILVIO SOUZA DE SANTANA	221	041.344.825-85	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	145	858.597.495-89	101	20/08/2024	Mensal	1.711,58	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
07/2024		VAGNER DA SILVA SANTOS	275	029.700.165-59	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		VALCI SILVA BRITTO	234	069.279.385-24	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	196	029.911.495-31	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		WELINGTON DE FREITAS SILVA DE JESUS	198	034.371.775-16	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	139	087.985.945-83	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	252	490.827.438-09	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
Total do Tomador							Sem Tomador	139.087,43	11.126,57	0,00	0,00	0,00	11.126,57
Total do Estabelecimento							24.597.344/0001-98	141.415,11	11.312,78	0,00	0,00	0,00	11.312,78
Total da Guia								157.950,05	12.635,52	0,00	0,00	0,00	12.635,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 81 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.013.12101/76

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		COSME SANTOS MARQUES	212	459.294.325-20	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		EDSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR	208	833.611.385-15	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		JOSE CICERO DE LIMA E SILVA JUNIOR	211	046.869.155-38	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO	202	029.835.435-79	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
Total do Tomador							Sem Tomador	6.858,34	548,64	0,00	0,00	0,00	548,64
Total do Estabelecimento							90.013.12101/76	6.858,34	548,64	0,00	0,00	0,00	548,64
Total da Guia								157.950,05	12.635,52	0,00	0,00	0,00	12.635,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 81 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS	257	644.275.525-87	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	247	861.346.355-02	101	20/08/2024	Mensal	1.250,58	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
07/2024			ELSON SILVA DE CARVALHO	251	029.178.985-42	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO	245	052.382.845-43	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			LUCIANO SANTANA BARRETO	259	022.903.725-95	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
Total do Tomador								Sem Tomador	9.676,60	774,10	0,00	0,00	0,00	774,10
Total do Estabelecimento								90.016.27652/75	9.676,60	774,10	0,00	0,00	0,00	774,10
Total da Guia									157.950,05	12.635,52	0,00	0,00	0,00	12.635,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores: 81 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA

Data Emissão: 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	72	141.415,11	11.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,78
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	141.415,11	11.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,78

Estabelecimento: 90.013.12101/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	4	6.858,34	548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,64
Total do Estabelecimento		90.013.12101/76	6.858,34	548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,64

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	5	9.676,60	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,10
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	9.676,60	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,10

Total da Guia 157.950,05 12.635,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.635,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1999
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exerce de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.950/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 81 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	24.597.344/0001-98	72	141.415,11	11.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,78
07/2024	90.013.12101/76	4	6.858,34	548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,64
07/2024	90.016.27652/75	5	9.676,60	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,10
Total da Guia			157.950,05	12.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 81 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	72	141.415,11	11.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,78
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	141.415,11	11.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,78

Estabelecimento: 90.013.12101/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	6.858,34	548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,64
Total do Estabelecimento		90.013.12101/76	6.858,34	548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,64

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	5	9.676,60	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,10
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	9.676,60	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,10

Total da Guia 157.950,05 12.635,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.635,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 81 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223054250-9 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/08/2024 16:57:03 (Brasília)



Relação de Tomadores de Serviço


Tomador: 90.007.05281/79


Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	1	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
Total do Tomador	90.007.05281/79	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	80	155.622,37	12.449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,31
Total do Tomador	Sem Tomador	155.622,37	12.449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,31
Total da Guia		157.950,05	12.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,52



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				01	02	03	04	05	06	07	08	09
				S	T	O	O	S	S	D		
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 299				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA: Marca: 1 Turma: 1 Nota: 1 1. Tempo Bom 2. Choveu o cond. Trab. 3. Choveu o cond. Trab.				CATEGORIA				OTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORGAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x19x19cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. FORMO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. 46mm/m2, NBR781. Fck(mín)≥8MPa, sob cam. areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUINDO TELA DE AÇO SOLDADA				Gerente da Obra Engenheiro 1 Fac. de Engenharia Aux Adm 1 Mão de obra 1 Encargado geral								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Ajudante Geral 25 Caldeiro 3 Capineiro Operador de Motosserra Mecânico Montador Montador Elétrica Eletricista Operador de Panel Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão 1 Pintor Armeiro 2								
				MÃO DE OBRA								
				Hb DO DIA Hb DO DIA Hb DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA DORRADA DE TRABALHO Hb DO DIA Hb ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO OTDE Veículo Leve Carrocinho Motor Carrocinho Traco Escavadeira Pá carregadeira Caminhão Pá 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/07/2024				Data: 01/07/2024								




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				03/07/2024	S	T	O	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2023 RDO: 301				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux Adm 1 Mensal de obra 1 Escarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORGAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x19x19cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, Intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. 46mm/m ² , NBR781, Fck(min)≥33MPa, sob cam. areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUINDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA80, Q188 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Marceneiro Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pintor Operador de Escaladeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caminhão 1 Ploter Acendedor 2							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Bônica Caminhão Toca Escaladeira Pá carregadeira Camião Pintor PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/07/2024				Data: 03/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023				04/07/2024						
				S T D O S S S D						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				IDDE: 302						
MÃO DE OBRA DIRETA				CATEGORIA						
MÃO DE OBRA DIRETA				OTDE						
SERVIÇOS E EXECUTADOS OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALORAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CDR OMBIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 1 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x18x18cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibrorrensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp=6cm, 45kg/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cam. areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO BETO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUINDO TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA COM Q194 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO RO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20				Garantia de Obra Representante 1 Tec. de Segurança 1 Aux. Segurança 1 Encarregado geral 1						
SERVIÇOS E EXECUTADOS OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALORAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CDR OMBIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 1 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x18x18cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibrorrensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp=6cm, 45kg/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cam. areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO BETO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUINDO TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA COM Q194 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO RO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia 20 Pedreiro 25 Ajustador Geral 25 Carretilha 3 Operador de Motoniveladora Motoniveladora Motorista Montador e Intercala Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de PE correteleta 1 Motorista de caminhão Plator Armeiro 2						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				SEU TIPO DO DIA JORNADA DE TRABALHO SALDO DIA SALDO ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO OTDE Velocidade Leve Camião de Bunch Camião de Toco Escavadeira PE correteleta Camião Plator PIC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				TICIALIZAÇÃO:						
Data: 04/07/2024				Data: 04/07/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 06/07/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 083/2023						
SÍMBOLO DA OBRA				ELETIVO PESSOAL						
SMBL				CATEGORIA						
SMBL				MÃO DE OBRA DIRETA						
<p>ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS); LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 Bloco cúbico tipo "u" (caixa) 9x18x18cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. 4cm, NBR 9781, Fck(min) = 35MPa, sob c/ovim areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO BETO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOP TER O), INCLUINDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/60, Q235 (3,11K/6/M2), DIÂMETRO DO ROLO 50 MM, LARGURA = 2,48 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 20 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa</p>				<p>Resumo do Efeito</p> <p>1. Engenheiro 1</p> <p>2. Operário 1</p> <p>3. Motorista 1</p> <p>4. Carregador geral</p>						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/07/2024				Data: 06/07/2024						



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				06/07/2024						
				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: _____ QTD: _____						
SIMBOLOGIA: Marca () Tera () Quil ()				MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Téc. de Segurança Ass. Adm. Ass. de obra Encarregado geral MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Carroceiro Operador de Motosserra Motorista Montador e Instalador Estacionista Operador de Páteo Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão Pintor Arreiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO SÓLDO DIA MÍNACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO						
Data: 06/07/2024				Data: 06/07/2024						




 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 1762023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				07/07/2024						
				Nº DO: 305				CATEGORIA		
SÍMBOLOGIA: Manhã () Tarde () Noite ()				MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇO				Engenheiro Fac. de Segurança Ass. Adm. Ass. de Obra Encarregado geral MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de Topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador Elétrico Encanador Operador de Pneu Operador de Escavadeira Operador de Pa Carregadeira Motorista de Camião Pintor Armeiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DIA JORNADA DE TRABALHO MÃO DE OBRA MÃO ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E CUMPRIMENTOS						
				TIPO QTD. Pedreiro Ladr Calceteiro Mteca Calceteiro Toco Escavadeira Pa Carregadeira Camião Pneu PC 200 Máquina Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/07/2024				Data: 07/07/2024						

[Handwritten signature]

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				DATA 08/07/2024									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				E F E T I V O P E S S O A L									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATEGORIA									
CONTRATO Nº 176/2023				MÃO DE OBRA INDIRETA									
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				MÃO DE OBRA DIRETA									
SIMBOLOGIA				RESUMO DO EFETIVO									
<p>1. Tempo Bom 2. Chuva e cond. Trab. 3. Chuva e cond. Trab.</p> <p>SERVAÇÕES E RECUITADOS OCORRÊNCIAS</p> <p>ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x18x18cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 COM PREPARO EM BETONERA 400L. PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. 4,6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=95MPa, sob coxim areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FIBTO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTER), INCLUINDO TELA DE AÇO SOLDADA</p>				<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança 1</p> <p>Aux. Edif. 1</p> <p>Encarregado geral</p> <p>INÍCIO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Tipógrafo</p> <p>Assistente de topografia</p> <p>Probleta 20</p> <p>Ajudante Geral 25</p> <p>Calculista</p> <p>Capataz 3</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Motorista</p> <p>Operador Elétrico</p> <p>Electricista</p> <p>Operador de Pintal</p> <p>Operador de Escavadeira 1</p> <p>Operador de PA carregadeira</p> <p>Motorista de c/arrua 1</p> <p>Pintor</p> <p>Armeiro 2</p> <p>INÍCIO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>INÍCIO DIA</p> <p>INACUMULADO</p> <p>EFETIVO E EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO QTD.</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Camionete 100cc</p> <p>Camionete 1000</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pa carregadeira</p> <p>Capataz</p> <p>Pintal</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibrante</p>									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS									
RENEHE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO									
Data: 08/07/2024				Data: 08/07/2024									

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				08/07/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR											
CONTRATO Nº: 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2023				ADOL: 307			
CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDETERMINADA							
SÍMBOLOGIA											
<p>1. Tempo Bom 2. Chuva c. cont. Trab. 3. Chuva e cont. Trab.</p> <p>SERVIÇOS E RECURSOS OCORRENCIAS</p> <p>ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VÍGIA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS);</p> <p>LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 8 CM.</p> <p>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017</p> <p>Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 8x18x18cm</p> <p>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS</p> <p>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPa.</p> <p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L</p> <p>PORRÃO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.</p> <p>Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 30x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR 9781, Fck(min)=95MPa, sob costm areia grossa</p> <p>PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA</p>				<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Ass. Adm. 1</p> <p>Baixa de obra 1</p> <p>Encarregado geral</p>							
RESUMO DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				RESUMO DO DIA							
				RESUMO ACUMULADO							
				EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD							
				Máquina Leve							
				Caminhão Bituck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capomba							
				Patrol							
				MC 300							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/07/2024				Data: 08/07/2024							

[Handwritten signature]

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		10/07/2024									
		S	T	X	O	O	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2023 ID.O: 300		EFETIVO PESSOAL									
CATEGORIA: QTD:		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SINOPSE TÉCNICA:		MÃO DE OBRA DIRETA									
SERVIÇOS E REQUISITOS OBRIGATORIOS:		1- Terço Bem 2- Chave e com. Trab. 3- Chave e com. Trab. 1- Escavadeira 2- Operário 3- Operário 4- Operário 5- Operário 6- Operário 7- Operário 8- Operário 9- Operário 10- Operário 11- Operário 12- Operário 13- Operário 14- Operário 15- Operário 16- Operário 17- Operário 18- Operário 19- Operário 20- Operário 21- Operário 22- Operário 23- Operário 24- Operário 25- Operário 26- Operário 27- Operário 28- Operário 29- Operário 30- Operário 31- Operário 32- Operário 33- Operário 34- Operário 35- Operário 36- Operário 37- Operário 38- Operário 39- Operário 40- Operário 41- Operário 42- Operário 43- Operário 44- Operário 45- Operário 46- Operário 47- Operário 48- Operário 49- Operário 50- Operário 51- Operário 52- Operário 53- Operário 54- Operário 55- Operário 56- Operário 57- Operário 58- Operário 59- Operário 60- Operário 61- Operário 62- Operário 63- Operário 64- Operário 65- Operário 66- Operário 67- Operário 68- Operário 69- Operário 70- Operário 71- Operário 72- Operário 73- Operário 74- Operário 75- Operário 76- Operário 77- Operário 78- Operário 79- Operário 80- Operário 81- Operário 82- Operário 83- Operário 84- Operário 85- Operário 86- Operário 87- Operário 88- Operário 89- Operário 90- Operário 91- Operário 92- Operário 93- Operário 94- Operário 95- Operário 96- Operário 97- Operário 98- Operário 99- Operário 100- Operário									
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CDRAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 9 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 8x18x18cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COQUE DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. PODERO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 30x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR 9782, Fck(min)=35MPa, sob cossim areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA		Garanta de Obra Engenheiro 1 Fac. de Engenharia 1 Ass. Técnico 1 Escavadeira 1									
CONSIDERAÇÕES:		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DIA JORNADA DE TRABALHO RENDIMENTO RENDIMENTO ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES:		EFETIVO E OUBRIMENTOS TIPO QTD. Máquina Leve Camião de Truck Camião de Toca Escavadeira Pó carregadeira Capomba Patrol PC 300 Placa Vibratória									
RESUMO DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO: Data: 10/07/2024									

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		DATA		M		S		T		Q		O		S		S		D	
		11/07/2024																	
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ALIZ</p> <p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR</p> <p>CONTRATO Nº 179/2023</p> <p>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023</p> <p>NO: 309</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS: MANTA () TELA ()</p> <p>SERVIÇOS E EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS:</p> <p>1. Tempo Bom 2. Chuva c. com. Trab. 3. Chuva e com. Trab.</p> <p>ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DOU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=39MPa, sob coxim areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FETO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA</p>		<p>CATEGORIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Fisc. de Segurança 1</p> <p>Aux. Administrativo 1</p> <p>Encarregado geral 1</p>		<p>MÃO DE OBRA OBRUTA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Assistente de Topografia 20</p> <p>Ajustante Geral 25</p> <p>Carpinteiro 3</p> <p>Operador de Motocerra 1</p> <p>Motocerra 1</p> <p>Operador de Patrul 1</p> <p>Operador de Escavadeira 1</p> <p>Operador de Pa carregadeira 1</p> <p>Motocerra de cavaamba 1</p> <p>Placa 1</p> <p>Arrombador 2</p>															
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		ELETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA OBRUTA		MÃO DE OBRA OBRUTA		MÃO DE OBRA OBRUTA		MÃO DE OBRA OBRUTA		MÃO DE OBRA OBRUTA	
OBSERVAÇÕES		ELETIVO E OBRUTOS		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA	
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO																	
Data: 11/07/2024		Data: 11/07/2024																	

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data: 12/07/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S		T		Q		O	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR			EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 176/2023			CATEGORIA				OBTÉ			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			MÃO DE OBRA INDIRETA							
NOME: JTB			MÃO DE OBRA DIRETA							
SÍMBOLOGIA			SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS							
<p>1. Tempo Bem 2. Chave e/ou cond. Trab. 3. Chave e/ou cond. Trab.</p> <p>ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COIROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 8x18x18cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp. 6cm, 46un/m², NBR 9781, Fck(min)=35MPa, sob casim. areia grossa. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA</p>			<p>Gerente de Obra 1</p> <p>Téc. de Segurança 1</p> <p>Ass. Adm. 1</p> <p>Maestre de obra 1</p> <p>Escarregado geral 1</p>							
Hs DO DIA			Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/07/2024			Data: 12/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data: 13/07/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 176.2823		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003.2823		NRQ: 211			S T O Q S S D	
SEM SERVIÇOS		1. Tempo Bom 2. Chove o cont. Trab. 3. Chove e cont. Trab.		EFETIVO PESSOAL				
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA		CATEGORIA				
SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra Engenheiro FIC de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral		OTDE				
CONSIDERAÇÕES		MAO DE OBRA DIRETA		RESUMO DO EFETIVO				
OBSERVAÇÕES		Topografo Auxiliar de topografia Pintor Apontador Local Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador Eletricista Marinheiro Operador de Pátrol Operador de Escavadeira Operador de Pátrolagem Motorista de caminhão Pintor Arriador		E F E T I V O E Q U I P A M E N T O S				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		VEÍCULO LEVADO Caminhão Branco Caminhão Toco Escavadeira Pátrolagem Licença Pátrol PC 300 Plataforma				
Data: 13/07/2024		Data: 13/07/2024		JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO				

[Handwritten signature]


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				14/07/2024	S	T	Q	Q	B	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 179/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 312		EFETIVO PESSOAL			
CATEGORIA: Mão de Obra Indireta QTD:												
1- Tempo Bom 2- Classe o. com. Trab. 3- Classe si. com. Trab. SERVIÇOS E RECURSOS OCORRENCIAS												
SEM SERVIÇOS												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E OUBRIMENTOS								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
DATA: 14/07/2024				DATA: 14/07/2024								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				15/07/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 178/2023			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			ADID: 313			EFETIVO PESSOAL	
	Contrato: 178/2023			Valor: 1			Valor: 1			CATEGORIA: MÃO DE OBRA DIRETA	
SÍMBOLOS: 1- Tempo Bom 2- Chuva q. cont. Trab. 3- Chuva q. cont. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS E REQUISITOS OCORRENCIAS				Engenheiro 1							
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 30x15x10cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. FERRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 30x20cm, esp. 6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=8MPa, sob coxim areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FIBTO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA				Tac. de topografia 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA							
OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajustante Geral 25 Calculista Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Motorista Montador e Intelectual Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Máquina de Cimento Montador de capangas 1 Puxa Armador 2							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA CUMULADO							
				EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD. Veículo Leve Camião de Bênk Camião Toco Escavadeira Máquina de Cimento Capanga Puxa PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/07/2024				Data: 15/07/2024							




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				16/07/2024	S	T	O	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 178/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2023 NDO: 314							
SÍMBOLOGIA 1. Tempo Bom 2. Chuva e/ou vento 3. Chuva e/ou vento 4. Chuva e/ou vento				CATEGORIA EFETIVO PESSOAL							
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DOU SARATAS, ESPESURA DE 9 CM. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 8x18x18cm IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. PISO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 30x20cm, esp. 46mm/m2, NBR 9781. Fck(mín)=8MPa, sob casim areia grossa PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FETO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTER), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA				MÃO DE OBRA INDIRETA Operário de Obra 1 Inspetor 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Alvenaria Geral 25 Carpinteiro 3 Operário de Motoniveladora Motorista Motorista e Mecânico Elétrica Operador de Petrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão 1 Pneu Armeiro 2							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO NDO DO DIA INACUMULADO							
DESCRIÇÃO				EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO QTD. Veículo Leve Camião de 8 toneladas Camião de 12 toneladas Escavadeira Pá carregadeira Caminhão Petrol AC 200 Máquina Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 16/07/2024				SERVIÇOS: Data: 16/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				17/07/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2023			ND-01		315					
	SÍMBOLOS Matéria ()		Tarefa ()		Hora ()						
1. Tempo Bom 2. Chove e com. Trab. 3. Chove e sem Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL							
EXECUÇÃO DO FORNO DO GESSO EXECUÇÃO DE PINTADERIA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA ESCAVAÇÃO PARA DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO				CATEGORIA							
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de Topografia							
				Aux. Adm.							
				Diante de obra							
				Encarregado geral							
				REBDO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de Topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calculista							
				Capataz							
				Operador de Máquina							
				Motofone							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Motofone de caçambas							
				Profa							
				Armadão							
				REBDO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				REBDO DIA							
				RELA CUMPRIDO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E QUANTIDADE							
				TIPO				QTD.			
				Módulo Leve							
				Carrocinho Black							
				Carrocinho Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Capataz							
				Profa							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
DESCRIÇÃO DE OBRA:				REALIZAÇÃO:							
Data: 17/07/2024				Data: 17/07/2024							

[Handwritten signature]

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				18/07/2024	S	T	Q	Q	S	S	S	D			
 CLIENTE: PRE FEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			NO: 316		EFETIVO PESSOAL									
	CATEGORIA				QTDE										
SERVIÇOS				MÃO DE OBRA INDIRETA											
1 - Terra Brta 2 - Choca e cons. Trab. 3 - Cava e cons. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1											
				Insp. de Segurança Aux. Adm. 1											
				Mestre de obra Encarregado geral 1											
				RESUMO DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Triangulo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Cadeirao Carpinteiro 3											
				Operador de Motocicla Motorista Motorista Motorista E Mecanico Eletreico Operador de Pneu Operador de Escavadeira 1 Operador de Pa Carregadeira Motorista de caminhão 1 Placa Arremate 2											
				RESUMO DO EFETIVO											
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO RENO DO DIA N/A CANCELADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E COMPENSAÇÃO											
				TIPO QTD											
				Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Toco Escavadeira Pa Carregadeira Caminhão Pneu PC 200 Placa Vibrante											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 18/07/2024				Data: 18/07/2024											



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				19/07/2021	S	T	Q	Q	S	S	S	D			
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 076/2021	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021			EFETIVO PESSOAL											
	RDO: 317			CATEGORIA					QTDE						
SÍMBOLOS: Matéria () Ferragem () 1. Tempo Bruto 2. Chama Q. com. Trab. 3. Chama Q. com. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SITUAÇÕES E RECLAM. OCORRÊNCIAS:				Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra Escarregador geral 1											
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE PINGADERA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA ESCAVAÇÃO PARA DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceiro Capataz 3 Operário de Motosserra Motorista Serrador Montador e Instalador Eletricista Operador de Patrul Operador de Escavadeira 1 Operador de PA carregadeira Motorista de caçambas 1 Pneu Arrendar 2											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVOS EQUIPAMENTOS											
				TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Tico Escavadeira PA carregadeira Capataz Pneu RC 200 Placa Vibrante											
DEPARTAMENTO DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO											
Data: 19/07/2021				Data: 19/07/2021											



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023			20/07/2024									
			S E T O Q O B S D									
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			ADJ. 318									
Mês () Dia () Hora ()			MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1. Tempo Bom 2. Chuva e cond. Trab. 3. Chuva e cond. Trab.			Descrição de Obra Engenharia Fun. de Segurança Aux. Adm. Almoço de obra Encargado geral									
SEM SERVIÇOS			MÃO DE OBRA Topógrafo Auxiliar de topógrafo Pedreiro Apicalista Geral Calceiro Capanga Operador de Máquina Motorista Mecânico Eletricista e Instalador Elétrico Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Trator Motorista de capanga Plator Armador									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO									
			EFETIVO DO DIA HORAS DE TRABALHO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES			EFETIVO E EQUIPAMENTOS									
			TIPO Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Trator Escavadeira Trator Capanga Patrol HC 300 Placa Veicular									
GERENTE DE OBRA:			REALIZAÇÃO									
Data: 20/07/2024			Data: 20/07/2024									



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
 CLIENTE: PM FORTALEZA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023				21/07/2024									
				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 319									
Nome: () CPF: () 1. Tempo Bom 2. Chama o cons. Trab. 3. Classe M. cons. Trab. SERVIÇOS E RECURSOS OCORRIDOS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: QTD: MÃO DE OBRA INDIRETA									
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Aux. Adm. Mão de obra Encarregado geral MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de Topógrafo Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motocarro Motorista Mecânico Montador e Mecânico Eletricista Operador de Pórtico Operador de Escavadeira Operador de Pórtico carregadeira Montadora de capômetro Pintor Arreator MÃO DE OBRA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DIA JORNADA DE TRABALHO PREÇO DIA VALOR ACUMULADO									
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO: QTD: Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Trator Escavadeira Pórtico carregadeira Capômetro Pintor MC 200 Placa Vibratória									
OBSERVAÇÕES													
GERENTE DE OBRA: Data: 21/07/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/07/2024									



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		22	07	2024	S	T	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 903/2023 NºPJ: 348						
Localização: Santa Luz - SP		MAO DE OBRA INDIRETA						
SÉRIE/LOGIA: 1		Gerente de Obra Engenheiro 1 Inc. de Segurança Ass. Adm 1 Mestre de obra Escarregado geral 1						
1. Trabalho 2. Obra 3. Obra 4. Obra 5. Obra 6. Obra 7. Obra 8. Obra 9. Obra 10. Obra		MAO DE OBRA DIRETA						
EXECUÇÃO DO FERRO DO GESSO EXECUÇÃO DE PINGADERA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS FEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO		Topografo Acionador de topografia Faltista 2 Ajuntador local 2 Caloteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Pintal Operador de Escavadeira 1 Operador de PA carregadeira Motorista de caminhão 1 Pintor Arripador 2						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: Data: 22/07/2024		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
FISCALIZAÇÃO: Data: 22/07/2024		Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Licença Pintal PC 200 Plata Vibratória						

[Handwritten signature]


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				DI	TE	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 003/2023 ADQ: 322				E F E T I V O P E S S O A L						
Simbologia: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou. Tráf. 3- Chuva e/ou. Tráf. 4- SERRAÇÕES E RECUTADOR (OCORRÊNCIAS)				CATEGORIA			QTD			
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE PINTURA DOS QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Téc. de Segurança 1 Aux. Edif. 1 Escrivão de obra 1 Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo 1 Auxiliar de Topografia 20 Pedreiro 20 Ajudante Geral 20 Carpinteiro 3 Operador de Motosserra 1 Betonista 1 Montador 1 Instalador Elétrico 1 Encanheiro 1 Operador de Petrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pa Carregadeira 1 Betonista de cimento 1 Pintor 1 Armador 2						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO INÍCIO DA TÉRMINO DA						
				OBSERVAÇÕES						
				E F E T I V O E Q U I P A M E N T O						
				TIPO QTD Trilho de Lona 1 Caminhão Bitock 1 Caminhão Toco 1 Escavadeira 1 Pa Carregadeira 1 Capumba 1 Petrol 1 Rolo 200 1 Placa Vibratória 1						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/07/2024				Data: 22/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA											
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 479.2823	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 880.2923				MUNICÍPIO:	ZZ					
	Mês:		1		Dia:		1		Hora:		
1. Tempo Bem 2. Chave a cond. Trab. 3. Chave a cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS											
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE PINTURA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS FEITORES DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO											
Gerente da Obra Engenheiro 1											
Tec. de Segurança Acabado 1											
Mestre de obra Escarregado geral 1											
Hs DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor 20 Auxiliar Geral 25 Carpinteiro Operador de Motocerra 3 Motorista Montador e Mecânico Motorista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira Operador de P/Compactadora 1 Motorista de caminhão 1 Vistor Arrastor 2											
Hs DO DIA											
CONSIDERAÇÕES											
RESUMO DO EFETIVO											
Hs DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES											
EFETIVO E EQUIPAMENTOS											
Veículo Leve Caminhão Merck Caminhão Teca Escavadeira P/Compactadora Cargueiro Patrol PC 300 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/07/2024					Data: 25/07/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 126/2023				26/07/2024						
				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 Nº DO: 324						
MEMBRO () 1 () 1. Tempo Bom 2. Classe O. cond. Trab. 3. Classe S. cond. Trab. SERVIDOR E RECIPIENTADO (OCORRÊNCIAS)				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: MAO DE OBRA RUROTA QTD:						
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de topografia Aux. Adm. Mestre de obra Escavadeira geral IN-DI DIA MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral C. de alvenaria Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Elétrico Eletricista Operador de Pipel Operador de Escavadeira Operador de Máquina Mecânico de caminhão Pintor Arreiro IN-DI DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO IN-DI DIA IN-DI DIA OBSERVAÇÕES EFETIVOS E SUBSTITUÍDOS TPO QTD: Valcilo Leoni Caminhão Truck Caminhão Trator Escavadeira Máquina Cargueiro Pintor JC 200 Pneu Vibratório						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVOS E SUBSTITUÍDOS						
OFICINA DE OBRA: Data: 26/07/2024				LOCALIZAÇÃO: Data: 26/07/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			27.07.2024							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR			ELETIVO PESSOAL							
	CONTRATO Nº: 07/2023			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		NDO: 329		CATEGORIA			QTDE
SÍMBOLO DA	Metrô ()	F ()	T ()	T ()	T ()	T ()	T ()	T ()	T ()	T ()	T ()
1. Tempo Bom 2. Chove c. cond. Trab. 3. Chove n. cond. Trab.				MÃO DE OBRA RESERVA							
SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de topografia							
				Aux. Adm.							
				Mostr. de obra							
				Encarregado geral							
								MÃO DE OBRA DIRETA			
Topógrafo											
Assist. de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Carpinteiro											
Capanga											
Operador de Motosserra											
Mecânico											
Montador											
Montador E. Hidráulica											
Eletroscista											
Operador de Patrulha											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa. de regularização											
Mecânico de caminhão											
Pintor											
Armadador											
				RESUMO DO ELETIVO							
				EFE TIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO											
MÃO DE OBR											
MÃO DE OBR. ACUMULADO											
				ELETIVO E EQUIPAMENTO							
				TIPO				QTDE.			
Válvula Leve											
Caminhão Mitsub											
Caminhão Terc											
Escavadeira											
Pa. de regularização											
Capanga											
Patrul											
PC 200											
Placa Vibratória											
GENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27.07.2024				Data: 27.07.2024							



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 176.280				28/07/2024						
				S	T	Q	0	S	S	0
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 803.780				EFETIVO PESSOAL						
NRDE: 336				CATEGORIA			OTDE			
MÃO DE OBRA INDIRETA										
1. Tempo Base 2. Chave a. cont. Trab. 3. Chave a. cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tcc. de Segurança Ass. Adm. Mestre de obra Escarregado geral						
SEM SERVIÇOS				HORA DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Apoiador lateral Calandria Carpinteiro Operador de Motocreta Motorista Motorador Montador e INICIATA Eletreista Operador de Pátrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caminhão Plater Armeiro						
				HORA DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HORA DO DIA HORA ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS						
				Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Licença Pátrol PC 209 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/07/2024				Data: 28/07/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 476/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 327		29/07/2024						
SIMBOLOGIA: Nome: () Tipo: () 1- Tempo Item 2- Chama o cont. Trab. 3- Chama o cont. Trab. SERRAÇÕES/RECURSOS/OCORRÊNCIAS				ESTATIVO PERSONAL										
				CATEGORIA				QTD						
EXECUÇÃO DO FORRO DO BESO EXECUÇÃO DE PINGADERA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS FEITORES DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO				MÃO DE OBRA INDIRETA										
				Gerente de Obra							1			
				Engenheiro										
				Téc. de Segurança							1			
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo										
				Assistente de Topografia										
				Pedreiro							20			
				Apontador Geral							25			
				Carpinteiro							3			
				Operador de Motosserra										
				Montador										
				Montador Elétrica										
				Eltricista										
				Operador de Petrol										
				Operador de Escavadeira							1			
				Operador de Pa carregadeira										
				Motorista de caminhão							1			
				Pintor										
				Armadador							2			
				MÃO DE DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				MÃO DE DIA										
				MÃO DE DIA ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E GABARITOS										
				TIPO				QTD.						
				Válvula Leve										
				Caminhão Truck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pa carregadeira										
				Caminhão										
				Petrol										
				JC 200										
				Placa Vibratória										
GÉRMEN DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/07/2024				Data: 29/07/2024										




 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		30/07/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 175/2023		EFETIVO PESSOAL						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		CATEGORIA						
Nº de 1 1. Tempo Rem 2. Chave e cond. Trab. 3. Chave e cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO DO FORRO DO BESO EXECUÇÃO DE PINTURA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO		Gerente de Obra Engenheiro 1 T.C. de Segurança Aux. Adm 1 Mestre de obra Escarregado geral 1						
		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Afundado geral 20 Canteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador hidráulica Siderista Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão 1 Pintor Arrastor 2						
CONSIDERAÇÕES		RESERVO DE EMPL. INDI 03 = 1 INU DO DIA JORNADA DE TRABALHO 0h DO DIA 0h ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		RESERVO DE EQUIPAMENTOS Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Camião Párol P.C. 200 Pínea vibratória						
GERENTE DE OBRA Data 30/07/2024		FISCALIZAÇÃO Data 30/07/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				31/07/2024	S	T	X	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 076/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 329			EFETIVO PESSOAL					
	SÍMBOLOGIA			1. Tempo Bom 2. Chuva c/ cond. trab. 3. Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA					QTD
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE PINTADERA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VISAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO				SITUAÇÃO RECURSOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA					
				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								
				Fac. de Supervisão								1
				Ass. Adm.								
				Ass. de obra								1
				Encarregado geral								
				M.D.O DA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								20
				Ajustante Geral								25
				Carpinteiro								
				Carpinteiro								3
				Operador de Máquina								
				Montador								
				Montador								
				Montador E. Létrico								
				Eletreletricista								
				Operador de Máquina								
				Operador de Escavadeira								1
				Operador de Rô. Carregadeira								
				Bombeiro de Cimento								1
				Plata								
				Armadador								2
				M.D.O DA								
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO					
							EFE TIVO DO DIA					
							JORNADA DE TRABALHO					
							M.D.O DA					
							M.ACCUMULADO					
OBSERVAÇÕES							EFETIVO E EQUIPAMENTOS					
							TIPO					QTD
							Volante Leve					
							Caminhão 10t					
							Caminhão 7t					
							Escavadeira					
							Rô. Carregadeira					
							Caminhão					
							Plata					
							PC 200					
							Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 31/07/2024				Data: 31/07/2024								




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				31/08/2024	S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 1912823				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 903.5923 MPU: ZM							
SÍMBOLO DA OBRA: 1 1. Tempo Item 2. Obra a ser constr. 3. Obra a ser constr.				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA				OTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DO FERRO DO BÊSSO EXECUÇÃO DE PINGADEIRA DO QUIOSQUE NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LEVANTE DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Inc. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra Escarapote geral 1							
				RH DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor 20 Ajudante geral 20 Caldeiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador Elétrico Eletricista Operador de Pintor Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caminhão 1 Motorista Arrastador 2							
				RH DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO RH DO DIA RH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Tipo OTDE Volvo Leste Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Lixadeira Motor PC 300 Placa Vibração							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/08/2024				Data: 01/08/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		30/08/2024	S	T	Q	0	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 980/2023		MODO: EPI				
Nome: 1 1. Tempo Bruto 2. Chave de cond. Trab. 3. Chave de cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFEATIVO PESSOAL CATEGORIA QTD MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Esc. de Segurança Ass. Adm 1 Mão de obra Escarpetado geral 1						
EXECUÇÃO DO FÓRDO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 08 Alcantolado 20 Caloteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Mandador/Eletricista Encanador Operador de Prensa Operador de Escavadeira 1 Operador de PA carregadeira Motorista de caminhão 1 Pintor Arrastador 2						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFEITIVO						
		EFEITIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HORAS DO DIA HORAS ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EQUIPAMENTOS						
		Vinte e Nove 29 Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira PA Carregadeira Cascalho Prensa P.C. 200 Plataforma						
GERENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO						
Data: 02/08/2024		Data: 02/08/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				03/08/2024						
				S	T	O	Q	S	X	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO BARRIO POPULAR CONTRATO Nº 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			EFETIVO PESSOAL						
	Mãe ()	Filho ()	Idoso ()	CATEGORIA			QTD			
1. Tempo Bom 2 - Chave e com. Trab. 3. Chave e com. Trab. SERVIÇOS RECURSOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS				Garantia de Obra Engenheiro Esc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral HINDO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Auxiliar Geral Carpinteiro Carpinheiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador E. Hidráulico Eletricista Operador de Páteo Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Mecânico de Capamba Pintor Arreiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DIA JORNADA DE TRABALHO HINDO DIA HINACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				ELETIVO E OUBRAMENTO						
				TIPO QTD Velocidade Leve Camião Truck Camião Tron Escavadeira Pá carregadeira Capamba Páteo Pá 200 Páa Velocidade						
DEPARTAMENTO DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
DATA: 03/08/2024				DATA: 03/08/2024						




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				04/08/2024									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				E F E T I V O P E S S O A L									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATEGORIA									
CONTRATO Nº 076/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023									
Materia				MÃO DE OBRA INDETERMINADA									
1. Tempo Bom 2. Chave o com. Trab. 3. Chave sí cond. Trab.				OTDE									
SMB/LOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Esc. de Engenharia Ass. Adm. Mestre de obra Escorregadio geral MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajustante Geral Carpinteiro Carpinteiro Operador de Máquina Mecânico Montador Montador Elétrica Eletricista Operador de Máquina Operador de Escavadeira Operador de Pa. carregadeira Mecânico de caminhão Pintor Arremador									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO MÃO DE OBRA INACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVOS EQUIPAMENTOS									
				TIPO QTD.									
				Veículo Leve Caminhão 18000 Caminhão Trator Escavadeira Pa. carregadeira Cargueiro Prato PC 200 Placa Vibratória									
DESCRIÇÃO DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 04/08/2024				Data: 04/08/2024									

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
			X									
05/08/2024			S	T	Q	Q	S	S	S	D		
 <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 178/2023</p>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		Nº 01: 334		EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA				QTD	
	Mês	1	Dia		1		MÃO DE OBRA INDIRETA					
	1. Tempo Bom 2. Chove a cond. Trab. 3. Chove a cond. Trab.			Situação								
	SERVIDORES CONTRATADOS / OCORRÊNCIAS											
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES							Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Suprimento Aux. Adm. 1 Mestre de obra Encarregado geral 1					
							MÃO DE OBRA					
							MÃO DE OBRA DIRETA					
							Topógrafo Auxiliar de Topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador e Montecista Eletroista Operador de Páteo Operador de Escavadeira 1 Operador de Pa carregadeira Montador de cimento 1 Pneus Arquiteto 2					
							MÃO DE OBRA					
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO					
							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA CUMULADO					
OBSERVAÇÕES							EFETIVOS EQUIPAMENTOS					
							TIPO QTD.					
							Válvula Leve Caminhão 10000 Caminhão 15000 Escavadeira Pa carregadeira Caminhão Páteo PC 200 Pneus a Vitrólica					
GEMINTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:									
Data: 05/08/2024			Data:		05/08/2024							




Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Dia										
				31/08/2024	S	T	Q	O	S	S	D			
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 063/2023 NºDI: 326				EFETIVO PESSOAL										
				CATEGORIA							QTDE			
SINOPSE				MÃO DE OBRA INDIRETA										
EXECUÇÃO DO FERRO DO BESO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES				1. Tempo Bem			2. Chevo cond. Trab.		3. Chevo cond. Trab.		Gerente de Obra			
				wob 1			1		1		1	1		
				Total			1		1					
				NENHOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
GERENTE DA OBRA				MÃO DE OBRA DIRETA										
Nº DO DIA				Topógrafo Auxiliar de topografia Pintor Almotoxeiro Calculista Carpinteiro Operador de Motosserra Motociclista Motorista Operador de Máquina Motorista de Camião Motorista de Camioneta Operador de Pácarregadora Operador de Escavadeira Operador de Pácarregadora Motorista de Camião Motorista de Camioneta Operador de Máquina										
CONSIDERAÇÕES				2 2 3 1 1 2 2										
OBSERVAÇÕES				Nº DO DIA JORNADA DE TRABALHO Nº DO DIA Nº ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA:				Nº DO EQUIPAMENTO QTD.										
Data: 07/08/2024				Visão Leste Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pácarregadora Camião Motor Pácarregadora Pácarregadora										
FISCALIZAÇÃO:														
Data: 07/08/2024														

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				08/08/2024	S	T	Q	O	B	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			MO: 237		EFETIVO PESSOAL						
	Mês: 1 / 1			Dia: 1 / 1			CATEGORIA					
	1. Tempo Bom 2. Chuva c. cond. Trab. 3. Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA DIRETA								
SIMULAÇÃO SERVIÇOS E RECURSOS OCORRIDOS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Esc. de Engenharia Aux. Adm. 1 Auxiliar de obra Encarregado geral 1								
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VISAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calfiteiro Carpinteiro 3 Operador de Motocerra Motorista Montador Serralteiro E Metalista Estruc. de Aço Operador de Petrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçambas 1 Pintor Armador 2								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				MÃO DE OBRA JORNADA DE TRABALHO MÃO DE OBRAS REALIZADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVOS EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTD								
				Veículo Leve Camião de Resaca Camião de Terra Escavadeira Pá carregadeira Capoteira Petrol PC 200 Placa Vibratória								
SINOPSE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO								
Data: 08/08/2024				Data: 08/08/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR COMITADO N°: 179/2023		09/09/2024 S T Q Q S S D	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		EFETIVO PESSOAL	
RDO: 238 Nº de Mão de Obra Direta: 1		CATEGORIA	
1. Tempo Bem 2. Chave e cond. Trab. 3. Chave e cond. Trab. STRAÇOS E RECIPIENTES / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA	
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Seguiança Aux. Adm. 1 Baixa de obra Encargado geral 1 MÃO DE OBRA DIRETA Topografia Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Apontador Geral 25 Canteiro 3 Operador de Motores e Motores Motocicla Motorista E Mecânica Elétrica Operador de Pintor Operador de Encanador 1 Operador de PA corresponsável Assistente de segurança 1 Pintor Armer 2	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DIA JORNADA DE TRABALHO Nº DO DIA Nº ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO E EQUIPAMENTOS	
		TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Buss Caminhão Trator Escavadeira Trator corresponsável Capacete Pintor PC 200 Placa Vibratória	
SINOPSE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO	
Dia: 09/09/2024		Data: 09/09/2024	

(Handwritten signature)

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		10/08/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 1762823		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 803/2023							
Mês: 1 Dia: 1 Hora: 1		Nº de: 1 Hora: 1							
SÍMBOLO: 1 Tempo Base: 1 Chave e cond. Trab.: 1 Chave e cond. Trab.: 1		Nº de: 1 Hora: 1							
SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Mão de Obra Indireta Gerente de Obra Engenheiro I. Sc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral					
CONSIDERAÇÕES				Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia Pintores Ajustador Leste Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Mecânico/Eletricista Estacionista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P.A. carregadeira Motorista de caminhão Pintor Arrastador					
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO DIA DIA 1 DO DIA JORNADA DE TRABALHO Nº DO DIA Nº ACUMULADO					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		TIPO: Visto Leve Canteiro: Canteiro Escavadeira P.A. carregadeira Caminhão Patrol PC 200 Placa Vibratória					
Data: 10/08/2024		Data: 10/08/2024							



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Dia						
		11/08/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023		EFETIVO PESSOAL						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		CATEGORIA		OTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra Engenheiro Fiscal de Segurança Ass. Adm. Mestre de obra Escarregado geral						
1. Tempo Bom 2. Chuva e/ou cond. Trab. 3. Chuva e/ou cond. Trab.		Hs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/eletricista Estacionista Operador de Páteo Operador de Escavadeira Operador de P/Carregadeira Motorista de caçamba Pintor Arrastor						
RESUMO DO EFETIVO		Hs INÍCIO DO DIA Hs FIM DO DIA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO OTDE Winkler Leste Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira P/Carregadeira Cimento Páteo PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 11/08/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 11/08/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 09/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 341		EFETIVO PESSOAL			
	1. Tempo Rem 2. Chave c. cond. Trab. 3. Chave s/ cond. Trab. SERVIÇOS E RECURSOS OCORRENCIAS		CATEGORIA		QTD			
SÍMBOLO DA EXECUÇÃO DO FERRO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DE PINGADERA DOS QUIOSQUE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES EXECUÇÃO DE FERRO PVC		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra		1				
		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança		1				
		Aux. Adm.		1				
		Mestre de obra		1				
		Encarregado geral		1				
		RÉDITO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Assistente de topografia		20				
		Pedreiro		25				
		Assistente civil		25				
		Carpinteiro		3				
		Capateiro		3				
		Operador de Motosserra						
		Motocivis						
		Montador						
		Montador e laticínios						
		Elétrico						
		Operador de betão						
		Operador de Escavadeira		1				
		Operador de Pá carregadeira		1				
		Assistente de caçamba		1				
		Pintor		2				
		Arquiteto		2				
		RÉDITO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DIA		JORNADA DE TRABALHO				
		RÉDITO DIA		RÉDITO ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES		EFETIVO E COMPARAÇÃO						
		TIPO		QTD				
		Veículo Leve						
		Compressor						
		Caminhão 10m						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Capamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
SITUAÇÃO DA OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/08/2024		Data: 12/08/2024						




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
EMPRESA	S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL						
								CATEGORIA						
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: SP0203 CONDIÇÃO PÚBLICA Nº: 003/2023 IDO: 342				1. Tempo Bom 2. Chave c. conv. Trab. 3. Chave s/ conv. Trab. SERVIÇOS E EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Fac. de Segurança Aux. Adm. 1 Aux. de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES EXECUÇÃO DE FORRO PVC								Mão de Obra Direta Topógrafo Assessor de Topografia 20 Insulador 25 Canteiro 3 Operador de Motosserra Mecânico Montador Motorista e Mecânica Encarregado Operador de Motor Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Assistente de Cacerba 1 Pintor Armeiro 2						
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES								EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Nº DO DIA Nº ACUMULADO						
								EFETIVO E GARANTIDOS TIPO QTD:						
GÉRENTES DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Velocidade Leve Canteiro Alvo Canteiro Topo Escavadeira Pá carregadeira Cacerba Pintor PC 200 Placa Vibrotato						
Data: 13/08/2024				Data: 13/08/2024										

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				14/08/2023	S	T	D	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: SN-0223	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			EFETIVO PESSOAL							
	Nº DO: 343			CATEGORIA				QTDE			
	MÃO DE OBRA DIRETA										
SIMBOLOGIA: 1. Tempo Bom 2 - Chove e com. trab. 3. Chove e com. Trab. ESPACOS E RECURSOS OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Fac. de Segurança Aux. Adm. 1 Mestre de obra Escarpadeira geral 1							
EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAJEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS REITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES EXECUÇÃO DE FORRO PVC				REBDO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografista Auxiliar de topografia Hidrômetro 20 Auxiliar Geral 25 Caldeiro Capataz 3 Operador de Motosserra Mecânica Montador Montador e Mecânica Hidrômetro Operador de Plató Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Plator Arreio 2							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				RESUMO DO DIA JORNADA DE TRABALHO REBDO DIA NÃO CUMPRADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E GASTAMETON							
				TIPO QTD. Velocidade Leve Camião de Bordo Camião de Terra Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Plator PC 200 Pneu a Vácuo							
DEPENDE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO							
Data: 14/08/2023				Data: 14/08/2023							



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 15/08/2024						
				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA						
				QTD						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N°: 09/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 003/2023 EDITAL: 244 Simbologia: Nome: () Tipo: () Item: () Sub-item: () 1- Tempo Bom 2- Chovia ou condi. Trab. 3- Serviço a' cond. Trab.	SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA Gestante da Obra 1 Engenheiro 1 Esc. de Engenharia 1 Aux. Adm. 1 Mestre de obra 1 Escarregador geral 1 MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de Topografia 20 Pedreiro 20 Apontado Geral 20 Calculeiro 3 Carpinteiro 3 Operador de Motosserra 1 Motorista 1 Montador e Mecânico 1 Eltricista 1 Operador de Petrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador do PA carregadeira 1 Motorista de caminhão 1 Pintor 2 Arromador 2 RESUMO DO EFETIVO EFE TIPO DO DIA JORNADA DE TRABALHO INÍCIO DO DIA FIM ACUMULADO EFETIVO E EQUIPAMENTOS TIPO QTD Tráfego Leve 1 Caminhão Block 1 Caminhão Tron 1 Escavadeira 1 Pa carregadeira 1 Caminhão 1 Petrol 1 FC 200 1 Placa Vibratória 1						
	EXECUÇÃO DO FORRO DO GESSO									
	EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO									
	NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO									
	EXECUÇÃO DE OBRAS EM DO ESTACIONAMENTO									
	EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA									
	EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES									
	EXECUÇÃO DE REBOCO									
	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES									
	EXECUÇÃO DE FORRO PVC									
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
PRESENTE DA OBRA:		FINALIZAÇÃO:								
Data: 15/08/2024		Data: 15/08/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Dia								
		14/09/2024	S	T	Q	0	X	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 903/2023	HURU: 340		EFETIVO PESSOAL							
	MÃO DE OBRA INDIRETA		CATEGORIA		QTD					
SÍMBOLOGIA 1. Tempo Eten 2. Obra e/ou. Trab. 3. Obra e/ou. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO FERRO DO GESSO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO EXECUÇÃO DO VIGAMENTO DA FACHADA EXECUÇÃO DOS PEITORIS DOS QUIOSQUES EXECUÇÃO DE REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PILARES	Mão de Obra 1. Enc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral									
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		TIPÓLOGIA								
		Atividade de topografia								
		Medição		20						
		Ajuste e nivel		20						
		Cálculo								
		Carpinete		3						
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador de elétrica								
		Elétrica								
		Operador de Pá de								
		Operador de Escavadeira		1						
		Operador de PA carregadeira								
		Motorista de caçamba		1						
		Pintor								
		Armador		2						
		MÃO DE OBRA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO						
		Hr DO DIA								
		Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		Vigante Leve		010						
		Caminhão Manck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		PA carregadeira								
		Caçamba								
		Pintor								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/09/2024		Data: 16/09/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				17/08/2024	S	T	Q	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 09/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 346		EFETIVO PESSOAL						
	Mês: (1)		Dia: (1)		Hora: ()		CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBIOLOGIA				1. Tempo Bom 2. Chave c. com. Trab. 3. Chave si com. Trab.				Garanta de Obra				
SERVIÇOS E RECURSOS OCORRENCIAS				Engenheiro								
SEM SERVIÇOS				Faz. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Escarregado geral								
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topograf								
				Assist. de Topografia								
				Pedreiro								
				Ajuvante Civil								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Montador								
				Montador e Mecânico								
				Eletrecista								
				Operador de Pedreiro								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de PA carregadeira								
				Bastante de cacoada								
				Plano								
				Armador								
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				DIA DO DIA								
				M.A. ACUMULADO								
				EFETIVO E CUMPRIMENTOS								
				TIPO				QTD.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Bisco								
				Caminhão Tona								
				Escavadeira								
				PA carregadeira								
				Carpinteiro								
				Plano								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FINALIZAÇÃO								
Data: 17/08/2024				Data: 17/08/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				18/08/2024	S	T	Q	Q	S	S	X
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 09/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 347		EFETIVO PESSOAL					
	Mão de Obra Indireta		Mão de Obra Direta		CATEGORIA						
SÍMBOLOGIA: 1. Tempo Bom 2. Chove o cont. Trab. 3. Chove a cont. Trab. SERVIÇOS E RECURSOS OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Fac. de Engenharia Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral RND DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alvenaria Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador e Instalador Eletricista Operador de Prensa Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Operador de caçamba Pintor Armador							
SEM SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DA JORNADA DE TRABALHO RND DO DIA ANACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD							
				Veículo Leve Camião de Boque Camião de Tronco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párola PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				ISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/08/2024				Data: 18/08/2024							



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				19/08/2024	S	T	Q	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 076/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 348		ELETIVO PESSOAL						
	Marca: () () () Tipo: () () () 1. Tempo Bem 2. Chave C. cond. TIA 3. Chave S/ cond. Tiel.			Nota: () () ()		CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SÍMBOLO DA				Serviço de Obra								
EXECUÇÃO INTERTRAVADO				Engenheiro 1								
RECUPERAÇÃO DE PILARES				Téc. de Segurança 1								
APLICAÇÃO DE SELADOR				Aux. Adm. 1								
APLICAÇÃO DE MASSA PVA				Mestre de obra 1								
				Encarregado geral 1								
				MÃO DE OBR. DIRETA								
				Topógrafo								
				Assist. de topografia								
				Pedreiro 20								
				Ajudante Geral 25								
				Carpinteiro 3								
				Operador de Motosserra								
				Mecânico								
				Montador								
				Montador Elétrico								
				Elétrico								
				Operador de Máquina								
				Operador de Escavadeira 1								
				Operador de Pa. Carregadeira								
				Mecânico de caminhão 1								
				Pneus								
				Armador 2								
				MÃO DE OBR.								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				LIMPAZA DE TRABALHO								
				MÃO DE OBR.								
				MÃO DE OBR. CUMPRIDA								
OBSERVAÇÕES				EFETIVOS EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTD.								
				Válvula Leve								
				Caminhão Bóck								
				Caminhão Tronk								
				Trator								
				Pa. Carregadeira								
				Caminhão								
				Pneus								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/08/2024				Data: 19/08/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
 CLIENTE: PNE FEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 349		S	X	T	Q	Q	S	S	D
	Mês: () / () / ()		Dia: () / () / ()		EFETIVO PESSOAL							
	1. Tempo Bom 2. Chove ou outro Tráf. 3. Chuva ou outro Tráf.		1. () 2. () 3. ()		CATEGORIA			QTD				
SERVIÇOS E RECURSOS OCORRENCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO INTERTRAVADO RECUPERAÇÃO DE PILARES APLICAÇÃO DE SELADOR APLICAÇÃO DE MASSA PVA					Gerente de Obra			1				
					Engenheiro			1				
					Téc. de Segurança			1				
					Aux. Adm.			1				
					Encarregado geral			1				
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro			20				
					Ajustante Geral			25				
					Carpinteiro							
					Carpinteiro			3				
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador E Mecânico							
					Eleticista							
					Operador de Petrol							
					Operador de Escavadeira			1				
					Operador de Pa carregadeira							
					Motorista de caminhão			1				
					Plata							
					Armador			2				
					MÃO DE OBRA							
					RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					MÃO DE OBRA							
					MÃO DE OBRA ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
					TIPO			QTD				
					Volante Leve							
					Caminhão 10t							
					Caminhão 10t							
					Escavadeira							
					Pa carregadeira							
					Carpinteira							
					Petrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/08/2024				Data: 26/08/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				21/08/2024									
				S T O O S S D									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: MEC DE OBRA INDIRETA QTD:									
1. Tempo Bom 2. Chama o cons. Trab. 3. Chama si cons. Trab. SERVIÇOS E RECLUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Fac. de Segurança Ror. Adm. 1 Maestre de obra Encarregado geral 1									
EXECUÇÃO INTERTRAVADO RECUPERAÇÃO DE PILARES APLICAÇÃO DE SELADOR APLICAÇÃO DE MASSA PVA				H/D/DI DA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Auxiliar Civil 20 Calceiro Capataz 3 Operador de Motosserra Motorista Secante Motorista E Mecânico Silenciado Operador de Petrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Di. correpietra Motorista de caçamba 1 Pintor Armeiro 2									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DA JORNADA DE TRABALHO H/D/DI DA H/A CUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS									
				TIPO QTD. Veículo Leve Camião de 16000 Camião 1000 Escavadeira Di. correpietra Capataz Petrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO									
Data: 21/08/2024				Data: 21/08/2024									



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				22/08/2024	S	T	Q	X	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 076/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 261								
	Mão de obra () 1. Tempo Bom 2. Chave G. cond. Trab. 3. Chave B. cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA								
EXECUÇÃO INTERTRAVADO RECUPERAÇÃO DE PILARES APLICAÇÃO DE SELADOR APLICAÇÃO DE MASSA PVA				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Fac. de Segurança								
				Ass. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografia												
Assist. de topografia												
Pedreiro												
Ajudante Civil												
Carpinteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Batedeira												
Mortelista												
Mortelista E Misturador												
Estraficador												
Operador de Máquina												
Operador de Escavadeira												
Operador de Máquina Carregadeira												
Mortelista de cimento												
Pintor												
Armadador												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				MÃO DE OBRA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				MÃO DE OBRA								
				MÃO DE OBRA ACUMULADO								
				DESCRIÇÃO DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO				
Data: 22/08/2024				Data: 22/08/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		23/09/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178.2823		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023		HORA: 12h				
1 Tempo Bom 2 Cheia de mão. Trab. 3 Cheia de mão. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL				
EXECUÇÃO INTERTRAVADO RECUPERAÇÃO DE PILARES APLICAÇÃO DE SELADOR APLICAÇÃO DE MASSA PVA				CATEGORIA		QTD		
				MÃO DE OBRA INDIRETA				
				Gerente de Obra Engenheiro 1				
				Esc. de Engenharia Aux. Adm. 1				
				Mão de obra Escarregado geral 1				
				Hrs DO DIA				
				MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topógrafo Auxiliar de topografia				
				Pintore 18				
				Ajudante Geral 20				
				Caldeirão Carpinteiro 3				
				Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/eletricista Siderista Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de P.A. carregadeira Motorista de caminhão 1 Pintor Arriador 2				
				Hrs DO DIA				
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTD.		
				Vinte Lave Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira P.A. carregadeira Cricambo Pintor P.C. 200 Pinta Miraflex				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/09/2024		Data: 23/09/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				24/08/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO BIOPARQUE POPULAR CONTRATO Nº: 076/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO:	203						
	Mês:	1		Tipo:	1						
1. Tempo Bom 2. Chove q/ cont. Trab. 3. Chove q/ cont. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Esc. de Segurança Aux. Adm. Motorista de obra Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Assessor de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Máquina Montador Montador e Instalador Elétrico Operador de Pintor Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Operadora de cacoar Plúvia Arrocador							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DA JORNADA DE TRABALHO MÊS DO DIA Nº ACUMULADO							
				EFETIVO E EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD.							
OBSERVAÇÕES				Velocidade Leve Caminhão Truck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Cacoar Plúvia PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO							
Data: 24/08/2024				Data: 24/08/2024							



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				25/08/2024	S	T	O	Q	S	S	X	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 254								
	1. Tempo Bom 2. Chama o cond. Trab. 3. Chama p/ cond. Trab.			CATEGORIA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA								
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Fisc. de Segur. Anp								
				Ass. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				RÉD DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Assist. de topografia								
				Pedreiro								
				Auxiliar Geral								
Canteiro												
Capitão												
Operador de Motosserra												
Montador												
Montador E Interconex												
Etricista												
Operador de Páteo												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Mecânico de cacamba												
Pneuc												
Armeiro												
RÉD DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				RÉD DO DIA								
				RÉD ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTD.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Motor								
				Caminhão Trator								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Cacamba								
Páteo												
RNC 200												
Placa Veicular												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 25/08/2024				Data: 25/08/2024								



 Engenheiro Civil


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
 CLERTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO INHOPIRIBO POPULAR CONTRATO Nº 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023	26/08/2024						
	Mandat () () Titulo () () 1. Tempo Rem 2. Chave o cont. Trab. 3. Chave si cont. Trab.	RDO: 268						
SERVAÇOS E RECURSOS OCORRENCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO INTERTRAVADO		MÃO DE OBRA DIRETA						
RECUPERAÇÃO DE PILARES		Topografo						
APLICAÇÃO DE SELADOR		Assist. de Topografia						
APLICAÇÃO DE MASSA PUA		Pedreiro 20						
		Assistente Civil 25						
		Carpinteiro 3						
		Operador de Motosserra						
		Montador						
		Montador e Mecânico						
		Eletroinstalador						
		Operador de Pintura						
		Operador de Escavadeira 1						
		Operador de Pá carregadeira						
		Mecânico de caminhão 1						
		Pneus						
		Arrendo: 2						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFFECTIVO DA JORNADA DE TRABALHO						
		RDO DIA						
		RDO ACUMULADO						
		EFFECTIVO E EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTD						
		Veículo Leve						
		Caminhão Truck						
		Caminhão Trator						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caminhão						
		Pneu						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
DESCRIÇÃO DA OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/08/2024		Data: 26/08/2024						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data											
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2021		27		08		2024		S		D			
		5		1		0		0		5		0	
		EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QUANTIDADE		MÃO DE OBRA INDIRETA					
1. Tempo Básico 2. Obrero em geral 3. Choveiro em geral SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		Gênero de Obra Escavadeira 1 Fric. de Segurança Aux Adm 1 Mão de obra Escavadeira geral 1											
EXECUÇÃO INTERTRAVADO RECUPERAÇÃO DE PILARES APLICAÇÃO DE SELADOR APLICAÇÃO DE MASSA PVA		HR DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxílio de topografia Piloteiro 2 Ajudante de Top. 2 Calculista Capataz 3 Operador de Motocicleta Motociclista Motorista Operador de Tratorista Tratorista Operador de Párol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motociclista de cangaço 1 Párol Arrastador 2											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO DIA E JORNADA											
		HR DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EQUIPAMENTOS											
		Volvo Lave Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangaço Párol PIC 208 Plataforma vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/08/2024		Data: 27/08/2024											



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº: 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 Nº DO: 357 Modalidade: () () () () () () 1. Tempo Bom 2. Chama de Cont. Trab. 3. Cláusula de Cont. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS - OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL	
		CATEGORIA	QTD
		MÃO DE OBRA INDIRETA	
EXECUÇÃO INTERTRAVADO RECUPERAÇÃO DE PILARES APLICAÇÃO DE SELADOR APLICAÇÃO DE MASSA PVA		Gestor de Obra	1
		Engenheiro	1
		Téc. de Segurança	
		Aux. Adm.	1
		Bombeiro de obra	
		Encarregado geral	1
		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topógrafo	
		Auxiliar de Topografia	
		Pedreiro	20
		Ajudante Geral	25
		Cabeleiro	
		Carromeiro	3
		Operador de Motocicleta	
		Mecânico	
Montador e Instalador			
Eletreista			
Operador de Prensa			
Operador de Escavadeira	1		
Operador de Pa. Carregadeira			
Mecânico de Camião	1		
Pintor			
Armeiro	2		
MÃO DE OBRA			
RESUMO DO EFETIVO			
EFETIVO DO DIA			
JORNADA DE TRABALHO			
MÃO DE OBRA			
MATERIALIZADO			
EFETIVO E EQUIPAMENTOS			
TIPO	QTD		
Veículo Leve			
Caminhão Mixto			
Caminhão Toco			
Escavadeira			
Pa. Carregadeira			
Caminhão			
Píntor			
PC 200			
Prensa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:	ISCALIZAÇÃO:		
Data: 28/09/2024	Data: 28/09/2024		

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO – SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 01 – EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO



FOTO 02 – EXECUÇÃO DO FORRO DE GESSO




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 03 – APLICAÇÃO DE LONA E MALHA POP PARA PISO EM CONCRETO ARMADO



FOTO 04 – APLICAÇÃO DE SELADOR



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

[Handwritten signature]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 05 – APLICAÇÃO DE SELADOR



FOTO 06 – APLICAÇÃO DE SELADOR




 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 07 – APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA



FOTO 08 – APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA

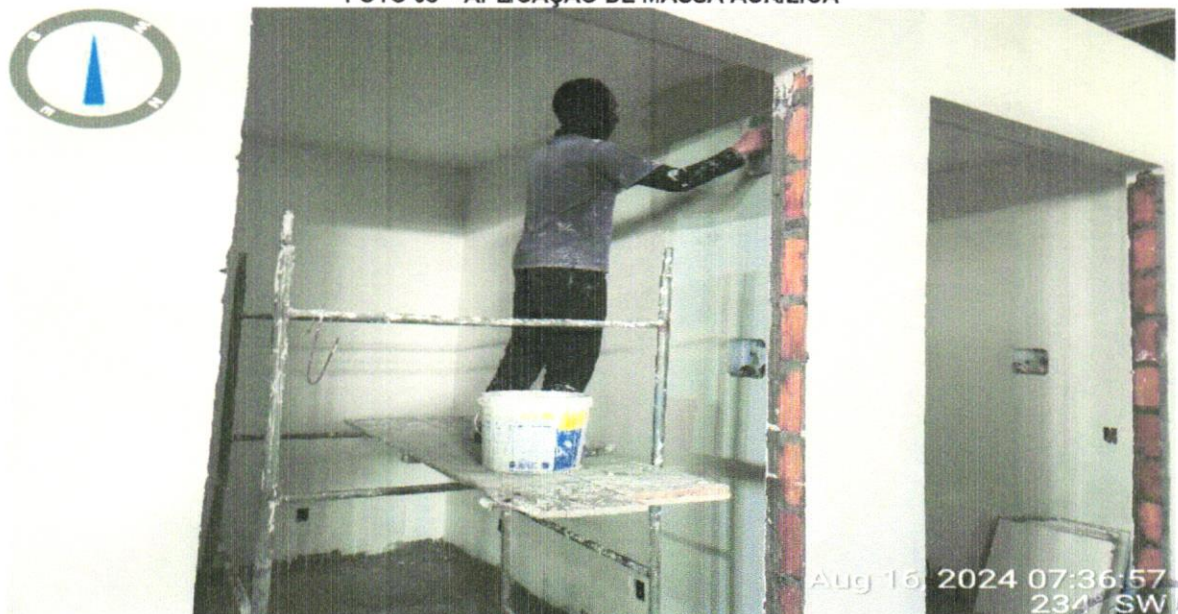


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 09 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO CANTEIRO DO ESTACIONAMENTO



FOTO 10 – EXECUÇÃO DO CANTEIRO DO ESTACIONAMNETO



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

[Handwritten signature]



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


FOTO 11 – EXECUÇÃO DO FORRO DE PVC



FOTO 12 – EXECUÇÃO DO FORRO DE PVC




 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 13 – EXECUÇÃO DO FORRO DE PVC



FOTO 14 – APLICAÇÃO DE MASSA



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

[Handwritten signature]




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 15 – APLICAÇÃO DE SELADOR



FOTO 16 – APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA

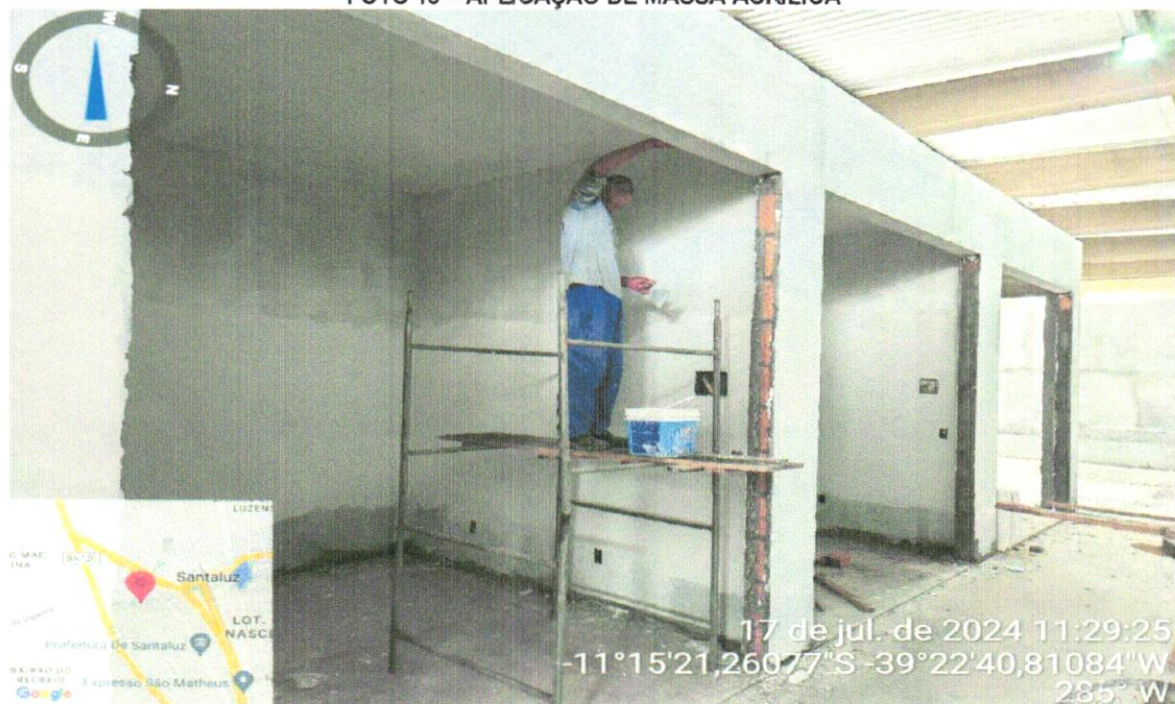


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 17 – APLICAÇÃO DE GESSO



FOTO 18 – EXECUÇÃO DE LONA E CONCRETO




 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 19 – EXECUÇÃO DE CAIXA 4X2



FOTO 20 – EXECUÇÃO DE CAIXA 4X2

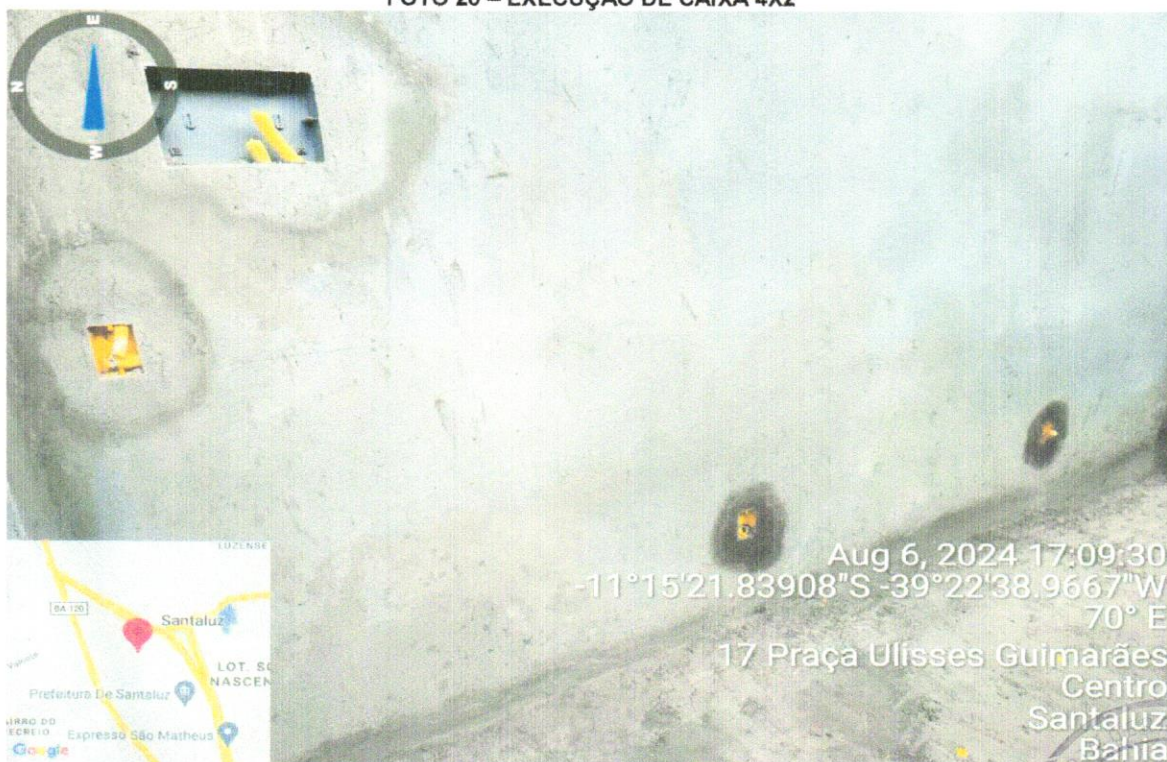

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

[Handwritten signature]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/0/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 21 – EXECUÇÃO DE CAIXA 4X2



FOTO 22 – APLICAÇÃO DE MASSA



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

[Handwritten signature]




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


FOTO 23 – EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO



FOTO 24 – EXECUÇÃO DE FORRO PVC

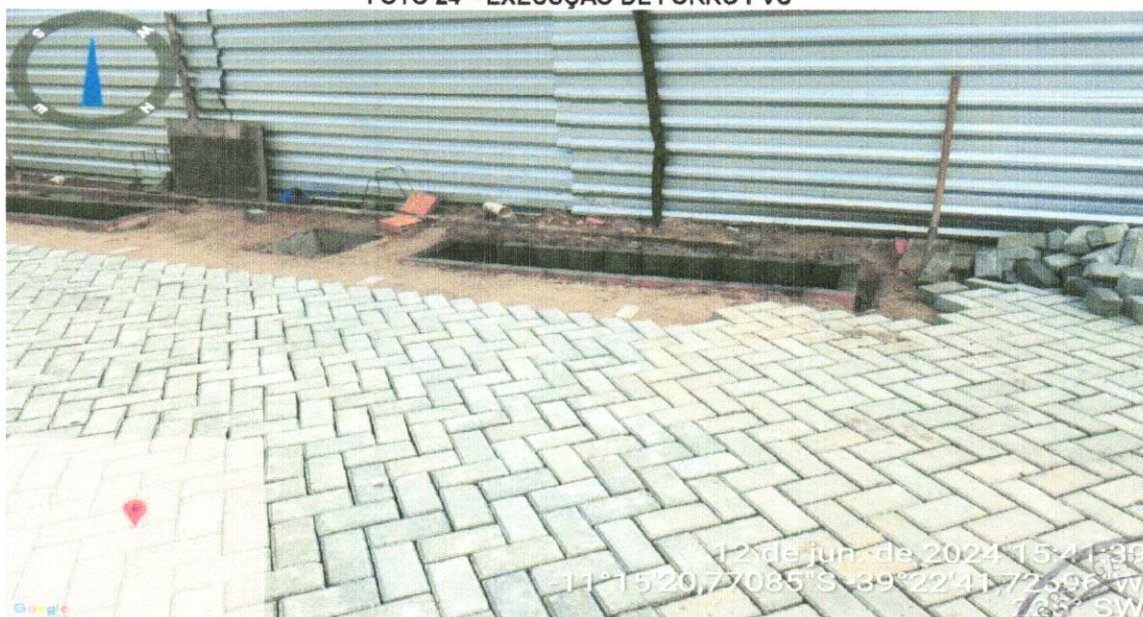


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 [Illegible text]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 25 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO ESTACIONAMENTO



FOTO 26 – APLICAÇÃO DE SELADOR E EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 27 – APLICAÇÃO DE SELADOR E EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO

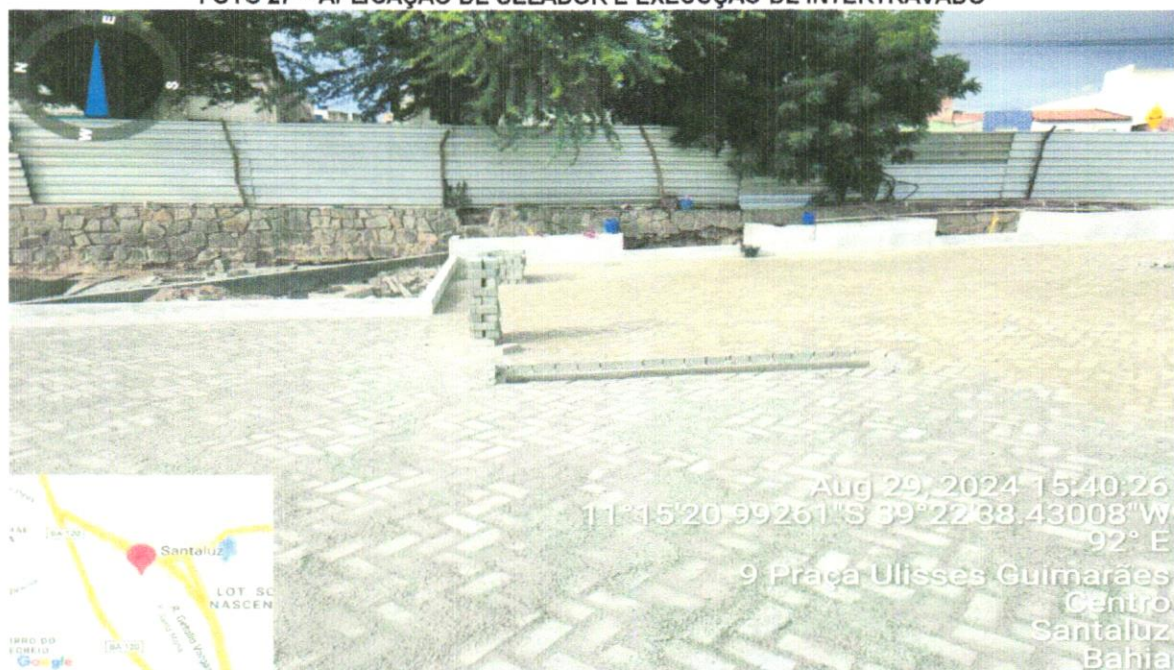


FOTO 28 – APLICAÇÃO DE SELADOR E EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 29 – APLICAÇÃO DE SELADOR



FOTO 30 – EXECUÇÃO DA ALVENARIA DO ESTACIONAMNETO



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

