



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 65      Data do Sub-Empenho: 04/02/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE      Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80      Insc. Estadual:	CPF:      RG:
Conta Corrente: 37725-2      Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      Data do Empenho: 04/02/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	326.000,00	228.304,95	97.695,05
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE TAPINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº 097/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2025 À 27/01/2025. NFS-e 588.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	207.423,40	43.071,18	164.352,22

Data do Empenho: 04/02/2025      Data do Liquidação: 04/02/2025



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	2.842,70
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	516,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	1.292,14
## Trinta e oito mil e quatrocentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos ##		Valor Retido 4.651,69
		Valor Líquido 38.419,49

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/01/2025	588	U			43.071,18
Quantidade: 1	Total:					43.071,18

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	43.071,18

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/02/2025.    ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/02/2025, podendo efetuar o pagamento.    NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentação conferida  
 11/02/2025  
 Carlos Antônio da Silva Filho  
 Controlador Interno  
 Portaria 0231/2025





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 65      Data do Sub-Empenho: 04/02/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>		
Nome:	<b>5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro:	CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE      Estado: BA
CNPJ:	33.957.361/0001-80      Insc. Estadual:	CPF:      RG:
Conta Corrente:	37725-2      Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:	Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido:	<b>2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	Data do Empenho:	<b>04/02/2025</b>
-----------	----------------------------------------------------	------------------	-------------------



Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.:	006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	245-2022	326.000,00	<b>228.304,95</b>	97.695,05
Patrimônio:	-					

<b>HISTÓRICO</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022RDC, CONTRATO Nº245-2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	207.423,40	<b>43.071,18</b>	164.352,22

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SRV	1	43.071,18	43.071,18

## Quarenta e três mil e setenta e um reais e dezoito centavos ##	<b>43.071,18</b>
-------------------------------------------------------------------	------------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/02/2025.   <hr/> ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/02/2025   <hr/> NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3783306





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 30/01/2025

A empresa:


ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
CEFEM
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – TAPINHA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 097/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 588 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 43.071,18 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/01/2025 a 27/01/2025 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 13, DCTFWEB CP 12.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,

  
Franklin de J. Sena  
Fiscal de Contratos

Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

**588**

Data e hora de Emissão:

**29/01/2025 10:29:24**

Código de Verificação:

**589b8b34f9**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**33957361000180 003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

*Franklin de J. Senna*  
*Conselheiro*  
*29/01/2025*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **30/01/2025**

*Assinatura*

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**13807870000119 0000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE TAPINHA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 4BM: 01/01/2025 À 27/01/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.071,18

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 17.228,47

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 25.842,71

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$43.071,18**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>17.228,47</b>	Base de cálculo (R\$): <b>25.842,71</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.292,14</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>2.842,69</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>516,85</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$): <b>38.419,50</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (mês/ano)
- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 402589		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo: 25.842,70	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.292,14	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.292,14		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 06/02/2025	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 08:54:29	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 588 - DATA DE EMISSÃO: 29-01-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.292,14		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.292,14		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000012 . 9      92143906202 . 4      50228010500 . 3      00040258912 . 1

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000012 . 9      92143906202 . 4      50228010500 . 3      00040258912 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros




MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 402589	EXERCÍCIO 2025	DATA 06/02/2025 08:54:29	DATA VENCIMENTO: 28/02/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.292,14
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.292,14





I.R.R.F

Nº DAM: 402587	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NÚMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE	UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>				
CÓDIGO ATIV 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 516,85	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 516,85	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 516,85
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 06/02/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 08:48:18	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	516,85
Valor do Tributo: 516,85	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 516,85		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 516,85	Vlr. Devido com Desconto: 516,85		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 588 - Data de emissão: 29-01-2025.			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	516,85



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000005 . 9      16853906202 . 1      50228010100 . 2      00040258707 . 5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000005 . 9      16853906202 . 1      50228010100 . 2      00040258707 . 5

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 402587	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 08:48:18	DATA VENCIMENTO: 28/02/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	516,85
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	516,85





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20250235936

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:57 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **FD73.99FE.6E4F.2A11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão N°: 00000022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 06/12/2024 10:00:46 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 13/01/2025 10:04:37 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 06/03/2025

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** k7tdKypy

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 2377059/2025

Expedição: 13/01/2025, às 10:02:06

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/01/2025 a 10/02/2025

**Certificação Número:** 2025011203265415952666

Informação obtida em 13/01/2025 10:00:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42  
**Número da Guia:** 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024			VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	20/01/2025	Mensal	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024			VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	20/01/2025	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.011.25370/73</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>6.493,41</b>	<b>519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,42</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42  
**Número da Guia:** 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.014.24417/77		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	20/01/2025	Mensal	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024		GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	20/01/2025	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>90.014.24417/77</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>6.493,41</b>	<b>519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,42</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42  
**Número da Guia:** 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.015.74165/79		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	20/01/2025	Mensal	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024		EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	20/01/2025	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>90.015.74165/79</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>6.493,41</b>	<b>519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,42</b>



**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42  
**Número da Guia:** 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.011.25370/73</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.014.24417/77</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	101	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.74165/79</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>

**Total FGTS**      **6.493,41**      **519,42**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **519,42**

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exerceente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):**

519,42

**Número da Guia:** 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	90.011.25370/73	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
13º/2024	90.014.24417/77	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
13º/2024	90.015.74165/79	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	90.011.25370/73	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
12/2024	90.014.24417/77	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
12/2024	90.015.74165/79	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total FGTS</b>			<b>6.493,41</b>	<b>519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,42</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42  
**Número da Guia:** 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2024	12 - FGTS 13° salário	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.011.25370/73</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>

**Estabelecimento:** 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2024	12 - FGTS 13° salário	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.014.24417/77</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>

**Estabelecimento:** 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2024	12 - FGTS 13° salário	1	721,49	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
12/2024	11 - FGTS mensal	1	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.015.74165/79</b>	<b>2.164,47</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,14</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>6.493,41</b>	<b>519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,42</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 519,42  
**Número da Guia:** 0125010246378130-4 **Data Emissão:** 02/01/2025 14:00:24 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	3	2.164,47	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13
12/2024	3	4.328,94	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,29
	<b>Total FGTS</b>	<b>6.493,41</b>	<b>519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,42</b>



Pagar este documento até

**20/01/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**519,42**

CPF/CNPJ do Empregador  
33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador  
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125010246378130-4

Tag  
02/01/2025 14:00

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	3	173,13	0,00	0,00	0,00	173,13
12/2024	3	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
<b>Total Geral:</b>		<b>519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,42</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2025 às 14:00:24 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0092010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6c4ddc7612f4a77afd8f08273d4f42f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia6207050915463010037

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6c4ddc7612f4a77afd8f08273d4f42f





**Comprovante Pix**  
Transferência para chave Pix

Data e hora: **20/01/2025 - 18:12:06**

Número de Controle: **E60746948202501202111A3576LC5BS8**

**Dados de quem pagou**

Nome: **ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO**

CPF/CNPJ: **\*\*\*.768.825-\*\***

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 519,42**

Identificador: **ae86f8423ca44c7f9375fae0fd17edc6**

Data e hora: **20/01/2025 - 18:12:06**

Debitado da: **Corrente**

**Dados de quem recebeu**

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CPNJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

**AUTENTICAÇÃO**

**2F73bAQY y2qDApki l5eOTcD? Hy\*QwRuo bRaGLgfp 7i#C\*Vfz xMPBFIEH w2eTm25u  
vkBnVTyW J#q4xf3w ?WJr6KmF ryrCj\*ZH wdSJZH8e G?NsdxdI fRZa9SU7 uFF3@XVy  
9rC7gxvJ VSBKJKnK wepgyApn 7dUHbKxc #f6nyOtu kAQKggBT 06 65740 04355194 2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	12/2024	Número do Recibo	50000303088486
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 10:03:22	Identificação da Apuração de Débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000297067780
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CONSELHEIRO ELIEL MARTINS	Número	131
Complemento	CASA TERREO	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7591895303
Correio Eletrônico	ASCN.EGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CPF	03876882508
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	326,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 326,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	232,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 232,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	288,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
Saldo a Pagar	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	288,59		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 288,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	423,60		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 423,60		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	43,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 43,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 36,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14,42		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.011.25370/73	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.014.24417/77	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.015.74165/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 8,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	33.957.361/0001-80
<b>Nome</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	12/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 559,02	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.419,21	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 250,98	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.229,21	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
<b>CPF</b>	038.768.825-08
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/01/2025 10:03:22
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000303088486
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	33.957.361/0001-80



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ</b>	33.957.361/0001-80
<b>Período de Apuração</b>	12/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000303088486
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/01/2025 10:03:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	326,04	326,04	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	232,98	232,98	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	423,60	423,60	0,00

Obra: 90.011.25370/73

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	43,28	43,28	0,00

Obra: 90.011.25370/73

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	8,65	8,65	0,00

Obra: 90.014.24417/77

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	43,28	43,28	0,00

Obra: 90.014.24417/77

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	8,65	8,65	0,00

Obra: 90.015.74165/79

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	288,59	288,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	43,28	43,28	0,00

Obra: 90.015.74165/79



**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	36,07	36,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	2,88	2,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2024	14,42	14,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2024	21,64	21,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	8,65	8,65	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	12/2024	Número do Recibo	0000050000303088486
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 10:03:22	Identificação da Apuração de Débitos	29914257691 / eSocial 96392430 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	127.335,79	2.229,21	125.106,58





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 4ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	43.071,18
	OS: 097/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022		

PERÍODO:	01/01/2025 À 27/01/2025
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE TAPINHA													
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
16	OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE TAPINHA					147.679,46		43.071,18		140.991,46		6.688,00	5%
17	SERVICIOS PRELIMINARES					7.963,76		4.137,12		7.888,01		0,00	0%
17.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%
17.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	10	2,91	3,59	35,90		0,00	10,00	35,90	0,00	0,00	0%
17.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,5	52,52	64,88	421,72		0,00	6,50	421,72	0,00	0,00	0%
17.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	65	7,19	8,88	577,20	65	577,20	65,00	577,20	0,00	0,00	0%
17.5	Demolição de reboco	m²	40	7,86	9,71	388,40		0,00	40,00	388,40	0,00	0,00	0%
17.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	31,8	23,44	28,95	920,61		0,00	31,80	920,61	0,00	0,00	0%
17.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	73,83	3,27	4,03	297,53		0,00	73,83	297,53	0,00	0,00	0%
17.5	Demolição de reboco	m²	72	7,86	9,71	699,12		0,00	72,00	699,12	0,00	0,00	0%
17.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	54,17	23,44	28,95	1.568,22		0,00	54,17	1.568,22	0,00	0,00	0%
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	7,14	8,77	10,61	75,76	7,14	75,76	0,00	7,14	75,76	100%	100%
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	21,35	105,40	127,63	2.724,94	21,35	2.724,94	21,35	2.724,94	0,00	0,00	0%
	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m	92,54	6,78	6,20	759,22	92,54	759,22	92,54	759,22	0,00	0,00	0%
18	MOVIMENTO DE TERRA					1.043,11		0,00		1.043,12		0,00	0%
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,15	122,70	151,58	174,31		0,00	1,15	174,32	0,00	0,00	0%
18.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	7,26	96,87	119,67	668,80		0,00	7,26	668,80	0,00	0,00	0%
19	FUNDAÇÃO					754,09		0,00		754,10		0,00	0%
19.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	3,83	19,02	23,49	89,96		0,00	3,83	89,97	0,00	0,00	0%
19.2	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	25,5	18,33	22,64	577,32		0,00	25,50	577,32	0,00	0,00	0%
19.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,15	468,50	578,78	86,81		0,00	0,15	86,82	0,00	0,00	0%
20	ALVENARIA					10.962,76		0,00		10.962,76		0,01	0%
20.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	31,8	56,93	70,33	2.236,49		0,00	31,80	2.236,49	0,00	0,00	0%
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	112,57	53,42	65,99	7.428,49		0,00	112,57	7.428,49	0,00	0,01	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,80	55,05	66,65	506,54		0,00	7,80	506,54	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	40,65	49,21	295,26		0,00	6,00	295,26	0,00	0,00	0%
	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,80	53,90	65,26	495,98		0,00	7,80	495,98	0,00	0,00	0%
21	REVESTIMENTO					21.735,90		13.588,21		21.735,91		0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2





Franklin de J. S. e. o. a.  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

21.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	178,3	8,09	9,96	1.781,21	0,00	178,30	1.781,22	0,00	0,00	0%	
21.2	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaysnar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de liga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,17	452,02	556,42	7.912,81	14,17	7.912,81	0,00	0,00	0,00	0%	
21.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	209,7	24,58	30,36	6.366,49						0%	
21.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	2,65	83,47	103,11	273,24	2,65	273,24	0,00	0,00	0,00	0%	
21.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	19	91,04	112,47	2.136,93	19	2.136,93	0,00	0,00	0,00	0%	
21.6	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	3	723,48	0,00	0,00	0,00	0%	
21.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	9,64	83,47	103,11	993,98	9,64	993,98	0,00	0,00	0,00	0%	
	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	18	71,02	85,96	1.547,76	18	1.547,76	0,00	0,00	0,00	0%	
22	<b>PINTURA</b>				12.695,52	4.583,12	9.266,40				3.438,12	27%	
22.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	375,83	3,46	4,29	1.612,31	21	90,09	274,02	1.715,55	101,81	436,78	27%
22.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	375,83	11,48	14,16	5.329,26	21	297,78	274,02	3.865,60	101,81	1.443,66	27%
22.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	375,83	12,40	15,31	5.753,85	274,02	4.185,25	101,81	1.558,70	101,81	1.558,70	27%
23	<b>ESQUADRIA</b>				11.651,82	0,00	11.651,82				-0,01	0%	
23.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	2,52	652,93	806,62	2.032,68					0,00	0%	
23.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57					0,00	0%	
23.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	5,8	234,77	280,03	1.682,17					0,00	0%	
23.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,08	464,29	573,56	619,46					0,00	0%	
23.5	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08					0,00	0%	
23.6	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74					0,00	0%	
23.7	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	982,98	1.985,96					0,00	0%	
24	<b>PISO</b>				122,39	930,16					0,00	0%	
24.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	114,16	49,37	60,99	6.962,61					16.989,24	18%	
24.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	55,75	8,23	10,16	566,42					3.303,83	53%	
26	<b>PLANTIO DE GRAMA BATAIS</b>				30,87	1.672,23					0,00	0%	
26.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	m²	54,17	25,50	3,31	1.793,30					0,00	0%	
26.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	m²	54,17	2,74	3,31	179,30					0,00	0%	
26.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af. 07/2021	m²	54,17	75,73	91,69	4.866,85					0,00	0%	
26.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	35	72,37	82,72	2.895,20					0,00	0%	
25	<b>PISO EXTERNO</b>				2.384,90						0,00	0%	
25.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	3,29	712,74	880,51	2.866,88					0,00	0%	
25.2	Avenaria tipo cerâmico maciço (58x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	8,62	60,24	74,42	641,50	1,31	1.153,47	3,29	2.896,88	0,00	0%	
26	<b>CANTEIROS E BANCOS</b>				82,72	3.752,31					0,00	0%	
26.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	45,38	72,37	82,72	3.752,31	45,38	3.752,31	45,36	3.752,31	0,00	0%	
26.2	Plantio de grama batiais em placas. AF. 05/2018	m²	0,9	12,12	14,97	13,47	0,9	13,47	0,90	13,47	0,00	0%	
26.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,15	84,72	104,66	15,69	0,15	15,70	0,15	15,70	0,00	0%	
26.4	PLANTIO DE ARGORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDE MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39	3	276,39	3,00	276,39	0,00	0%	
26.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	2,82	19,02	23,49	66,24	2,82	66,24	2,82	66,24	0,00	0%	
26.6	Avenaria tipo cerâmico maciço (58x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,4	80,24	74,42	104,18	1,4	104,19	1,40	104,19	-0,01	0%	
27	<b>COBERTURA</b>				887,83	887,83					0,00	0%	
27.1	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,66	887,83	887,83	1	887,83	1,00	887,83	0,00	0%	
27.1	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, tabalana ou similar	m²	59,4	49,14	60,70	3.605,58					2.634,30	14%	
											0,00	0%	

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2





Franklin da Fonseca  
 Engenheiro Civil  
 CREA 155.110/04-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 105188855-2

27.2	27.2	19,8	77,75	96,05	1.901,79		0,00	19,80	1.901,79	0,00	0,00	0%
	27.3	49,38	57,95	71,59	3.535,11		0,00	49,38	3.535,11	0,00	0,00	0%
	27.4	49,38	8,70	10,74	530,34		0,00	49,38	530,34	0,00	0,00	0%
	27.5	13	45,39	56,07	728,91		0,00	13,00	728,91	0,00	0,00	0%
	27.6	9,1	159,93	197,57	1.797,88		0,00	4,79	946,36	4,31	851,52	47%
	27.7	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19		0,00	0,19	651,41	0,52	1.782,78	73%
	27.3	6,14	104,74	128,82	778,67		0,00	6,14	778,67	0,00	0,00	0%
		54,17	57,95	71,59	3.878,03		0,00	54,17	3.878,03	0,00	0,00	0%
		46,32	104,74	128,82	5.874,26	46,32	5.874,26	46,32	5.874,26	0,00	0,00	0%
		15	13,95	16,89	RS 558,54		0,00		558,54		0,00	0%
		6	5,31	6,42	38,52		0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
		6	6,29	7,62	45,72		0,00	6,00	45,72	0,00	0,00	0%
		3	60,83	73,65	220,95		0,00	3,00	220,95	0,00	0,00	0%
		9	97,93	120,98	4.617,48		2.577,48	9,00	4.526,26	0,00	91,23	2%
		9	23,37	28,87	1.088,82		0,00	9,00	1.088,82	0,00	0,00	0%
		11	24,62	30,41	334,51		0,00	9,00	259,83	0,00	0,00	0%
		2	28,13	34,75	69,50		0,00	8,00	243,28	3,00	91,23	27%
		70	2,90	3,58	250,80		0,00	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
		120	4,20	5,18	621,60		0,00	70,00	250,80	0,00	0,00	0%
		3	38,95	48,11	144,33		0,00	3,00	144,33	0,00	0,00	0%
		2	11,38	14,05	28,10		0,00	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
		3	11,97	14,78	44,34		0,00	3,00	44,34	0,00	0,00	0%
		1	21,04	25,99	25,99		0,00	1,00	25,99	0,00	0,00	0%
		40	8,78	10,84	433,60		0,00	40,00	433,60	0,00	0,00	0%
		1	390,16	482,00	482,00		0,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
		2	14,41	17,45	34,90		0,00	2,00	34,90	0,00	0,00	0%
		88,84	7,43	8,99	799,37		0,00	88,84	799,37	0,00	0,00	0%
		4,00	374,56	453,57	1.814,27	4	1.814,27	4,00	1.814,27	0,00	0,00	0%
		74,00	5,27	6,38	472,20	74	472,20	74,00	472,20	0,00	0,00	0%
		24,00	10,02	12,13	291,00	24	291,00	24,00	291,00	0,00	0,00	0%
		4	337,62	417,09	8.948,68		3.782,10	4,00	8.143,32	0,00	805,36	9%
		1	42,12	52,03	52,03		0,00	4,00	1.668,36	0,00	0,00	0%
		1	449,35	555,12	555,12		0,00	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
		2	259,93	321,11	642,22		0,00	2,00	642,22	0,00	0,00	0%



Franklin de Jesus  
 Engenheiro Civil  
 CREA 15188855-4

29.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	22,36	27,62	828,60	0,00	30,00	828,60	0,00	0,00	0%
29.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10	22,81	28,17	281,70	0,00	10,00	281,70	0,00	0,00	0%
29.7	Caixa de descida de sobrepôr completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	2,00	180,56	0,00	0,00	0%
29.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	9,03	11,15	55,75	0,00	5,00	55,75	0,00	0,00	0%
29.9	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	0,00	4,00	96,88	0,00	0,00	0%
29.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâmn = 25mm	un	4	9,84	12,15	48,60	0,00	0,00	0,00	4,00	48,60	100%
29.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	44,92	55,49	221,96	4	221,96	4,00	0,00	0,00	0%
29.12	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	1,00	0,00	0,00	0%
29.13	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL - 1140 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	729,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	0,00	0,00	0%
29.14	Sundobor paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inferiores de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	1	892,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	1,00	1.225,64	0,00	0%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	312,49	378,38	1.513,52	2	756,76	2,00	756,76	2,00	50%
	<b>INFRAESTRUTURA</b>											
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de formas), af_06/2017	m²	0,86	147,85	179,02	153,96	0,00	0,86	153,96	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,16	20,18	24,43	52,77	0,00	2,16	52,77	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,86	2.735,20	3.311,92	2.848,25	0,00	0,86	2.848,25	0,00	0,00	0%
	<b>SUPERESTRUTURA</b>											
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,86	2.735,20	3.311,92	2.848,25	0,00	0,86	2.848,25	0,00	0,00	0%
	Edificação Habitacional Unifamiliar Terrea (Casa em Empreendimentos), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,86	2.735,20	3.311,92	2.848,25	0,00	0,86	2.848,25	0,00	0,00	0%
	<b>RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR</b>											
	Impermeabilização de superfície e argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/ímpermeabilizante Vedatit ou similar	m²	20,24	61,33	74,28	1.503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDÍOS. AF_10/2015	m	38,00	10,02	12,13	460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	Portão em chapa de ferro, veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	0,48	541,15	655,28	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 6,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	743,02	899,55	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
30	Limpeza geral	m²	59,55	2,20	2,71	1.563,80	1.563,80	59,55	1.563,80	0,00	0,00	0%
30.1	Placa de inauguração em alumínio com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	1,00	1.402,42	0,00	0%
30.2		un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	1,00	1.402,42	0,00	0%

VALOR GERAL: 147.679,46      TOTAL DA OBRA: 147.679,46      TOTAL DO PERÍODO: 43.071,18      TOTAL ACUMULADO: 140.991,46      SALDO: 6.688,00



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.					CATEGORIA							
CONTRATO Nº 2452022					RDC: 866		RDC: 306		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rav 01 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Bastivo de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MAO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Calceiteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/08/2024					Data: 02/08/2024							

Franklin de J.

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.										
CONTRATO Nº 2452822				RDC: 866		RDO: 387				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 206						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/08/2024				Data: 03/08/2024						

*Franklin de J. S.*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				EFETIVO PESSOAL						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				CATEGORIA						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				QTDE						
CONTRATO Nº: 2462822				MAO DE OBRA INDRETA						
RDC: 096										
RDO: 308										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS										
SEM SERVIÇO										
				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 206						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/08/2024				Data: 04/08/2024						

*Franklin de J. Sona*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		X						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.		S	T	Q	Q	S	S	D
CONTRATO Nº 2452022		RDC: 906			RDO: 309			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017		Gerente de Obra						
		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encamegado geral		1				
Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		2				
		Ajudante Geral		2				
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motoeira						
		Motorista						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncie						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Pisca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/08/2024		Data: 05/08/2024						

*Franklin de J. Soares*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 2452022					RDC: 000		RDC: 310		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MAO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Calceteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					Veículo Lave							
					Caminhão Muncie							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/08/2024					Data: 06/08/2024							

Franklin de Jesus

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 2462822 RDC: 096 RDO: 311				CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. a/_122017				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro 2											
Ajudante Geral 2											
Calceiteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/06/2024				Data: 07/06/2024							

Franklin de J. Sona



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA.		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 2482822		RDC: 886		RDO: 312		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS						
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. at_12/2017		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
Topografo								
Auxiliar de topografia								
Pedreiro 2								
Ajudante Geral 2								
Calceiteiro								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 206						
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/08/2024		Data: 08/08/2024						

Francilino de J. C.

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188854-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BANHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 2452822 RDC: 066 RDO: 313 Nota:		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA MAO DE OBRA DIRETA QTDE							
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_122917		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MAO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/08/2024		Data: 09/08/2024							

  
 Franklin de S. Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 2452922				RDC: 066				RDC: 314			
Condições Climáticas: Simbologia: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
Data: 10/08/2024				Data: 10/08/2024							

  
 Franklin de J. Cordeiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 05188554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 2452022 RDC: 006 RDO: 315				EFTIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Simbologia:				CATEGORIA						
Monil: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/08/2024				Data: 11/08/2024						

Franklin de J. F. Pena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 01888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 01888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 098				RDO: 316			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encargado geral							
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				HR DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de P4 carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pistão											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
				HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				P4 carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/08/2024				Data: 12/08/2024							

Franklin de Jesus  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 2452022 RDC: 096 RDC: 317				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Piloto Serralheiro							
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				HH DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória							
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/08/2024				Data: 13/08/2024							

  
 Franklin de J. Soares

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 3452622				RDC: 086				RDC: 318			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Urb. 3- Chuva e/ cond. Urb.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caixa							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/08/2024				Data: 14/08/2024							

*Franklin de S. Soares*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 086		RDC: 319		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hr DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTDE.
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/08/2024				Data: 15/08/2024								

*Franklin de J. Fona*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>CONTRATO Nº</b> 245/2022 <b>RDC:</b> 006 <b>RDO:</b> 328				<b>CATEGORIA</b>				<b>QTDE</b>			
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )     Tarde: ( 1 )     Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom    2- Chuva al cond. Trab.    3- Chuva al cond. Trab.				<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>											
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>							
Topógrafo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro				2							
Ajudante Geral				2							
Caldeirão											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pistão											
Serralheiro											
<b>RESUMO DO EFETIVO</b>											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>											
				<b>TIPO</b>							
				<b>QTDE.</b>							
Veículo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 16/08/2024				Data: 16/08/2024							

*Handwritten signature and stamp:*  
 Maria Helena J. Sousa  
 Engenheira Civil  
 CRÉD. Nº 524.170/2016-2-1

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA				QTDE				
CONTRATO Nº 2452/22				RDC: 006		RDC: 321		MÃO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro								
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
OBSERVAÇÕES				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pinel								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
FISCALIZAÇÃO:				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
Data: 17/08/2024				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
Data: 17/08/2024				Data: 17/08/2024								

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 066				RDO: 222			
Condições Climáticas: <b>SIMBOLOGIA</b>				MAO DE OBRA INDIRETA							
Mostr: ( 1 )				Tarde: ( 1 )				Noite: ( )			
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTD.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 205							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/08/2024				Data: 18/08/2024							

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BÁHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006			RDO: 323			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2014				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Cabeleiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
CONSIDERAÇÕES				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pinel								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munch								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/08/2024				Data: 19/08/2024								

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA - DF 188854-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - DF 188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 866		RDO: 324		MAO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
Mantém: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,8 CM. AF_09/2020				Aux. Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Calçateiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Fiscal								
				Serraheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTD.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/08/2024				Data: 20/08/2024								

*Handwritten signature in blue ink.*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 066		RDC: 325		CATEGORIA				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Calefiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 206								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 21/08/2024				Data: 21/08/2024								

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 21/08/2024

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 2452022 RDC: 886 RDO: 328											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2020				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1  Hh DO DIA  MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de PÁ carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA  RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO  EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira PÁ carregadeira Caçamba Petrol PC 206 Placa Vibratória							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/08/2024				Data: 22/08/2024							

*Handwritten signature in blue ink.*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRINA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 2452922				RDC: 096		RDC: 327		MAO DE OBRA DIRETA				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra								
SIMBIOLOGIA				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_99/2020				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HH DO DIA								
				HH ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 23/08/2024				Data: 23/08/2024								

*Handwritten signature in blue ink.*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 246/2022					CATEGORIA							
RDC: 066					MÃO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 328												
Condiciona Climas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
SEM SERVIÇO					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Caleteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de PÁ carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munch							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					PÁ carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/08/2024					Data: 24/08/2024							

  
 Francisco de Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 329				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Simbologia: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente da Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 250										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/08/2024				Data: 25/08/2024						

  
 25/08/2024  
 Engenheiro Civil

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDC: 330											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro								2			
Ajudante Geral								1			
Cabeleiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba							1				
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
OBSERVAÇÕES				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTD.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/06/2024				Data: 26/06/2024							

*Frans...*  
*26/06/2024*  
*Luiz...*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 098		RDC: 331		CATEGORIA				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLÓGICA				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_062014				HR DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pistão												
Serralheiro												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HR DO DIA								
OBSERVAÇÕES				HR ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTD								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Yoco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/08/2024				Data: 27/08/2024								

Franklin de J. S.  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188854-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.										
CONTRATO Nº 248/2022 RDC: 006 RDO: 332										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro						
				Capiteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de PÁ carregadeira										
Motozista de caçamba										
Pintor 1										
Barralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				PÁ carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/08/2024				Data: 28/08/2024						

Franklin de Jesus  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 096 RDO: 333				CATEGORIA						
Condições Climáticas: SÍMBOLOGIA:				MAO DE OBRA INDIRÉTA						
Serviço: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 300										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/08/2024				Data: 29/08/2024						

  
 Franklin de J. Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.													
CONTRATO Nº 2452/2022				RDC: 006				RDO: 334					
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA					
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro								2					
Ajudante Geral								2					
Carpinteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba								1					
Pintor													
Serralheiro													
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTDE.	
				Veículo Leve									
Caminhão Munch													
Caminhão Toco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
IPC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 30/08/2024				Data: 30/08/2024									


Franklin de J. Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA - BA 01/188855-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - DS 1888554-2






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.						CATEGORIA							QTDE
CONTRATO Nº 245/2022						RDC: 006		RDO: 335		MAO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Simbologia: Maranh: ( 1 )						Tarde: ( 1 )		Noite: ( )					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
Ajudante Geral													
Calçateiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de PA carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							QTDE
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munch							
						Caminhão Yoco							
						Escavadeira							
						PA carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/06/2024						Data: 31/06/2024							

  
 Franklin de Jesus  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 05188554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRIVA.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 098		RDO: 336		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro			
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								HR DO DIA			
								MAO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Fritol							
				Serralheiro							
				HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
OBSERVAÇÕES				HR ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/09/2024				Data: 01/09/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 338				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014				Gerente de Obra								
				Engenheiro								1
				Téc. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
Hh DO DIA												
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								2
				Ajudante Geral								2
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								1
				Serralheiro								
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 03/09/2024				Data: 03/09/2024								

Franklin de J. S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 2452822      RDC: 006      RDC: 339				CATEGORIA      QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva s/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador/Eltricista						
Elettricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pinor										
Serralheiro										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO      QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PIC 150										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/09/2024				Data: 04/09/2024						

  
 Francisco de J. Soares  
 Engenheiro Civil

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	X	S	S	D	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.					<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>CONTRATO N°</b> 2452022 <b>RDC:</b> 006 <b>RDC:</b> 349 <b>Maanhã:</b> ( 1 ) <b>Tarde:</b> ( 1 ) <b>Noite:</b> ( )					<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> 1- Tempo Bom      2- Chuva e/ cond. Trab.      3- Chuva e/ cond. Trab. <b>SIMBOLOGIA</b> <b>SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS</b>					<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_06/2014					Gerente de obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
										<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		
Topógrafo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro										2		
Ajudante Geral										2		
Calçateiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor							1					
Serraheiro												
<b>CONSIDERAÇÕES</b>					<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
					<b>TIPO</b> <b>QTDE</b>							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Yoco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PIC 305							
Placa Vibratória												
<b>GERENTE DE OBRA:</b>					<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 05/09/2024					Data: 05/09/2024							

Fran Wilton de J. Sena

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	D	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRIHA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006	RDC: 341			CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							2
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor							1				
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/09/2024				Data: 06/09/2024							

Franklin de Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA 036.000/03-1

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 006				RDC: 342			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/09/2024				Data: 07/09/2024							

Franklin da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 05188554-2





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 595		RDO: 343		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra			
SEM SERVIÇO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 250							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/09/2024				Data: 08/09/2024							

Franklin de Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 086 RDC: 344				EFTIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor 1												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE.								
				Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/09/2024				Data: 09/09/2024								

  
 Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA - Bahia - 010000000-1

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data												
					S	X	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFTIVO PESSOAL												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA.					CATEGORIA												
CONTRATO Nº 246/2022					RDC: 086				RDO: 345								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					MAO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra												
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_062914					Engenheiro												
					Téc. de Segurança												
					Aux Adm												
					Mestre de obra												
					Encarregado geral												
					Hh DO DIA												
					CONSIDERAÇÕES					MAO DE OBRA DIRETA							
Topógrafo																	
Auxiliar de topografia																	
Pedreiro																	
Ajudante Geral																	
Calceiteiro																	
Carpinteiro																	
Operador de Motosserra																	
Motorista																	
Montador/Eltricista																	
OBSERVAÇÕES					Operador de Patrol												
					Operador de Escavadeira												
					Operador de Pá carregadeira												
					Motociclista de caçamba												
					Pintor												
					Serralheiro												
					Hh DO DIA												
GERENTE DE OBRA: Data: 10/09/2024					RESUMO DO EFETIVO												
					EFETIVO DO DIA												
					JORNADA DE TRABALHO												
					Hh DO DIA												
					Hh ACUMULADO												
					GERENTE DE OBRA: Data: 10/09/2024					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
										TIPO							
										Veículo Leve							
										Caminhão Muncck							
										Caminhão Toco							
Escavadeira																	
Pá carregadeira																	
Caçamba																	
Patrol																	
PC 200																	
Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA: Data: 10/09/2024					FISCALIZAÇÃO: Data: 10/09/2024												

Franklin de J. Sona  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 096 RDC: 347		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Viatória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/09/2024		Data: 12/09/2024						

  
 Franklin de Jesus  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data														
						S	T	Q	Q	X	S	S	D							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFTIVO PESSOAL														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.																				
CONTRATO Nº 245/2022		RDC: 006		RDO: 348																
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						CATEGORIA														
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva sl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA														
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra														
						Engenheiro							1							
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014						Tec. de Segurança														
						Aux Adm														
						Mestre de obra														
						Encarregado geral							1							
CONSIDERAÇÕES						MAO DE OBRA DIRETA														
						Topografo														
OBSERVAÇÕES						Auxiliar de topografia														
						Pedreiro							2							
						Ajudante Geral							2							
						Caleteiro														
						Carpinteiro														
						Operador de Motosserra														
						Motorista														
						Montador/Eletricista														
						Eletricista														
						Operador de Patrol														
						Operador de Escavadeira														
						Operador de Pá carregadeira														
						Motorista de caçamba							1							
						Filtor														
Serralheiro																				
GERENTE DE OBRA: Data: 13/09/2024						RESUMO DO EFETIVO														
						EFETIVO DO DIA														
						JORNADA DE TRABALHO														
						Hh DO DIA														
GERENTE DE OBRA: Data: 13/09/2024						Hh ACUMULADO														
						FISCALIZAÇÃO: Data: 13/09/2024						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
												Veículo Leve								
												Caminhão Munk								
												Caminhão Yoco								
												Escavadeira								
												Pá carregadeira								
												Caçamba								
												Patrol								
												PC 200								
												Placa Vibratória								

Franklin de J. Pena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 025.000.000-1/1

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 2492622				RDC: 096		RDO: 349		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pinçor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão 10cc							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
				QTD.							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/09/2024				Data: 14/09/2024							

  
 Franklin de L. F. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	X	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 999		RDC: 359		QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Téc. de Segurança											
				Aux. Adm.											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
								MAO DE OBRA DIRETA							
								Topógrafo							
								Auxiliar de topografia							
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calçateiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 15/09/2024				Data: 15/09/2024											

*Franklin de Jesus*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

*AS*  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 986 RDC: 351				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
Ajudante Geral 2												
Calceiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor 1												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE.								
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
Data: 16/09/2024				Data: 16/09/2024								

Franklin de J. Cordeiro

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X		Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 066 RDO: 352				CATEGORIA QTD							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/09/2024				Data: 17/09/2024							

  
 Franklin de J. Sena

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 008 RDO: 354				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS  Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncok							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/09/2024				Data: 19/09/2024							

*Franklin de S. S.*

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 2452922 RDC: 066 RDC: 355												
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.					MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS					Gerente de Obra							
					Engenheiro 1							
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral 1							
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO		
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munk							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 206							
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/09/2024					Data: 20/09/2024							

Franklin de J. Soares

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 096		RDO: 356		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Simbologia: Maranh: ( 1 ) Tardia: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Nota: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 21/09/2024				Data: 21/09/2024								

Franklin de J. Cordeiro

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.			CATEGORIA						
CONTRATO Nº 245/2022			RDC: 066			RDO: 357			
Condições Climáticas: Simbologia: ( 1 )			Tempo Bom ( 1 )			Chuva a/ cond. Trab. ( 1 )		Noite: ( )	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO			Gerente de Obra						
			Engenheiro						
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encamegado geral						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro						
			Ajudante Geral						
			Cascalheiro						
			Carpinteiro						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor						
			Serralheiro						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO			QTD.			
			Veículo Leve						
			Caminhão Munch						
			Caminhão Yoco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/09/2024			Data: 22/09/2024						

Francilino de Jesus

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 2452822 RDC: 096 RDO: 358				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA								
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucebond), esp=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
Pedreiro 2												
Ajudante Geral 2												
Calculista												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 205								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 23/09/2024				Data: 23/09/2024								

Franklin de J. Pena



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRHA.												
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 066		RDO: 359		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite:				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				HR DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								2
				Ajudante Geral								2
				Calceiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador/Eltricista								
				Eltricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pílori								
				Serralheiro								
				HR DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HR DO DIA								
				HR ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/09/2024				Data: 24/09/2024								

Franklin de S. Sona

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDO: 380		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							
Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				HR DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pílotar							
				Serralheiro							
				HR DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
OBSERVAÇÕES				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
				HR ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:							
Data: 25/09/2024				FISCALIZAÇÃO:							
				Data: 25/09/2024							

Franklin de Jesus

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188854-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 2462022				RDC: 066		RDC: 362		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								1
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_082017 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (9x9x19), esp = 0,95m (faca), com argamassa traço B - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								2
				Ajudante Geral								2
				Cajoteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador/Eletricista								
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTDE.
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/09/2024				Data: 27/09/2024								

Franklin de J. Pena

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 2452022 RDC: 908 RDC: 363				CATEGORIA QTD							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eltricista							
				Eltricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD							
				Veículo Lave							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/09/2024				Data: 28/09/2024							

  
 Franklin de J. S. Sona

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 246/2022				RDC: 006		RDC: 364		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eltricista							
Eltricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 206											
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/09/2024				Data: 29/09/2024							

Franklin de J. F. Fena

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 246/2022 RDC: 086 RDO: 365				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE							
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 Avenaria tipo cerâmico maciço (6x1x19), esp = 5,55m (facão), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e/ junta de 2,0cm - R1				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Fã carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/09/2024				Data: 30/09/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
 Franklin de J. Fona



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X		Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPIRUA				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 806		RDO: 366		MÃO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA DIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 9,05m (taço), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munch								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/10/2024				Data: 01/10/2024								

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sona  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFTIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 2452/22				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDC: 906				QTD						
RDO: 367										
Condições Climáticas: Manhã: ( ) 1 Tarde: ( ) 1 Noite: ( )										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017 Avenária lixada cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (teço), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motofleta						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motofleta de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Antonio Soares Cordeiro Neto				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/10/2024				Data: 02/10/2024						

Franklin de Jesus  
Engenheiro  
CREA-01840931-1

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 2452022 RDC: 006 RDO: 368				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA QTDE:							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRENCIAS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x3x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 05 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e/ junta de 2,0cm - R1				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Caldeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/10/2024				Data: 03/10/2024							

Franklin de J. Souza

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 006 RDO: 369											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COIROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (falso), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrul							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pílotar							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrul							
				PC 200							
				Pílea Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/10/2024				Data: 04/10/2024							

Franklin de J. Sena

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA				QTDE							
CONTRATO Nº 249/2022				RDC: 006		RDO: 379		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Simbologia: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Nota: ( )				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux. Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
												Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Canteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba															
Pinçor															
Serralheiro															
								Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
GERENTE DE OBRA:				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO								QTDE.			
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
Patrol															
PC 260															
Placa Vibratória															
FISCALIZAÇÃO:				Data: 05/10/2024											
Data: 05/10/2024															

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sousa



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 006		RDC: 371		MAO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Marra: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
								MAO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Capisteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pilotar							
				Barralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Pileca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/10/2024				Data: 06/10/2024							

Franklin de A. Pena

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRINHA.												
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 096 RDC: 372												
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA								
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
Serviços Executados / Ocorrências: Limpeza geral BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				HH DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 2								
				Calçateiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				HH DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HH DO DIA								
				HH ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTD.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/10/2024				Data: 07/10/2024								

Franklin de Sousa

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 05188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 2452622 RDC: 006 RDO: 373				EFETIVO PESSOAL						
Condições climáticas: Marf: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLÓGICA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Limpeza geral BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_91/2020 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,20 x 1,60 x 0,60 m				Hh DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serraheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 250 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/10/2024				Data: 08/10/2024						

Franklin de Jesus

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	S	S	D	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRINHA. <b>CONTRATO Nº</b> 245/2022 <b>RDC:</b> 008 <b>RDO:</b> 374				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> <b>SIMBOLOGIA</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: _____ 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b> <b>QTD</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>Limpeza geral</b> <b>BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b> Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
								<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>			
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HH DO DIA							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				HH ACUMULADO							
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				TIPO	QTD.						
<b>GERENTE DE OBRA:</b>	<b>FISCALIZAÇÃO:</b>										
Data: 09/10/2024				Data: 09/10/2024							

  
 Franklin de L. P. Neto  
 Engenheiro Civil  
 L.O. de 05/2004 nº 1

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 05188854-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPRINA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 098 RDO: 375				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE						
Limpeza geral BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_91/2020 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				HH DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pêloir										
Serraheiro										
HH DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HH DO DIA						
OBSERVAÇÕES				HH ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/10/2024				Data: 10/10/2024						

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 05188554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.												
CONTRATO Nº 248/2022				RDC: 806		RDO: 377		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Piloto								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 12/10/2024				Data: 12/10/2024								

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 05188554-2

Franklin de A. Pena



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
					S	T	Q	Q	S	S	X	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.																
CONTRATO Nº 2492822 RDC: 066 RDO: 378																
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					CATEGORIA											
SIMBOLOGIA					MAO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS					Gerente de Obra											
SEM SERVIÇO					Engenheiro											
					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral											
					Hr DO DIA											
										MAO DE OBRA DIRETA						
										Topografo						
					Auxiliar de topografia											
					Pedreiro											
					Ajudante Geral											
					Calefateiro											
					Carpinteiro											
					Operador de Motosserra											
					Motorista											
					Montador/Eletricista											
					Eletricista											
					Operador de Patrol											
					Operador de Escavadeira											
					Operador de Pá carregadeira											
					Motorista de caçamba											
					Pintor											
					Serralheiro											
					Hr DO DIA											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hr DO DIA											
					Hr ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO											
					QTDE.											
					Veiculo Leve											
					Caminhão Muncik											
					Caminhão Toco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					PC 250											
					Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 13/10/2024					Data: 13/10/2024											

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 051888554-2

Franklin de J. Costa



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 2452622 RDC: 066 RDO: 379				MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva ej cond. Trab. 3- Chuva ej cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Tec. de Segurança							
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Escarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/10/2024				Data: 14/10/2024							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: D5188854-2

Franklin de J. S. Costa



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X		Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPIRUA.											
CONTRATO Nº 2452/2022				RDC: 006		RDO: 389		CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). Fossa séptica pré-moldada, tipo ome, capacidade 15 pessoas (n=900 litros)				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Canteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pinior											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/10/2024				Data: 15/10/2024							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de Sousa



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 006		RDC: 381		MAO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva ej cond. Trab. 3- Chuva ej cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)				Gerente da Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Cabeleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pê carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pê carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/10/2024				Data: 18/10/2024							

Franklin de J. Sousa

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 008		RDO: 382		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
								MAO DE OBRA DIRETA				
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro 2												
Ajudante Geral 2												
Caleteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Lave								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Pisca Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 17/10/2024				Data: 17/10/2024								

Franklin de Sousa

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022          RDC: 096          RDC: 383				S	T	Q	Q	X	S	S	D			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva al cond. Trab.    3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA										
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)				Gerente de Obra										
				Engenheiro									1	
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Maestro de obra										
				Encarregado geral							1			
				Hh DO DIA										
				MAO DE OBRA DIRETA										
				Topografo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro							2			
				Ajudante Geral							2			
				Calceiteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pinor										
				Serralheiro										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO							QTDE.			
				Veiculo Leve										
				Caminhão Muncck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 18/10/2024				Data: 18/10/2024										

Franklin de Jesus  


  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - DS1888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 096		RDO: 384		MAO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/10/2024				Data: 19/10/2024							

Franklin de J. S. Sana  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA							
CONTRATO N° 2452022				RDC: 006		RDC: 385		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
GERENTE DE OBRA:				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 206											
Peca Vibratória											
Data: 20/10/2024				FISCALIZAÇÃO:							
				Data: 20/10/2024							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de Jesus  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO TAPIRHA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 2452922				RDC: 098		RDO: 388		MAO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). Fossa séptica pré-moldada, tipo omc, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)				Hh DO DIA			
MAO DE OBRA DIRETA											
Topógrafo											
Auxiliar de Topografia											
Pedreiro 2											
Ajudante Geral 2											
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QYDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/10/2024				Data: 21/10/2024							

*Franklin de J. Sona*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPIRUA.											
CONTRATO Nº 2452/22				RDC: 006				RDO: 387			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2019 Formecimento e espalhamento de terra vegetal preparada PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pinçor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO ELETIVO							
				ELETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				ELETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/10/2024				Data: 22/10/2024							

Franklin de J. Sena

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 245/2022				RDC: 086		RDC: 388		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
<p>TORNEIRA CROMADA 1/2DU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</p> <p>PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018</p> <p>Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada</p> <p>PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018</p>				<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Maestro de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>MAO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajudante Geral 2</p> <p>Calçateiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de PA carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba</p> <p>Pintor</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO</p> <p>QTDE.</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Muncck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>PA carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Piaca Vibratória</p>							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/10/2024				Data: 23/10/2024							

Franklin de Jesus



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.											
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 098				RDC: 399			
Categorias Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA							
S- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encargado geral							
TORNEIRA CROMADA 1/2"XU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Fomecimento e espalhamento de terra vegetal preparada PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HH DO DIA							
				HH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/10/2024				Data: 25/10/2024							

Franklin de Sousa

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		S	T	Q	Q	S	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.										
CONTRATO Nº 2452/22		RDC: 006		RDC: 391		CATEGORIA				
Condições Climáticas:	Marrã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS								Gerente de Obra	
SEM SERVIÇO									Engenheiro	
									Tec. de Segurança	
									Aux Adm	
									Mestre de obra	
									Encarregado geral	
									Hh DO DIA	
									MÃO DE OBRA DIRETA	
									Topografo	
									Auxiliar de topografia	
									Pedreiro	
									Ajudante Geral	
									Calceteiro	
									Carpinteiro	
									Operador de Motosserra	
									Motofixa	
									Montador	
									Montador/Eletricista	
									Eletricista	
									Operador de Patrol	
									Operador de Escavadeira	
								Operador de P&A carregadeira		
								Motorista de caçamba		
								Pintor		
								Serralheiro		
								Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO				QTDE.				
		Veiculo Leve								
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		P&A carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/10/2024		Data: 26/10/2024								

Franklin da Silva



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 006	RDO: 292	MÃO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Engenheiro						
SEM SERVIÇO				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/10/2024				Data: 27/10/2024						

Franklin de J. Sena

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHA - POSTO TAPINHA.										
CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 998 RDO: 393 Nota: ( ) Condções Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.AF_05/2019 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.AF_05/2019										
Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						MAO DE OBRA INDIRETA				
Hs DO DIA						MAO DE OBRA DIRETA				
Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 2										
Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P4 carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
Hs DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO				
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO				
GERENTE DE OBRA: Data: 28/10/2024						EFETIVO EQUIPAMENTOS				
FISCALIZAÇÃO: Data: 28/10/2024						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira P4 carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				

  
 Franklin de J. Pena

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - DF188854-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				T		Q	Q	S	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 245/2022      RDC: 006      RDO: 394				CATEGORIA								
Condições Climáticas:      Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA:      1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA								
Serviços Executados/Ocorrências  Limpeza geral Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/10/2024				Data: 29/10/2024								

Franklin de Jesus

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA. CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 098 RDO: 395				EFETIVO PESSOAL						
Condições climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE						
Serviços executados / ocorrências  Limpeza geral Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				HH DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 3						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
HH DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HH DO DIA						
OBSERVAÇÕES				HH ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Yoco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/10/2024				Data: 30/10/2024						

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

  
 Franklin de J. Senna



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA CONTRATO Nº 245/2022 RDC: 096 RDO: 396				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE							
Serviços Executados / Ocorrências  Limpeza geral Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm.com logomarca e moldura				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				HR DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Piloto Serralheiro							
								HR DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Date: 31/10/2024				Date: 31/10/2024							

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

  
 Franklin de J. Sena



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA				T							
CONTRATO Nº 2452022				RDC: 006		RDC: 397 4 436					
				Q							
				Q							
				S							
				S							
				D							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.			Gerente de Obra				
sem serviço				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro			
								Tec. de Segurança			
								Aux. Adm.			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								Hb DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topógrafo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								Carpinteiro			
								Operador de Motobomba			
								Motorista			
				Montador							
				Montador/Elétrica							
				Elétrica							
				Operador de Páteo							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de capanga							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hb DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hb DO DIA							
				Hb ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTD.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Tron							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capanga							
				Páteo							
				PC 300							
				Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/11/2024 à 30/11/2024				Data: 01/11/2024 à 30/11/2024							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2

Franklin de J. Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHÁ														
CONTRATO Nº 2452022		RDC: 008	RDO: 427 4 487	CATEGORIA			GTDE							
Mão de obra ( 1 )		Tarefa ( 1 )	Nota ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Topógrafo										
sem serviço				Assistente de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Cocoleiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motoberra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Elétrico										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de capamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
								Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
								JORNADA DE TRABALHO						
Hh DO DIA														
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO										
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Capamba										
				Patrol										
				PC 300										
				Placa Vibratória										
				ORIENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/12/2024 à 31/12/2024				Data: 01/12/2024 à 31/12/2024										

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2

Franklin de A. Pena  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 2452022		RDC: 008		RDO: 498		MÃO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 )		Tarde ( 1 )		Noite ( )		MÃO DE OBRA DIRETA				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Garante de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE: M3XXM), AF_072022				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muçca						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				PÁ carregadeira						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 300						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 01/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/01/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA												
CONTRATO Nº 2450022	RDC: 006	RDO: 499										
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M33XW), AF_070020				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				HR DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Caldenseiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motoberra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de PL carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				HR DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HR DO DIA								
				HR ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				PL carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA Data: 03/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 03/01/2023								

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA + DS1888554-2

  
**Franklin da J. Sena**









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																																			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						<table border="1"> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								X														S	T	Q	Q	S	S	D							
X																																									
S	T	Q	Q	S	S	D																																			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA						EFETIVO PESSOAL																																			
CONTRATO Nº 2450022						RDC: 006				RDC: 483																															
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						CATEGORIA				QTDE																															
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA																																			
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. n_120217 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_062016 Regularização manual e compacto com placa vibratória						Gerente de Obra																																			
						Engenheiro				1																															
						Téc. de Segurança																																			
						Aux. Adm.																																			
						Mestre de obra																																			
						Encarregado geral				1																															
						HR DO DIA																																			
						MÃO DE OBRA DIRETA																																			
						Topógrafo																																			
						Auxiliar de topografia																																			
						Pedreiro				2																															
						Ajudante Geral				2																															
						Canteiro																																			
						Carpinteiro																																			
						Operador de Motosserra																																			
						Motorista																																			
						Montador																																			
						Montador/Eletricista																																			
						Eletricista																																			
						Operador de Petrol																																			
						Operador de Escavadeira																																			
						Operador de Pá carregadeira																																			
						Motorista de caçamba																																			
						Fleiteiro																																			
						Serralheiro																																			
						HR DO DIA																																			
						RESUMO DO EFETIVO																																			
						EFETIVO DO DIA																																			
						JORNADA DE TRABALHO																																			
						HR DO DIA																																			
						HR ACUMULADO																																			
						EFETIVO EQUIPAMENTOS																																			
						TIPO				QTDE.																															
						Veículo Leve																																			
						Caminhão Munck																																			
						Caminhão Toco																																			
						Escavadeira																																			
						Pá carregadeira																																			
						Caçamba																																			
						Petrol																																			
						PC 200																																			
						Placa Vibratória																																			
ORIENTE DE OBRA						FISCALIZAÇÃO																																			
Data: 06/01/2025						Data: 06/01/2025																																			

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sousa  
 Engenheiro Ci  
 CREA+ 051888554-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHÁ CONTRATO Nº 24502022 RDO: 006 RDO: 464 Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.						S	X										
						S	T	Q	Q	S	S	S	D				
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. #_122017 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_052018 Regularização manual e compactação com placa vibratória						EFETIVO PESSOAL				MÃO DE OBRA INDIRETA							
						CATEGORIA				QTD							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra											
						Engenheiro				1							
						Téc. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral				1							
						Hr DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro				2							
						Ajudante Geral				2							
						Cabeleiro											
						Carpinteiro											
						Operador de Motocerra											
						Mortista											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caminhão											
						Pintor											
						Serralheiro											
						Hr DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hr DO DIA											
						Hr ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO				QTD							
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caminhão											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 07/01/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 07/01/2023											

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2

Francisco de Jesus  
 Engenheiro Civil  
 CREA-051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA										
CONTRATO Nº 245/2022										
RDC: 008				CATEGORIA						
RDO: 480				QTDE						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOS: 1- Tempo Bom 2- Chuva at const. Trab. 3- Chuva at const. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA						
SÍMBOLOS: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA						
Remoção de picada de terra manual, sem respaldamento. #_122617				Topógrafo						
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_162016				Auxiliar de topografia						
Regularização manual e compactação com placa vibratória				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Operador de Motocerra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Pádua						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pê carregadeira						
				Motorista de capamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				HÍ DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HÍ DO DIA						
				HÍ ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE						
				Veículo Lave						
				Comunhão Muncip						
				Comunhão Toco						
				Escavadeira						
				Pê carregadeira						
				Capamba						
				Pádua						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 08/11/2022				FISCALIZAÇÃO: 08/11/2022						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

Franklin de I. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							Data:											
									X									
							S	T	Q	Q	S	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHÁ							CATEGORIA					QTDE						
CONTRATO Nº 2452022		RDC: 006		RDC: 466														
Condições Cívicolas: Manhã ( 1 )		Tarde ( 1 )		Noite ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.							Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Engenheiro											
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Regularização manual e compactação com placa vibratória							Tec. de Segurança											
							Aux. Adm.											
							Mestre de obra											
							Encargado geral											
							Hs DO DIA											
							MÃO DE OBRA DIRETA											
							Topógrafo											
							Auxiliar de topografia											
							Pedreiro											
							Ajudante Geral											
							Calceteiro											
							Carpinteiro											
							Operador de Motosserra											
							Motorista											
							Montador											
							Montador/Eletricista											
							Elevador											
							Operador de Párol											
							Operador de Escavadeira											
							Operador de Pá carregadeira											
							Motorista de caçamba											
							Pintor											
							Serralheiro											
							Hs DO DIA											
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO											
							EFETIVO DO DIA											
							JORNADA DE TRABALHO											
							Hs DO DIA											
							Hs ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS											
							TIPO					QTDE						
							Veículo Leve											
							Caminhão Manick											
							Caminhão Toco											
							Escavadeira											
							Pá carregadeira											
							Caçamba											
							Párol											
							PC 200											
							Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 09/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/01/2023														

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
							X			
			S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHÁ CONTRATO Nº 248/2022      RDC: 006      RDO: 487			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 )      Tarde ( 1 )      Noite ( )			CATEGORIA				QTD			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva al. cont. Trab.    3- Chuva al. cont. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências  Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "L" de Z" - fornecimento e montagem SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_05/2020			Garanta de Obra							
			Engenheiro		1					
			Téc. de Segurança							
			Ass. Adm.							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral		1					
CONSIDERAÇÕES:			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topógrafo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro		2					
			Ajudante Geral		2					
OBSERVAÇÕES:			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hr DO DIA							
			Hr ACUMULADO							
			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO		QTD.					
			Veículo Leve							
			Caminhão Munca							
			Caminhão Topo							
			Escavadeira							
			PI carregadeira							
			Capumba							
			Patrol							
PC 200										
Placa Vibatória										
GERENTE DE OBRA: Data: 19/01/2023			FISCALIZAÇÃO: Data: 19/01/2023							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - DS1888554-2

  
**Franklin de J. Sousa**  
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINA					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 349/2022					RDC: 008		RDC: 488		CATEGORIA			OTDE
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.					MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Orçamento de Obra							
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp=0,3mm, pintura Kaynar 909 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020					Engenheiro							1
					Téc. de Segurança							
					Ass. Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO		
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					HR DO DIA							
					HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							OTDE
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					PI carregadeira							
					Cacamba							
					Patrol							
					PC 200							
Risca Vibratória												
GERENTE DE OBRA: Data: 11/01/2023					FISCALIZAÇÃO: Data: 11/01/2023							

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2

*Franklin de J. Sosa*  
 Engenheiro Civil  
 CREA + 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA						S	T	Q	Q	S	S	D	X			
CONTRATO Nº 2452022 RDC: 006 RDO: 489 Nota:						EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.						MÃO DE OBRA INOBYETA										
sem serviços						Gerente de Obra										
						Engenheiro										
						Téc. de Segurança										
						Ass. Adm.										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral										
						CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA				
						Topógrafo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro										
						Ajudante Geral										
						Carpinteiro										
						Carpinteiro										
						Operador de Motosserra										
						Motorista										
						Montador										
						Montador/Eletricista										
						Eletricista										
						Operador de Patrol										
						Operador de Escavadeira										
						Operador de Pá carregadeira										
						Motorista de capanga										
Pintor																
Serralheiro																
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hs DO DIA										
						Hs ACUMULADO										
						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO							QTDE.			
						Veículo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Capanga										
						Patrol										
						PC 300										
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA: Data: 13/01/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 12/01/2023										

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2

Franklin de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
					X									
					S	T	Q	Q	S	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA					CATEGORIA					QTDE				
CONTRATO Nº 2450022					RDO: 006		RDO: 470			MÃO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )														
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.					Gerente de Obra					1				
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de Z". Formatação e montagem SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_08/2020					Téc. de Segurança									
					Ass. Adm.									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral					1				
										HR DO DIA				
					MÃO DE OBRA DIRETA									
					Topógrafo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro					2				
					Ajudante Geral					2				
					Calceiro									
					Carpinteiro									
					Operador de Motosserra									
					Motorista									
					Montador									
					Montador/Eletricista									
					Eletricista									
					Operador de Fuso									
					Operador de Escavadeira									
					Operador de PI carregadeira									
					Mototata de caçamba									
					Pintor									
					Serralheiro									
					HR DO DIA									
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
					JORNADA DE TRABALHO									
					HR DO DIA									
					HR ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					TIPO					QTDE				
					Veículo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					PI carregadeira									
					Capomba									
					Pintor									
					PC 300									
					Prensa Vibratória									
GERENTE DE OBRA					PRCALIZAÇÃO									
Data: 13/01/2025					Data: 13/01/2025									

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA												
CONTRATO Nº 2450222					RDC: 008		RDC: 471		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA					Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro							1
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp. 0,5mm, pintura Kaynar 800 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "L" de 2" - forreamento e montagem SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_05/2020					Téc. de Segurança							
					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					HR DO DIA							
					HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							QTDE.
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					PI carregadeira							
					Capomba							
					Páteo							
					PC 200							
					Pico Vibratório							
ORIENTANTE DE OBRA Data: 14/01/2021					FISCALIZAÇÃO Data: 14/01/2021							


Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA CONTRATO Nº 3450022 RDC: 008 RDO: 472				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				CATEGORIA			QTOE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab 3- Chuva of cond. Trab				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS: Revestimento azulejo em alumínio composto (Alucobond), 40x30cm, pintura Kaynar 800 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hs DO DA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pí carregadora Motorista de capanga Pintor Serralheiro Hs DO DA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTOE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pí carregadora Capanga Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Dtn: 15/01/2025				FISCALIZAÇÃO: Dtn: 15/01/2025						


  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

  
**Franklin de A. Sena**  
 Engenheiro Ci.  
 CREA 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO TAPINHÁ CONTRATO Nº 2450022 RDC: 008 RDC: 473				S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE	
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 40,3mm, pintura Kaynar 900 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_090205				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Ass. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Piston Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Petrol PC 200 Peça Vibração				QTDE			
GERENTE DE OBRA Data: 16/01/2023				FISCALIZAÇÃO Data: 16/01/2023							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

  
**Franklin de A. Pena**  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
CONTRATO Nº 263222				RDC: 001		RDC: 426		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Menor ( 1 )				Temperatura ( 1 )		Vento ( 1 )		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Base 2- Obra de cond. Trab. 3- Obra af cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências							
<p>Letra em alumínio 20 x 25cm - instalado</p> <p>Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado</p> <p>RELEIJA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,4 CM AF_2020</p> <p>Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado</p>				<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral</p>							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				<p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Servente</p> <p>Operador de Prensa</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motorista de cangaço</p> <p>Pinel</p> <p>Semalhado</p>							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hs DO DIA</p> <p>Hs ACUMULADO</p>							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				<p>TIPO</p> <p>QTDE</p> <p>Velocidade</p> <p>Cambião Alcega</p> <p>Cambião Tron</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Cangaço</p> <p>Prensa</p> <p>PC 250</p> <p>Placa Vibratória</p>							
GERENTE DE OBRA Data: 17/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 17/01/2023							

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2

  
**Franklin de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data															
						S	T	Q	Q	S	S	D									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZBAHIA - POSTO TAPINHA						CATEGORIA															
CONTRATO Nº 2450022						RDC: 006				RDC: 475				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )						MÃO DE OBRA DIRETA															
SIMBOLOGIA						Garanta de Obra															
1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						Engenheiro 1															
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências						Téc. de Segurança															
Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado						Ass. Adm.															
Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado						Mestre de obra															
SOLTEIRA EM GRANTITO, LARGURA 10 CM, ESPESURA 2,6 CM, AF_892828						Encarregado geral 1															
Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado																					
						HR DO DIA															
						MÃO DE OBRA DIRETA															
						Topógrafo															
						Auxiliar de topografia															
						Pedreiro 2															
						Ajudante Geral 2															
						Carpinteiro															
						Operador de Motosserra															
						Metalista															
						Montador															
						Montador/Eletricista															
						Elétrico															
						Operador de Petrol															
						Operador de Escavadeira															
						Operador de PI carregadeira															
						Motorista de caçamba															
						Pintor															
						Serralheiro															
						HR DO DIA															
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO															
						EFETIVO DO DIA															
						JORNADA DE TRABALHO															
						HR DO DIA															
						HR ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS															
						TIPO															
						QTD.															
						Veículo Leve															
						Caminhão Munck															
						Caminhão Toco															
						Escavadeira															
						PI carregadeira															
						Caçamba															
						Petrol															
						PC 205															
						Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:															
Data: 18/01/2023						Data: 18/01/2023															

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

Franklin de A. Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
CONTRATO Nº 2652022		RDC: QM		RDC: 476		CATEGORIA		GTDE		
Condicion. Construc. Maranh ( 1 )		Tender ( 1 )		Total ( )						
SÍMBOLOS: 1- Tempo Bom - 2- Chove et cond. Trab. - 3- Chove et cond. Trab.										
SITUAÇÃO: sem serviços				SITUAÇÃO EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Diretor de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Ass. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				H0 DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Procurador						
				Ajudante Geral						
				Canteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de PI carregadora						
				Motorista de capamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				H0 DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				H0 DO DIA						
				H0 ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		GTDE				
				Válculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Tronç						
				Escavadeiras						
				PI carregadora						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 350						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 19/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/01/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + D5188554-2

Franklin de J. Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA + D5188554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA					X								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 349/2022      RDC: 000      RDO: 477					EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas:      Máx (    )      Mín (    )      Vento (    )					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SÍMBOLOGIA:      1- Trabalho Base    2- Obrero af. cond. Trab.    3- Obrero af. cond. Trab.					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Azar Adm. Mestre de obra Encarregado geral  Hrs DO DIA								
Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado SOLZEIRA EM GRANITO LANCIRA 15 CM, ESPORRILA 24 CM, AF_09/2020 Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pídemetro Apontador Geral Caldeirão Carpinteiro Operador de Motosserra Motociclista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadora Motorista de capamba Píster Serralheiro  Hrs DO DIA								
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hrs DO DIA								
					Hrs ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO								
					QTDE.								
					Veículo Leve								
					Caminhão Basculante								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadora								
					Capamba								
					Patrol								
					PC 350								
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA Data: 20/01/2023					FISCALIZAÇÃO Data: 20/01/2023								

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA+ 051888554-2

  
 Franklin de J. Sena



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA										
CONTRATO Nº 2450022		RDC: 006	RDC: 478	CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências Letra em alumínio 30 x 20cm - Instalado Letra em alumínio 45 x 45cm - Instalado SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2A CM, AF_09308 Letra em alumínio 15 x 15cm - Instalado				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				HR DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Mortista						
				Montador/Desmontador						
				Etricista						
				Operador de Pneu						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caminhão						
				Pintor						
				Serralheiro						
				HR DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				HR DO DIA						
OBSERVAÇÕES				HR ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caminhão						
				Pneu						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA Data: 21/01/2023				FISCALIZAÇÃO Data: 21/01/2023						

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de S. Sana



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data																												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										X								S	T	Q	Q	S	S	D				
			X																														
S	T	Q	Q	S	S	D																											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA					EFETIVO PESSOAL																												
CONTRATO Nº 340/2022			RDC: 008		RDO: 478		CATEGORIA			QTDE																							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )					MÃO DE OBRA INDIRETA																												
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																												
SEM SERVIÇO: Preparo de superfícies com lixamento de paredes e tetos					Gerente de Obra																												
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_062014					Engenheiro																												
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_062014					Téc. de Segurança																												
					Aux Adm																												
					Mestre de obra																												
					Encarregado geral																												
					MÃO DE OBRA DIRETA																												
					Topógrafo																												
					Auxiliar de topografia																												
					Pedreiro																												
					Ajudante Geral																												
					Cajuleiro																												
					Carpinteiro																												
					Operador de Motosema																												
					Motorista																												
					Montador																												
					Montador/Eletricista																												
					Eletricista																												
					Operador de Patrol																												
					Operador de Escavadeira																												
					Operador de Pá carregadeira																												
					Motorista de caçamba																												
					Pintor																												
					Serralheiro																												
					RESUMO DO EFETIVO																												
					EFETIVO DO DIA																												
					JORNADA DE TRABALHO																												
					HR DO DIA																												
					HR ACUMULADO																												
					EFETIVO EQUIPAMENTOS																												
					TPO																												
					QTDE																												
					Velocidade Leve																												
					Caminhão Munck																												
					Caminhão Toco																												
					Escavadeira																												
					Pá carregadeira																												
					Caçamba																												
					Patrol																												
					PC 300																												
					Placa Vibretila																												
GERENTE DE OBRA: Data: 22/01/2023					FISCALIZAÇÃO: Data: 22/01/2023																												

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 051888554-2

Franklin de J. F. Silva





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 2462022		RDC: 006	RDC: 481	CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva si cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Topografo									
EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_072016 EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO, AF_072016 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_062018 Fercalçamento e espalhamento de terra vegetal preparada				Assistente de topografia									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE					
				Veículo Leve									
				Caminhão Muncis									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadora									
				Capanga									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
ORIENTE DE OBRA		FISCALIZAÇÃO											
Data: 24/01/2023		Ass: 3461/2023											

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

Fran Van de Lona  
 Engenheiro Ci  
 051888554-2







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data													
					S	T	Q	Q	S	S	S	D	X					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAMA - POSTO TAPINHÁ					CATEGORIA													
CONTRATO Nº 2692022					RDC: 008			RDC: 488			QTDE							
Condições Climáticas: Manhã ( 1 ) Tarde ( 1 ) Noite ( )					MÃO DE OBRA INDETERMINADA													
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.					MÃO DE OBRA DETERMINADA													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA DETERMINADA													
sem serviços					MÃO DE OBRA INDETERMINADA													
					Engenheiro									1				
					Téc. de Segurança													
					Aux. Adm.													
					Mestre de obra													
					Encarregado geral													
					OBSERVAÇÕES					MÃO DE OBRA DETERMINADA								
Topógrafo																		
Auxiliar de topografia																		
Pedreiro																		
Ajudante Geral																		
Cabeleiro																		
Carpinteiro																		
Operador de Motosserra																		
Motorista																		
Montador																		
Montador/Eletricista																		
Eletricista																		
Operador de Patrão																		
Operador de Escavadeira																		
Operador de PI carregadeira																		
Motorista de caçamba																		
Pintor																		
Serralheiro																		
CONDIÇÕES					REBANCO DO EFETIVO													
					EFETIVO DO DIA													
					JORNADA DE TRABALHO													
					HR DO DIA													
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS													
					TIPO									QTDE.				
					Válvula Leve													
					Caminhão Munck													
					Caminhão Toco													
					Escavadeira													
					PI carregadeira													
					Caçamba													
					Patrão													
					PC 300													
					Placa Vibratória													
					REPRESENTANTE DE OBRA					FISCALIZAÇÃO:								
					Data: 26/11/2023					26/11/2023								

Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2

Franklin de J. Senna  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 051888554-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA						EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 248/2022 RDC: 006 BO 484						CATEGORIA QTDE									
Condições Climáticas Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )						MAO DE OBRA INDIRETA									
SÍMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. 3- Chuva s/ cond. Trab. Tráb.						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1									
						Tec. de Segurança									
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018						Aux Adm									
						Mestre de obra									
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020						Encarregado geral 1									
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015															
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						RH DO DIA									
						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topógrafo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro 2									
						Ajudante Geral 2									
						Calceiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de P3 carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pneiro									
						Serralheiro									
						RH DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						RH DO DIA									
						RH ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO QTDE.									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Traco									
						Escavadeira									
						P3 carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA						FISCALIZAÇ									
Data: 27/01/2025						AO: 27/01/2025									

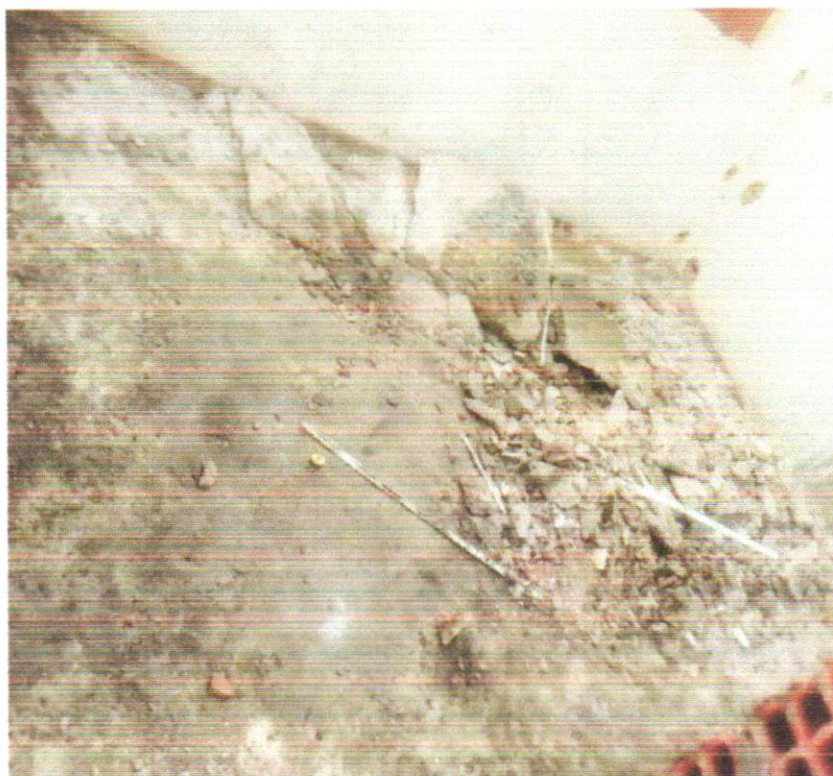
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de Jesus  
Engenheiro Civil



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO TAPINHA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

Franklin de L. Sopa  
Engenheiro Civil  
CREA+ 051888554-2

FOTO 01 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01



FOTO 02 - Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af\_12/2017



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
15/10/2024	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 03 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

Franklin de J. Sena  
Engenheiro  
CREA 07/000000000



FOTO 04 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 05 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado

*Franklin de J. Sena*  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2

*Antonio Soares Cordeiro Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



FOTO 06 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

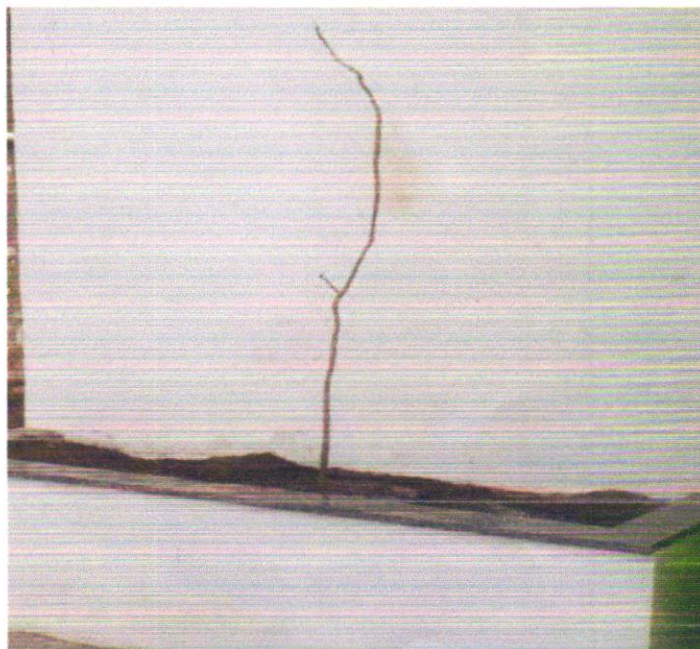


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/01.2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2

FOTO 07 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014



  
 Franklin da Senna  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 05188554-2



FOTO 08 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF\_05/2018

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01.2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 09 - Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)

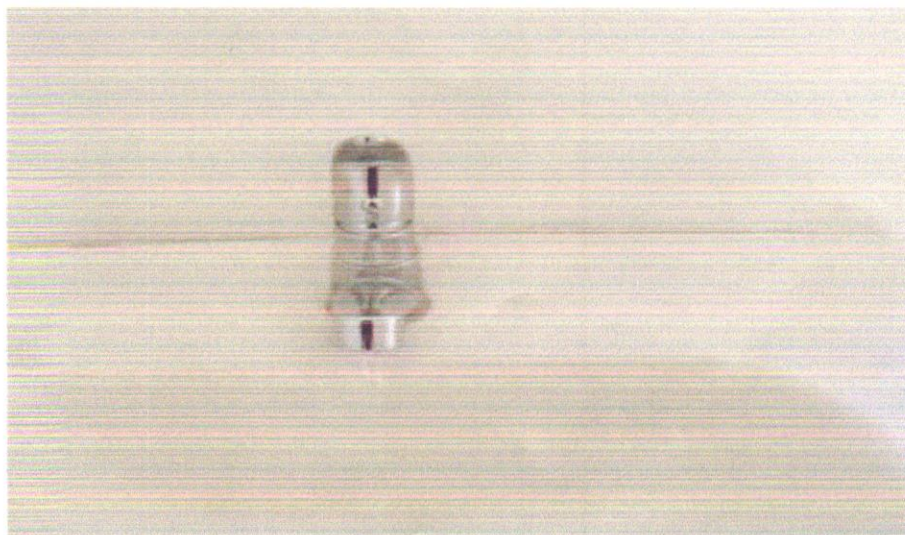


FOTO 10 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

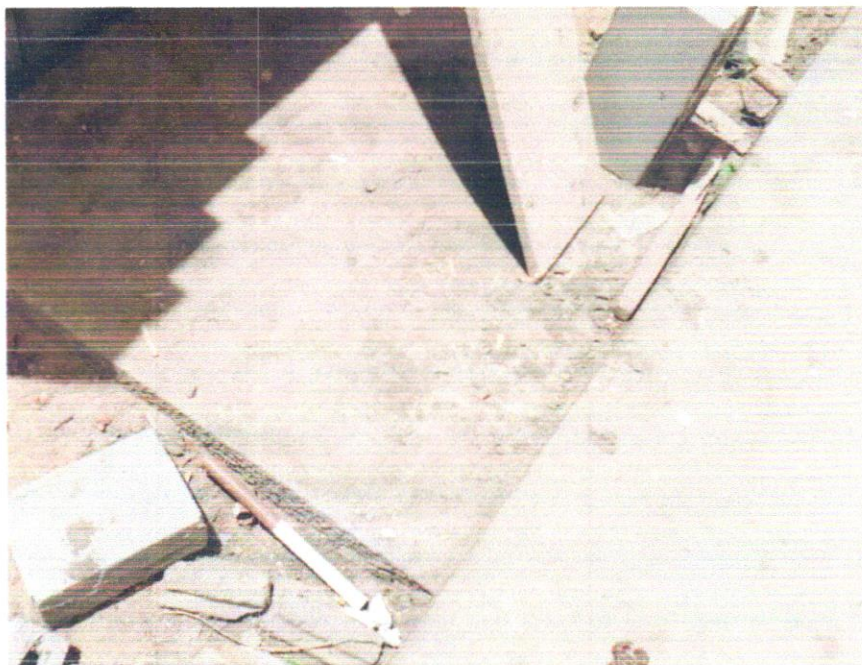


Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

Francisco de Jesus  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01.2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

FOTO 11 - Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas ( $v=900$  litros)



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



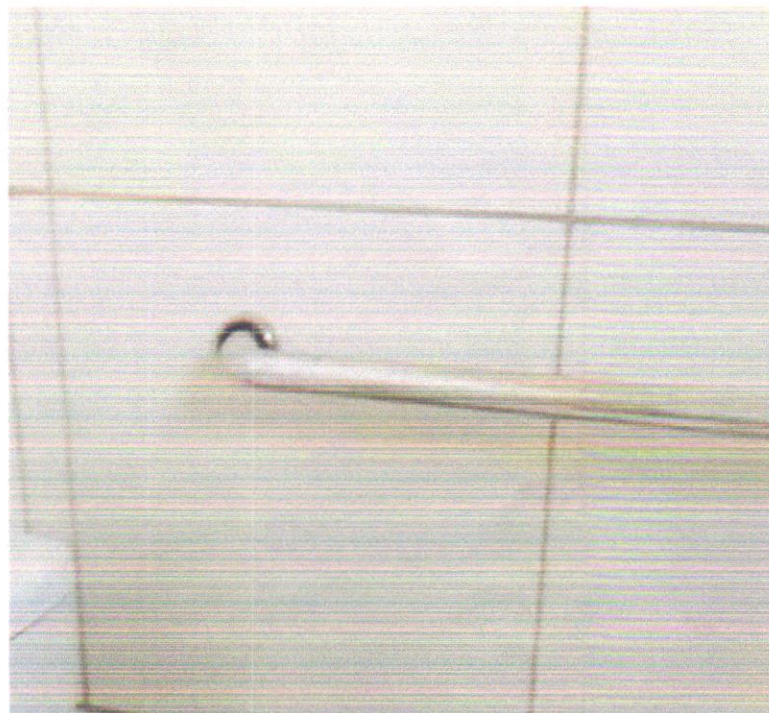
FOTO 12 - FILTRO ANAERÓBICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF\_12/2020

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

FOTO 13 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m

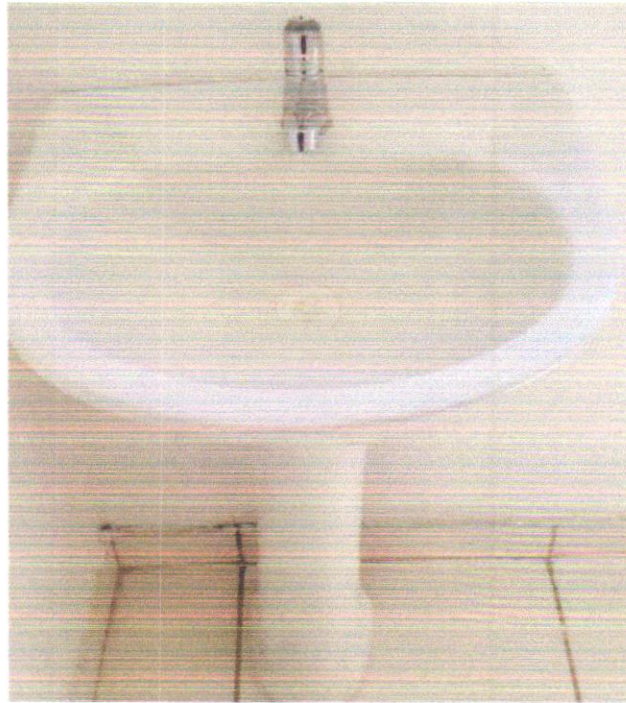


Francisco de Assis  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



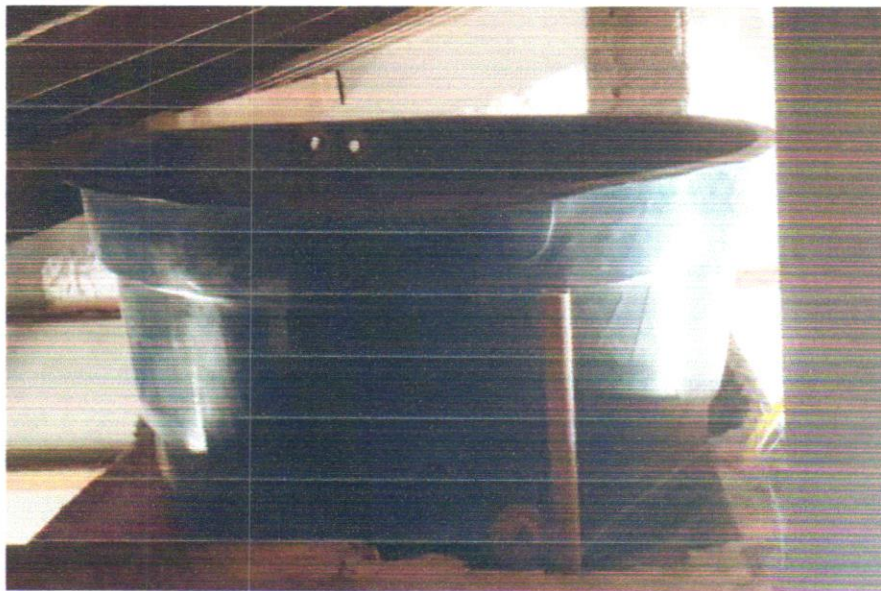
FOTO 14 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

FOTO 15 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020



Franklin de J. Sana  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

FOTO 16 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 17 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

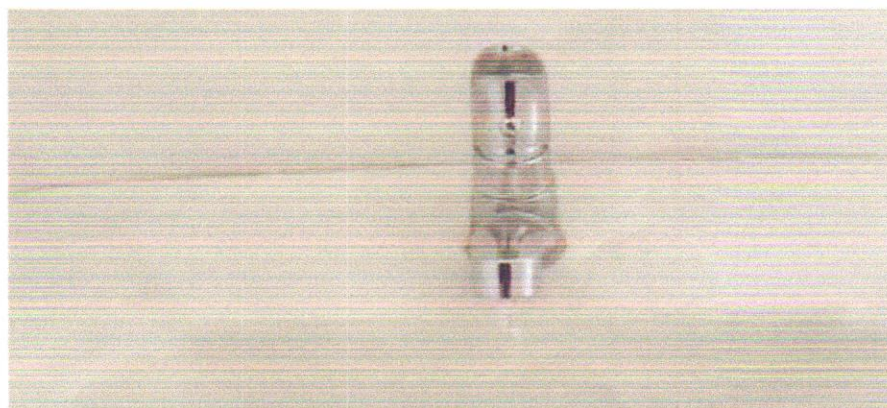


FOTO 18 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

Franklin de J. Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 051888554-2



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha



FOTO 19 - Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051886554-2



Foto 20 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

Franklin de L. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA-051886554-2



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/01/2025	Santaluz	Reforma do Posto do Povoado do Tapinha

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2

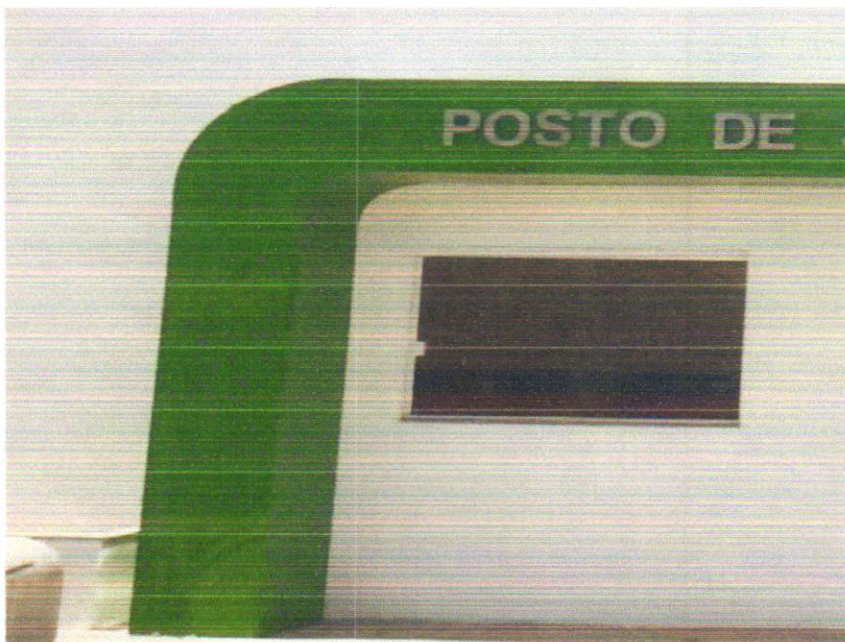


FOTO 03 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem



Franklin de J. S.  
Engenheiro Civil  
CREA-051888554-2



FOTO 04 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CNPJ/MF 13.807.870/0001-19

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



## TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento ao contrato nº. 245/2022 do RDC - Regime Diferenciado de Contratação nº 006/2022 que entre si celebram o Município de Santaluz - BA e a Empresa ASCN CONSULTORA LTDA CNPJ nº 33.957.361/0001-80.

O Municipal de Santaluz - BA, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, CEP: 48.880-000 - Santaluz-BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.807.870/0001-19, representada pelo Prefeito, Sr. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 016.549.665-76 e portador do RG nº 1148395733, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde ISAAC SANTOS BACELAR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 045.177.515-54, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa EMPRESA ASCN SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.957.361/0001-80, com sede na Avenida Conselheiro Eliel Martins, nº 131, Casa, Térreo, Centro - Riachão de Jacuípe - BA, CEP: 44.640-000, doravante designada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei 8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente apostilamento a alteração da cláusula segunda do presente contrato, acrescentando à dotação orçamentária, como descrito a seguir:

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A Dotação orçamentária que será inserida em tal despesa é:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE: 1201

PROJETO ATIVIDADE: 1.007

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1700 / 1701 / 1706 / 1710 / 1720 / 1721 / 1754 / 1755





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CNPJ/MF 13.807.870/0001-19

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE: 1201

PROJETO ATIVIDADE: 2.049

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1708 / 1720

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 1.006

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1600 / 1601 / 1631 / 1632 / 1708 / 1754

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 2.038

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1706

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA FINALIDADE

Este termo de apostilamento tem por finalidade acrescentar dotação orçamentária ao presente contrato.

## CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o art. 65, parágrafo 8º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Santaluz - BA, 03 de fevereiro de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR

Prefeito Municipal







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
CNPJ Nº 13.807.870/0001-19  
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



2

Santaluz - BA, 03 de fevereiro de 2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
**RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2022**  
**EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santaluz torna público, para os fins legais, a inserção da seguinte dotação orçamentária:

**EMPRESA:** ASCN CONSTRUTORA LTDA.  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 177/2022  
**CONTRATO:** 245/2022

**Dotação Orçamentária:**

**ÓRGÃO:** Secretaria Municipal de Infraestrutura  
**UNIDADE:** 1201  
**PROJETO ATIVIDADE:** 1.007  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51  
**FONTE DE RECURSOS:** 1500 / 1700 / 1701 / 1706 / 1710 / 1720 / 1721 / 1754 / 1755

**ÓRGÃO:** Secretaria Municipal de Infraestrutura  
**UNIDADE:** 1201  
**PROJETO ATIVIDADE:** 2.049  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51  
**FONTE DE RECURSOS:** 1708 / 1720

**ÓRGÃO:** Fundo Municipal de Saúde  
**UNIDADE:** 1101  
**PROJETO ATIVIDADE:** 1.006  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51  
**FONTE DE RECURSOS:** 1500/ 1600/ 1601/1631/ 1632/ 1708/ 1754

**ÓRGÃO:** Fundo Municipal de Saúde  
**UNIDADE:** 1101  
**PROJETO ATIVIDADE:** 2.038  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51  
**FONTE DE RECURSOS:** 1706

**ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro - CEP.: 48.880-000 - Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico  
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04  
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

