



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 258-2022

EMPENHO: 316 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 568 Data do Sub-Empenho: 09/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5476 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1541 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 09/05/2025
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 013-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 289-2022	179.000,00	146.071,85	32.928,15
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 289-2022, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 013-2022, OBRA Nº 116/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2025 À 30/04/2025. NFS-e 561.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
146.071,85	146.071,85	0,00

Data do Empenho: 09/05/2025

Data do Liquidação: 09/05/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00E	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1541	9.640,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00E	IRRF - Fonte 1541	1.752,86
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00E	ISS - Fonte 1541	4.382,16
## Cento e trinta mil e duzentos e noventa e seis reais e nove centavos ##		Valor Retido 15.775,76
		Valor Liquidado 130.296,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/05/2025	561	U			146.071,85
Quantidade: 1					Total:	146.071,85

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	146.071,85

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 20/05/25

CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 08/05/2025

A empresa:

MP2 CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ: 24.597.344/0001-98

Endereço:

AVE. TANCREDO NEVES 2539, ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING – CAMINHO DAS ÁRVORES
– SALVADOR – CEP: 41820-021 – BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICIPIO DE SANTALUZ -BA.
Processo Licitatório: RDC 013/2022
Contrato: 289/2022 Processo administrativo: 258/2022 Nº da obra: 116/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 561 VALOR DA NOTA: R\$ 146.071,85 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 A 30/04/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FUNDEB

Atenciosamente,

Victor Araújo de Almeida

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000561
Data e Hora de Emissão:
08/05/2025 09:32:46
Código de Verificação:
NEVÁ-8ZEE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2639 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail:
setorfiscal.trib@gmail.com

Inscrição Municipal:
00.561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
☒ O(s) - viço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM **08/05/2025**
Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Nº DO CONTRATO: 289/2022 OBRA Nº: 116/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022 RDC Nº 013/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 30/04/2025

VALOR TOTAL: R\$ 146.071,85

Valor Material 40%: R\$ 58.428,74 Base de cálculo do INSS 60%: 87.643,11 x 11% R\$: 9.640,74

Valor do ISS 5%: R\$ 4.382,16

Retenção IR Alíquota 1,2%: R\$ 1.752,86

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$146.071,85

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
58.428,74	87.643,11	5,00%	4.382,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
9.640,74	0,00	0,00	1.752,86	0,00	4.382,16	130.296,09

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 05/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 423055	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING		Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 87.643,11	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 4.382,16	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 4.382,16	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2025	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 09/05/2025 01:17:11	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 561 - DATA DE EMISSÃO: 08-05-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.382,16	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.382,16	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81790000043 . 8

82163906202 . 4

50610010500 . 2

00042305512 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000043 . 8

82163906202 . 4

50610010500 . 2

00042305512 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 423055	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 09/05/2025 01:17:11	DATA VENCIMENTO: 10/06/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.382,16
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.382,16

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 423054	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES		NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
DOCUMENTOS		UF: BA
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO: 24.597.344/0001-98
C.N.P.J.:		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 1.752,86	Quantidade/Niquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 1.752,86	Taxa Expediente R\$: 1.752,86	Valor Total R\$: 1.752,86
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 09/05/2025 01:15:15	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 1.752,86	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.752,86	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.752,86
Taxa de Expediente: 1.752,86	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.752,86	Vlr. Devido com Desconto: 1.752,86	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.752,86
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		
4) NF-e Nº 561 - Data de emissão: 08-05-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000017 . 6 52863906202 . 5 50531010100 . 9 00042305407 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000017 . 6 52863906202 . 5 50531010100 . 9 00042305407 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 423054	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 09/05/2025 01:15:15	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO: 30349		(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.752,86
MP2 CONSTRUÇOES LTDA		(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.752,86



Versão: Jasper 2.0.1.0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ-BA

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA Nº: 116/2024
Nº DO CONTRATO: 289/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022
RDC Nº 013/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/04/2025 a 30/04/2025
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
EMPRESA:	MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA
CNPJ:	24.597.344/0001-98
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO	R\$ 146.071,85

PLANILHA DE MEDIÇÃO								MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO		% EXECUTADO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 104.780,02	2,58 %							
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 405,11	R\$ 500,47	R\$ 3.002,82	0,07 %	R\$ -		6,00	R\$ 3.002,82	0,00	R\$ -	0,20 %
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.295,12	R\$ 1.599,99	R\$ 1.599,99	0,04 %	R\$ -		1,00	R\$ 1.599,99	0,00	R\$ -	0,06 %
1.3	Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 10 mm (1 uso) - Rev 02	m²	88,00	R\$ 141,69	R\$ 175,04	R\$ 15.403,52	0,38 %	R\$ -		88,00	R\$ 15.403,52	0,00	R\$ -	0,57 %
1.4	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	R\$ 6.222,05	R\$ 7.686,72	R\$ 7.686,72	0,19 %	R\$ -		1,00	R\$ 7.686,72	0,00	R\$ -	0,01 %
1.4	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	R\$ 6.222,05	R\$ 7.686,72	R\$ 7.686,72	0,19 %	R\$ -		0,00	R\$ -	1,00	R\$ 7.686,72	0,00 %
1.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 743,25	R\$ 918,21	R\$ 918,21	0,02 %	R\$ -		1,00	R\$ 918,21	0,00	R\$ -	0,11 %
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.052,87	R\$ 1.300,72	R\$ 3.277,81	0,08 %	R\$ -		2,52	R\$ 3.277,81	0,00	R\$ -	0,08 %
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.160,13	R\$ 1.433,22	R\$ 28.664,40	0,71 %	R\$ -		20,00	R\$ 28.664,40	0,00	R\$ -	0,07 %
1.8	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	R\$ 931,36	R\$ 1.150,60	R\$ 23.012,00	0,57 %	R\$ -		20,00	R\$ 23.012,00	0,00	R\$ -	0,09 %
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	1.514,30	R\$ 6,50	R\$ 8,03	R\$ 12.159,83	0,30 %	R\$ -		1.514,30	R\$ 12.159,83	0,00	R\$ -	12,45 %
1.10	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.400,00	R\$ 0,46	R\$ 0,57	R\$ 1.368,00	0,03 %	R\$ -		2.400,00	R\$ 1.368,00	0,00	R\$ -	175,44 %
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					R\$ 146.000,18	3,60 %							
2.1	EDIFICAÇÃO					R\$ 142.696,43	3,52 %							

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154/022-4

Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	758,00	R\$ 102,24	R\$ 126,31	R\$ 95.742,98	2,36 %	146,00	R\$ 18.441,26	658,00	R\$ 83.111,98	100,00	R\$ 12.631,00	0,69 %
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	343,64	R\$ 78,01	R\$ 96,37	R\$ 33.116,59	0,82 %		R\$ -	343,64	R\$ 33.116,59	0,00	R\$ -	1,04 %
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	175,17	R\$ 7,11	R\$ 8,78	R\$ 1.537,99	0,04 %		R\$ -	175,17	R\$ 1.538,01	0,00	-R\$ 0,02	11,39 %
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	280,54	R\$ 35,49	R\$ 43,84	R\$ 12.298,87	0,30 %		R\$ -	280,54	R\$ 12.298,87	0,00	R\$ -	2,28 %
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS					R\$ 2.116,32	0,05 %							
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,59	R\$ 78,01	R\$ 96,37	R\$ 1.502,41	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	15,59	R\$ 1.502,41	0,00 %
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,95	R\$ 7,11	R\$ 8,78	R\$ 113,70	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,95	R\$ 113,70	0,00 %
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,41	R\$ 35,49	R\$ 43,84	R\$ 500,21	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	11,41	R\$ 500,21	0,00 %
2.3	CASTELO D'ÁGUA					R\$ 1.187,43	0,03 %							
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,09	R\$ 78,01	R\$ 96,37	R\$ 972,37	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	10,09	R\$ 972,37	0,00 %
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	R\$ 7,11	R\$ 8,78	R\$ 113,79	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,96	R\$ 113,79	0,00 %
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,31	R\$ 35,49	R\$ 43,84	R\$ 101,27	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,31	R\$ 101,27	0,00 %
3	FUNDAÇÕES					R\$ 333.629,58	8,22 %							
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					R\$ 82.856,28	2,04 %							
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	75,29	R\$ 34,13	R\$ 42,16	R\$ 3.174,23	0,08 %		R\$ -	75,29	R\$ 3.174,23	0,00	R\$ -	2,37 %
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	160,87	R\$ 156,68	R\$ 193,56	R\$ 31.138,00	0,77 %		R\$ -	160,87	R\$ 31.138,00	0,00	R\$ -	0,52 %
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	450,26	R\$ 17,80	R\$ 21,99	R\$ 9.901,22	0,24 %		R\$ -	450,26	R\$ 9.901,22	0,00	R\$ -	4,55 %
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	60,08	R\$ 16,48	R\$ 20,36	R\$ 1.223,23	0,03 %		R\$ -	60,08	R\$ 1.223,23	0,00	R\$ -	4,91 %
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	562,26	R\$ 14,54	R\$ 17,96	R\$ 10.098,19	0,25 %		R\$ -	562,26	R\$ 10.098,19	0,00	R\$ -	5,57 %
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	229,18	R\$ 12,11	R\$ 14,96	R\$ 3.428,53	0,08 %		R\$ -	229,18	R\$ 3.428,53	0,00	R\$ -	6,68 %
3.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	154,06	R\$ 19,12	R\$ 23,62	R\$ 3.638,90	0,09 %		R\$ -	154,06	R\$ 3.638,90	0,00	R\$ -	4,23 %
3.1.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, PC30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	23,14	R\$ 708,50	R\$ 875,28	R\$ 20.253,98	0,50 %		R\$ -	23,14	R\$ 20.253,98	0,00	R\$ -	0,11 %
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					R\$ 212.662,21	5,24 %							
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	99,89	R\$ 32,82	R\$ 40,55	R\$ 4.050,54	0,10 %		R\$ -	99,89	R\$ 4.050,54	0,00	R\$ -	2,47 %
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	95,94	R\$ 736,62	R\$ 910,02	R\$ 87.307,32	2,15 %		R\$ -	95,94	R\$ 87.307,32	0,00	R\$ -	0,11 %
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	593,99	R\$ 80,13	R\$ 98,99	R\$ 58.799,07	1,45 %		R\$ -	593,99	R\$ 58.799,07	0,00	R\$ -	1,01 %
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,17	R\$ 17,80	R\$ 21,99	R\$ 3,74	0,00 %		R\$ -	0,17	R\$ 3,74	0,00	R\$ -	4,55 %

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	804,86	R\$ 16,48	R\$ 20,36	R\$ 16,386,95	0,40 %		R\$ -	804,86	R\$ 16,386,95	0,00	R\$ -	4,91 %
3.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	88,18	R\$ 14,54	R\$ 17,96	R\$ 1,583,71	0,04 %		R\$ -	88,18	R\$ 1,583,71	0,00	R\$ -	5,57 %
3.2.7	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	24,33	R\$ 12,11	R\$ 14,96	R\$ 363,98	0,01 %		R\$ -	24,33	R\$ 363,98	0,00	R\$ -	6,68 %
3.2.8	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	405,01	R\$ 19,12	R\$ 23,62	R\$ 9,566,34	0,24 %		R\$ -	405,01	R\$ 9,566,34	0,00	R\$ -	4,23 %
3.2.9	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	39,96	R\$ 700,89	R\$ 865,88	R\$ 34,600,56	0,85 %		R\$ -	39,96	R\$ 34,600,56	0,00	R\$ -	0,12 %
3.3	FUNDACÃO DO CASTELO D'ÁGUA					R\$ 22.627,66	0,56 %							
3.3.1	Escavação mecânica com 25 cm de diâmetro, sem armação	M	63,00	R\$ 76,76	R\$ 94,83	R\$ 5,974,29	0,15 %		R\$ -	0,00	R\$ -	63,00	R\$ 5,974,29	0,00 %
3.3.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 05/2021	UN	9,00	R\$ 19,19	R\$ 23,71	R\$ 213,39	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 213,39	0,00 %
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	m²	12,96	R\$ 32,82	R\$ 40,55	R\$ 525,53	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,96	R\$ 525,53	0,00 %
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDÃO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	m²	8,64	R\$ 92,84	R\$ 114,69	R\$ 990,92	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	8,64	R\$ 990,92	0,00 %
3.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	238,29	R\$ 14,54	R\$ 17,96	R\$ 4,279,69	0,11 %		R\$ -	0,00	R\$ -	238,29	R\$ 4,279,69	0,00 %
3.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	199,34	R\$ 12,11	R\$ 14,96	R\$ 2,982,13	0,07 %		R\$ -	0,00	R\$ -	199,34	R\$ 2,982,13	0,00 %
3.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	18,49	R\$ 12,96	R\$ 16,01	R\$ 296,02	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	18,49	R\$ 296,02	0,00 %
3.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	23,54	R\$ 19,12	R\$ 23,62	R\$ 556,01	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	23,54	R\$ 556,01	0,00 %
3.3.9	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,78	R\$ 708,50	R\$ 875,28	R\$ 6,809,68	0,17 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,78	R\$ 6,809,68	0,00 %
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS					R\$ 5.229,44	0,13 %							
3.4.1	Escavação mecânica com 30 cm de diâmetro, sem armação	bloco	21,00	R\$ 136,26	R\$ 168,34	R\$ 3,535,14	0,09 %		R\$ -	0,00	R\$ -	21,00	R\$ 3,535,14	0,00 %
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	m²	1,50	R\$ 32,82	R\$ 40,55	R\$ 60,83	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,50	R\$ 60,83	0,00 %
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDÃO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	m²	6,00	R\$ 92,84	R\$ 114,69	R\$ 688,14	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 688,14	0,00 %
3.4.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	12,23	R\$ 19,12	R\$ 23,62	R\$ 288,87	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,23	R\$ 288,87	0,00 %
3.4.5	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,75	R\$ 708,50	R\$ 875,28	R\$ 656,46	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	0,75	R\$ 656,46	0,00 %
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME					R\$ 10.253,99	0,25 %							
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	m²	11,45	R\$ 32,82	R\$ 40,55	R\$ 464,30	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	11,45	R\$ 464,30	0,00 %
3.5.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames	m²	1,48	R\$ 736,62	R\$ 910,02	R\$ 1,346,83	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,48	R\$ 1,346,83	0,00 %
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	m²	36,64	R\$ 80,13	R\$ 98,99	R\$ 3,626,99	0,09 %		R\$ -	0,00	R\$ -	36,64	R\$ 3,626,99	0,00 %
3.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	78,87	R\$ 16,48	R\$ 20,36	R\$ 1,605,79	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	78,87	R\$ 1,605,79	0,00 %
3.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; Inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	8,43	R\$ 19,12	R\$ 23,62	R\$ 199,12	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	8,43	R\$ 199,12	0,00 %
3.5.6	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,44	R\$ 708,50	R\$ 875,28	R\$ 3,010,96	0,07 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,44	R\$ 3,010,96	0,00 %
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 277.898,79	6,72 %							



Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA - PM3-PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.198,42	R\$ 1.480,53	R\$ 8.883,18	0,22 %	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 8.883,18	0,00 %
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA - PM4 - PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 1.198,42	R\$ 1.480,53	R\$ 5.922,12	0,15 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 5.922,12	0,00 %
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA - PM5-PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 1.198,42	R\$ 1.480,53	R\$ 14.805,30	0,36 %	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 14.805,30	0,00 %
6.1.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA - PM6-FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.160,85	R\$ 1.434,11	R\$ 11.472,88	0,28 %	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 11.472,88	0,00 %
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$ 9.546,51	0,24 %						
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 330,78	R\$ 408,65	R\$ 5.721,10	0,14 %	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 5.721,10	0,00 %
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00	R\$ 56,05	R\$ 69,24	R\$ 553,92	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 553,92	0,00 %
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	19,20	R\$ 137,92	R\$ 170,39	R\$ 3.271,49	0,08 %	R\$ -	0,00	R\$ -	19,20	R\$ 3.271,49	0,00 %
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO					R\$ 139.422,65	3,43 %						
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10	R\$ 663,38	R\$ 819,54	R\$ 1.721,03	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,10	R\$ 1.721,03	0,00 %
6.3.1.1	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	6,72	R\$ 663,38	R\$ 819,54	R\$ 5.507,31	0,14 %	R\$ -	0,00	R\$ -	6,72	R\$ 5.507,31	0,00 %
6.3.2	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68	R\$ 663,38	R\$ 819,54	R\$ 1.376,83	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,68	R\$ 1.376,83	0,00 %
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x270 -conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	143,10	R\$ 515,00	R\$ 636,23	R\$ 91.044,51	2,24 %	R\$ -	0,00	R\$ -	143,10	R\$ 91.044,51	0,00 %
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	5,04	R\$ 515,00	R\$ 636,23	R\$ 3.206,60	0,08 %	R\$ -	0,00	R\$ -	5,04	R\$ 3.206,60	0,00 %
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,08	R\$ 663,38	R\$ 819,54	R\$ 3.343,72	0,08 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,08	R\$ 3.343,72	0,00 %
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	R\$ 663,38	R\$ 819,54	R\$ 4.302,59	0,11 %	R\$ -	0,00	R\$ -	5,25	R\$ 4.302,59	0,00 %


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



6.3.7	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2"- fornecimento e montagem	m²	46,80	R\$ 500,20	R\$ 617,95	R\$ 28.920,06	0,71 %		R\$ -	0,00	R\$ -	46,80	R\$ 28.920,06	0,00 %
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV					R\$ 34.667,35	0,85 %							
6.4.1	Porta de Vidro Temperado - PV2 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00	R\$ 1.816,64	R\$ 2.244,28	R\$ 2.244,28	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.244,28	0,00 %
6.4.1	Porta de Vidro Temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00	R\$ 1.816,64	R\$ 2.244,28	R\$ 2.244,28	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.244,28	0,00 %
6.4.2	Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	m²	3,53	R\$ 419,67	R\$ 518,46	R\$ 1.830,16	0,05 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,53	R\$ 1.830,16	0,00 %
6.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL IL AP 01/2021 P	m²	46,80	R\$ 490,32	R\$ 605,74	R\$ 28.348,63	0,70 %		R\$ -	0,00	R\$ -	46,80	R\$ 28.348,63	0,00 %
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					R\$ 79.780,43	1,97 %							
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75	R\$ 819,51	R\$ 1.012,42	R\$ 1.771,74	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,75	R\$ 1.771,74	0,00 %
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60	R\$ 819,51	R\$ 1.012,42	R\$ 1.619,87	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,60	R\$ 1.619,87	0,00 %
6.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	3,22	R\$ 469,52	R\$ 580,05	R\$ 1.867,76	0,05 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,22	R\$ 1.867,76	0,00 %
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	R\$ 819,51	R\$ 1.012,42	R\$ 2.055,21	0,05 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,03	R\$ 2.055,21	0,00 %
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16	R\$ 469,52	R\$ 580,05	R\$ 1.252,91	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,16	R\$ 1.252,91	0,00 %
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 1.190,55	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,10	R\$ 1.190,55	0,00 %
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 7.143,32	0,18 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,60	R\$ 7.143,32	0,00 %
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 3.571,66	0,09 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,30	R\$ 3.571,66	0,00 %
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 10.714,98	0,26 %		R\$ -	0,00	R\$ -	18,90	R\$ 10.714,98	0,00 %
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 1.190,55	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,10	R\$ 1.190,55	0,00 %
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 3.571,66	0,09 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,30	R\$ 3.571,66	0,00 %
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 4.762,21	0,12 %		R\$ -	0,00	R\$ -	8,40	R\$ 4.762,21	0,00 %
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 7.143,32	0,18 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,60	R\$ 7.143,32	0,00 %
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 19.048,85	0,47 %		R\$ -	0,00	R\$ -	33,60	R\$ 19.048,85	0,00 %
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - lincuso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	R\$ 458,90	R\$ 566,93	R\$ 9.524,42	0,23 %		R\$ -	0,00	R\$ -	16,80	R\$ 9.524,42	0,00 %




Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

6.5.16	Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	5,44	R\$ 469,52	R\$ 580,05	R\$ 3.155,47	0,08 %		R\$ -	0,00	R\$ -	5,44	R\$ 3.155,47	0,00 %
6.5.17	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	5,44	R\$ 29,16	R\$ 36,02	R\$ 195,95	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	5,44	R\$ 195,95	0,00 %
6.6	VIDROS					R\$ 28.681,01	0,71 %							
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	16,20	R\$ 266,59	R\$ 329,35	R\$ 5.335,47	0,13 %		R\$ -	0,00	R\$ -	16,20	R\$ 5.335,47	0,00 %
6.6.2	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20	R\$ 419,67	R\$ 518,46	R\$ 3.732,91	0,09 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,20	R\$ 3.732,91	0,00 %
6.6.3	Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr	m²	3,57	R\$ 419,67	R\$ 518,46	R\$ 1.850,90	0,05 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,57	R\$ 1.850,90	0,00 %
6.6.4	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	16,90	R\$ 850,73	R\$ 1.050,99	R\$ 17.761,73	0,44 %		R\$ -	0,00	R\$ -	16,90	R\$ 17.761,73	0,00 %
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					R\$ 54.511,60	1,34 %							
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	20,52	R\$ 536,32	R\$ 662,57	R\$ 13.595,94	0,33 %		R\$ -	0,00	R\$ -	20,52	R\$ 13.595,94	0,00 %
6.7.3	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m²	164,10	R\$ 137,92	R\$ 170,39	R\$ 27.961,00	0,69 %		R\$ -	0,00	R\$ -	164,10	R\$ 27.961,00	0,00 %
6.7.4.1	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	13,50	R\$ 776,76	R\$ 959,61	R\$ 12.954,74	0,32 %		R\$ -	0,00	R\$ -	13,50	R\$ 12.954,74	0,00 %
7	SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 753.345,46	18,56 %							
7.2	Estrutura steel frame metálica em tesouras	m²	1.451,75	R\$ 67,13	R\$ 82,93	R\$ 120.393,63	2,97 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1.451,75	R\$ 120.393,63	0,00 %
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	M	83,13	R\$ 55,72	R\$ 68,84	R\$ 5.722,67	0,14 %		R\$ -	0,00	R\$ -	83,13	R\$ 5.722,67	0,00 %
7.3	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, Isoeste ou similar - Rev. 01	m²	1.451,75	R\$ 308,49	R\$ 381,11	R\$ 553.276,44	13,63 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1.451,75	R\$ 553.276,44	0,00 %
7.4	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 63 cm	M	115,14	R\$ 95,07	R\$ 117,45	R\$ 13.523,19	0,33 %		R\$ -	0,00	R\$ -	115,14	R\$ 13.523,19	0,00 %
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	M	139,80	R\$ 56,29	R\$ 69,54	R\$ 9.721,69	0,24 %		R\$ -	0,00	R\$ -	139,80	R\$ 9.721,69	0,00 %
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	M	66,15	R\$ 56,29	R\$ 69,54	R\$ 4.600,07	0,11 %		R\$ -	0,00	R\$ -	66,15	R\$ 4.600,07	0,00 %
7.7	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	M	108,80	R\$ 56,29	R\$ 69,54	R\$ 7.565,95	0,19 %		R\$ -	0,00	R\$ -	108,80	R\$ 7.565,95	0,00 %
7.7	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	35,40	R\$ 500,20	R\$ 617,95	R\$ 21.875,43	0,54 %		R\$ -	0,00	R\$ -	35,40	R\$ 21.875,43	0,00 %
7.8	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	M	310,13	R\$ 43,50	R\$ 53,74	R\$ 16.666,39	0,41 %		R\$ -	0,00	R\$ -	310,13	R\$ 16.666,39	0,00 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 24.058,22	0,59 %							
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	211,50	R\$ 52,57	R\$ 64,94	R\$ 13.734,81	0,34 %		R\$ -	0,00	R\$ -	211,50	R\$ 13.734,81	0,00 %
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	630,63	R\$ 13,25	R\$ 16,37	R\$ 10.323,41	0,25 %		R\$ -	630,63	R\$ 10.323,41	0,00	R\$ -	6,11 %
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					R\$ 438.384,73	10,80 %							
9.1	EDIFICAÇÃO					R\$ 433.053,57	10,67 %							
9.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	4.084,95	R\$ 5,00	R\$ 6,18	R\$ 25.244,99	0,62 %	408,49	R\$ 2.524,47	3676,44	R\$ 22.720,40	408,51	R\$ 2.524,59	14,56 %
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.783,00	R\$ 35,87	R\$ 44,31	R\$ 123.314,73	3,04 %	278,30	R\$ 12.331,47	2225,40	R\$ 98.607,47	557,60	R\$ 24.707,26	1,80 %
9.1.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.301,95	R\$ 42,01	R\$ 51,90	R\$ 67.571,21	1,66 %	130,20	R\$ 6.757,38	1010,97	R\$ 52.469,34	290,98	R\$ 15.101,86	1,50 %
9.1.4	Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	1.909,34	R\$ 25,50	R\$ 31,50	R\$ 60.144,21	1,48 %	190,93	R\$ 6.014,30	1527,45	R\$ 48.114,68	381,89	R\$ 12.029,54	2,54 %
9.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	671,71	R\$ 62,87	R\$ 77,67	R\$ 52.171,72	1,29 %		R\$ -	0,00	R\$ -	671,71	R\$ 52.171,72	0,00 %
9.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	8,30	R\$ 55,75	R\$ 68,87	R\$ 571,62	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	8,30	R\$ 571,62	0,00 %
9.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha	m²	8,78	R\$ 55,75	R\$ 68,87	R\$ 604,68	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	8,78	R\$ 604,68	0,00 %


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



9.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - braço	m²	17,25	R\$ 55,75	R\$ 68,87	R\$	1.188,01	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	17,25	R\$	1.188,01	0,00 %
9.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	166,07	R\$ 55,75	R\$ 68,87	R\$	11.437,24	0,28 %		R\$ -	0,00	R\$ -	166,07	R\$	11.437,24	0,00 %
9.1.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	238,60	R\$ 20,19	R\$ 24,94	R\$	5.950,68	0,15 %		R\$ -	0,00	R\$ -	238,60	R\$	5.950,68	0,00 %
9.1.11	Porto de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	495,39	R\$ 55,83	R\$ 68,97	R\$	34.167,05	0,84 %		R\$ -	0,00	R\$ -	495,39	R\$	34.167,05	0,00 %
9.1.12	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	734,92	R\$ 55,83	R\$ 68,97	R\$	50.687,43	1,25 %		R\$ -	0,00	R\$ -	734,92	R\$	50.687,43	0,00 %
9.2	MURETA						5.331,16	0,13 %								
9.2.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	91,79	R\$ 5,00	R\$ 6,18	R\$	567,26	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	91,79	R\$	567,26	0,00 %
9.2.2	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	91,79	R\$ 42,01	R\$ 51,90	R\$	4.763,90	0,12 %		R\$ -	0,00	R\$ -	91,79	R\$	4.763,90	0,00 %
10	SISTEMAS DE PISOS						349.645,24	8,61 %								
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						256.869,44	6,33 %								
10.1.1	Contrapiço de concreto bloco-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	954,70	R\$ 43,12	R\$ 53,27	R\$	50.856,87	1,25 %		R\$ -	0,00	R\$ -	954,70	R\$	50.856,87	0,00 %
10.1.2	Canuda regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	286,79	R\$ 33,58	R\$ 41,48	R\$	11.896,05	0,29 %		R\$ -	0,00	R\$ -	286,79	R\$	11.896,05	0,00 %
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e péto coberto	m²	382,52	R\$ 39,86	R\$ 49,24	R\$	18.835,28	0,46 %		R\$ -	0,00	R\$ -	382,52	R\$	18.835,28	0,00 %
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	23,72	R\$ 61,57	R\$ 76,06	R\$	1.804,14	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	23,72	R\$	1.804,14	0,00 %
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	228,05	R\$ 49,06	R\$ 60,61	R\$	13.872,11	0,34 %		R\$ -	0,00	R\$ -	228,05	R\$	13.872,11	0,00 %
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	347,46	R\$ 87,69	R\$ 108,33	R\$	37.640,34	0,93 %		R\$ -	0,00	R\$ -	347,46	R\$	37.640,34	0,00 %
10.1.7	Piso vinílico em massa espessura 2 mm	m²	394,65	R\$ 198,78	R\$ 245,57	R\$	96.914,20	2,39 %		R\$ -	0,00	R\$ -	394,65	R\$	96.914,20	0,00 %
10.1.8	Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	0,81	R\$ 186,25	R\$ 230,09	R\$	186,37	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	0,81	R\$	186,37	0,00 %
10.1.9	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	2,94	R\$ 186,25	R\$ 230,09	R\$	676,46	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,94	R\$	676,46	0,00 %
10.1.10	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela	m²	4,50	R\$ 186,25	R\$ 230,09	R\$	1.035,41	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,50	R\$	1.035,41	0,00 %
10.1.11	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	M	132,10	R\$ 15,84	R\$ 19,57	R\$	2.585,20	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	132,10	R\$	2.585,20	0,00 %
10.1.12	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	238,60	R\$ 35,85	R\$ 44,29	R\$	10.567,59	0,26 %		R\$ -	0,00	R\$ -	238,60	R\$	10.567,59	0,00 %
10.1.13	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	M	99,15	R\$ 79,70	R\$ 98,46	R\$	9.762,31	0,24 %		R\$ -	0,00	R\$ -	99,15	R\$	9.762,31	0,00 %
10.1.14	Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm	M	1,75	R\$ 132,80	R\$ 164,06	R\$	287,11	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,75	R\$	287,11	0,00 %
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						92.775,80	2,29 %								
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm	m²	387,78	R\$ 130,53	R\$ 161,26	R\$	62.533,40	1,54 %		R\$ -	0,00	R\$ -	387,78	R\$	62.533,40	0,00 %
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m³	22,06	R\$ 472,15	R\$ 583,29	R\$	12.867,38	0,32 %		R\$ -	0,00	R\$ -	22,06	R\$	12.867,38	0,00 %
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, assentados sobre camião de areia	m²	125,06	R\$ 70,39	R\$ 86,96	R\$	10.875,22	0,27 %		R\$ -	0,00	R\$ -	125,06	R\$	10.875,22	0,00 %
10.2.4	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m²	7,63	R\$ 117,50	R\$ 145,16	R\$	1.107,57	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,63	R\$	1.107,57	0,00 %
10.2.5	Piso tátil alerta em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m²	1,38	R\$ 117,50	R\$ 145,16	R\$	200,32	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,38	R\$	200,32	0,00 %
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE ÁREA (S/TRANSP)	m³	27,24	R\$ 13,11	R\$ 16,20	R\$	441,29	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	27,24	R\$	441,29	0,00 %
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF 05/2018	m²	302,01	R\$ 12,73	R\$ 15,73	R\$	4.750,62	0,12 %		R\$ -	0,00	R\$ -	302,01	R\$	4.750,62	0,00 %
11	PINTURAS E ACABAMENTOS						198.633,20	4,89 %								
11.1	EDIFICAÇÃO						193.812,39	4,77 %								
11.1.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	3.222,29	R\$ 19,86	R\$ 24,54	R\$	79.075,00	1,95 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3.222,29	R\$	79.075,00	0,00 %
11.1.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	3.033,26	R\$ 14,51	R\$ 17,93	R\$	54.386,35	1,34 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3.033,26	R\$	54.386,35	0,00 %
11.1.3	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	500,86	R\$ 12,80	R\$ 15,81	R\$	7.918,60	0,20 %		R\$ -	0,00	R\$ -	500,86	R\$	7.918,60	0,00 %



Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

11.1.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	500,86	R\$ 13,87	R\$ 17,13	R\$ 8.579,73	0,21 %		R\$ -	0,00	R\$ -	500,86	R\$ 8.579,73	0,00 %
11.1.5	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	188,92	R\$ 29,14	R\$ 36,00	R\$ 6.801,12	0,17 %		R\$ -	0,00	R\$ -	188,92	R\$ 6.801,12	0,00 %
11.1.6	Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos	m²	23,86	R\$ 29,14	R\$ 36,00	R\$ 858,96	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	23,86	R\$ 858,96	0,00 %
11.1.7	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	515,99	R\$ 24,69	R\$ 30,50	R\$ 15.737,70	0,39 %		R\$ -	0,00	R\$ -	515,99	R\$ 15.737,70	0,00 %
11.1.8	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	189,04	R\$ 55,32	R\$ 68,34	R\$ 12.918,99	0,32 %		R\$ -	0,00	R\$ -	189,04	R\$ 12.918,99	0,00 %
11.1.9	Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos	m²	247,08	R\$ 24,69	R\$ 30,50	R\$ 7.535,94	0,19 %		R\$ -	0,00	R\$ -	247,08	R\$ 7.535,94	0,00 %
11.2	MURETA					R\$ 4.820,81	0,12 %							
11.2.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	91,79	R\$ 28,00	R\$ 34,59	R\$ 3.175,02	0,08 %		R\$ -	0,00	R\$ -	91,79	R\$ 3.175,02	0,00 %
11.2.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	91,79	R\$ 14,51	R\$ 17,93	R\$ 1.645,79	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	91,79	R\$ 1.645,79	0,00 %
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 63.710,70	1,57 %							
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					R\$ 52.684,81	1,30 %							
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,00	R\$ 10,42	R\$ 12,87	R\$ 630,63	0,02 %		R\$ -	49,00	R\$ 630,63	0,00	R\$ -	7,77 %
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	285,00	R\$ 5,88	R\$ 7,26	R\$ 2.069,10	0,05 %	185,00	R\$ 1.343,10	285,00	R\$ 2.069,10	0,00	R\$ -	13,77 %
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,00	R\$ 12,26	R\$ 15,15	R\$ 257,55	0,01 %	17,00	R\$ 257,55	17,00	R\$ 257,55	0,00	R\$ -	6,60 %
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	115,00	R\$ 20,22	R\$ 24,98	R\$ 2.872,70	0,07 %		R\$ -	0,00	R\$ -	115,00	R\$ 2.872,70	0,00 %
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	R\$ 33,26	R\$ 41,09	R\$ 1.068,34	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 1.068,34	0,00 %
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,00	R\$ 54,92	R\$ 67,85	R\$ 4.342,40	0,11 %		R\$ -	0,00	R\$ -	64,00	R\$ 4.342,40	0,00 %
12.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125,00	R\$ 68,30	R\$ 84,38	R\$ 10.547,50	0,26 %		R\$ -	0,00	R\$ -	125,00	R\$ 10.547,50	0,00 %
12.1.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 110 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	59,00	R\$ 45,15	R\$ 55,78	R\$ 3.291,02	0,08 %		R\$ -	0,00	R\$ -	59,00	R\$ 3.291,02	0,00 %
12.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 190mm - 4"	UN	4,00	R\$ 461,30	R\$ 569,89	R\$ 2.279,56	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.279,56	0,00 %
12.1.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	UN	4,00	R\$ 333,50	R\$ 412,01	R\$ 1.648,04	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.648,04	0,00 %
12.1.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	UN	3,00	R\$ 37,29	R\$ 46,07	R\$ 138,21	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 138,21	0,00 %
12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4"	UN	4,00	R\$ 48,92	R\$ 60,44	R\$ 241,76	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 241,76	0,00 %
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,27	R\$ 5,28	R\$ 21,12	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 21,12	0,00 %

Visto Af. de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2014	UN	82,00	R\$ 4,10	R\$ 5,07	R\$ 415,74	0,01 %	40,00	R\$ 202,80	40,00	R\$ 202,80	42,00	R\$ 212,94	9,62 %
12.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1"	UN	2,00	R\$ 6,08	R\$ 7,51	R\$ 15,02	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 15,02	0,00 %
12.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	UN	72,00	R\$ 11,25	R\$ 13,90	R\$ 1.000,80	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	72,00	R\$ 1.000,80	0,00 %
12.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2"	UN	4,00	R\$ 22,93	R\$ 28,33	R\$ 113,32	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 113,32	0,00 %
12.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	UN	4,00	R\$ 48,92	R\$ 60,44	R\$ 241,76	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 241,76	0,00 %
12.1.19	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	UN	4,00	R\$ 11,30	R\$ 13,96	R\$ 55,84	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 55,84	0,00 %
12.1.20	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	UN	23,00	R\$ 22,31	R\$ 27,56	R\$ 633,88	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 633,88	0,00 %
12.1.21	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	UN	12,00	R\$ 22,31	R\$ 27,56	R\$ 330,72	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 330,72	0,00 %
12.1.22	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	UN	4,00	R\$ 38,32	R\$ 47,34	R\$ 189,36	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 189,36	0,00 %
12.1.23	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm	UN	2,00	R\$ 86,07	R\$ 106,33	R\$ 212,66	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 212,66	0,00 %
12.1.24	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	UN	35,00	R\$ 11,26	R\$ 13,91	R\$ 486,85	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	35,00	R\$ 486,85	0,00 %
12.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm	UN	2,00	R\$ 12,29	R\$ 15,18	R\$ 30,36	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 30,36	0,00 %
12.1.26	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	UN	4,00	R\$ 11,26	R\$ 13,91	R\$ 55,64	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 55,64	0,00 %
12.1.27	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica	UN	2,00	R\$ 14,19	R\$ 17,53	R\$ 35,06	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 35,06	0,00 %
12.1.28	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm	UN	6,00	R\$ 29,10	R\$ 35,95	R\$ 215,70	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 215,70	0,00 %
12.1.29	Joelho 45 soldável - 25mm	UN	6,00	R\$ 6,35	R\$ 7,84	R\$ 47,04	0,00 %	6,00	R\$ 47,04	6,00	R\$ 47,04	0,00	R\$ -	12,76 %
12.1.30	Joelho 45 soldável - 32mm	UN	2,00	R\$ 11,07	R\$ 13,68	R\$ 27,36	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 27,36	0,00 %
12.1.31	Joelho 45 soldável - 50mm	UN	6,00	R\$ 18,24	R\$ 22,53	R\$ 135,18	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 135,18	0,00 %
12.1.32	Joelho 45 soldável - 75mm	UN	5,00	R\$ 98,03	R\$ 121,11	R\$ 605,55	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 605,55	0,00 %
12.1.33	Joelho 45 soldável - 85mm	UN	1,00	R\$ 116,11	R\$ 143,44	R\$ 143,44	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 143,44	0,00 %
12.1.34	Joelho 90 soldável - 20mm	UN	4,00	R\$ 7,70	R\$ 9,51	R\$ 38,04	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 38,04	0,00 %
12.1.35	Joelho 90 soldável - 25mm	UN	155,00	R\$ 9,29	R\$ 11,48	R\$ 1.779,40	0,04 %	50,00	R\$ 574,00	50,00	R\$ 574,00	105,00	R\$ 1.205,40	2,81 %
12.1.36	Joelho 90 soldável - 32mm	UN	3,00	R\$ 12,93	R\$ 15,97	R\$ 47,91	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 47,91	0,00 %
12.1.37	Joelho 90 soldável - 50mm	UN	30,00	R\$ 15,98	R\$ 19,74	R\$ 592,20	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 592,20	0,00 %
12.1.38	Joelho 90 soldável - 60mm	UN	15,00	R\$ 41,92	R\$ 51,79	R\$ 776,85	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 776,85	0,00 %
12.1.39	Joelho 90 soldável - 75mm	UN	7,00	R\$ 154,75	R\$ 191,18	R\$ 1.338,26	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 1.338,26	0,00 %
12.1.40	Joelho 90 soldável - 85mm	UN	14,00	R\$ 154,75	R\$ 191,18	R\$ 2.676,52	0,07 %		R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 2.676,52	0,00 %
12.1.41	Joelho 90 soldável - 110mm	UN	8,00	R\$ 58,68	R\$ 72,49	R\$ 579,92	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 579,92	0,00 %
12.1.42	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	UN	2,00	R\$ 30,35	R\$ 37,49	R\$ 74,98	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 74,98	0,00 %
12.1.43	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4"	UN	20,00	R\$ 14,99	R\$ 18,52	R\$ 370,40	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 370,40	0,00 %
12.1.44	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"	UN	86,00	R\$ 30,35	R\$ 37,49	R\$ 3.224,14	0,08 %	60,00	R\$ 2.249,40	60,00	R\$ 2.249,40	26,00	R\$ 974,74	1,86 %
12.1.45	Tê 90 soldável - 25mm	UN	38,00	R\$ 12,92	R\$ 15,96	R\$ 606,48	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	38,00	R\$ 606,48	0,00 %
12.1.46	Tê 90 soldável - 32mm	UN	3,00	R\$ 17,83	R\$ 22,03	R\$ 66,09	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 66,09	0,00 %
12.1.47	Tê 90 soldável - 50mm	UN	19,00	R\$ 25,11	R\$ 31,02	R\$ 589,38	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 589,38	0,00 %
12.1.48	Tê 90 soldável - 75mm	UN	6,00	R\$ 51,95	R\$ 64,18	R\$ 385,08	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 385,08	0,00 %
12.1.49	Tê 90 soldável - 85mm	UN	10,00	R\$ 51,95	R\$ 64,18	R\$ 641,80	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 641,80	0,00 %
12.1.50	Tê 90 soldável - 110mm	UN	2,00	R\$ 76,99	R\$ 95,11	R\$ 190,22	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 190,22	0,00 %
12.1.51	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm	UN	1,00	R\$ 14,71	R\$ 18,17	R\$ 18,17	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 18,17	0,00 %
12.1.52	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm	UN	23,00	R\$ 20,55	R\$ 25,39	R\$ 583,97	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 583,97	0,00 %
12.1.53	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm	UN	1,00	R\$ 33,63	R\$ 41,55	R\$ 41,55	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 41,55	0,00 %
12.1.54	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm	UN	7,00	R\$ 79,41	R\$ 98,10	R\$ 686,70	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 686,70	0,00 %
12.1.55	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm	UN	10,00	R\$ 79,41	R\$ 98,10	R\$ 981,00	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 981,00	0,00 %
12.1.56	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	UN	4,00	R\$ 79,41	R\$ 98,10	R\$ 392,40	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 392,40	0,00 %
12.1.57	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm	UN	5,00	R\$ 117,60	R\$ 145,28	R\$ 726,40	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 726,40	0,00 %
12.1.58	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm	UN	2,00	R\$ 117,60	R\$ 145,28	R\$ 290,56	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 290,56	0,00 %
12.1.59	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2"	UN	20,00	R\$ 21,32	R\$ 26,34	R\$ 526,80	0,01 %	10,00	R\$ 263,40	10,00	R\$ 263,40	10,00	R\$ 263,40	1,90 %
12.1.60	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.06/2022	UN	2,00	R\$ 24,44	R\$ 30,19	R\$ 60,38	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 60,38	0,00 %

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					R\$ 11.025,89	0,27 %							
12.2.1	Registro de esfera 1/2"	UN	2,00	R\$ 52,25	R\$ 64,55	R\$ 129,10	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 129,10	0,00 %
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 146,16	R\$ 180,57	R\$ 361,14	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 361,14	0,00 %
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 353,24	R\$ 436,39	R\$ 872,78	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 872,78	0,00 %
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 713,63	R\$ 881,62	R\$ 1.763,24	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.763,24	0,00 %
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 114,90	R\$ 141,95	R\$ 141,95	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 141,95	0,00 %
12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 166,96	R\$ 206,26	R\$ 2.475,12	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 2.475,12	0,00 %
12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R\$ 94,30	R\$ 116,50	R\$ 3.844,50	0,09 %	23,00	R\$ 2.679,50	23,00	R\$ 2.679,50	10,00	R\$ 1.165,00	0,60 %
12.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 89,54	R\$ 110,62	R\$ 1.438,06	0,04 %		R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.438,06	0,00 %
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 25.908,83	0,64 %							
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					R\$ 22.819,71	0,56 %							
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	296,00	R\$ 31,10	R\$ 38,42	R\$ 11.372,32	0,28 %		R\$ -	0,00	R\$ -	296,00	R\$ 11.372,32	0,00 %
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	98,00	R\$ 61,76	R\$ 76,30	R\$ 7.477,40	0,18 %		R\$ -	0,00	R\$ -	98,00	R\$ 7.477,40	0,00 %
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 28,35	R\$ 35,02	R\$ 700,40	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 700,40	0,00 %
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	71,00	R\$ 28,41	R\$ 35,10	R\$ 2.492,10	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	71,00	R\$ 2.492,10	0,00 %
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 89,91	R\$ 111,07	R\$ 777,49	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 777,49	0,00 %
13.2	ACESSÓRIOS					R\$ 3.089,12	0,08 %							
13.2.1	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00	R\$ 110,78	R\$ 136,86	R\$ 2.189,76	0,05 %		R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 2.189,76	0,00 %
13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	16,00	R\$ 45,50	R\$ 56,21	R\$ 899,36	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 899,36	0,00 %
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 110.607,91	2,72 %							
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	226,00	R\$ 45,15	R\$ 55,78	R\$ 12.606,28	0,31 %		R\$ -	226,00	R\$ 12.606,28	0,00	R\$ -	1,79 %

Victor
 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel
 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	186,00	R\$ 20,11	R\$ 24,84	R\$ 4.620,24	0,11 %		R\$ -	186,00	R\$ 4.620,24	0,00	R\$ -	4,03 %
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	160,00	R\$ 27,58	R\$ 34,07	R\$ 5.451,20	0,13 %		R\$ -	160,00	R\$ 5.451,20	0,00	R\$ -	2,94 %
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	154,00	R\$ 43,00	R\$ 53,12	R\$ 8.180,48	0,20 %		R\$ -	154,00	R\$ 8.180,48	0,00	R\$ -	1,88 %
14.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,00	R\$ 61,76	R\$ 76,30	R\$ 2.899,40	0,07 %		R\$ -	38,00	R\$ 2.899,40	0,00	R\$ -	1,31 %
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	37,00	R\$ 9,69	R\$ 11,97	R\$ 442,89	0,01 %		R\$ -	37,00	R\$ 442,89	0,00	R\$ -	8,35 %
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 28,35	R\$ 35,02	R\$ 210,12	0,01 %		R\$ -	6,00	R\$ 210,12	0,00	R\$ -	2,86 %
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 23,86	R\$ 29,48	R\$ 619,08	0,02 %		R\$ -	21,00	R\$ 619,08	0,00	R\$ -	3,39 %
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	R\$ 15,28	R\$ 18,88	R\$ 547,52	0,01 %		R\$ -	29,00	R\$ 547,52	0,00	R\$ -	5,30 %
14.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	54,00	R\$ 8,99	R\$ 11,11	R\$ 599,94	0,01 %		R\$ -	54,00	R\$ 599,94	0,00	R\$ -	9,00 %
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 28,41	R\$ 35,10	R\$ 842,40	0,02 %		R\$ -	24,00	R\$ 842,40	0,00	R\$ -	2,85 %
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	48,00	R\$ 34,74	R\$ 42,92	R\$ 2.060,16	0,05 %	8,00	R\$ 343,36	48,00	R\$ 2.060,16	0,00	R\$ -	2,33 %
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	R\$ 14,59	R\$ 18,02	R\$ 684,76	0,02 %		R\$ -	38,00	R\$ 684,76	0,00	R\$ -	5,55 %
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	166,00	R\$ 11,88	R\$ 14,68	R\$ 2.436,88	0,06 %		R\$ -	166,00	R\$ 2.436,88	0,00	R\$ -	6,81 %
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 86,86	R\$ 107,31	R\$ 2.146,20	0,05 %		R\$ -	20,00	R\$ 2.146,20	0,00	R\$ -	0,93 %

Victor por de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 86,86	R\$ 107,31	R\$ 429,24	0,01 %	R\$ -	4,00	R\$ 429,24	0,00	R\$ -	0,93 %
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 99,05	R\$ 122,37	R\$ 1.957,92	0,05 %	R\$ -	16,00	R\$ 1.957,92	0,00	R\$ -	0,82 %
14.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 64,89	R\$ 80,17	R\$ 481,02	0,01 %	R\$ -	6,00	R\$ 481,02	0,00	R\$ -	1,25 %
14.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 64,89	R\$ 80,17	R\$ 160,34	0,00 %	R\$ -	2,00	R\$ 160,34	0,00	R\$ -	1,25 %
14.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,48	R\$ 16,65	R\$ 16,65	0,00 %	R\$ -	1,00	R\$ 16,65	0,00	R\$ -	6,01 %
14.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 37,07	R\$ 45,80	R\$ 274,80	0,01 %	R\$ -	6,00	R\$ 274,80	0,00	R\$ -	2,18 %
14.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 18,20	R\$ 22,48	R\$ 112,40	0,00 %	R\$ -	5,00	R\$ 112,40	0,00	R\$ -	4,45 %
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 20,96	R\$ 25,89	R\$ 543,69	0,01 %	R\$ -	21,00	R\$ 543,69	0,00	R\$ -	3,86 %
14.24	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	13,00	R\$ 81,80	R\$ 101,06	R\$ 1.313,78	0,03 %	R\$ -	13,00	R\$ 1.313,78	0,00	R\$ -	0,99 %
14.25	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 81,80	R\$ 101,06	R\$ 1.718,02	0,04 %	R\$ -	17,00	R\$ 1.718,02	0,00	R\$ -	0,99 %
14.26	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 158,19	R\$ 195,43	R\$ 390,86	0,01 %	R\$ -	2,00	R\$ 390,86	0,00	R\$ -	0,51 %
14.27	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 24,47	R\$ 30,23	R\$ 513,91	0,01 %	R\$ -	17,00	R\$ 513,91	0,00	R\$ -	3,31 %
14.28	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 56,99	R\$ 70,41	R\$ 211,23	0,01 %	R\$ -	3,00	R\$ 211,23	0,00	R\$ -	1,42 %
14.29	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 56,99	R\$ 70,41	R\$ 140,82	0,00 %	R\$ -	2,00	R\$ 140,82	0,00	R\$ -	1,42 %

Visto por e Assinado
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro de Almeida
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



14.30	TÉ PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 92,12	R\$ 113,81	R\$ 113,81	0,00 %		R\$ -	1,00	R\$ 113,81	0,00	R\$ -	0,88 %
14.31	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 46,01	R\$ 56,84	R\$ 1.193,64	0,03 %		R\$ -	21,00	R\$ 1.193,64	0,00	R\$ -	1,76 %
14.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 93,94	R\$ 116,05	R\$ 232,10	0,01 %		R\$ -	2,00	R\$ 232,10	0,00	R\$ -	0,86 %
14.33	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	UN	7,00	R\$ 183,25	R\$ 226,39	R\$ 1.584,73	0,04 %	7,00	R\$ 1.584,73	7,00	R\$ 1.584,73	0,00	R\$ -	0,44 %
14.34	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 300,42	R\$ 371,14	R\$ 6.309,38	0,16 %	1,00	R\$ 371,14	1,00	R\$ 371,14	16,00	R\$ 5.938,24	0,02 %
14.35	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 16,40	R\$ 20,26	R\$ 384,94	0,01 %	19,00	R\$ 384,94	19,00	R\$ 384,94	0,00	R\$ -	4,94 %
14.36	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 16,40	R\$ 20,26	R\$ 60,78	0,00 %	3,00	R\$ 60,78	3,00	R\$ 60,78	0,00	R\$ -	4,94 %
14.37	Ralo linear 50cm	un	6,00	R\$ 87,74	R\$ 108,39	R\$ 650,34	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 650,34	0,00 %
14.38	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	17,00	R\$ 11,95	R\$ 14,76	R\$ 250,92	0,01 %	17,00	R\$ 250,92	17,00	R\$ 250,92	0,00	R\$ -	6,78 %
14.39	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	20,00	R\$ 15,57	R\$ 19,24	R\$ 384,80	0,01 %	20,00	R\$ 384,80	20,00	R\$ 384,80	0,00	R\$ -	5,20 %
14.40	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	un	1,00	R\$ 32.347,57	R\$ 39.962,19	R\$ 39.962,19	0,98 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 39.962,19	0,00 %
14.41	Sumidouro Ø 3,80m	UN	1,00	R\$ 5.559,37	R\$ 6.868,05	R\$ 6.868,05	0,17 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 6.868,05	0,00 %
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$ 74.057,43	1,82 %							
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUIO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	R\$ 293,46	R\$ 362,54	R\$ 2.175,24	0,05 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.175,24	0,00 %
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 512,47	R\$ 633,11	R\$ 11.395,98	0,28 %		R\$ -	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 11.395,98	0,00 %
15.3	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4"	M	19,40	R\$ 100,07	R\$ 123,63	R\$ 2.398,42	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	19,40	R\$ 2.398,42	0,00 %
15.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	UN	24,00	R\$ 351,03	R\$ 433,66	R\$ 10.407,84	0,26 %		R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 10.407,84	0,00 %
15.5	Cuba de embutir oval em louça branca	UN	22,00	R\$ 142,19	R\$ 175,66	R\$ 3.864,52	0,10 %		R\$ -	0,00	R\$ -	22,00	R\$ 3.864,52	0,00 %
15.6	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	UN	7,00	R\$ 407,69	R\$ 503,66	R\$ 3.525,62	0,09 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 3.525,62	0,00 %
15.7	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x54x17cm	UN	10,00	R\$ 407,69	R\$ 503,66	R\$ 5.036,60	0,12 %		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 5.036,60	0,00 %
15.8	Cuba industrial em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	UN	1,00	R\$ 407,69	R\$ 503,66	R\$ 503,66	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 503,66	0,00 %
15.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x55x20cm, Burigotto ou equivalente						0,00 %							
15.10	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 145,14	R\$ 179,31	R\$ 717,24	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 717,24	0,00 %



Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 145,14	R\$ 179,31	R\$ 1.075,86	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.075,86	0,00 %
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 848,54	R\$ 1.048,29	R\$ 7.338,03	0,18 %	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 7.338,03	0,00 %
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO	UN	18,00	R\$ 29,96	R\$ 37,01	R\$ 666,18	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 666,18	0,00 %
15.15	FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	R\$ 60,65	R\$ 74,93	R\$ 299,72	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 299,72	0,00 %
15.16	Papeleira de sobrepor interfolhado	UN	18,00	R\$ 70,96	R\$ 87,66	R\$ 1.577,88	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 1.577,88	0,00 %
15.17	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 160,00	R\$ 197,66	R\$ 395,32	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 395,32	0,00 %
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 160,00	R\$ 197,66	R\$ 790,64	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 790,64	0,00 %
15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 111,49	R\$ 137,73	R\$ 2.065,95	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 2.065,95	0,00 %
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 21,70	R\$ 26,81	R\$ 375,34	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 375,34	0,00 %
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 64,20	R\$ 79,31	R\$ 2.220,68	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 2.220,68	0,00 %
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 64,20	R\$ 79,31	R\$ 317,24	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 317,24	0,00 %
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 68,31	R\$ 84,39	R\$ 1.940,97	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 1.940,97	0,00 %
15.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	23,00	R\$ 45,21	R\$ 55,85	R\$ 1.284,55	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 1.284,55	0,00 %
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 362,18	R\$ 447,44	R\$ 4.026,96	0,10 %	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 4.026,96	0,00 %
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 349,64	R\$ 431,95	R\$ 2.591,70	0,06 %	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.591,70	0,00 %
15.28	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	14,00	R\$ 330,78	R\$ 408,65	R\$ 5.721,10	0,14 %	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 5.721,10	0,00 %
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.088,06	R\$ 1.344,19	R\$ 1.344,19	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.344,19	0,00 %
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					R\$ 6.033,07	0,15 %						
16.1	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,44	R\$ 504,72	R\$ 623,53	R\$ 1.521,41	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,44	R\$ 1.521,41	0,00 %
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 663,38	R\$ 819,54	R\$ 196,69	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 196,69	0,00 %

Victor Araujo de Almeida
 Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2




16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,80	R\$ 49,01	R\$ 60,55	R\$ 2.773,19	0,07 %	R\$ -	0,00	R\$ -	45,80	R\$ 2.773,19	0,00 %
16.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	45,00	R\$ 16,61	R\$ 20,52	R\$ 923,40	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	45,00	R\$ 923,40	0,00 %
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	und	4,00	R\$ 45,46	R\$ 56,16	R\$ 224,64	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 224,64	0,00 %
16.6	Regulador 2º estágio com registro	un	1,00	R\$ 49,87	R\$ 61,61	R\$ 61,61	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 61,61	0,00 %
16.7	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	R\$ 227,45	R\$ 280,99	R\$ 280,99	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 280,99	0,00 %
16.8	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	R\$ 20,70	R\$ 25,57	R\$ 25,57	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 25,57	0,00 %
16.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	un	1,00	R\$ 20,70	R\$ 25,57	R\$ 25,57	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 25,57	0,00 %
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					R\$ 34.501,83	0,85 %						
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 229,06	R\$ 282,98	R\$ 2.263,84	0,06 %	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 2.263,84	0,00 %
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 773,86	R\$ 956,03	R\$ 1.912,06	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.912,06	0,00 %
17.3	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	10,00	R\$ 132,15	R\$ 163,26	R\$ 1.632,60	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 1.632,60	0,00 %
17.4	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 83,90	R\$ 103,65	R\$ 207,30	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 207,30	0,00 %
17.5	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,96	R\$ 227,26	R\$ 909,04	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 909,04	0,00 %
17.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	65,00	R\$ 147,42	R\$ 182,12	R\$ 11.837,80	0,29 %	R\$ -	0,00	R\$ -	65,00	R\$ 11.837,80	0,00 %
17.7	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.553,80	R\$ 1.919,56	R\$ 3.839,12	0,09 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 3.839,12	0,00 %
17.8	TAMPAO POPO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 414,37	R\$ 511,91	R\$ 511,91	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 511,91	0,00 %
17.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 291,03	R\$ 359,54	R\$ 1.797,70	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.797,70	0,00 %
17.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 182,33	R\$ 225,25	R\$ 675,75	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 675,75	0,00 %
17.11	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 186,84	R\$ 230,82	R\$ 923,28	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 923,28	0,00 %
17.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	57,00	R\$ 25,32	R\$ 31,28	R\$ 1.782,96	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	57,00	R\$ 1.782,96	0,00 %
17.13	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	12,00	R\$ 16,05	R\$ 19,83	R\$ 237,96	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 237,96	0,00 %

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2




17.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 1.638,18	R\$ 2.023,81	R\$ 4.047,62	0,10 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 4.047,62	0,00 %
17.15	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 222,16	R\$ 274,46	R\$ 274,46	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 274,46	0,00 %
17.16	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$ 222,16	R\$ 274,46	R\$ 548,92	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 548,92	0,00 %
17.17	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	43,00	R\$ 20,70	R\$ 25,57	R\$ 1.099,51	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	43,00	R\$ 1.099,51	0,00 %
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					R\$ 263.775,49	6,50 %							
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 6.745,98	0,17 %							
18.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 90,28	R\$ 111,53	R\$ 111,53	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 111,53	0,00 %
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 526,52	R\$ 650,46	R\$ 1.951,38	0,05 %	3,00	R\$ 1.951,38	3,00	R\$ 1.951,38	0,00	R\$ -	0,15 %
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 678,28	R\$ 837,95	R\$ 837,95	0,02 %	1,00	R\$ 837,95	1,00	R\$ 837,95	0,00	R\$ -	0,12 %
18.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 778,11	R\$ 961,28	R\$ 3.845,12	0,09 %	1,00	R\$ 961,28	1,00	R\$ 961,28	3,00	R\$ 2.883,84	0,03 %
18.2	DISJUNTORES					R\$ 11.717,57	0,29 %							
18.2.1	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	UN	74,00	R\$ 11,48	R\$ 14,18	R\$ 1.049,32	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	74,00	R\$ 1.049,32	0,00 %
18.2.2	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	UN	1,00	R\$ 12,10	R\$ 14,95	R\$ 14,95	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 14,95	0,00 %
18.2.3	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	UN	3,00	R\$ 12,10	R\$ 14,95	R\$ 44,85	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 44,85	0,00 %
18.2.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	UN	23,00	R\$ 13,27	R\$ 16,39	R\$ 376,97	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 376,97	0,00 %
18.2.5	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	UN	6,00	R\$ 14,70	R\$ 18,16	R\$ 108,96	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 108,96	0,00 %
18.2.6	Disjuntor monopolar termomagnético 40A	UN	1,00	R\$ 21,29	R\$ 26,30	R\$ 26,30	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 26,30	0,00 %
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	UN	2,00	R\$ 72,30	R\$ 89,32	R\$ 178,64	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 178,64	0,00 %
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	UN	2,00	R\$ 75,80	R\$ 93,64	R\$ 187,28	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 187,28	0,00 %
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	R\$ 80,10	R\$ 98,96	R\$ 197,92	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 197,92	0,00 %
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	UN	7,00	R\$ 95,66	R\$ 118,18	R\$ 827,26	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 827,26	0,00 %
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	2,00	R\$ 565,15	R\$ 698,19	R\$ 1.396,38	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.396,38	0,00 %
18.2.12	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	2,00	R\$ 138,62	R\$ 171,25	R\$ 342,50	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 342,50	0,00 %
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 40A	UN	1,00	R\$ 232,33	R\$ 287,02	R\$ 287,02	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 287,02	0,00 %
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 63A	UN	4,00	R\$ 232,33	R\$ 287,02	R\$ 1.148,08	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.148,08	0,00 %
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 100A	UN	1,00	R\$ 232,33	R\$ 287,02	R\$ 287,02	0,01 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 287,02	0,00 %
18.2.16	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	28,00	R\$ 117,91	R\$ 145,67	R\$ 4.078,76	0,10 %		R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 4.078,76	0,00 %
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00	R\$ 117,91	R\$ 145,67	R\$ 1.165,36	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.165,36	0,00 %
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 34.881,04	0,86 %							
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	701,60	R\$ 9,27	R\$ 11,45	R\$ 8.033,32	0,20 %	210,48	R\$ 2.410,00	701,60	R\$ 8.033,32	0,00	R\$ -	8,73 %
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	288,60	R\$ 12,14	R\$ 15,00	R\$ 4.329,00	0,11 %	86,60	R\$ 1.299,00	288,60	R\$ 4.329,00	0,00	R\$ -	6,67 %
18.3.3	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	418,50	R\$ 17,05	R\$ 21,06	R\$ 8.813,61	0,22 %	100,00	R\$ 2.106,00	100,00	R\$ 2.106,00	318,50	R\$ 6.707,61	1,13 %
18.3.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	M	2,10	R\$ 35,09	R\$ 43,35	R\$ 91,04	0,00 %		R\$ -	0,00	R\$ -	2,10	R\$ 91,04	0,00 %
18.3.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	M	25,40	R\$ 42,90	R\$ 53,00	R\$ 1.346,20	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	25,40	R\$ 1.346,20	0,00 %
18.3.6	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	40,00	R\$ 18,81	R\$ 23,24	R\$ 929,60	0,02 %		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 929,60	0,00 %


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2




18.3.7	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	14,00	R\$ 224,76	R\$ 277,67	R\$ 3.887,38	0,10 %	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 3.887,38	0,00 %
18.3.8	Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm	UN	2,00	R\$ 43,95	R\$ 54,30	R\$ 108,60	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 108,60	0,00 %
18.3.9	Caixa de passagem PVC 4x2"	UN	279,00	R\$ 14,85	R\$ 18,35	R\$ 5.119,65	0,13 %	R\$ -	50,00	R\$ 917,50	229,00	R\$ 4.202,15	0,98 %
18.3.10	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	UN	168,00	R\$ 10,71	R\$ 13,23	R\$ 2.222,64	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	168,00	R\$ 2.222,64	0,00 %
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R\$ 158.345,90	3,90 %						
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	8.267,90	R\$ 4,04	R\$ 4,99	R\$ 41.256,82	1,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	8.267,90	R\$ 41.256,82	0,00 %
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	266,50	R\$ 6,54	R\$ 8,08	R\$ 2.153,32	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	266,50	R\$ 2.153,32	0,00 %
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	1.087,40	R\$ 8,95	R\$ 11,06	R\$ 12.026,64	0,30 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1.087,40	R\$ 12.026,64	0,00 %
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	M	555,30	R\$ 14,70	R\$ 18,16	R\$ 10.084,25	0,25 %	R\$ -	0,00	R\$ -	555,30	R\$ 10.084,25	0,00 %
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	M	299,90	R\$ 22,47	R\$ 27,76	R\$ 8.325,22	0,21 %	R\$ -	0,00	R\$ -	299,90	R\$ 8.325,22	0,00 %
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	M	196,50	R\$ 26,15	R\$ 32,31	R\$ 6.348,92	0,16 %	R\$ -	0,00	R\$ -	196,50	R\$ 6.348,92	0,00 %
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	M	607,20	R\$ 50,69	R\$ 62,62	R\$ 38.022,86	0,94 %	R\$ -	0,00	R\$ -	607,20	R\$ 38.022,86	0,00 %
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	M	59,80	R\$ 91,83	R\$ 113,45	R\$ 6.784,31	0,17 %	R\$ -	0,00	R\$ -	59,80	R\$ 6.784,31	0,00 %
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	M	184,30	R\$ 146,45	R\$ 180,92	R\$ 33.343,56	0,82 %	R\$ -	0,00	R\$ -	184,30	R\$ 33.343,56	0,00 %
18.5	ELETROCALHAS					R\$ 9.712,08	0,24 %						
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	M	86,10	R\$ 91,31	R\$ 112,80	R\$ 9.712,08	0,24 %	R\$ -	0,00	R\$ -	86,10	R\$ 9.712,08	0,00 %
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					R\$ 42.372,92	1,04 %						
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	143,00	R\$ 27,28	R\$ 33,70	R\$ 4.819,10	0,12 %	R\$ -	0,00	R\$ -	143,00	R\$ 4.819,10	0,00 %



 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	R\$ 28,81	R\$ 35,59	R\$ 1.210,06	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 1.210,06	0,00 %
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 38,28	R\$ 47,29	R\$ 283,74	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 283,74	0,00 %
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	R\$ 40,18	R\$ 49,64	R\$ 1.836,68	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	37,00	R\$ 1.836,68	0,00 %
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 53,11	R\$ 65,61	R\$ 262,44	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 262,44	0,00 %
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R\$ 40,18	R\$ 49,64	R\$ 744,60	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 744,60	0,00 %
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	R\$ 22,53	R\$ 27,83	R\$ 306,13	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 306,13	0,00 %
18.6.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 35,47	R\$ 43,82	R\$ 175,28	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 175,28	0,00 %
18.6.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 48,41	R\$ 59,81	R\$ 59,81	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 59,81	0,00 %
18.6.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 27,28	R\$ 33,70	R\$ 404,40	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 404,40	0,00 %
18.6.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 167,37	R\$ 206,77	R\$ 1.654,16	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.654,16	0,00 %
18.6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	18,00	R\$ 95,72	R\$ 118,25	R\$ 2.128,50	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 2.128,50	0,00 %
18.6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	102,00	R\$ 108,56	R\$ 134,12	R\$ 13.680,24	0,34 %	R\$ -	0,00	R\$ -	102,00	R\$ 13.680,24	0,00 %
18.6.14	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	40,00	R\$ 154,62	R\$ 191,02	R\$ 7.640,80	0,19 %	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 7.640,80	0,00 %
18.6.15	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00	R\$ 188,42	R\$ 232,77	R\$ 2.094,93	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.094,93	0,00 %
18.6.16	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	R\$ 380,39	R\$ 469,93	R\$ 1.879,72	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.879,72	0,00 %
18.6.17	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00	R\$ 380,39	R\$ 469,93	R\$ 469,93	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 469,93	0,00 %
18.6.18	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	16,00	R\$ 137,73	R\$ 170,15	R\$ 2.722,40	0,07 %	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 2.722,40	0,00 %


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



21.1.1	Colfa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18/8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg.=1115 x Prof.=700 x alt.=450mm	un	1,00	R\$ 1.591,12	R\$ 1.965,67	R\$ 1.965,67	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.965,67	0,00 %
21.2	EXAUSTOR ELETROMECHANICO INDUSTRIAL D=400MM	UN	1,00	R\$ 1.623,73	R\$ 2.005,96	R\$ 2.005,96	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.005,96	0,00 %
21.3	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	R\$ 253,33	R\$ 312,96	R\$ 1.251,84	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.251,84	0,00 %
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$ 79.692,22	1,96 %						
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 113,89	R\$ 140,70	R\$ 140,70	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 140,70	0,00 %
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	154,00	R\$ 10,68	R\$ 13,19	R\$ 2.031,26	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	154,00	R\$ 2.031,26	0,00 %
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00	R\$ 22,52	R\$ 27,82	R\$ 445,12	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 445,12	0,00 %
22.4	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/ 11 terminais de pressão c/ barramento	un	1,00	R\$ 316,12	R\$ 390,53	R\$ 390,53	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 390,53	0,00 %
22.5	Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm (Daisa BC-200) ou similar	un	4,00	R\$ 9,47	R\$ 11,70	R\$ 46,80	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 46,80	0,00 %
22.6	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	48,00	R\$ 22,52	R\$ 27,82	R\$ 1.335,36	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	48,00	R\$ 1.335,36	0,00 %
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43,95	R\$ 78,01	R\$ 96,37	R\$ 4.235,46	0,10 %	R\$ -	43,95	R\$ 4.235,46	0,00	R\$ -	1,04 %
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	43,95	R\$ 35,49	R\$ 43,84	R\$ 1.926,77	0,05 %	R\$ -	43,95	R\$ 1.926,77	0,00	R\$ -	2,28 %
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00	R\$ 94,95	R\$ 117,30	R\$ 1.876,80	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 1.876,80	0,00 %
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	65,00	R\$ 33,63	R\$ 41,55	R\$ 2.700,75	0,07 %	R\$ -	65,00	R\$ 2.700,75	0,00	R\$ -	2,41 %
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	348,78	R\$ 61,43	R\$ 75,89	R\$ 26.468,91	0,65 %	R\$ -	0,00	R\$ -	348,78	R\$ 26.468,91	0,00 %
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	308,00	R\$ 79,77	R\$ 98,55	R\$ 30.353,40	0,75 %	R\$ -	0,00	R\$ -	308,00	R\$ 30.353,40	0,00 %
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	16,00	R\$ 44,55	R\$ 55,04	R\$ 880,64	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 880,64	0,00 %
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM²	UN	340,00	R\$ 12,51	R\$ 15,45	R\$ 5.253,00	0,13 %	R\$ -	0,00	R\$ -	340,00	R\$ 5.253,00	0,00 %
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	32,00	R\$ 40,64	R\$ 50,21	R\$ 1.606,72	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	32,00	R\$ 1.606,72	0,00 %
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 127.217,36	3,13 %						
23.1	GERAIS					R\$ 84.349,38	2,08 %						
23.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 3.759,52	R\$ 4.644,51	R\$ 4.644,51	0,11 %	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 4.644,51	0,00 %
23.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	64,63	R\$ 329,65	R\$ 407,25	R\$ 26.320,57	0,65 %	R\$ -	0,00	R\$ -	64,63	R\$ 26.320,57	0,00 %
23.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	50,00	R\$ 329,65	R\$ 407,25	R\$ 20.362,50	0,50 %	R\$ -	0,00	R\$ -	50,00	R\$ 20.362,50	0,00 %
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m³	51,18	R\$ 143,46	R\$ 177,23	R\$ 9.070,63	0,22 %	R\$ -	0,00	R\$ -	51,18	R\$ 9.070,63	0,00 %
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	8,64	R\$ 181,77	R\$ 224,56	R\$ 1.940,20	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	8,64	R\$ 1.940,20	0,00 %
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	144,95	R\$ 86,01	R\$ 106,26	R\$ 15.402,39	0,38 %	R\$ -	0,00	R\$ -	144,95	R\$ 15.402,39	0,00 %
23.1.7	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,40	R\$ 411,30	R\$ 508,12	R\$ 3.251,97	0,08 %	R\$ -	0,00	R\$ -	6,40	R\$ 3.251,97	0,00 %
23.1.8	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	2,00	R\$ 42,35	R\$ 52,32	R\$ 104,64	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 104,64	0,00 %

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



23.1.9	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,40	R\$ 411,30	R\$ 508,12	R\$ 3.251,97	0,08 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,40	R\$ 3.251,97	0,00 %
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L					R\$ 42.867,98	1,06 %							
23.2.1	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	R\$ 23.604,22	R\$ 29.160,65	R\$ 29.160,65	0,72 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 29.160,65	0,00 %
23.2.2	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	18,00	R\$ 94,99	R\$ 117,35	R\$ 2.112,30	0,05 %		R\$ -	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 2.112,30	0,00 %
23.2.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	6,97	R\$ 122,82	R\$ 151,73	R\$ 1.057,56	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	6,97	R\$ 1.057,56	0,00 %
23.2.5	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	69,08	R\$ 55,32	R\$ 68,34	R\$ 4.720,93	0,12 %		R\$ -	0,00	R\$ -	69,08	R\$ 4.720,93	0,00 %
23.2.6	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	69,08	R\$ 55,32	R\$ 68,34	R\$ 4.720,93	0,12 %		R\$ -	0,00	R\$ -	69,08	R\$ 4.720,93	0,00 %
23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	69,08	R\$ 12,84	R\$ 15,86	R\$ 1.095,61	0,03 %		R\$ -	0,00	R\$ -	69,08	R\$ 1.095,61	0,00 %
24	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 11.737,39	0,29 %							
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1.514,30	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 3.573,75	0,09 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1.514,30	R\$ 3.573,75	0,00 %
24.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	R\$ 1.909,62	R\$ 2.359,14	R\$ 2.359,14	0,06 %		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.359,14	0,00 %
24.2	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	25,00	R\$ 187,94	R\$ 232,18	R\$ 5.804,50	0,14 %		R\$ -	0,00	R\$ -	25,00	R\$ 5.804,50	0,00 %
									R\$ 146.071,85		R\$ 1.227.368,22		R\$ 2.831.852,97	30,24%

Total sem BDI R\$ 3.285.754,58
Total do BDI R\$ 773.466,63
Total Geral R\$ 4.059.221,21

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão Social: MP2 CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041408083146995413

Informação obtida em 29/04/2025 13:30:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 18425603/2025

Expedição: 01/04/2025, às 09:19:33

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:53:19 do dia 25/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2025.

Código de controle da certidão: **E1F9.7DAA.D3D9.DBCB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 2270537

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:15:38 horas do dia 01/04/2025.

Válida até dia 30/06/2025.

Código de controle da certidão: **4FDE.739D.4051.3B33.1685.5A65.A1D0.E3EC**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20251817605

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUÇOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31857609658 / eSocial 106466728 / Reinf RET 106468797 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.441,97	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 17.911,58	R\$ 14.889,07
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.993,00	R\$ 3.993,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 11,99	R\$ 11,99
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 643,64	R\$ 643,64
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.002,18	R\$ 19.537,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/04/2025 07:59:48
Nº do recibo de entrega	0000050000331835714
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.919.197/0001-06



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000331835714
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 07:59:48	Identificação da Apuração de Débitos	31857609658 / eSocial 106466728 / Reinf RET 106468797 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000331320596
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	5.614,99		
Deduções	Salário Família: 195,00 Retenção Lei 9711/98: 5.419,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	116,38		
Saldo a Pagar	116,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	46,55		
Saldo a Pagar	46,55		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	69,83		
Saldo a Pagar	69,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9,31		
Saldo a Pagar	9,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	27,93		
Saldo a Pagar	27,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	178,44		
Saldo a Pagar	178,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	931,07		
Saldo a Pagar	931,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	75,90		
Saldo a Pagar	75,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	30,36		
Saldo a Pagar	30,36		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	45,54		
Saldo a Pagar	45,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	6,07		
Saldo a Pagar	6,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	18,21		
Saldo a Pagar	18,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	116,37		
Saldo a Pagar	116,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.12101/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	607,20		
Saldo a Pagar	607,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.528,85		
Saldo a Pagar	1.528,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	611,54		
Saldo a Pagar	611,54		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	917,31		
Saldo a Pagar	917,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	122,30		
Saldo a Pagar	122,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	366,92		
Saldo a Pagar	366,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.344,09		
Saldo a Pagar	2.344,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	12.230,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.022,51		
Saldo a Pagar	9.208,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.503,60		
Saldo a Pagar	1.503,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	826,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 826,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	643,64		
Saldo a Pagar	643,64		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	11,99		
Saldo a Pagar	11,99		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000331835714
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 07:59:48	Identificação da Apuração de Débitos	31857609658 / eSocial 106466728 / Reinf RET 106468797 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	5.614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	5.419,99	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	12.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,51	0,00	9.208,30
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	1.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,60
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,09

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	1.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,54
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,31
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,92

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,64

Grupo: CSRF



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2025	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99

Obra: 90.013.12101/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37

Obra: 90.013.12101/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21

Obra: 90.016.27652/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,07
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44

Obra: 90.016.27652/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000331835714
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 07:59:48	Identificação da Apuração de Débitos	31857609658 / eSocial 106466728 / Reinf RET 106468797 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 195,00 - Valor Utilizado: 195,00 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	5.614,99	195,00

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 9.269,48 - Valor Utilizado: 9.269,48 = Saldo Disponível: 0,00)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	5.614,99	5.419,99
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	826,98	826,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	12.230,81	3.022,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000331835714
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 07:59:48	Identificação da Apuração de Débitos	31857609658 / eSocial 106466728 / Reinf RET 106468797 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	5.614,99	5.614,99	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	826,98	826,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	12.230,81	3.022,51	9.208,30
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	1.503,60	0,00	1.503,60
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.344,09	0,00	2.344,09

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	1.528,85	0,00	1.528,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	122,30	0,00	122,30
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	611,54	0,00	611,54
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	917,31	0,00	917,31
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	366,92	0,00	366,92

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	643,64	0,00	643,64

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2025	11,99	0,00	11,99

Obra: 90.013.12101/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	607,20	0,00	607,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	116,37	0,00	116,37

Obra: 90.013.12101/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	75,90	0,00	75,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	6,07	0,00	6,07
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	30,36	0,00	30,36
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	45,54	0,00	45,54
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	18,21	0,00	18,21

Obra: 90.016.27652/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

			Valor	Créditos	Saldo
--	--	--	-------	----------	-------



Código	Descrição	PA Débito	Original	Vinculados	Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	931,07	0,00	931,07
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	178,44	0,00	178,44

Obra: 90.016.27652/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	116,38	0,00	116,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	9,31	0,00	9,31
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	46,55	0,00	46,55
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	03/2025	69,83	0,00	69,83
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	27,93	0,00	27,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000331835714
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 07:59:48	Identificação da Apuração de Débitos	31857609658 / eSocial 106466728 / Reinf RET 106468797 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	195,00	195,00	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	9.269,48	9.269,48	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000331835714
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 07:59:48	Identificação da Apuração de Débitos	31857609658 / eSocial 106466728 / Reinf RET 106468797 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	5.614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	5.419,99	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	12.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,51	0,00	9.208,30
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	1.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,60
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,09

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	1.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,54
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,31
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,92

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,64

Grupo: CSRF



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2025	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99

Obra: 90.013.12101/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37

Obra: 90.013.12101/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21

Obra: 90.016.27652/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,07
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44

Obra: 90.016.27652/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93



Pagar este documento até

07/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.846,22

CPF/CNPJ do Empregador
24.597.344

Nome/Razão Social do Empregador
MP2 CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050768984139-8

Tag
24597344 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	29	5.285,95	0,00	0,00	560,27	5.846,22
Total FGTS:		5.285,95	0,00	0,00	560,27	5.846,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.846,22**

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 16:13:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/adc0dca67be74e1bb80583328393bf8b5204000053039865802BR5523CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63047037

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/adc0dca67be74e1bb80583328393bf8b



07/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E003603052025050721031a68c63c858

Data e Hora: 07/05/2025 às 18:04:46

Valor: R\$ 5.846,22

Detalhes: FGTS MARÇO 25

Origem

Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI

CPF/CNPJ: 24597344000198

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 46379496501

Chave de segurança: AJ267LMLPG7PK2UX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.846,22
Número da Guia: 0125050768984139-8 **Data Emissão:** 07/05/2025 16:13:59 (Brasília) **Emitida por:** 24.597.344/0001-98 - MP2 CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADAILTON DO CARMO SANTOS	240	059.224.325-75	101	17/04/2025	Mensal	2.922,53	233,80	1,17	0,22	23,40	258,59
03/2025		ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	23	069.936.775-12	101	17/04/2025	Mensal	2.113,78	169,10	0,84	0,16	16,92	187,02
03/2025		ELTON SANTOS DA CONCEICAO	204	850.811.245-91	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		ERIK SANTOS CHAVES	296	068.545.015-55	101	17/04/2025	Mensal	2.771,40	221,71	1,10	0,21	22,19	245,21
03/2025		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	195	056.883.065-21	101	17/04/2025	Mensal	2.922,53	233,80	1,17	0,22	23,40	258,59
03/2025		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	187	040.084.945-37	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		GEAN PEREIRA DOS SANTOS	277	105.143.455-60	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30
03/2025		GIVANILDO CARVALHO SILVA	233	069.490.165-22	101	17/04/2025	Mensal	1.905,93	152,47	0,76	0,14	15,26	168,63
03/2025		HELEN CAILANE SANTOS GOES	278	104.717.955-50	101	17/04/2025	Mensal	2.268,46	181,47	0,90	0,17	18,16	200,70
03/2025		ISAIAS OLIVEIRA	189	619.175.085-49	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		IVAN LUIZ DE SOUZA MATOS	193	906.749.955-20	101	17/04/2025	Mensal	5.283,48	422,67	2,11	0,41	42,30	467,49
03/2025		JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS	239	058.965.185-44	101	17/04/2025	Mensal	2.922,53	233,80	1,17	0,22	23,40	258,59
03/2025		LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIV	238	030.927.645-44	101	17/04/2025	Mensal	2.922,53	233,80	1,17	0,22	23,40	258,59
03/2025		LUIZ GONZAGA DE JESUS	230	038.148.615-07	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30
03/2025		MAICON CARVALHO DOS SANTOS	229	075.211.995-88	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30
03/2025		MARCELO FERREIRA DA PAZ	138	807.970.755-34	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		MARCIO PIRES XAVIER	150	055.034.795-05	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		MARCONE LIMA SANTOS	228	071.093.685-05	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30
03/2025		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	235	095.569.215-67	101	17/04/2025	Mensal	1.905,93	152,47	0,76	0,14	15,26	168,63
03/2025		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	191	062.238.685-96	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		REGINALDO SANTOS SILVA	266	031.809.825-35	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		VALCI SILVA BRITTO	234	069.279.385-24	101	17/04/2025	Mensal	1.905,93	152,47	0,76	0,14	15,26	168,63
03/2025		WELINGTON DE FREITAS SILVA DE JESUS	198	034.371.775-16	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	139	087.985.945-83	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30
03/2025		WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	252	490.827.438-09	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
		Total do Tomador	Sem Tomador					58.384,15	4.670,65	23,28	4,42	467,37	5.165,72
		Total do Estabelecimento	24.597.344/0001-98					58.384,15	4.670,65	23,28	4,42	467,37	5.165,72
			Total FGTS					66.075,51	5.285,95	26,34	5,00	528,93	5.846,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.846,22
Número da Guia: 0125050768984139-8 **Data Emissão:** 07/05/2025 16:13:59 (Brasília) **Emitida por:** 24.597.344/0001-98 - MP2 CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.013.12101/76		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		EDSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR	208	833.611.385-15	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30
03/2025		LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO	202	029.835.435-79	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30
Total do Tomador							Sem Tomador	3.036,00	242,88	1,20	0,22	24,30	268,60
Total do Estabelecimento							90.013.12101/76	3.036,00	242,88	1,20	0,22	24,30	268,60
Total FGTS								66.075,51	5.285,95	26,34	5,00	528,93	5.846,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.846,22
Número da Guia: 0125050768984139-8 **Data Emissão:** 07/05/2025 16:13:59 (Brasília) **Emitida por:** 24.597.344/0001-98 - MP2 CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.27652/75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS	257	644.275.525-87	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
03/2025		ELSON SILVA DE CARVALHO	251	029.178.985-42	101	17/04/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,93	0,18	18,63	205,95
Total do Tomador							Sem Tomador	4.655,36	372,42	1,86	0,36	37,26	411,90
Total do Estabelecimento							90.016.27652/75	4.655,36	372,42	1,86	0,36	37,26	411,90
Total FGTS								66.075,51	5.285,95	26,34	5,00	528,93	5.846,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.846,22
Número da Guia: 0125050768984139-8 **Data Emissão:** 07/05/2025 16:13:59 (Brasília) **Emitida por:** 24.597.344/0001-98 - MP2 CONSTRUÇOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador


Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	29	66.075,51	5.285,95	0,00	0,00	26,34	5,00	528,93	5.846,22
	Total FGTS	66.075,51	5.285,95	0,00	0,00	26,34	5,00	528,93	5.846,22





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S T Q Q S S D	
		OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA			EFETIVO PESSOAL	
		CONTRATO Nº 289/2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022	RDO: 302	CATEGORIA	QTDE
Condições Climáticas:		Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra	
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro	
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2020 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido ruscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		Encarregado geral 1				
		Hh DO DIA				
		MÃO DE OBRA DIRETA				
		Topógrafo				
		Auxiliar de topografia				
		Pedreiro		6		
		Ajudante Geral		13		
		Calceiteiro				
		Carpinteiro		1		
		Operador de Motosserra				
		Motorista				
		Montador				
		Montador/Eletricista				
		Eletricista				
		Armador		2		
		Almoxarife		1		
		Operador de Pa carregadeira				
		Motorista de caçamba				
		Pintor				
		Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO				
		EFETIVO DO DIA		25		
		JORNADA DE TRABALHO				
		Hh DO DIA				
		Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				
		TIPO		QTDE.		
		Veículo Leve				
		Caminhão Munck				
		Caminhão Toco				
		Escavadeira				
		Pa carregadeira				
		Caçamba				
		Patrol				
		PC 200				
		Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				
Data: 2/4/2025		Data: 2/4/2025				


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA				Q	Q
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		RDO:	304
CATEGORIA		QTDE			
SIMBOLOGIA Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verge e contraverge pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verge e contraverge pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE BORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE BORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø60mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA			
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 26 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
GERENTE DE OBRA: Data: 4/4/2025		FISCALIZAÇÃO: Data: 4/4/2025			
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		S	T
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº: 288/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 288/2022 RDO: 306 Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pinor Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 0 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munc Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE			
CONSIDERAÇÕES			
OBSERVAÇÕES			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 6/4/2025		Data: 6/4/2025	

Daniel Pinheiro


Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S T Q Q S S D	
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA					EFETIVO PESSOAL	
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		RDO: 307	CATEGORIA	
Condições Climáticas:		Manhã: (2)		Tarde: (1)	MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1		
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR IGUAL A 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2016 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 26MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_08/2021 Anaço de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Anaço de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Anaço de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Anaço de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões				Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA		
				MÃO DE OBRA DIRETA		
				Topógrafo		
				Auxiliar de topografia		
				Pedreiro 8		
				Ajudante Geral 13		
				Calçeteiro		
				Carpinteiro 1		
				Operador de Motosserra		
				Motorista		
				Montador		
				Montador/Eletricista		
				Eletricista		
				Armador 2		
				Almoxarife 1		
				Operador de Pa carregadeira		
				Motorista de caçamba		
				Pintor		
				Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
				EFETIVO DO DIA 24		
				JORNADA DE TRABALHO		
				Hh DO DIA		
				Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS		
				TIPO		
				Veículo Leve		
				Caminhão Munck		
				Caminhão Toco		
				Escavadeira		
				Pa carregadeira		
				Caçamba		
				Patrol		
				PC 200		
				Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 7/4/2025				Data: 7/4/2025		



 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S T Q Q S S D	
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA				EFETIVO PESSOAL	
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		RDO: 308	
Condições Climáticas:		Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA QTDE	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_05/2016 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE BORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 8,4 M, ALTURA INTERNA = 8,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA	
				MÃO DE OBRA DIRETA	
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pinitor Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO	
				EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS	
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			
Data: 8/4/2025		Data: 8/4/2025			


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA				Q	S
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		R	S
		RDO: 309		S	D
Condições Climáticas:				EFETIVO PESSOAL	
Manhã: (2)		Tarde: (1)		CATEGORIA	
Noite: ()				QTDE	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão 8 central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral		1 1	
Hh DO DIA					
				MÃO DE OBRA DIRETA	
				Topógrafo	
				Auxiliar de topografia	
				Pedreiro	
				Ajudante Geral	
				Calçeteiro	
				Carpinteiro	
				Operador de Motosserra	
				Motorista	
				Montador	
				Montador/Eletricista	
				Eletricista	
				Armador	
				Almoxarife	
				Operador de Pá carregadeira	
				Motorista de caçamba	
				Pintor	
Hh DO DIA					
				RESUMO DO EFETIVO	
				EFETIVO DO DIA	
				JORNADA DE TRABALHO	
				Hh DO DIA	
				Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS	
				TIPO	
				QTDE.	
				Veículo Leve	
				Caminhão Munk	
				Caminhão Toco	
				Escavadeira	
				Pá carregadeira	
				Caçamba	
				Patrol	
				PC 200	
				Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			
Data: 8/4/2025		Data: 8/4/2025			



 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
		OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA			EFETIVO PESSOAL						
		CONTRATO Nº 289/2022			PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022			RDO: 310			
Condições Climáticas:		Manhã: (2)			Tarde: (1)			Noite: ()			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões					MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxeiro 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: Data: 10/4/2025					FISCALIZAÇÃO: Data: 10/4/2025						
					EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	T
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA		Q	Q
CONTRATO Nº 289/2022		S	S
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		D	
RDO: 311			
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () <td colspan="2">EFETIVO PESSOAL</td>		EFETIVO PESSOAL	
SIMBOLOGIA		CATEGORIA	
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA	
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento		Gerente de obra	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		Engenheiro	
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm		Tec. de Segurança	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		Aux Adm	
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm		Mestre de obra	
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		Encarregado geral	
Joelho 90 soldável - 25mm			
Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"			
Tê redução 90° soldável com bucha latão 8 central - 25mm - 1/2"			
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPÃO H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm			
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento		MÃO DE OBRA DIRETA	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A		Topógrafo	
Amação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		Auxiliar de topografia	
Amação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		Pedreiro	
Amação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		Ajudante Geral	
Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm		Calceteiro	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO		Carpinteiro	
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas		Operador de Motosserra	
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -		Motorista	
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -		Montador	
Joelho 45 soldável - 25mm		Montador/Eletricista	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.		Eletricista	
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020		Armador	
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO		Almozarife	
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E		Operador de Pá carregadeira	
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM		Motorista de caçamba	
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM		Pintor	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões			
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões			
Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões			
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA	
		JORNADA DE TRABALHO	
		Hh DO DIA	
		Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO	
		QTDE.	
		Veículo Leve	
		Caminhão Munck	
		Caminhão Toco	
		Escavadeira	
		Pá carregadeira	
		Caçamba	
		Patrol	
		PC 200	
		Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 11/4/2025		Data: 11/4/2025	


Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N°: 289/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022 RDO: 312		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Serviços Executados / Ocorrências Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA Hh DO DIA						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 0 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 12/4/2025		FISCALIZAÇÃO: Data: 12/4/2025						


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		X	
		S	T
		Q	Q
		S	S
		S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 288/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 268/2022 RDO: 314 Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hi DO DIA	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM CONTAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_05/2016 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE BORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hi DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA 25	
		JORNADA DE TRABALHO	
		Hi DO DIA	
		Hi ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO QTDE.	
		Veículo Leve	
		Caminhão Munck	
		Caminhão Toco	
		Escavadeira	
		Pa carregadeira	
		Caçamba	
		Patrol	
		PC 200	
		Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 14/4/2025		Data: 14/4/2025	



 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S T Q Q S S D	
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA		EFETIVO PESSOAL	
CONTRATO Nº 288/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022 RDO: 315		CATEGORIA QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra	
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro 1	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança	
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUIJO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 80MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		Encarregado geral 1 Hi DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pó carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hi DO DIA	
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA 26 JORNADA DE TRABALHO Hi DO DIA Hi ACUMULADO	
		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pó carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 15/4/2025		Data: 15/4/2025	


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	T
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA		Q	Q
CONTRATO Nº 289/2022		S	S
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		D	
RDO: 316			
CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA </td>		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLÓGIA		Gerente de Obra	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro	
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento		Tec. de Segurança	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		Aux Adm	
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm		Mestre de obra	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		Encarregado geral	
Reboco para paredes internas, externas, pórtilhos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm			
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
Joelho 90 soldável - 25mm			
Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"			
Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2"			
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm			
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento			
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A			
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação			
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação			
Armação de aço CA-50 Ø 12,6mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação			
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação			
Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM			
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO			
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas			
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -			
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -			
Joelho 45 soldável - 25mm			
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.			
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020			
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO			
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E			
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM			
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões			
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões			
Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões			
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA 25	
		JORNADA DE TRABALHO	
		Hh DO DIA	
		Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO	
		QTDE.	
		Veículo Leve	
		Caminhão Wunk	
		Caminhão Toco	
		Escavadeira	
		Pá carregadeira	
		Caçamba	
		Patrol	
		PC 200	
		Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 16/4/2025		Data: 16/4/2025	


Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 289/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022 RDO: 317		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA	QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90° soldável - 25mm Tê redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM CONTAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A Armação de aço CA-60 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45° soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almozanile 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA	
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
GERENTE DE OBRA: Data: 17/4/2025		FISCALIZAÇÃO: Data: 17/4/2025	
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Bunk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	T
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA		Q	Q
CONTRATO Nº 289/2022		Q	S
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		S	D
RDO: 315		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA	
SIMBOLOGIA		QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA </td>		MÃO DE OBRA DIRETA	
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento <td colspan="2">Gerente de Obra</td>		Gerente de Obra	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X33CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 <td colspan="2">Engenheiro</td>		Engenheiro	
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm <td colspan="2">Tec. de Segurança</td>		Tec. de Segurança	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 <td colspan="2">Aux Adm</td>		Aux Adm	
Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm <td colspan="2">Mestre de obra</td>		Mestre de obra	
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 <td colspan="2">Encarregado geral</td>		Encarregado geral	
Joelho 90 soldável - 25mm <td colspan="2"></td>			
Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" <td colspan="2"></td>			
Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" <td colspan="2"></td>			
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 <td colspan="2"></td>			
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM CONTAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO <td colspan="2"></td>			
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm <td colspan="2"></td>			
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 <td colspan="2"></td>			
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento <td colspan="2">Hh DO DIA</td>		Hh DO DIA	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td>		MÃO DE OBRA DIRETA	
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação <td colspan="2">Topógrafo</td>		Topógrafo	
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação <td colspan="2">Auxiliar de topografia</td>		Auxiliar de topografia	
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação <td colspan="2">Pedreiro</td>		Pedreiro	
Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação <td colspan="2">Ajudante Geral</td>		Ajudante Geral	
Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm <td colspan="2">Calçeteiro</td>		Calçeteiro	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO <td colspan="2">Carpinteiro</td>		Carpinteiro	
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas <td colspan="2">Operador de Motosserra</td>		Operador de Motosserra	
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - <td colspan="2">Motorista</td>		Motorista	
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - <td colspan="2">Montador</td>		Montador	
Joelho 45 soldável - 25mm <td colspan="2">Montador/Eletricista</td>		Montador/Eletricista	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. <td colspan="2">Eletricista</td>		Eletricista	
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 <td colspan="2">Armador</td>		Armador	
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO <td colspan="2">Almoxarife</td>		Almoxarife	
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E <td colspan="2">Operador de Pá carregadeira</td>		Operador de Pá carregadeira	
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM <td colspan="2">Motorista de caçamba</td>		Motorista de caçamba	
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM <td colspan="2">Pintor</td>		Pintor	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO <td colspan="2"></td>			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO <td colspan="2"></td>			
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões <td colspan="2"></td>			
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões <td colspan="2"></td>			
Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões <td colspan="2"></td>			
CONSIDERAÇÕES <td colspan="2">RESUMO DO EFETIVO </td>		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA	
		JORNADA DE TRABALHO	
		Hh DO DIA	
		Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES <td colspan="2">EFETIVO EQUIPAMENTOS </td>		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO	
		QTDE.	
		Veículo Leve	
		Carminhão Murek	
		Carminhão Toco	
		Escavadeira	
		Pá carregadeira	
		Caçamba	
		Patrol	
		PC 200	
		Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 16/4/2025		Data: 16/4/2025	

Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araújo de Almeida
 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA						CATEGORIA						
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		RDO: 320		QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Cálceiteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pa carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA 0						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pa carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/4/2025						Data: 20/4/2025						


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		X	
		S	T
		Q	Q
		S	S
		D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 289/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022 RDO: 321		ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 34 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA N= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_05/2016 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,6mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calçateiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO ELETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		ELETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA: Data: 21/4/2025		FISCALIZAÇÃO: Data: 21/4/2025	

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
					S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº: 289/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022 RDO: 322		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Reboco para paredes internas, externas, pórtilcos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90° soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM CONTAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_05/2016 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Viga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45° soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almojarife 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO										
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE.										
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 22/4/2025		FISCALIZAÇÃO: Data: 22/4/2025										



 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S T Q Q S S D	
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA					EFETIVO PESSOAL	
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		RDO: 323	CATEGORIA	
Condições Climáticas:		Manhã: (2)		Tarde: (1)	QTDE	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA		
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPÃO 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_05/2016 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA	
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
GERENTE DE OBRA: Data: 23/4/2025					FISCALIZAÇÃO: Data: 23/4/2025	
EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Lave Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4





MP2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data x s t q q s s d											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA																	
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		RDO: 328		CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas:		Manhã: (2)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro				1							
						Téc. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral				1							
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM CONTAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020						h/h DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro				6							
						Ajudante Geral				13							
						Calceiteiro											
						Carpinteiro				1							
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
Montador																	
Montador/Eletricista																	
Eletricista																	
Armador				2													
Almoxarife				1													
Operador de Pá carregadeira																	
Motorista de caçamba																	
Pintor																	
						h/h DO DIA											
						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA				25							
						JORNADA DE TRABALHO											
						h/h DO DIA											
						h/h ACUMULADO											
						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO				QTDE.							
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 298											
						Placa Vibratória											
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:					
Data: 28/4/2025						Data: 28/4/2025											


Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		S	T
			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N°: 289/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022 RDO: 339		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () +B7.234 SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trabi. 3- Chuva s/ cond. Trabi.		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CÁIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA: Data: 29/4/2025		FISCALIZAÇÃO: Data: 29/4/2025	


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA					EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 289/2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 258/2022		RDO: 330	CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 Joelho 90 soldável - 25mm Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - Joelho 45 soldável - 25mm JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 13 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Armador 2 Almoxarife 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA 25 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/4/2025					Data: 30/4/2025						


 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2


 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2025	Santaluz-Ba	Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 01 - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento



FOTO 02 - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento

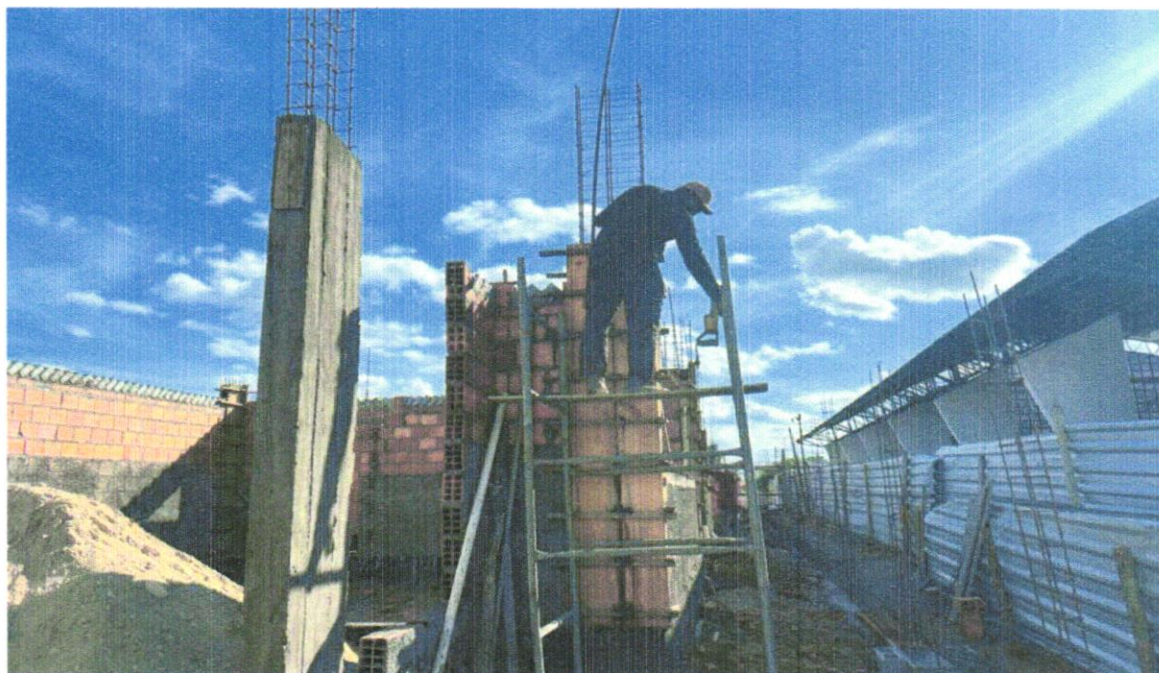

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/04/2025	Santaluz-Ba	Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 03 – Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento


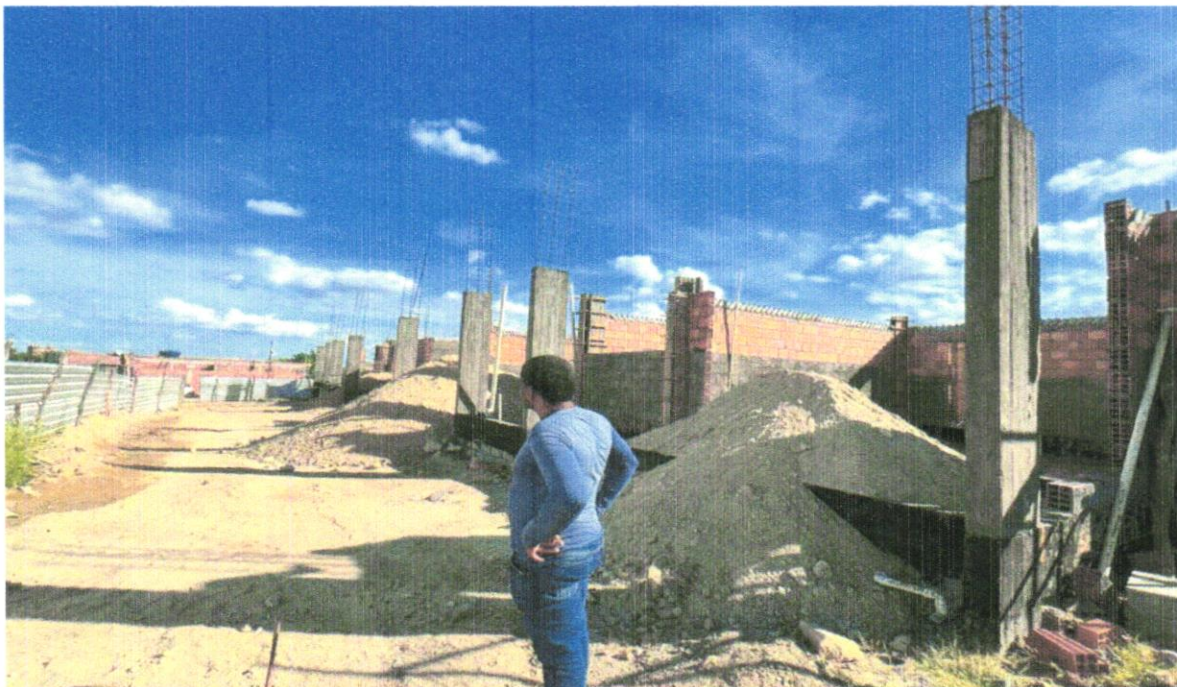


FOTO 04 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

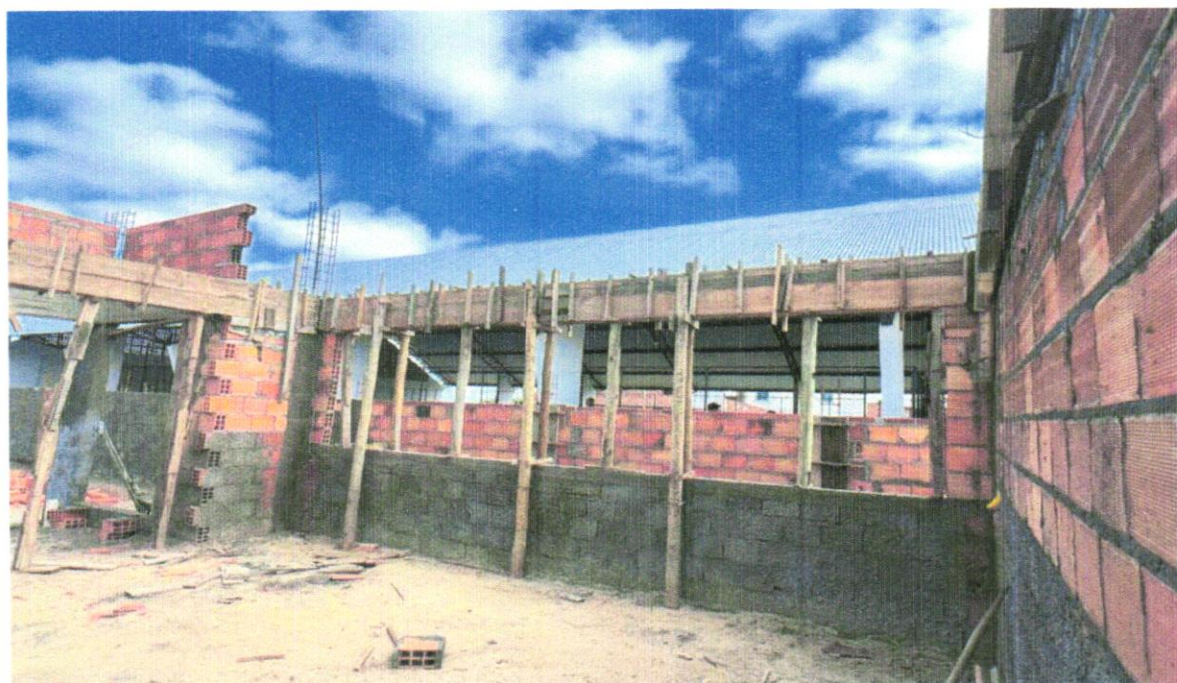

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2025	Santaluz-Ba	Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 05 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



FOTO 06 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2025	Santaluz-Ba	Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 07 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

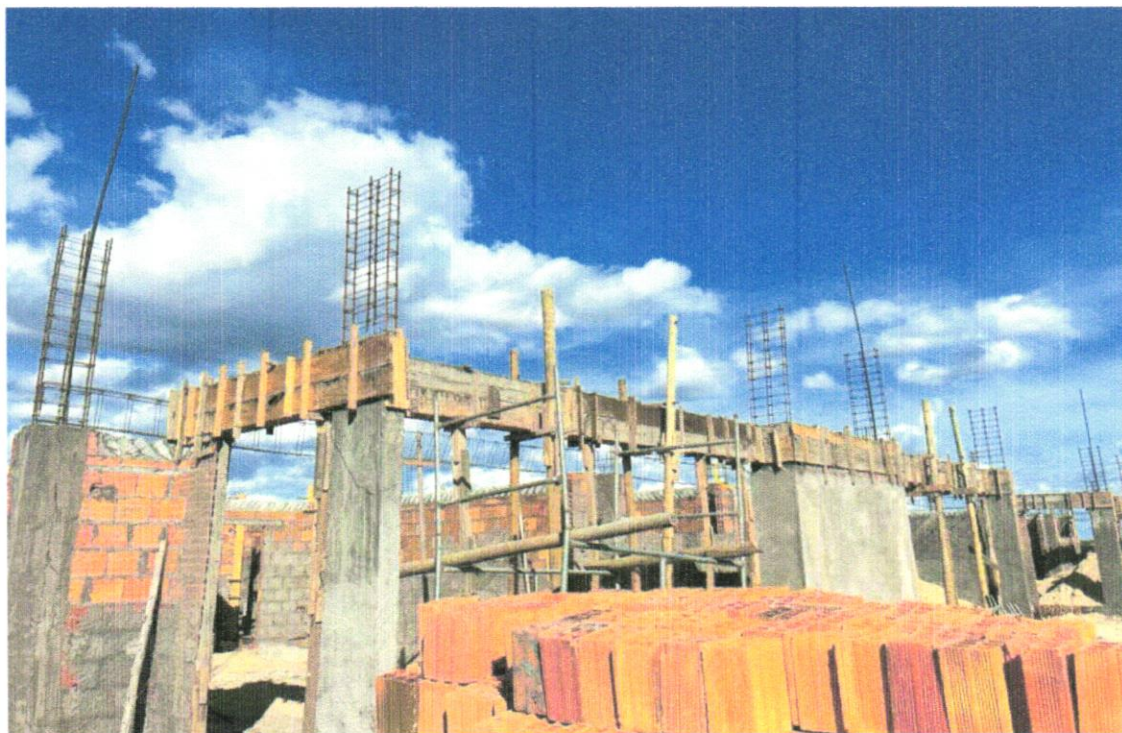


FOTO 08 – Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação



Victor Afonso de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154822-4

Daniel Pinheiro de Melo
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2025	Santaluz-Ba	Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 09 – Armação de aço CA-60 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

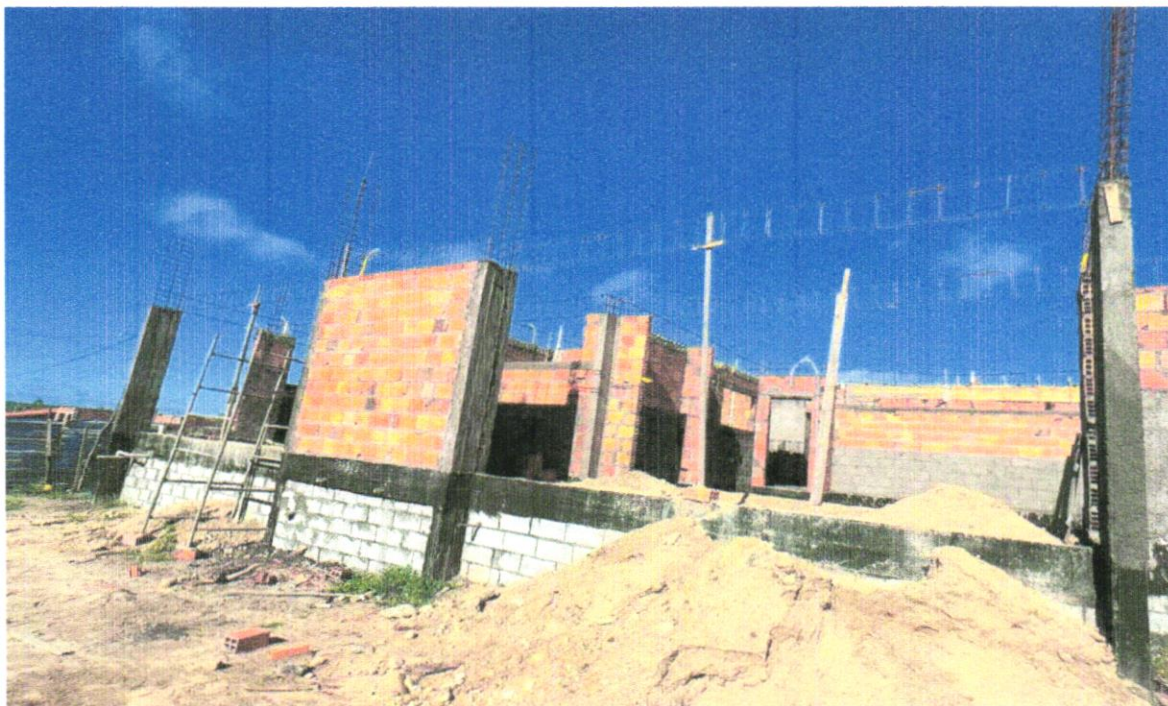


FOTO 10 – Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/04/2025	Santaluz-Ba	Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 11 – Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação


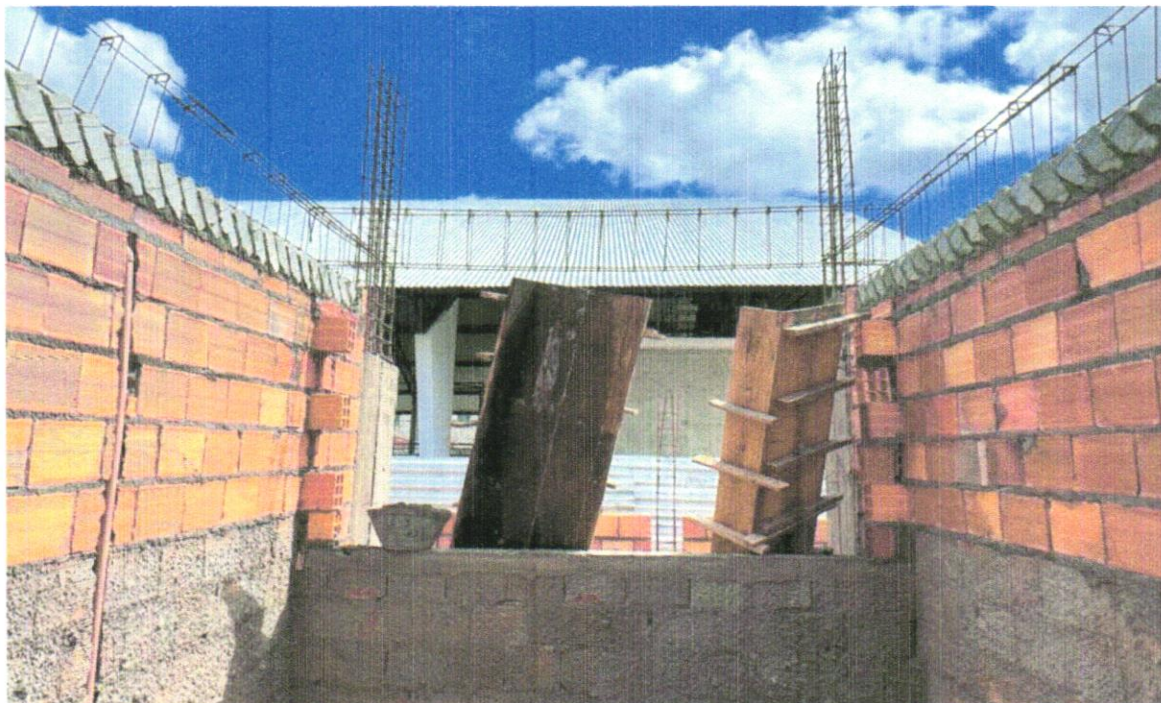


FOTO 12 – Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

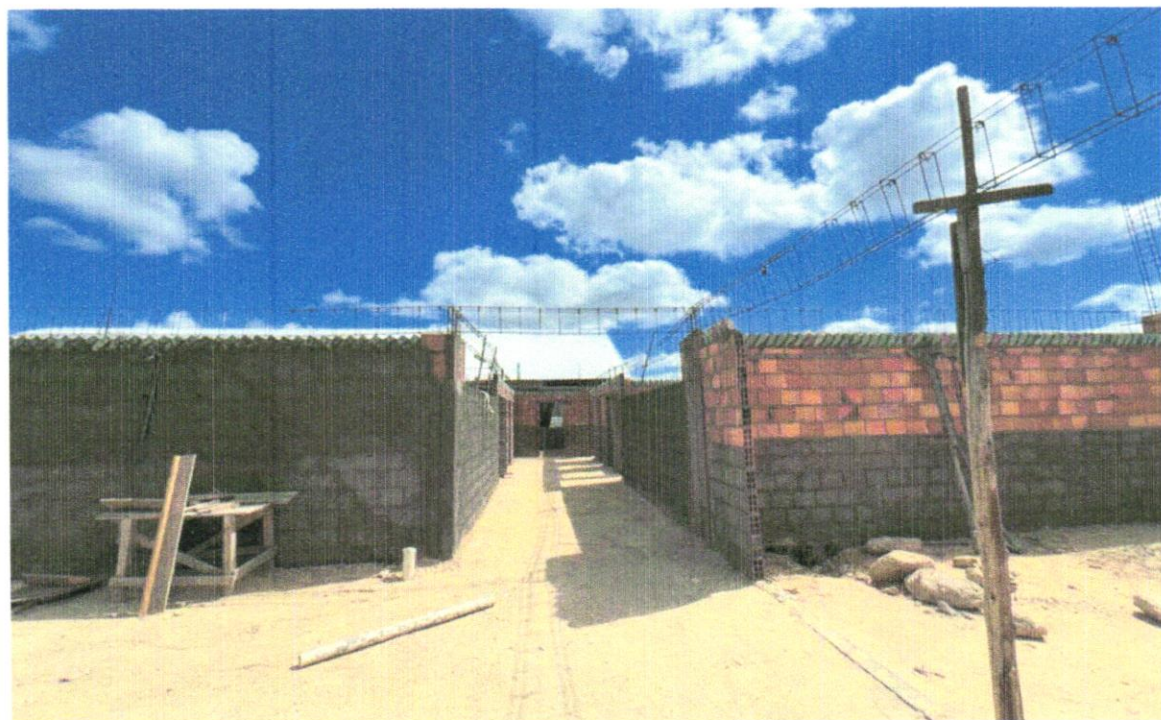

30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 13 - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação


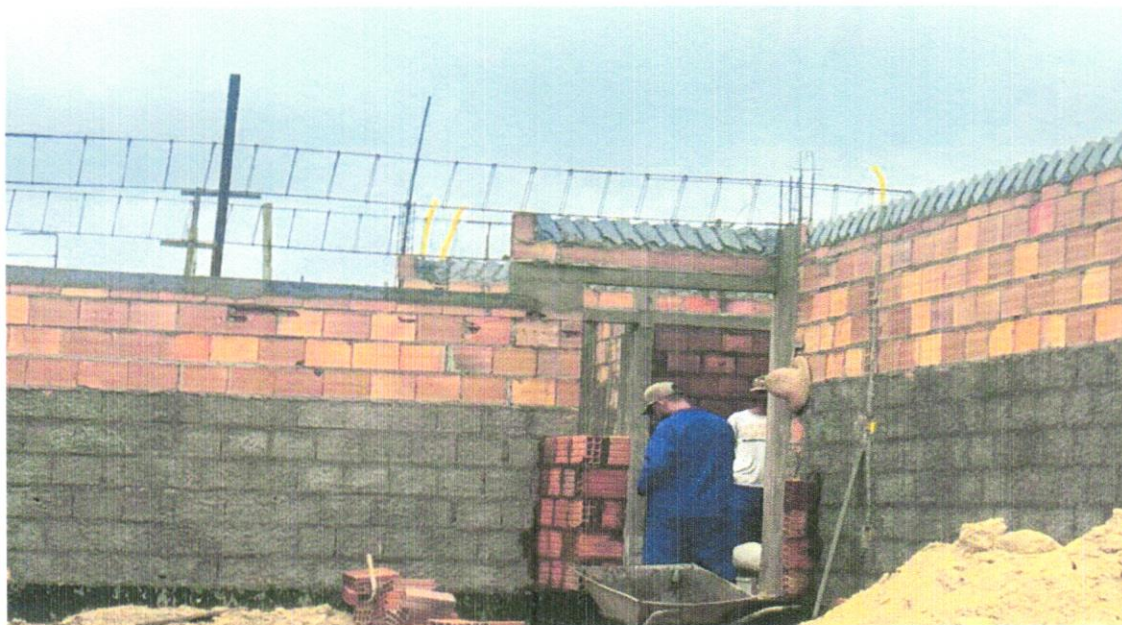


FOTO 14 – Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
• Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

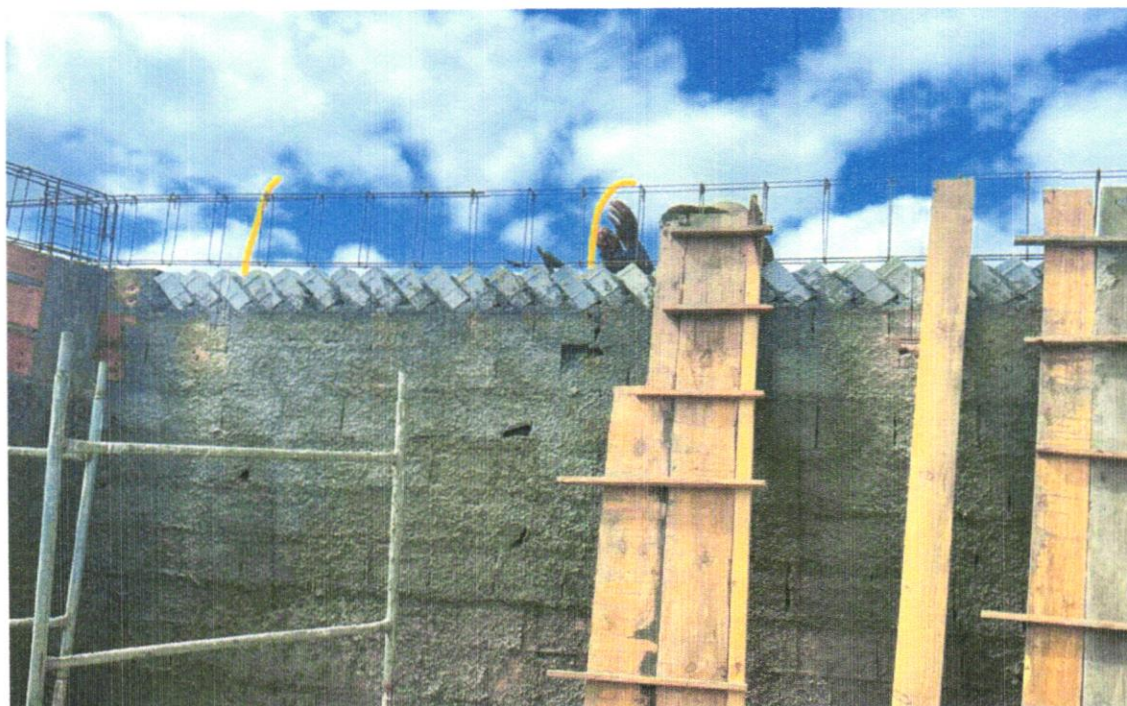

30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 15 – Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento



FOTO 16 – Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento



Victor Araujo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 17 - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento



FOTO 18 - Verga e contra verga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm

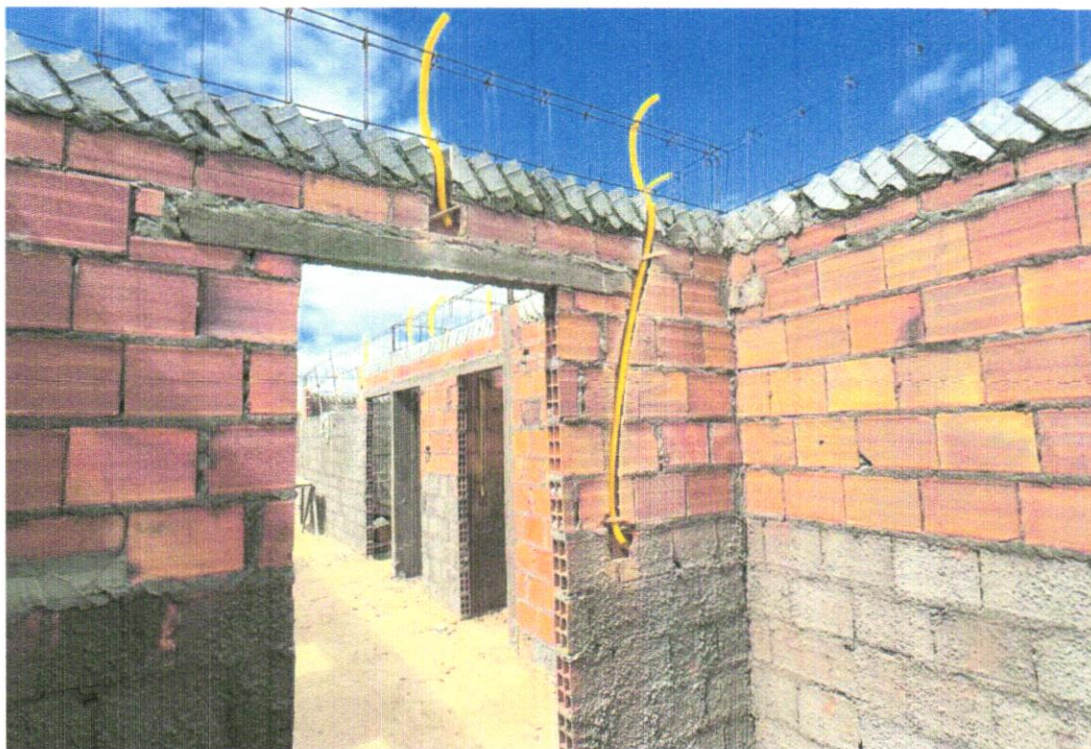

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 19 - Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm

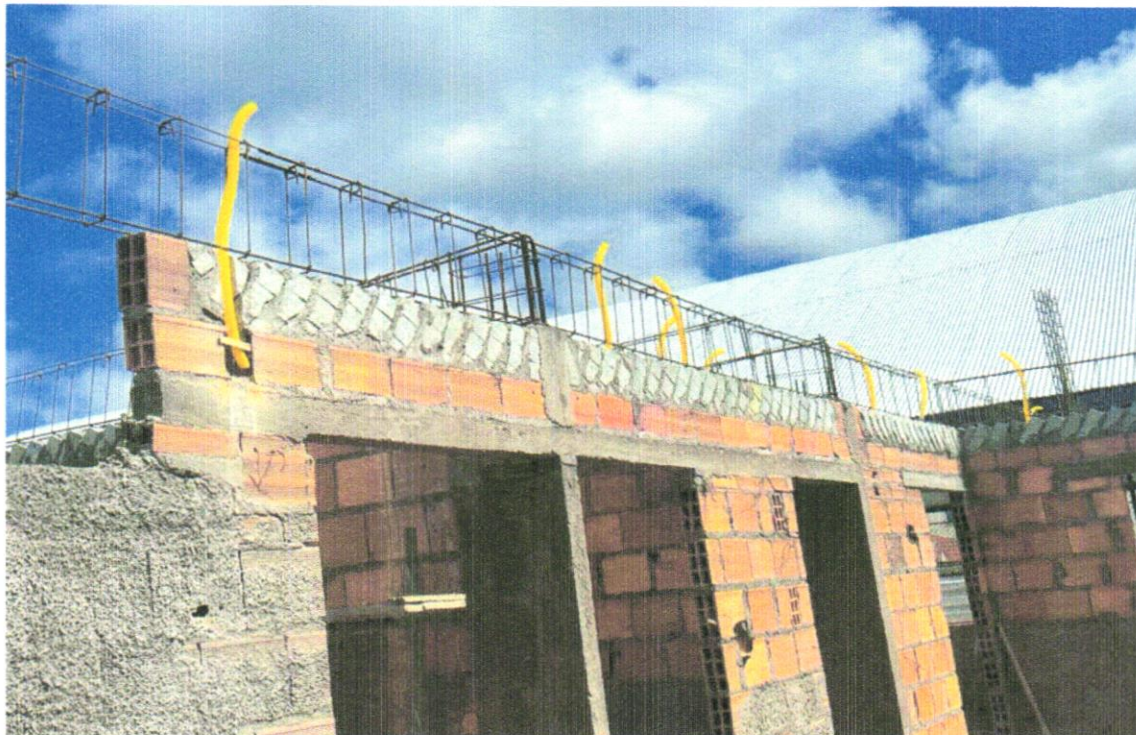


FOTO 20 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 21 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 22 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

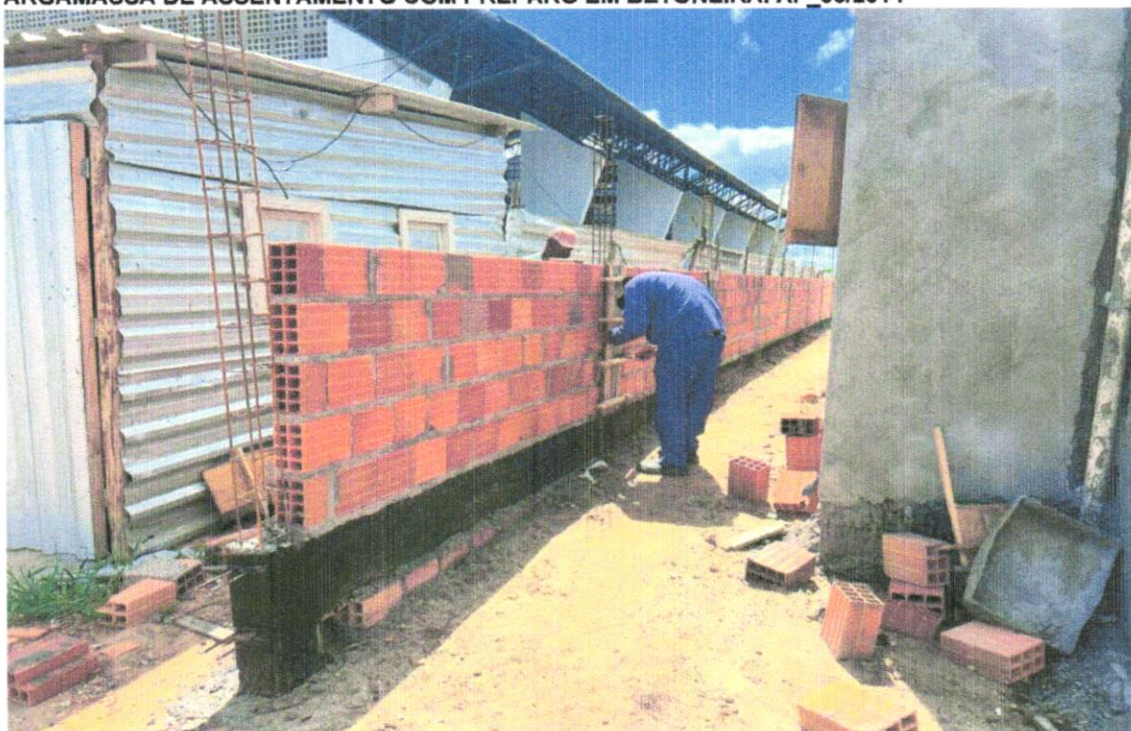

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro de Menezes
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 23 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 24 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

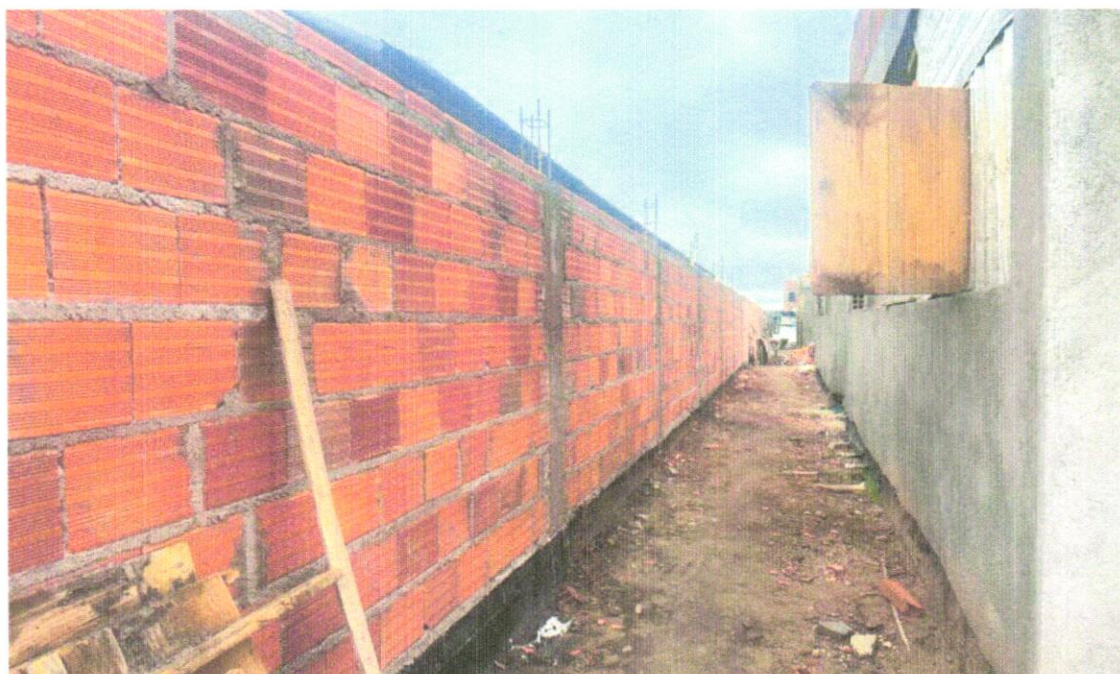

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154922-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 25 – FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016


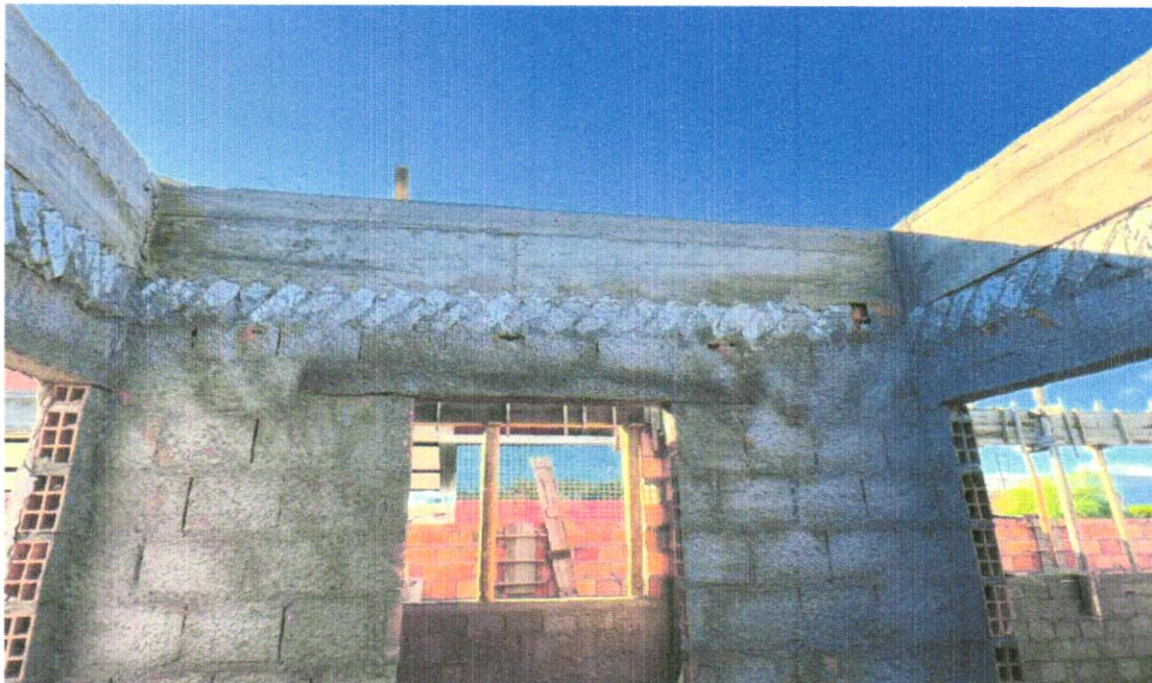


FOTO 26 – FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

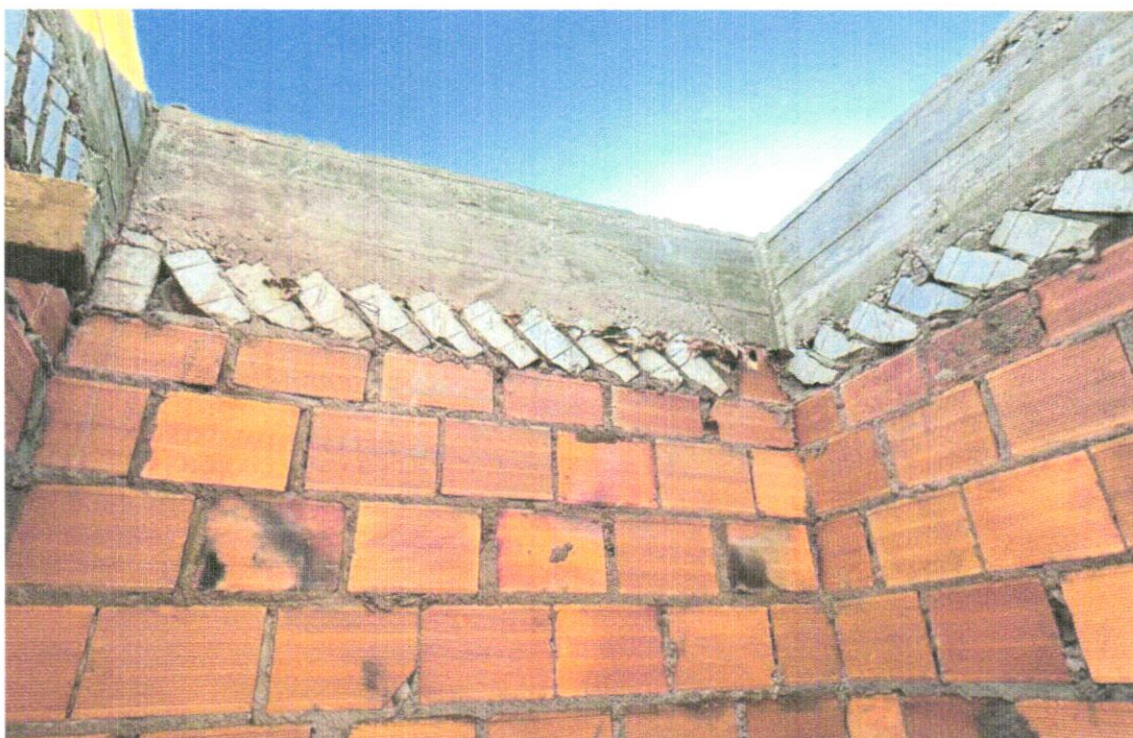

30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 27 – FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

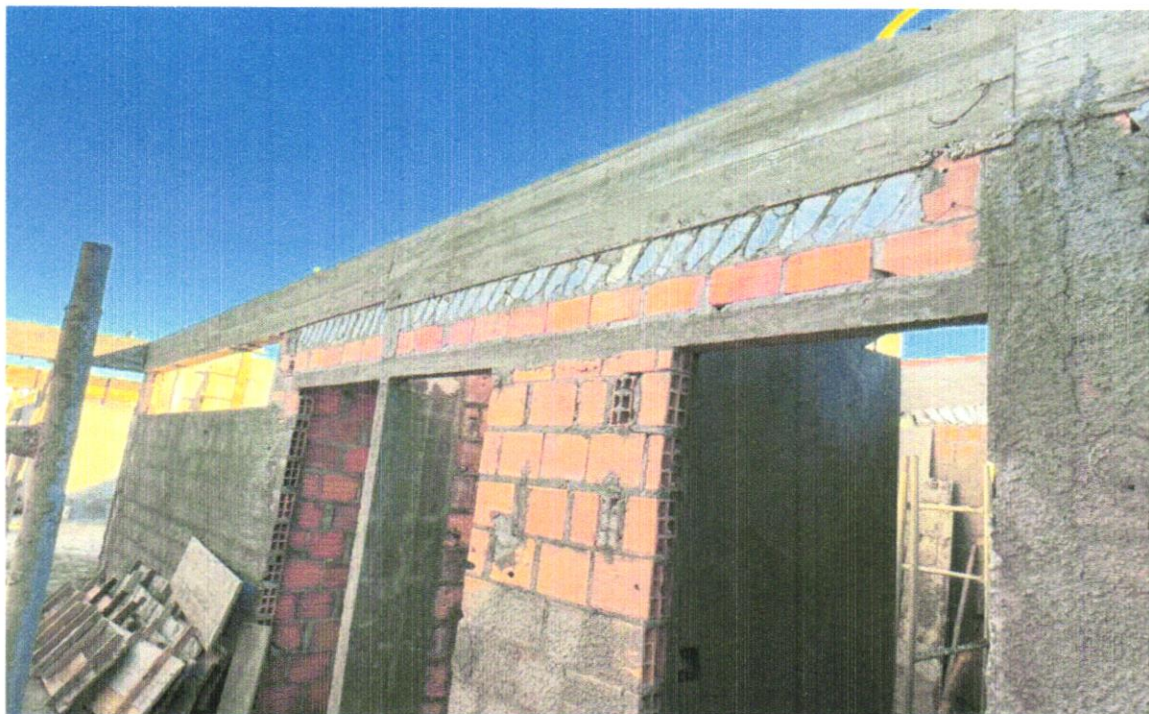


FOTO 28 – Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas



Victor Araujo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 29 – Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas



FOTO 30 – Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm

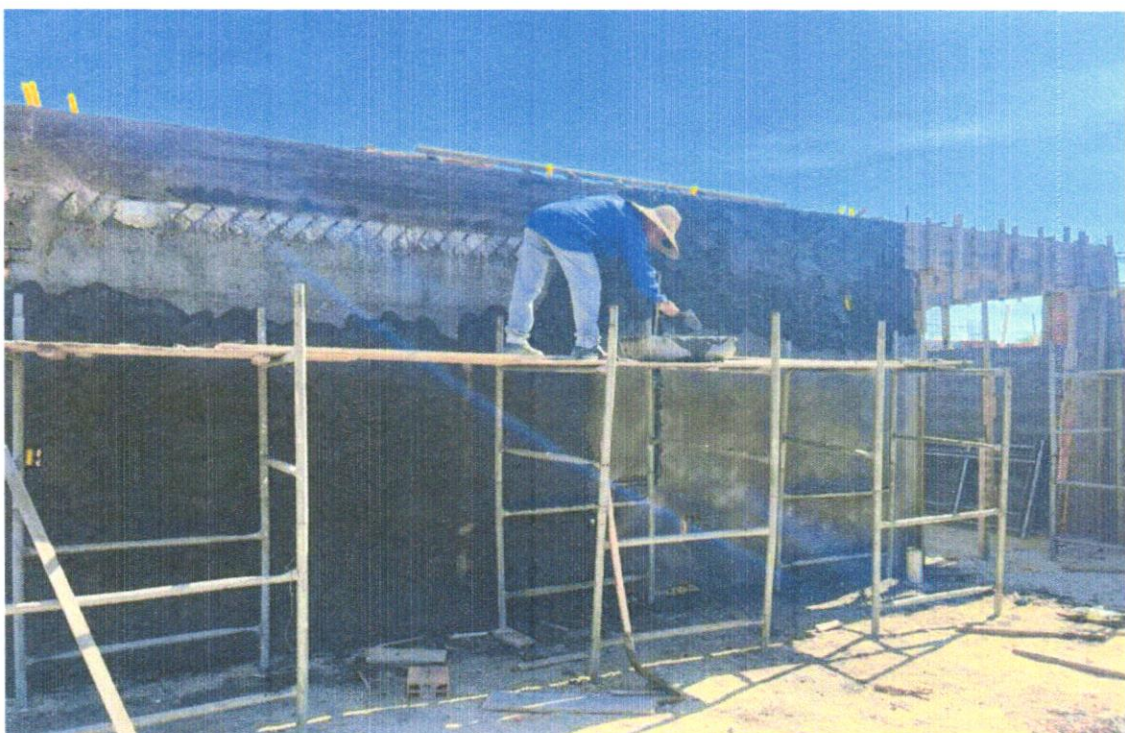

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 31 – Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm



FOTO 32 – Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 33 – Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm

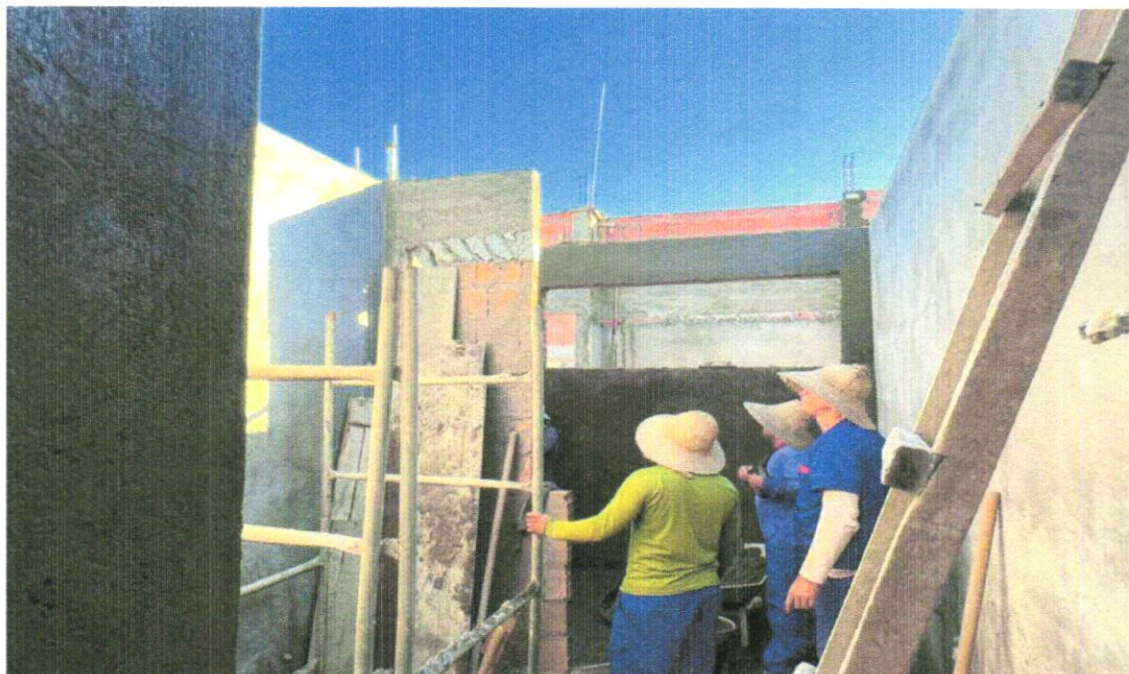


FOTO 34 – Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 35 – Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm


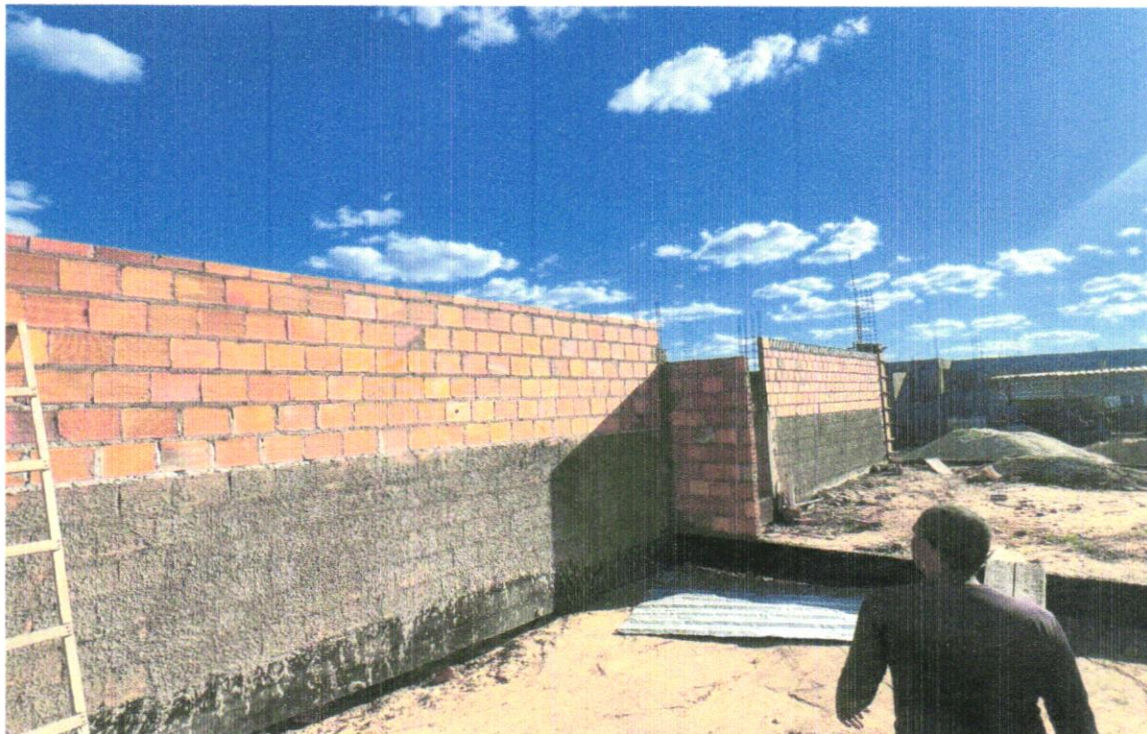


FOTO 36 – TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

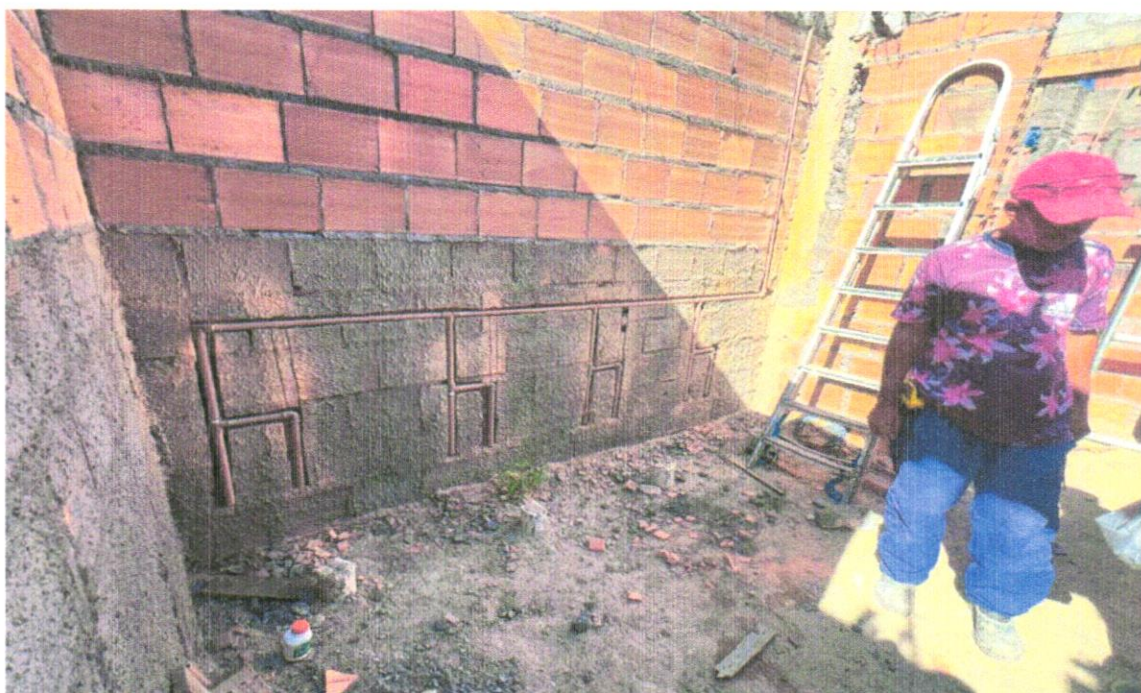

30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 37 – TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022


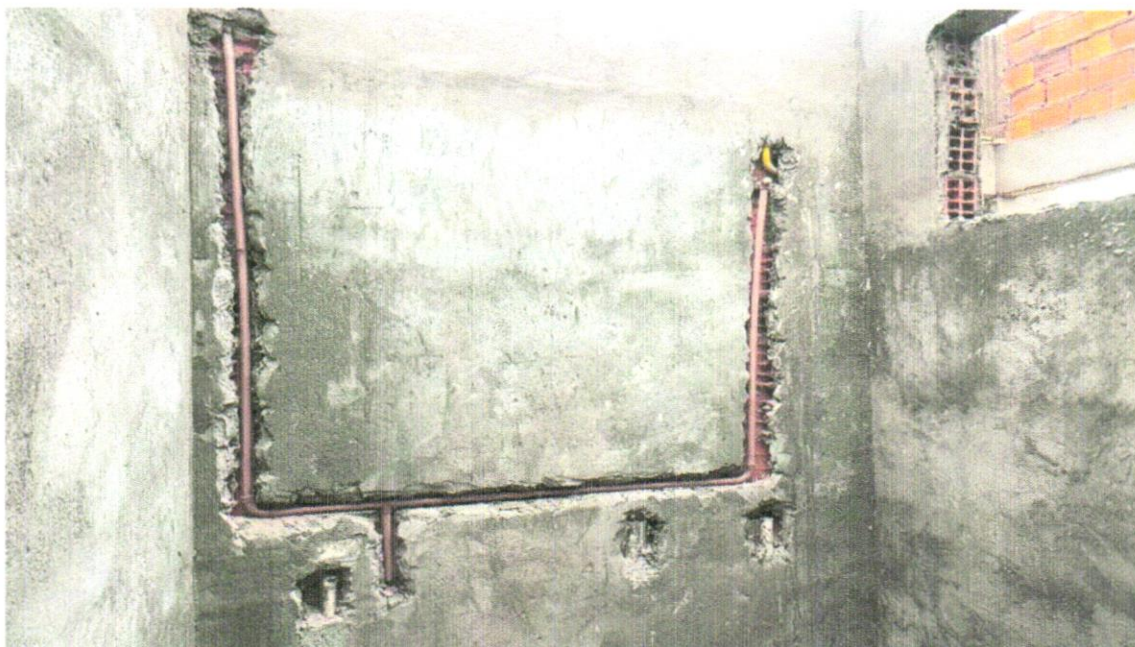


FOTO 38 – TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro de Almeida
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

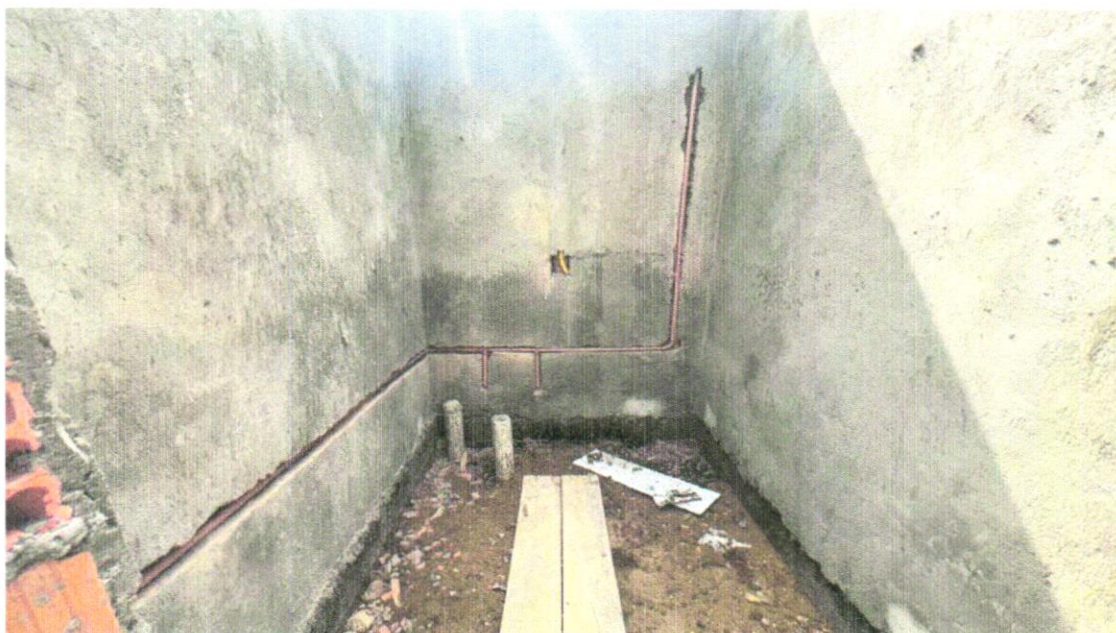

30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 39 – REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



FOTO 40 – Jo Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"elho 90 soldável - 25mm

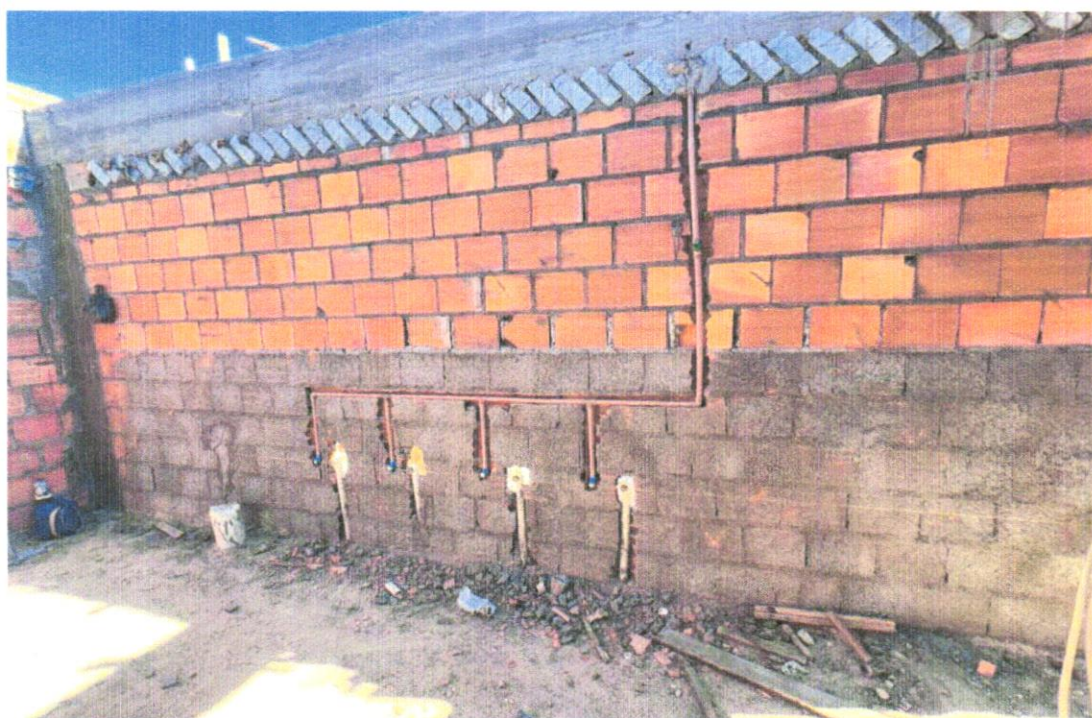

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 41 – Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2"



FOTO 42 – Joelho 90 soldável - 25mm

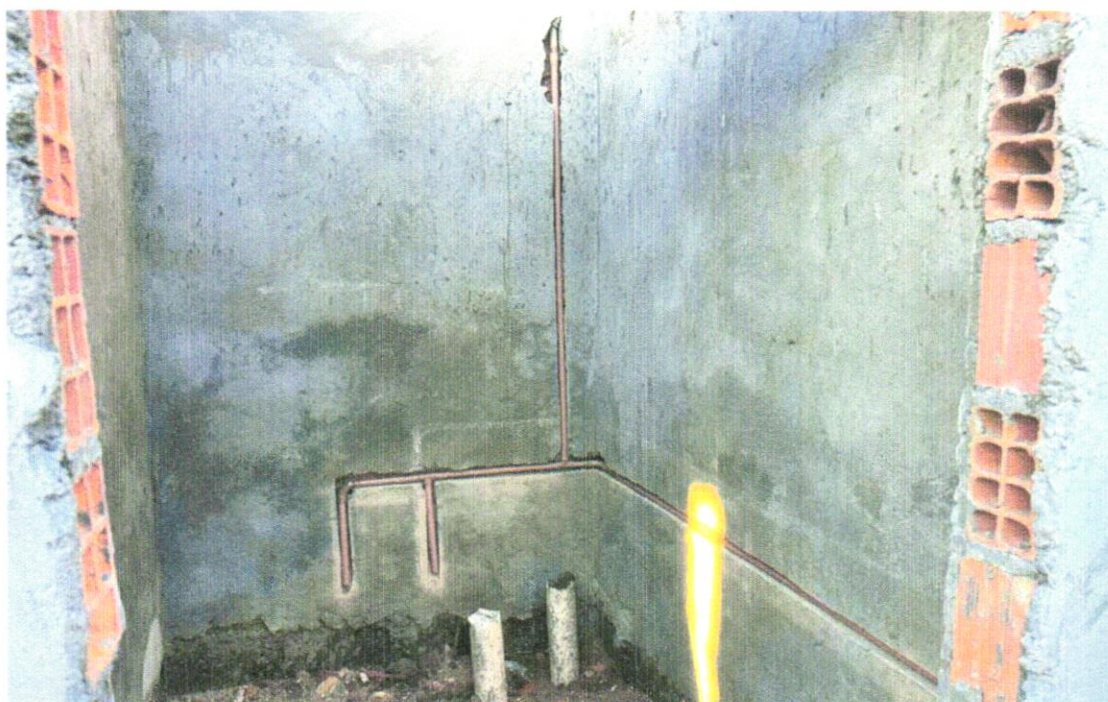

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

**FOTO 43 – JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022**



**FOTO 44 – CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020**



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 45 – RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



FOTO 46 – RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

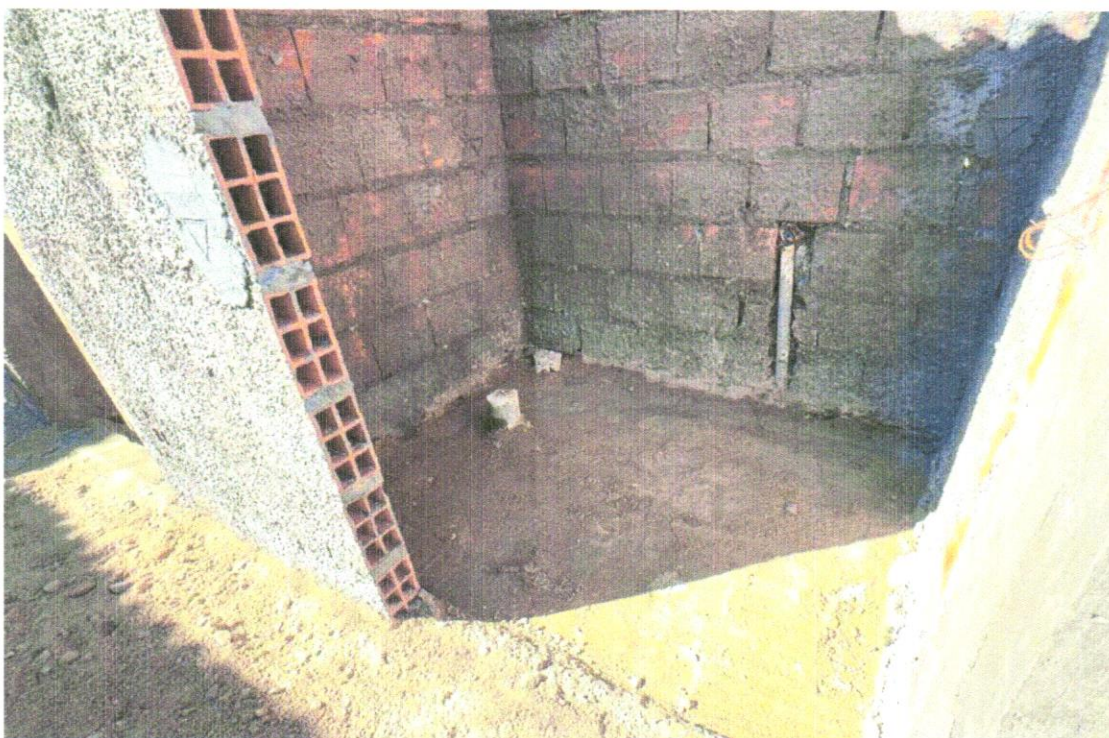

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 47 – TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM

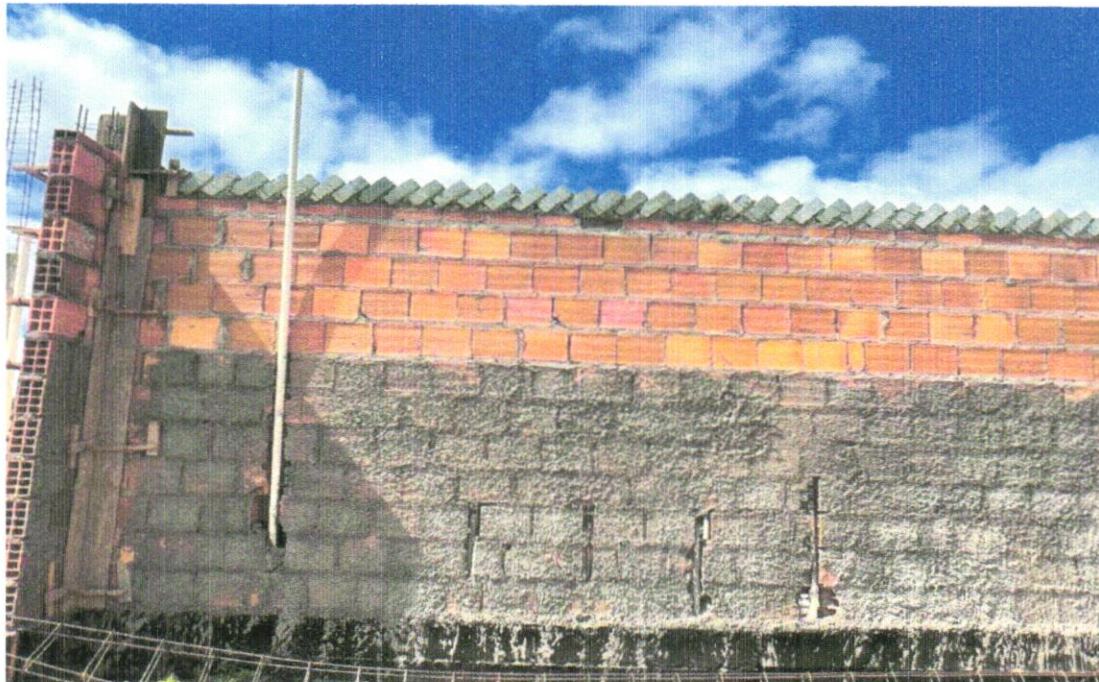


FOTO 48 – TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50 MM



Victor Melo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
• Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro de Melo
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 49 – QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO



FOTO 50 – QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
• Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 51 – Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões


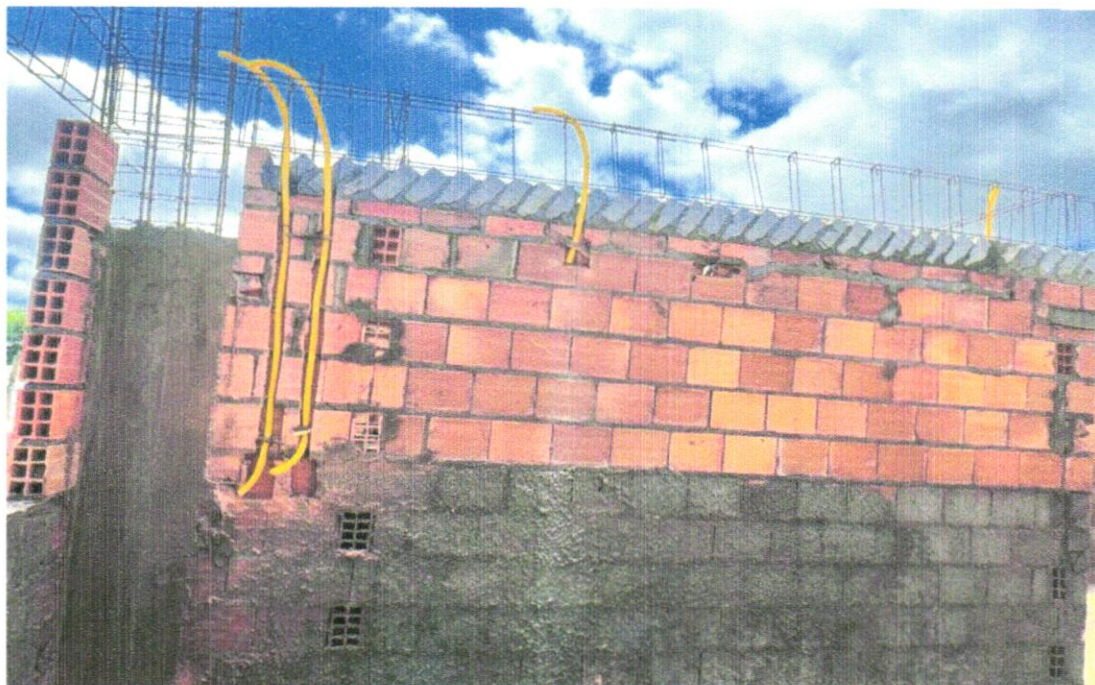


FOTO 52 – Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro de Almeida
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

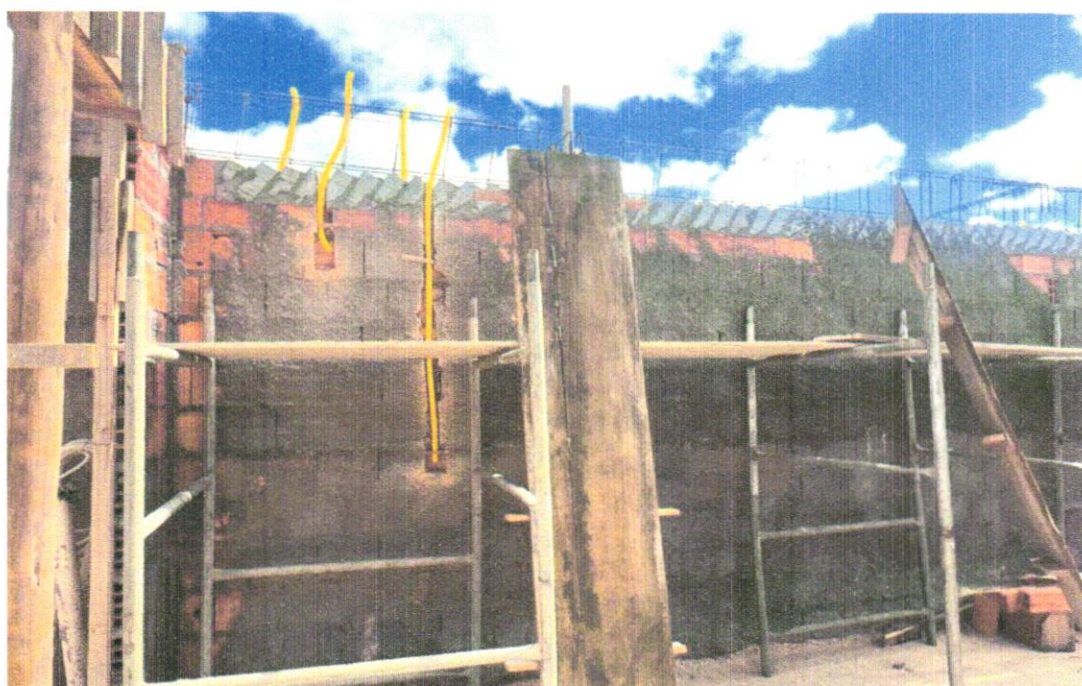

30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 53 – Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões



FOTO 54 – Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

**FOTO 55 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016**



**FOTO 56 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016**

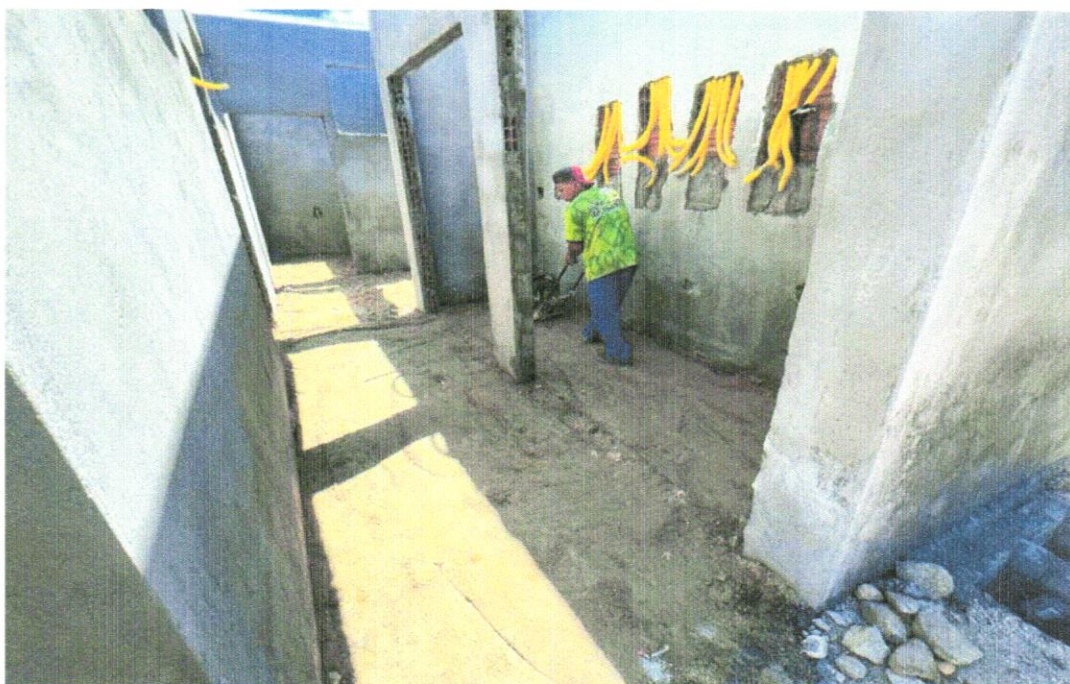

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2



30/04/2025

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche
Municipal no município de
Santaluz-Ba

FOTO 57 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016


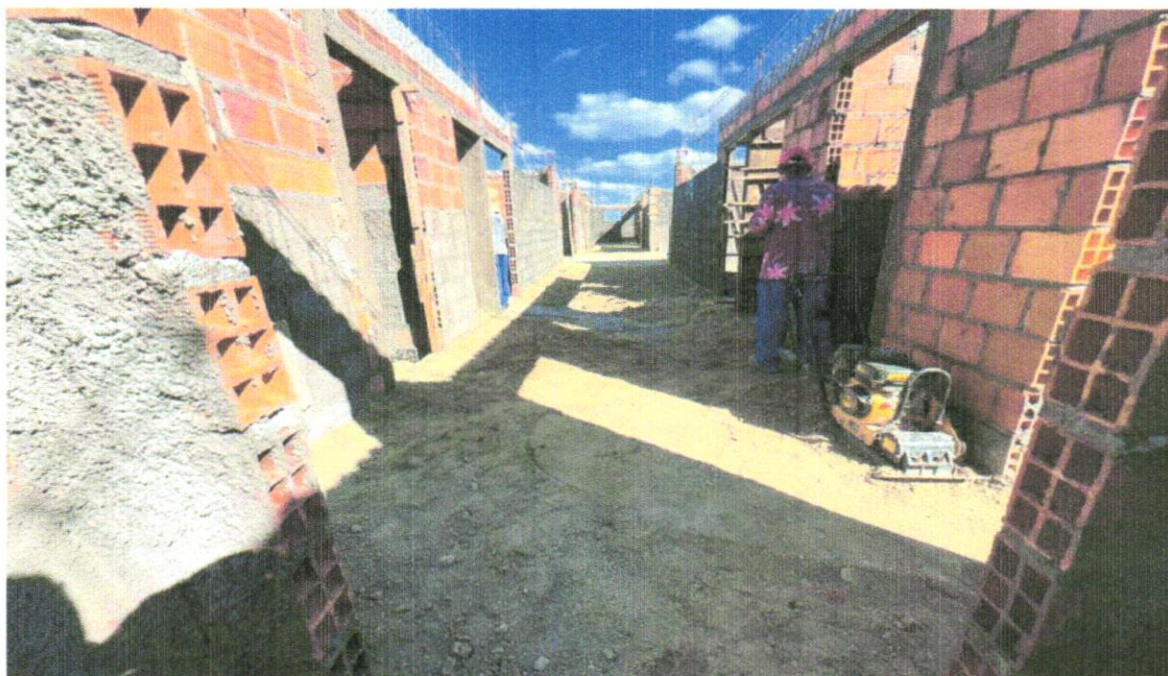


FOTO 58 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

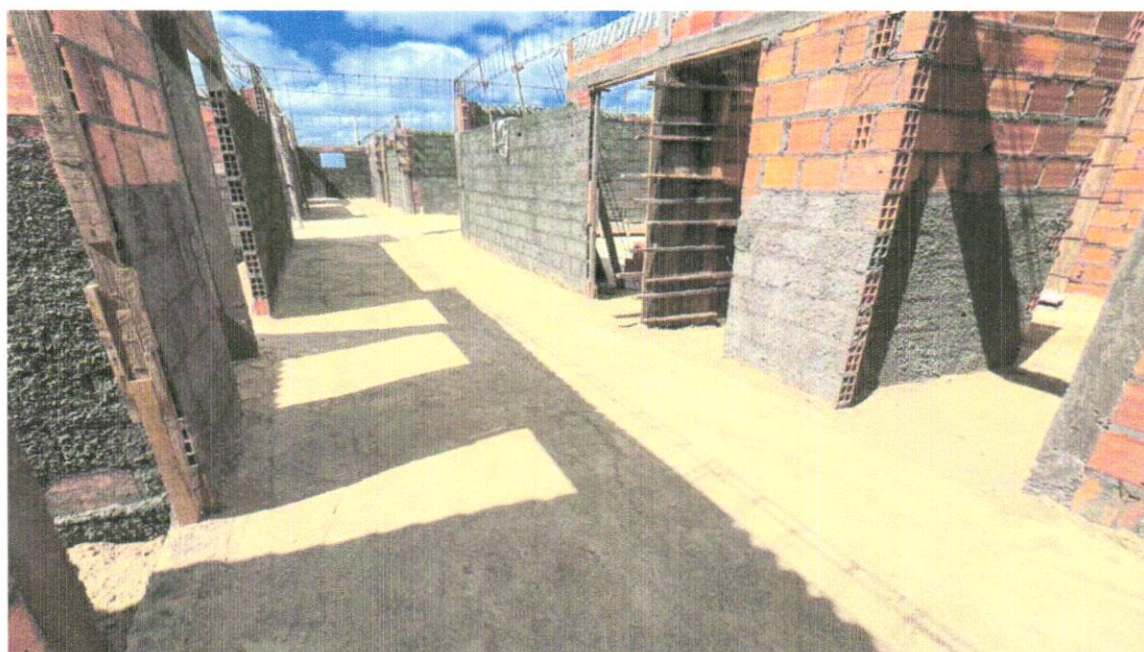

30/04/2025


Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 59 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016



FOTO 60 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

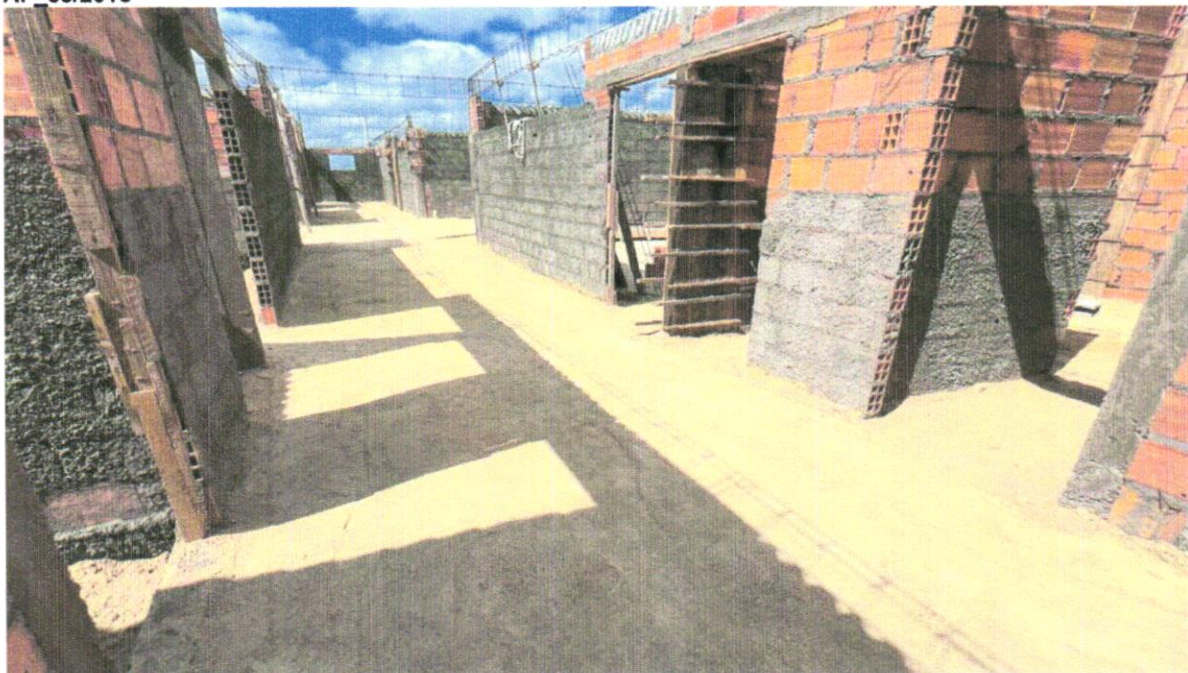

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

