



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 187-2024

EMPENHO: 196 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1454 Data do Sub-Empenho: 05/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 6507 - ECKO CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75	Complemento: SALA 06
Bairro: CENTRO	Cidade:
CNPJ: 19.846.470/0001-07 Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente: 29052-1 Agência: 1047-2	RG:
Tipo PIX:	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2057.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 30/04/2025
Unidade: 905 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
Função: 08 - Assistência Social	
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária	
Programa: 006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	
Ação: 2.057 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2024CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 413-2025	230.000,00	222.087,34	7.912,66
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº413-2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº002-2024. OBRA Nº 008/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025. NFS-e 709.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	194.573,54	193.212,56	1.360,98

Data do Empenho: 30/04/2025 Data da Liquidação: 05/12/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	10.626,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.004	IRRF - Fonte 1500	2.898,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.004	ISS - Fonte 1500	4.830,31
## Cento e setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos ##		Valor Retido 18.355,18
		Valor Líquido 174.857,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/12/2025	709	U			193.212,56
Quantidade: 1					Total:	193.212,56

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	193.212,56

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/12/2025. MARIANE DE SOUSA BARBOSA Secretário(a) de Assist. Social CPF: 880.456.415-68	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/12/2025, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 09/12/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013/2025

SIAFIC -



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 187-2024

EMPENHO: 196 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1454 Data do Sub-Empenho: 05/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 6507 - ECKO CONSTRUTORA LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75		Complemento: SALA 06	
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 19.846.470/0001-07	Insc. Estadual:	RG:	
Conta Corrente: 29052-1	Agência: 1047-2	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Reduzido:	2057.4451.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 30/04/2025
-----------	----------------	------------------------------	-----------------------------

Unidade:	905 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função:	08 - Assistência Social
Sub-Função:	244 - Assistência Comunitária
Programa:	006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Ação:	2.057 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.:	002-2024CE
Convênio:		Contrato:	413-2025
Patrimônio:	-		

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	222.087,34	7.912,66

- HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº413-2025
CONCORRENCIA EL ETRONICA Nº002-2024.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
194.573,54	193.212,56	1.360,98

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	193.212,56	193.212,56

Cento e noventa e três mil e duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos

193,212.56

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/12/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/12/2025

MARIANE DE SOUSA BARBOSA
Secretário(a) de Assist. Social
CPF: 880.456.415-68

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408



4020060

Santaluz-BA, 03 de dezembro de 2025

EMPRESA: ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, RIACHÃO DO JACUÍPE – BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO – ECKO CONSTRUTORA LTDA
FONTE DE PAGAMENTO: 1500
UNIDADE: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
AÇÃO: Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
ELEMENTO DE DESPESA: Obras e Instalações
HISTÓRICO: Contratação de empresa de engenharia para execução de construção de 30 unidades habitacionais para famílias de baixa renda do município de Santaluz-BA
Concorrência Eletrônica: 002/2024
Período de medição: 01/10/2025 a 31/10/2025
Nº da obra: 008/2025
Contrato: 413/2025
Nº da Nota Fiscal: 709
Valor: R\$ 193.212,56

Atenciosamente,



Mariane de Sousa Barbosa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 002/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:fiscalizacaotributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br
TEL:7532641552

Número da nota:
709
Data e hora de Emissão:
01/12/2025 08:36:00
Código de Verificação:
4c35919628



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19846470000107
Inscrição Municipal: 003.121/001-16
Nome/Razão Social: **ECKO CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO 75 SALA 06, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**
E-mail: **eckoconstrutora@hotmail.com**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**
CPF/CNPJ: 13807870000119
Inscrição Municipal: 00000000000000
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**
E-mail: **PMS@HOTMAIL.COM**

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) presta do(s)
☐ O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) obra(s) foi(ram) efetuada(s)
03.12.25
Assinatura
Francin de L. Pena

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZ-BA - MEDIÇÃO Nº 06 - CONFORME CONTRATO Nº 413/2025 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2024 - PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/10/2025 A 31/10/2025

SERVIÇO (50%) R\$ = 96.606,28
MATERIAIS (50%) R\$ = 96.606,28
INSS - RETIDO (11%) R\$ = 10.626,69
ISS (5%) = 4.830,31
IR (1,5%) R\$ = 2.898,18

BANCO CORA Nº 403 AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 4794913-8

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$193.212,56

CNAE:
4120400 - Construção de edifícios
Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 96.606,28	Base de cálculo (R\$): 96.606,28	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 4.830,31	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 10.626,69	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 2.898,18	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 174.857,38
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 11/2025 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 586556	CONTRIBUINTE 19736 - ECKO CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 19736
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO		NÚMERO: 75
COMPLEMENTO: SALA 06	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
R.G.:		ORGÃO
C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 2.898,18		Taxa Expediente R\$: 2.898,18
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 05/12/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 05/12/2025 11:14:26		DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 2.898,18	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.898,18	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.898,18
Taxa de Expediente: 2.898,18	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 2.898,18	Vlr. Devido com Desconto: 2.898,18	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.898,18
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 708 - DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81790000028 . 9

98183906202 . 4

51231010100 . 5

00058655607 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000028 . 9

98183906202 . 4

51231010100 . 5

00058655607 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 586556	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 05/12/2025 11:14:26	DATA VENCIMENTO: 31/12/2025
INSCRIÇÃO: 19736			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.898,18
ECKO CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.898,18



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 586557	CONTRIBUINTE 19736 - ECKO CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO		NÚMERO: 75
COMPLEMENTO: SALA 06	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE
C.N.P.J. / CPF: 19.846.470/0001-07		UF: BA
DOCUMENTOS		
R.G.:		ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		C.N.P.J. / CPF: 18.137.597/0001-86
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 96.606,28	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 4.830,31
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 4.830,31
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 05/12/2025	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 05/12/2025 11:16:58		DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 709 - DATA DE EMISSÃO: 01-12-2025		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 4.830,31
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 4.830,31



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000048 . 6

30313906202 . 8

60110010500 . 1

00058655712 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000048 . 6

30313906202 . 8

60110010500 . 1

00058655712 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 586557	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 05/12/2025 11:16:58	DATA VENCIMENTO: 10/01/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.830,31
ECKO CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.830,31



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BAHIA,

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:** nº 002/2024
- **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 187/2024

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS

A empresa **ECKO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 19.846.470/0001-07**, sediada na Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, sala 06 – Centro – Riachão do Jacuípe/BA, telefone (75) 9.9263-0491, e-mail eckoconstrutora@gmail.com, por intermédio de sua representante legal Sra. **Jacqueline de Oliveira Lima**, portadora do **CPF nº 814.761.245-15** e **RG nº 08.666.915-02**, vem, por meio desta, **DECLARAR E RETIFICAR** os dados bancários para pagamento da Nota Fiscal 709 e pagamentos futuros, anteriormente informados, conforme segue:

DADOS BANCÁRIOS ANTERIORES:

Banco: CORA – nº 403

Agência: 0001

Conta Corrente: 4794913-8

DADOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS (CORRETOS):

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1047-2

Conta Corrente: 29.052-1

Declaramos, ainda, que os dados acima informados são verdadeiros e estão aptos para fins de pagamento, faturamento e demais operações financeiras.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe-Ba, 08 de dezembro de 2025.

JACQUELINE DE
OLIVEIRA
LIMA:81476124515

Assinado de forma digital
por JACQUELINE DE
OLIVEIRA LIMA:81476124515
Dados: 2025.12.08 09:45:23
-03'00'

JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
CPF 814.761.245-15
SÓCIA ADMINISTRADORA

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e (75) 98123-1973

eckoconstrutora@gmail.com





CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - 6ª MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 187/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.

EMPRESA:

CNPJ:

MEDIÇÃO 06:

ECKO CONSTRUTORA LTDA

19.846.470/0001-07

R\$ 193.212,56

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	ACUMULADO	SALDO R\$	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	10865	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M²	8,00	R\$ 360,73	R\$ 2.885,84	0 R\$	0 R\$	0 R\$	8,00 R\$ 2.885,84	R\$ 2.885,84	0%
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERROS. AF_03/2024	M²	3465,13	R\$ 0,61	R\$ 2.113,73	0 R\$	0 R\$	0 R\$	3465,13 R\$ 2.113,73	R\$ 2.113,73	0%
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GUARNITO DE LAJULAS CORRIDAS PONTALETADAS A 0,20 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	480,00	R\$ 67,83	R\$ 32.558,40	0 R\$	0 R\$	0 R\$	480,00 R\$ 32.558,40	R\$ 32.558,40	0%
1.4	98458	SINAPI	APURIM. COM TILHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	844,20	R\$ 85,36	R\$ 72.060,91	0 R\$	0 R\$	0 R\$	844,20 R\$ 72.060,91	R\$ 72.060,91	0%
1.5	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_P4	UN	1,00	R\$ 5.889,27	R\$ 5.889,27	0 R\$	0 R\$	0 R\$	1,00 R\$ 5.889,27	R\$ 5.889,27	0%
1.6	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	70,00	R\$ 91,56	R\$ 6.409,20	0 R\$	0 R\$	0 R\$	70,00 R\$ 6.409,20	R\$ 6.409,20	0%
1.7	93684	SINAPI	EXECUÇÃO DE DESPILÓTI EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	20,00	R\$ 686,35	R\$ 13.727,00	0 R\$	0 R\$	0 R\$	20,00 R\$ 13.727,00	R\$ 13.727,00	0%
1.8	12031	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE DRENAGEM DE 150 MM, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 6.431,72	R\$ 12.863,44	0 R\$	0 R\$	0 R\$	2,00 R\$ 12.863,44	R\$ 12.863,44	0%
1.9	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	2,52	R\$ 863,53	R\$ 2.176,10	0 R\$	0 R\$	0 R\$	2,52 R\$ 2.176,10	R\$ 2.176,10	0%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	R\$ 140,68	R\$ 39.390,40	44 R\$ 6.199,92	22 R\$ 3.044,06	11 R\$ 1.547,48	165,00 R\$ 23.212,20	R\$ 13.384,60	37%
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1056,00	R\$ 43,23	R\$ 45.650,88	176 R\$ 7.638,48	88 R\$ 3.804,24	44 R\$ 1.980,96	640,00 R\$ 28.618,28	R\$ 17.032,62	37%
3			MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO. AF_06/2023	M³	1617,00	R\$ 72,15	R\$ 116.834,21	315 R\$ 22.750,95	210 R\$ 15.147,30	210 R\$ 15.147,30	1155,00 R\$ 83.310,15	R\$ 33.324,06	29%
3.2	106677	SINAPI	SECUNDARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	3465,17	R\$ 1,18	R\$ 4.088,90	622,5 R\$ 734,55	415 R\$ 486,70	800 R\$ 708,00	2487,50 R\$ 2.911,55	R\$ 1.177,25	29%
3.3	108328	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIERO - UNIDADE MOXIM). AF_07/2020	M3XMM	1617,00	R\$ 5,95	R\$ 9.681,15	315 R\$ 1.874,25	210 R\$ 1.249,50	210 R\$ 1.249,50	1155,00 R\$ 6.872,25	R\$ 2.148,90	29%
4			FUNDÇÃO										
4.1	83384	SINAPI	CAVALARIA MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M. AF_07/2021	M³	140,70	R\$ 102,22	R\$ 14.382,35	11 R\$ 1.431,08	0 R\$	0 R\$	126,58 R\$ 12.838,96	R\$ 1.445,39	10%
4.2	104915	SINAPI	ARMADURA DE SAPATA BLOCADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_03/2024	KG	4278,30	R\$ 12,76	R\$ 54.591,11	200 R\$ 2.552,00	200 R\$ 2.552,00	200 R\$ 2.552,00	3468,00 R\$ 40.410,88	R\$ 14.180,44	26%
4.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK + 25MPa, TRACO 13,3:27,7 (EM MASSA) DE 100% CIMENTO PORTLAND (CP II - F) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	105,80	R\$ 463,70	R\$ 49.060,72	0 R\$	0 R\$	0 R\$	84,48 R\$ 39.733,36	R\$ 9.793,34	20%
4.3.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X30 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	187,79	R\$ 671,29	R\$ 126.035,75	607 R\$ 40.277,40	0 R\$	0 R\$	126,77 R\$ 87.118,34	R\$ 25.517,41	23%
4.4	104917	SINAPI	ARMADURA DE SAPATA BLOCADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_03/2024	KG	176,10	R\$ 14,40	R\$ 2.535,84	0 R\$	0 R\$	0 R\$	140,88 R\$ 2.028,67	R\$ 507,17	23%
4.5	92756	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	1052,00	R\$ 13,18	R\$ 13.887,16	0 R\$	0 R\$	0 R\$	849,60 R\$ 11.197,73	R\$ 2.789,43	20%
4.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA, F = 17 MM. AF_06/2020	M²	360,00	R\$ 106,72	R\$ 38.419,20	0 R\$	0 R\$	0 R\$	288,00 R\$ 30.753,36	R\$ 7.665,84	20%
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAGOS. AF_09/2023	M²	900,00	R\$ 43,07	R\$ 38.763,00	700 R\$ 9.644,00	0 R\$	0 R\$	600 R\$ 29.833,65	R\$ 8.929,35	23%
4.8	94074	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA ALASTRO, TRACO 14,5:4,5 (EM MASSA) DE CIMENTO PORTLAND (CP II - F) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	27,97	R\$ 423,16	R\$ 11.836,34	0 R\$	0 R\$	0 R\$	27,96 R\$ 9.489,08	R\$ 1.247,27	20%



Franklin de L. Costa

Marcelo Mendes da Silva
CREA: Eng. Civil 005-D
BAHIA/BA 056087889



Maicelo Aguiar da Silva
Eng.º Civil - Nº 43.505-D
CREA/PA Nº 056087889

Projeto de Instalação de Furo - 1

1	94204 SINAPI	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1884,20	R\$	48,33	R\$	91.927,99		R\$	-		R\$	200	R\$	9.266,00	R\$	82.661,99	90%
2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIQUE E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1884,20	R\$	77,66	R\$	154.092,97		R\$	-		R\$	400	R\$	31.064,00	R\$	123.028,97	80%
3	101903 SINAPI	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL, BARRADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CEMENTO, VIGAS CONVENCIONAIS, AL TUBO 101 AL DA LAJE (ENCHIMENTO:CAPA) = (8+4). AF_11/2020, PA	M²	153,00	R\$	150,86	R\$	23.081,56		R\$	-		R\$	60	R\$	9.051,60	R\$	14.029,96	61%
4	94219 SINAPI	CLIMFERIA E ESPRAGO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARCAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	208,50	R\$	33,25	R\$	6.926,46		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	6.926,46	100%
5	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	198,00	R\$	42,22	R\$	8.359,56		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	8.359,56	100%
6	94227 SINAPI	PERFILADO PARA DIRECIONAL, BARRADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CEMENTO, VIGAS CONVENCIONAIS, AL TUBO 101 AL DA LAJE (ENCHIMENTO:CAPA) = (8+4). AF_11/2020, PA	M	540,00	R\$	62,88	R\$	28.600,20		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	28.600,20	100%
7	101965 SINAPI	ESQUADRIAS	M	159,00	R\$	93,49	R\$	14.864,91		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	14.864,91	100%
8	94670 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLOS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	144,00	R\$	190,66	R\$	27.457,92		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	27.457,92	100%
9	94696 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	7,50	R\$	360,64	R\$	2.929,80		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	2.929,80	100%
10	94676 SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTAL DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	R\$	600,35	R\$	30.021,00		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	30.021,00	100%
11	94676 SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTAL DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R\$	596,08	R\$	17.947,40		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	17.947,40	100%
12	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMPLUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150,00	R\$	142,23	R\$	21.334,50		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	21.334,50	100%
13	91296 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TIPO MAXIMAR, VÁCUA, PERADA OU SUPERPERADA, 180X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R\$	1.461,92	R\$	87.715,20		R\$	-		R\$	0	R\$	-	R\$	87.715,20	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Nº: 00000031

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ECKO CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 75 CENTRO
Complemento:	SALA 06
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	19846470000107
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00312100116

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 18/09/2025 14:47:17 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/12/2025

CHAVE DE VALIDAÇÃO: MTgBAJht

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:

<http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20255916436**

RAZÃO SOCIAL	
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	19.846.470/0001-07

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:12:30 do dia 18/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2026.

Código de controle da certidão: **F422.4632.FE40.3B1D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECKO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.846.470/0001-07

Certidão nº: 40714221/2025

Expedição: 16/07/2025, às 16:45:04

Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECKO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.846.470/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.846.470/0001-07
Razão Social: ECKO CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 75 SALA 06 / CENTRO /
RIACHÃO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305442143916068

Informação obtida em 21/11/2025 10:12:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.846.470/0001-07
Nome	ECKO CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	125024544 / Reinf CP 35234848623 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 527,43	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.410,17	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 355,59	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 39,76	R\$ 39,76
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.332,95	R\$ 39,76

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

-) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
-) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
-) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
CPF	814.761.245-15
Telefone	-





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.846.470 **Nome Empregador:** ECKO CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 785,30
Número da Guia: 0125110400824419-4 **Data Emissão:** 04/11/2025 11:22:24 (Brasília) **Emitida por:** 19.846.470/0001-07 - ECKO CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADILSON DOS SANTOS SILVA	1000000070	018.178.655-95	101	19/11/2025	Mensal	1.597,13	127,77	0,00	0,00	0,00	127,77
10/2025		JOAO VITOR SOARES DA SILVA	1000000068	077.317.655-12	101	19/11/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2025		MAEVILLY SOARES MERCES	1000000069	067.962.265-93	101	19/11/2025	Mensal	3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
10/2025		VAGNER SANTOS REIS	1000000071	133.078.655-60	101	19/11/2025	Mensal	1.683,15	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
				Total do Tomador		Sem Tomador		9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	785,30
				Total do Estabelecimento		19.846.470/0001-07		9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	785,30
						Total FGTS		9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	785,30



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 785,30

Empregador: 19.846.470 **Nome Empregador:** ECKO CONSTRUTORA LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

Número da Guia: 0125110400824419-4 **Data Emissão:** 04/11/2025 11:22:24 (Brasília) **Emitida por:** 19.846.470/0001-07 - ECKO CONSTRUTORA

Relação de Categorias

Estabelecimento:	19.846.470/0001-07									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	4	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30
		Total FGTS	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Empregador:

19.846.470

Nome Empregador:

ECKO CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

4

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

785,30

Número da Guia:

0125110400824419-4

Data Emissão:

04/11/2025 11:22:24 (Brasília)

Emitida por:

19.846.470/0001-07 - ECKO CONSTRUTORA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	19.846.470/0001-07	4	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30
		Total FGTS	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

19.846.470

Nome Empregador:

ECKO CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

4

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

785,30

Número da Guia:

0125110400824419-4

Data Emissão:

04/11/2025 11:22:24 (Brasília)

Emitida por:

19.846.470/0001-07 - ECKO CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		19.846.470/0001-07								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	4	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30
		Total FGTS	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

19.846.470

Nome Empregador:

ECKO CONSTRUTORA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

4

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

785,30

Número da Guia:

0125110400824419-4

Data Emissão:

04/11/2025 11:22:24 (Brasília)

Emitida por:

19.846.470/0001-07 - ECKO CONSTRUTORA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	4	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30	
	Total FGTS	9.816,28	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30	



CPF/CNPJ do Empregador
19.846.470

Nome/Razão Social do Empregador
ECKO CONSTRUTORA LTDA

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110400824419-4


Tag
19846470 10/2025 MENSAL

Valor a recolher
785,30

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	4	785,30	0,00	0,00	0,00	785,30
Total FGTS:		785,30	0,00	0,00	0,00	785,30
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						785,30
Observações						
Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 11:22:24 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 785,30

Transferência realizada

07/11/2025 13:02:58

De
ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ: 19846470000107
Ag 0001 - Cc 4794913-8

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação
E37880206202511071602WN8OR8WNM0B

Autenticação Cora

92b5f859-4fef-469d-9f12-61c35c1ccd9a

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 19.846.470/0001-07	Razão Social ECKO CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.8391755-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000399733094			Valor Total do Documento 39,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39,76			39,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	39,76			39,76

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 104/11/2025 11:24:28

85850000000 2 39760385253 1 23071625308 3 83917550411 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	39760385253 1	23071625308 3	83917550411 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.846.470/0001-07
Número: 07.16.25308.8391755-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 39,76



Pague com o PIX



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 39,76

Transferência realizada

07/11/2025 13:03:38

De

ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ: 19846470000107

Ag 0001 - Cc 4794913-8

Para

MINISTERIO DA FAZENDA

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E378802062025110716031NE2B0OAESE

Autenticação Cora

0aa963a3-062f-46d5-9278-97573c5cfac5

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ECKO CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	19.846.470/0001-07
Período apuração	09/2025	Número do Recibo	50000394669341
Data/Hora da Transmissão	17/10/2025 14:04:44	Identificação da Apuração de Débitos	125024544 / Reinf CP 35234848623 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO	Número	75
Complemento	SALA 06	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7532641426
Correio Eletrônico	ECKOCONSTRUTORA2016@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA	CPF	81476124515
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDREA DE OLIVEIRA LIMA		
CPF	01550937545	CRC	-
UF	-	Telefone	4834611000
Correio Eletrônico	eckoconstrutora@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	153,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 153,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	61,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	91,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 91,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	12,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,26		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	36,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	183,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 183,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.226,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.226,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	527,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 527,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	39,76		
Saldo a Pagar	39,76		



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	01/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	191
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	191
		SALDO DO PRAZO	175
DIA DA SEMANA	D S T C Q Q S		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	4	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	1	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	1	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	2	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO DE VALA

ARMAÇÃO DE SAPATA

ARMAÇÃO DE BALDRAME

CONCRETAGEM DE SAPATA

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	02/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	192
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	192
		SALDO DO PRAZO	174
DIA DA SEMANA	D S T Q S S S		

	Sunny	Cloudy	Rainy	Foggy	Snowy	Thunderstorm

CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	4	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	1	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	1	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	2	Caminhão Munk	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

COMENTÁRIOS

[illegible]

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão
 CONTRATADA: [illegible] NOME: [illegible] CPF: [illegible] RG: [illegible]	 [illegible]



Fraklin Delano



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	04/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	194
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	166
		SALDO DO PRAZO	200
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

[illegible]

CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA						EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO					
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante		Caminhão Pipa			
Engenheiro de Produção		Armador		Retro Escavadeira			
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro		Caminhão Basculante			
Técnico de segurança		Pedreiro		Caminhão Munck			
Auxiliar Administrativo		Encarregado		Caçamba			
Comprador		Vigilante		Compactador			
Topógrafo		Operador retro					
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.		

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	05/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	195
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	195
		SALDO DO PRAZO	171
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S		

			
---	---	---	---

CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA						EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO					
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante		Caminhão Pipa			
Engenheiro de Produção		Armador		Retro Escavadeira			
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro		Caminhão Basculante			
Técnico de segurança		Pedreiro		Caminhão Munck			
Auxiliar Administrativo		Encarregado		Caçamba			
Comprador		Vigilante		Compactador			
Topógrafo		Operador retro					
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.		

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE


COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	06/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	196
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	196
		SALDO DO PRAZO	170
DIA DA SEMANA	D ☐ S ☒ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S ☐		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	4	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	1	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	1	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	2	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

COMENTÁRIOS

[illegible]

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão
 MARCELO ALVES DA SILVA CREA 10.000.000-00 10.000.000-00	

[Handwritten signature]












EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	11/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	201
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	201
		SALDO DO PRAZO	165
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		


DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão



Frar klm dell'ana
Zugentotto
L. 15.000/15.000



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	13/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	203
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	203
		SALDO DO PRAZO	163
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

			
---	---	---	---

MÃO DE OBRA

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ARMAÇÃO DE SAPATA
ARMAÇÃO DE BALDRAME
CONCRETAGEM DE SAPATA
ARMAÇÃO DE PILAR
CHAPISCO
APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE

COMENTÁRIOS

[illegible]


Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão
 MARIANA RODRIGUES DA SILVA CREA RJ 125.171-0/2014 02/06/2014 14:00:00	

Franklin de Freitas



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Visto
SANTO AMARILHÃO

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	16/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	206
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	206
		SALDO DO PRAZO	160
DIA DA SEMANA	D S T Q C S S		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

COMENTÁRIOS

[illegible]

Assinatura Contratada

11/11/2019 14:14:14
 11/11/2019 14:14:14
 11/11/2019 14:14:14

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin del Corral



DIÁRIO DE OBRAS



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	17/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	207
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	207
		SALDO DO PRAZO	159
DIA DA SEMANA	D S F Q Q S S		

CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	5	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	1	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	1	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	3	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ARMAÇÃO DE BALDRAME

APLICAÇÃO DE CHAPISCO

ARMAÇÃO DE PILAR

CONCRETAGEM DE PILAR

ALVENARIA

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão





EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	19/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	209
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	209
		SALDO DO PRAZO	157
DIA DA SEMANA	D ☒ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ T		

DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	T
---------------	---	---	---	---	---	---	---



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

ADMINISTRATIVO N° 107/2024					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante		Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador		Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro		Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro		Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado		Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS						Pluviometria (mm)
SOL		NUBLADO		CHUVA		
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE


COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	20/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	210
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	210
		SALDO DO PRAZO	156
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	5	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	1	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	1	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	3	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	

CONDICÕES METEOROLÓGICAS						Pluviometria (mm)
SOL		NUBLADO		CHUVA		
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ARMAÇÃO DE BALDRAME
APLICAÇÃO DE CHAPISCO
CONCRETAGEM DE PILAR
ALVENARIA
CHAPISCO

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão
 MARCELO JOSÉ DE SOUZA CREA RJ 000000000-0 000000000-0	

Franklin del Corno



Franklin del Corral



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	22/10/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	212
		PRAZO CONTRATUAL (DAS)	366
		DIAS CORRIDOS	212
		SALDO DO PRAZO	154
DIA DA SEMANA	D S T C Q S S		

Date: _____		Time: _____		Location: _____		Weather: _____	
							

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	5	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	1	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	1	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	3	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDICÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

COMENTÁRIOS

[illegible]

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Author's address: Department of Mathematics,
University of California, San Diego,
La Jolla, CA 92037, U.S.A.
E-mail: bill@math.ucsd.edu

Franklin de 1822





DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	C	S	S
---------------	---	---	---	---	---	---	---



MÃO DE OBRA		TRANSPORTES
-------------	--	-------------

[illegible]**TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS**

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
TEMP.	HUMEDAD	GRANIZO	Pluviometría

NOTA	TESTE	TESTE	TESTE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	

REBOCO

COMENTÁRIOS

Franklin Delano





DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	C	S	S
---------------	---	---	---	---	---	---	---



MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTOS
-------------	--------------

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA		
-------------------------	--	--

CONDICÕES METEOROLÓGICAS	
--------------------------	--

DATA	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ NO ☐ SI	
--	--

[illegible]

~~Marthin del caso~~














Markham & Co
Yorkshire
London W.C.1
1925-1

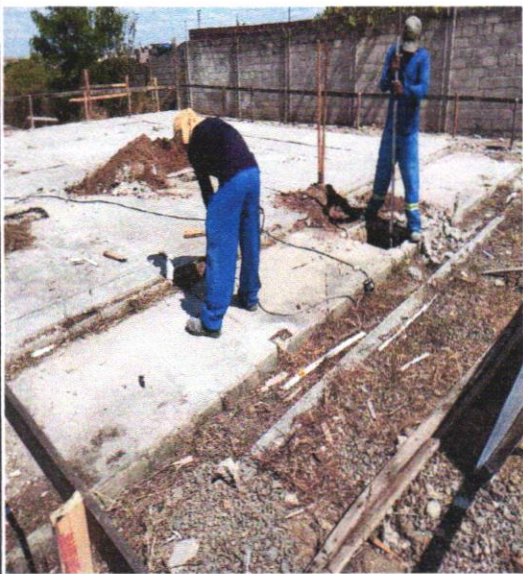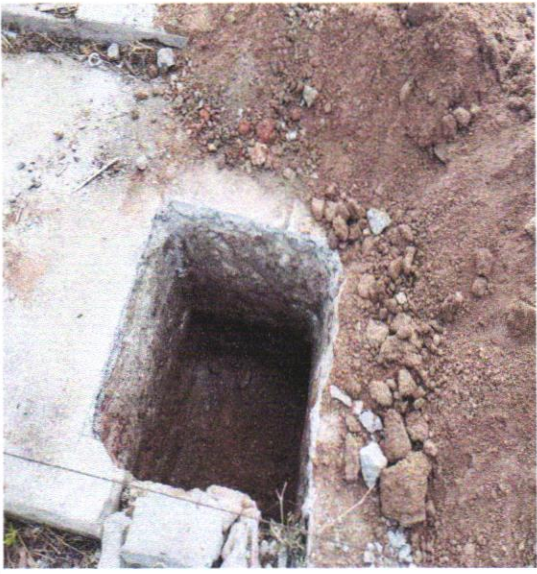
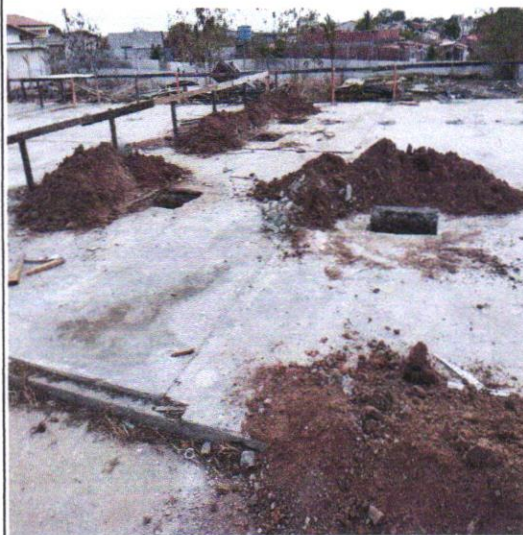


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025 ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06			
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA ISOLADA		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA ISOLADA	
			
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA ISOLADA		ARMAÇÃO DE SAPATA	
			


 Franklin de Souza
 Engº Civil
 CREA/BA Nº 13.505-D
 0500878889


 Marcelo Vicente da Silva
 Engº Civil
 CREA/BA Nº 13.505-D
 0500878889



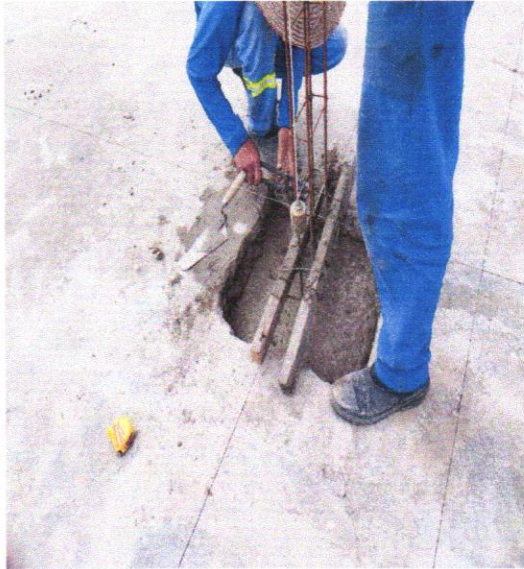
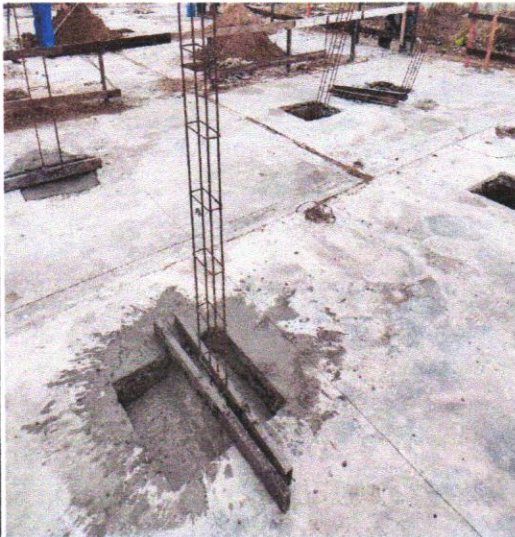


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024	
	PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025	
ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06		
ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DE SAPATA	ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DE SAPATA	
		
ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DE SAPATA	ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DE SAPATA	
		

Frazer Viana de Jesus
Engenheiro
CREA/BA Nº 03.605-D
0500878889

Marcelo Vazente da Silva
Engº Civil
CREA/BA Nº 03.605-D
0500878889

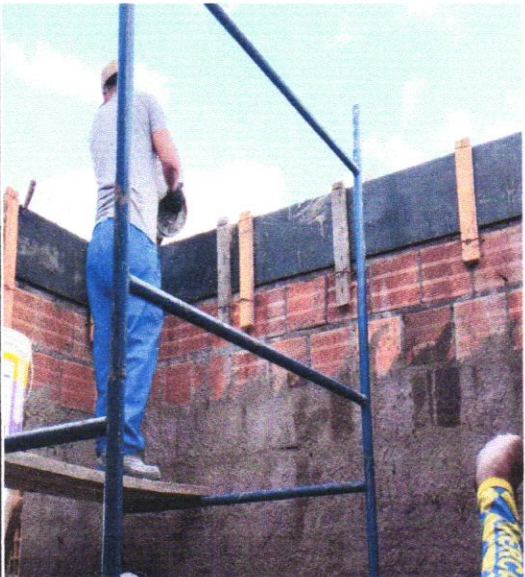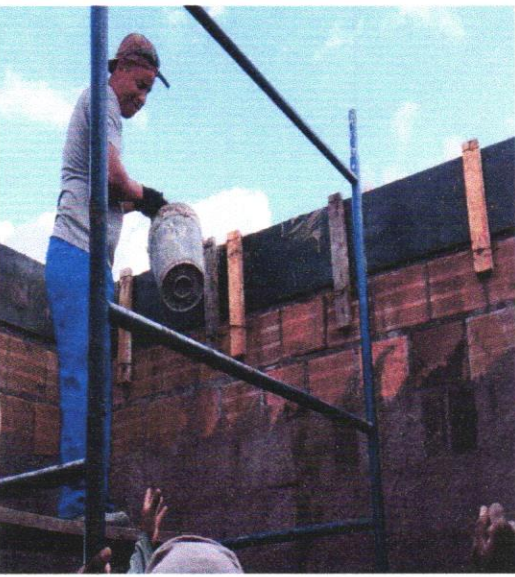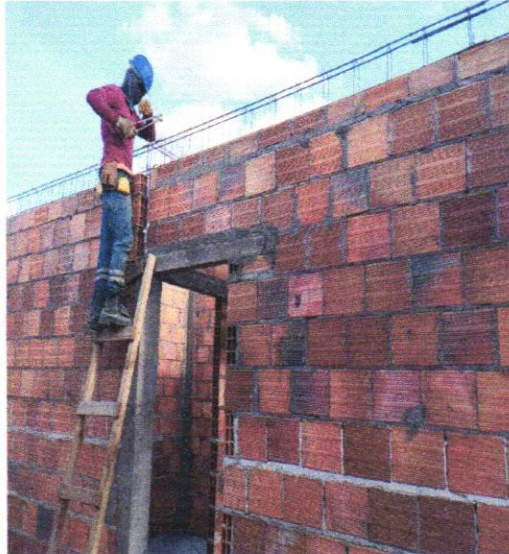
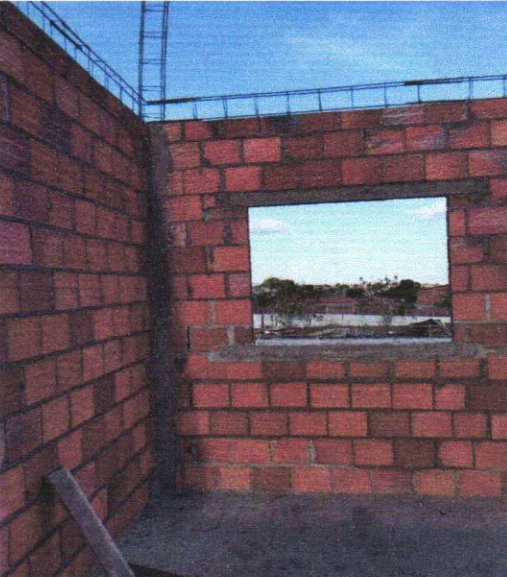


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025 ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06			
CONCRETAGEM DE VIGAS		CONCRETAGEM DE VIGAS	
			
ARMAÇÃO DE VIGAS		ARMAÇÃO DE VIGAS	
			

Franklin de Jesus
Engenheiro

Marcelo Vicente da Silva
Eng.º Civil
CREA / BA Nº 43.505-D
Inscrição nº 0500878889



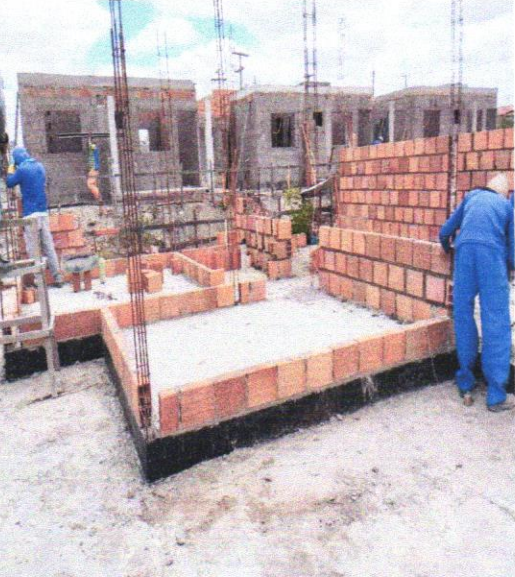
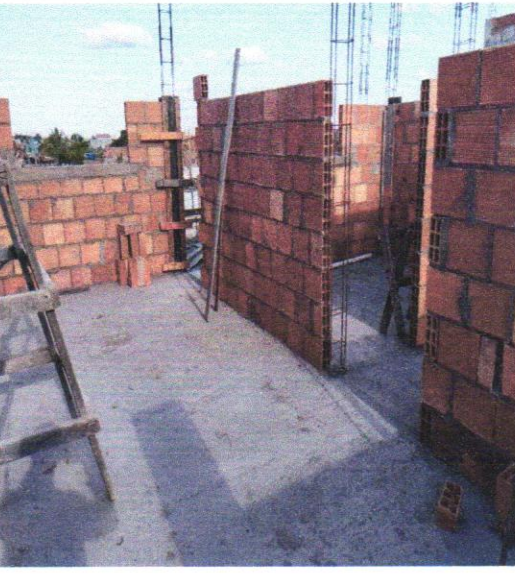


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025 ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06			
LEVANTE DE ALVENARIA		LEVANTE DE ALVENARIA	
			
LEVANTE DE ALVENARIA		LEVANTE DE ALVENARIA	
			

Francisco de Paula
 Engenheiro
 CREA/BA Nº 143.505-D
 0500878889

Marcelo Vicente da Silva
 Engº Civil
 CREA/BA Nº 143.505-D
 0500878889

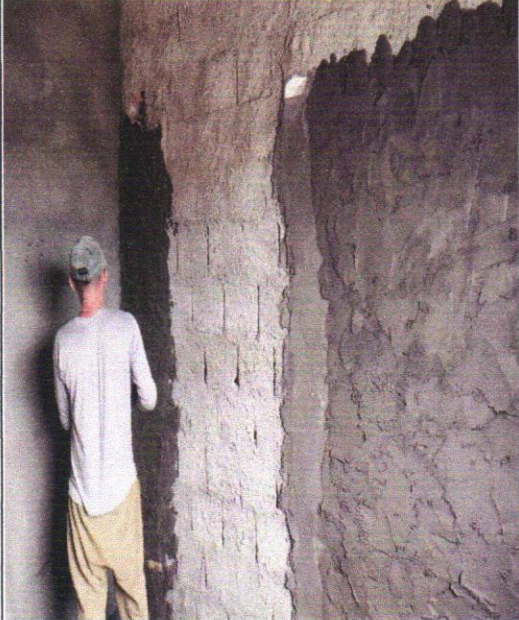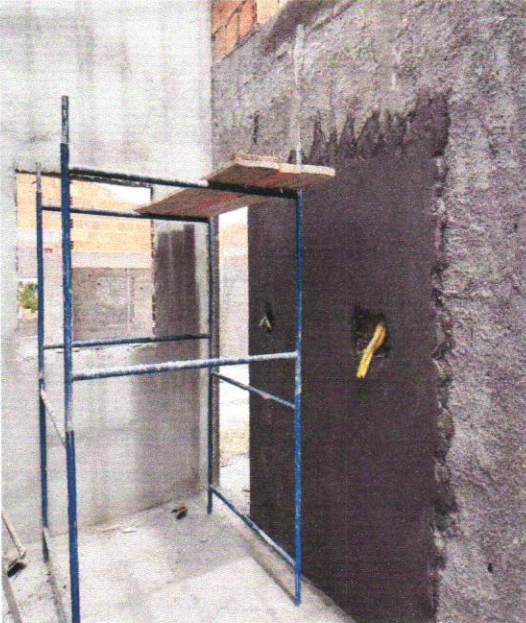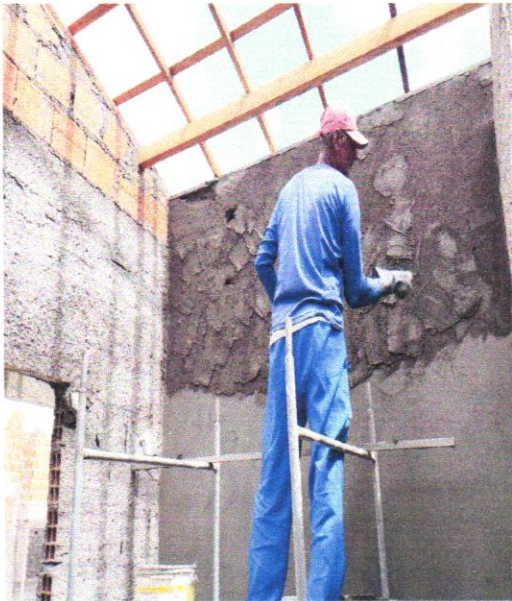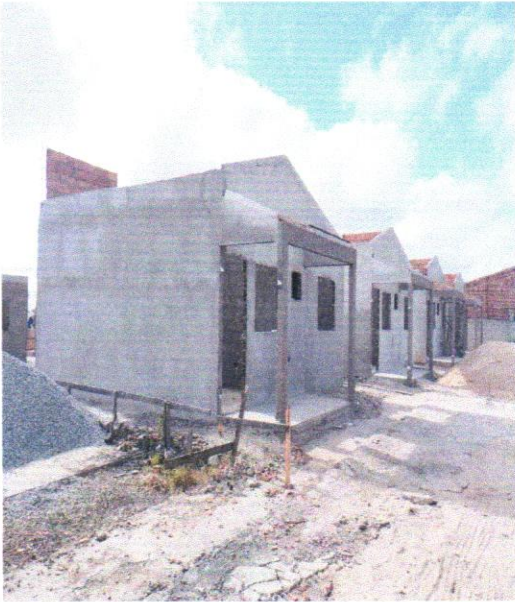



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024	
	PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025 ECKO CONSTRUTORA	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06		
APLICAÇÃO DE REBOCO	APLICAÇÃO DE REBOCO	
		
APLICAÇÃO DE REBOCO	APLICAÇÃO DE REBOCO	
		


[Handwritten signature]
Fiança de
Santuz
05/10/2025

[Handwritten signature]
Marcelo Viana da Silva
Engº Civil
CREA / BA Nº 43.505-D
Registro nº 0500878889



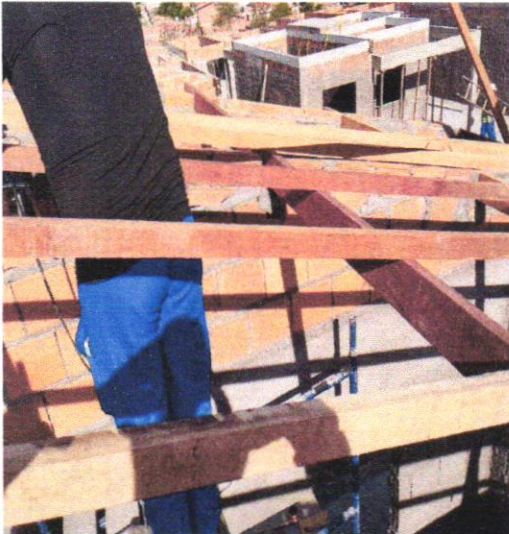



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025 ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06			
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO		INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO	
			
MADEIRAMENTO DO TELhado		MADEIRAMENTO DO TELhado	
			


 Franklin de Lencina
 Engº Civil
 CREA / BA Nº 43.505-D
 Matrícula nº 0500878889


 Marcelo Vicente da Silva
 Engº Civil
 CREA / BA Nº 43.505-D
 Matrícula nº 0500878889

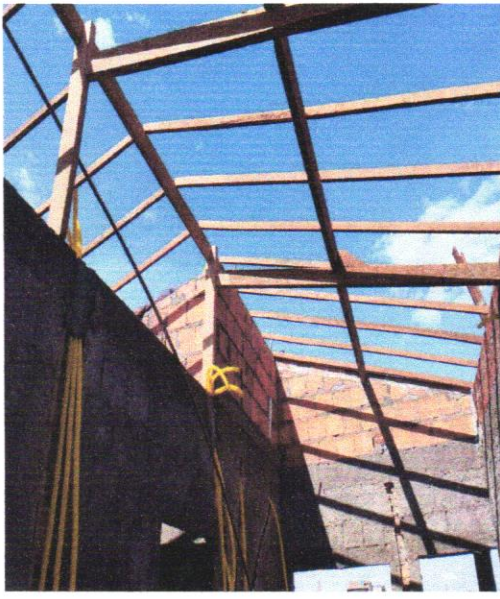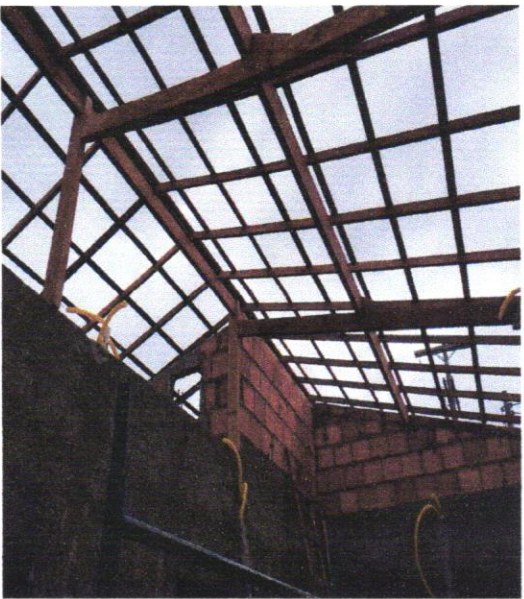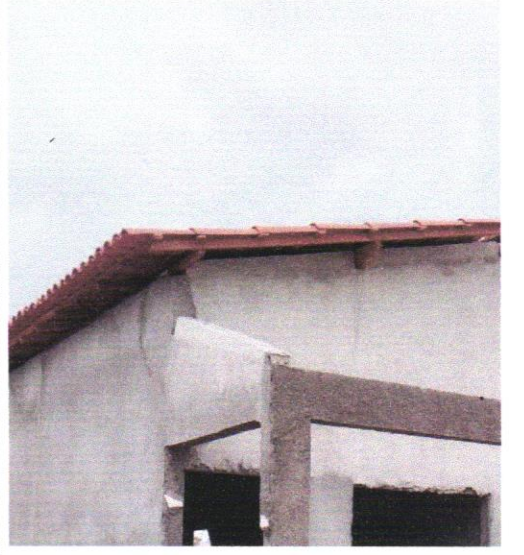

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025 ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06			
MADEIRAMENTO DO TELhado		MADEIRAMENTO DO TELhado	
			
TELHAMENTO		TELHAMENTO	
			

Franklin de Lencina



 Marcelo Vicente da Silva
 Eng.º Civil
 CREA / BA Nº 143.505-D
 Registro nº 0500878889

