

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 148 / 2022 Data do Empenho: 18/05/2022 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 0288-7 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.:	003-2020	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	130-2020	152.300,00	152.290,72	9,28
Patrimônio:						

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020. REFERENTE A MEDIÇÃO 15. PERÍODO 10/05/2022 A 18/05/2022. NF 202230.

Data do Empenho: 18/05/2022 Data do Liquidação: 18/05/2022



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	3.045,81
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	3.807,27
##	Cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos	Valor Retido 6.853,08
##		Valor Líquido 145.437,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/05/2022	202230	U			152.290,72

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	152.290,72

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/05/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/05/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 20/05/22

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



2892651

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 148 / 2022 **Data do Empenho: 18/05/2022** **TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal**

FORNECEDOR
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 **Complemento:** CASA
Bairro: CONTORNO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 19.650.110/0001-27 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 8681-3 **Agência:** 0288-7 **Banco:** 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)


Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 003-2020	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 130-2020	152.300,00	152.290,72	9,28
Patrimônio: -				


HISTÓRICO
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020.


Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-05-18	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	152.290,72	152.290,72

Cento e cinquenta e dois mil e duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos ## **152.290,72**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/05/2022. Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/05/2022


 NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula : 0598


 NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula : 6408


Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202230
Data da Competência: Maio/2022
Data e Hora da Emissão: 18/05/2022 10:02:00
Código Verificação: 1FE518F7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 130/2020 SENDO 40% SERVIÇOS (R\$ 60.916,29) E 60% (R\$ 91.374,43)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 18/05/2022 Anderson dos Santos Bispo

Engenheiro Civil

CREA-BA nº 051753514-9

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 152.290,72

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 152.290,72	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 91.374,43	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 60.916,29	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 3.045,81	DESC. COND: R\$ 0,00
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 3.807,27	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 145.437,64
------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870.0001-19



Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.05.2022


OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL		
MEDICÃO 15													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00	-	-	R\$ 6,00	R\$ 600,00	100,00%	6,00	R\$ 600,00	100,00%
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.490,42	R\$ 5,00	R\$ 7.452,10	-	-	R\$ 1.490,42	R\$ 7.452,10	100,00%	1.490,42	R\$ 7.452,10	100,00%
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	360,80	R\$ 19,00	R\$ 6.855,20	-	-	R\$ 360,80	R\$ 6.855,20	100,00%	360,80	R\$ 6.855,20	100,00%
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.560,00	R\$ 0,93	R\$ 1.450,80	-	-	R\$ 1.560,00	R\$ 1.450,80	100,00%	1.560,00	R\$ 1.450,80	100,00%
1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA)	UN	1,00	R\$ 1.078,24	R\$ 1.078,24	-	-	R\$ 1,00	R\$ 1.078,24	100,00%	1,00	R\$ 1.078,24	100,00%
1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	35,00	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	-	-	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00	100,00%	35,00	R\$ 7.000,00	100,00%
2 FUNDACOES E ESTRUTURAS													
2.1	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	m³	122,93	R\$ 83,42	R\$ 10.254,82	-	-	R\$ 122,93	R\$ 10.254,82	100,00%	122,93	R\$ 10.254,82	100,00%
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPa. AF 01/2017	m³	103,61	R\$ 1.806,00	R\$ 187.117,86	14,16	R\$ 25.571,16	R\$ 103,61	R\$ 187.117,86	100,00%	103,61	R\$ 187.117,86	100,00%
2.3	LAJE PREMOULIDA PARA PISO ESP 16 COM CAMADA DE CONCRETO ESP 6CM	m²	220,59	R\$ 162,97	R\$ 35.949,55	-	-	R\$ 220,59	R\$ 35.949,55	100,00%	220,59	R\$ 35.949,55	100,00%
2.4	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFL 16 X 3 X 38	KG	4.447,20	R\$ 6,27	R\$ 27.883,94	-	-	R\$ 4.447,20	R\$ 27.883,94	100,00%	4.447,20	R\$ 27.883,94	100,00%
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LUJES/DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS. 3 DEMIÇOS	m²	265,13	R\$ 36,16	R\$ 9.587,10	-	-	R\$ 265,13	R\$ 9.587,10	100,00%	265,13	R\$ 9.587,10	100,00%
3 COBERTURA													
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.058,88	R\$ 89,16	R\$ 94.409,74	56,43	R\$ 5.031,30	R\$ 1.058,88	R\$ 94.409,74	100,00%	1.058,88	R\$ 94.409,74	100,00%
3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 06/2016	m²	1.058,88	R\$ 156,38	R\$ 165.587,55	56,43	R\$ 8.824,52	R\$ 1.058,88	R\$ 165.587,55	100,00%	1.058,88	R\$ 165.587,55	100,00%
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	112,59	R\$ 94,07	R\$ 10.591,34	-	-	R\$ 112,59	R\$ 10.591,34	100,00%	112,59	R\$ 10.591,34	100,00%
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	119,09	R\$ 24,41	R\$ 2.906,99	-	-	R\$ 119,09	R\$ 2.906,99	100,00%	119,09	R\$ 2.906,99	100,00%
4 PAREDES E FECHAMENTOS													
4.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CERMAMICOS FUJADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ARELHO ALMOXARRE OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSEMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2016	m²	2.843,11	R\$ 42,00	R\$ 119.410,62	54,11	R\$ 2.272,62	R\$ 2.843,11	R\$ 119.410,62	100,00%	2.843,11	R\$ 119.410,62	100,00%
4.2	FORRO DE CONCRETO (TELA VIZADO), 7X50X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	22,01	R\$ 74,41	R\$ 1.637,76	17,93	R\$ 1.334,17	R\$ 22,01	R\$ 1.637,76	100,00%	22,01	R\$ 1.637,76	100,00%
4.3	ALVENARIA BARRILHO CERMAMICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 2CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	29,60	R\$ 101,95	R\$ 3.017,72	-	-	R\$ 29,60	R\$ 3.017,72	100,00%	29,60	R\$ 3.017,72	100,00%
4.4	DIVISÓRIA EM GOMARITO BRANCO, FOLDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO EXCLUSIVELY ERRAGENS	m²	40,32	R\$ 221,07	R\$ 8.913,54	-	-	R\$ 40,32	R\$ 8.913,54	100,00%	40,32	R\$ 8.913,54	100,00%
4.5	BRIDE DE FERRO EMBARÇA, MATA 3/16"	m²	339,10	R\$ 308,51	R\$ 104.717,47	234,00	R\$ 72.261,54	R\$ 205,55	R\$ 88.489,51	100,00%	205,55	R\$ 88.489,51	100,00%
4.6	SHAPEM DE CONCRETO PARA FEITE COM ACABAMENTO DESEMPENHO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (VAZADO) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL	M	349,65	R\$ 26,04	R\$ 9.104,89	-	-	R\$ 349,65	R\$ 9.104,89	100,00%	349,65	R\$ 9.104,89	100,00%
4.7	FORRO EM DRIVATA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 03/2017 P	m²	534,97	R\$ 53,00	R\$ 28.353,41	-	-	R\$ 533,00	R\$ 28.249,00	100,00%	533,00	R\$ 28.249,00	100,00%
4.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF 05/2017	M	629,25	R\$ 2,17	R\$ 1.365,47	-	-	R\$ 628,00	R\$ 1.362,76	100,00%	628,00	R\$ 1.362,76	100,00%
5	PISO												

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9




Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 18.05.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUERIDO)	V. TOTAL (REQUERIDO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL
MEDICÃO 15											
5.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	m²	1.490,42	R\$ 3,47	R\$ 5.171,76						
5.2	PREPARO MANUAL ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA/ NÃO INDUSTRIAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, PISO INDUSTRIAL, ESPESURA 8CM, AF_06/2014	m²	1.490,42	R\$ 40,73	R\$ 60.704,81						
5.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	m²	1.427,48	R\$ 77,40	R\$ 110.486,95						
5.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	629,25	R\$ 6,00	R\$ 3.775,50						
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	28,80	R\$ 400,00	R\$ 11.520,00						
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	m²	137,23	R\$ 43,63	R\$ 5.987,34						
5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	1.256,73	R\$ 35,50	R\$ 44.613,97	700,00	R\$ 24.850,00	735,75	R\$ 26.119,13	520,98	R\$ 18.994,84
5.8	EMBAZAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	5,36	R\$ 20,00	R\$ 107,20						
6	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	5.686,22	R\$ 2,00	R\$ 11.372,44	108,22	R\$ 216,44	5.686,22	R\$ 11.372,44	-	R\$ -
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 28X36 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 9 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	487,10	R\$ 30,00	R\$ 14.613,00			487,10	R\$ 14.613,00		R\$ -
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	886,87	R\$ 25,00	R\$ 22.171,73			886,87	R\$ 22.171,73		R\$ -
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 28X36 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 9 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	230,00	R\$ 40,66	R\$ 9.351,80			230,00	R\$ 9.351,80		R\$ -
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00			88,90	R\$ 7.112,00		R\$ -
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 28X36 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 9 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	4.047,22	R\$ 4,00	R\$ 16.188,88			4.047,22	R\$ 16.188,88		R\$ -
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAINOS SEM VÃOS, AF_06/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00			88,90	R\$ 7.112,00		R\$ -
6.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	4.047,22	R\$ 4,00	R\$ 16.188,88			4.047,22	R\$ 16.188,88		R\$ -
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SEPARA ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	4.581,22	R\$ 2,12	R\$ 9.712,19			4.581,22	R\$ 9.712,19		R\$ -
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOAS, AF_11/2016	m²	5.051,06	R\$ 12,50	R\$ 63.138,25			5.051,06	R\$ 63.138,25		R\$ -
6.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMOAS, SOBRE FUNDO DE LIXAMENTO	m²	221,60	R\$ 19,16	R\$ 4.255,96			221,60	R\$ 4.255,96		R\$ -
6.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMOAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	345,67	R\$ 22,29	R\$ 7.704,98			345,67	R\$ 7.704,98		R\$ -
6.12	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMOAS SOBRE MASSA ACRILICA	m²	67,50	R\$ 10,03	R\$ 677,03			67,50	R\$ 677,03		R\$ -

Anderson dos Santos Bisparco
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

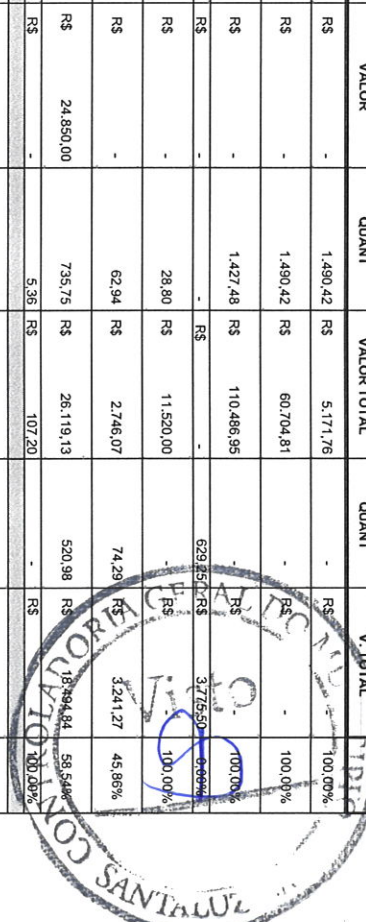


Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.05.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT		V. TOTAL		EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%		
				(R\$EQUILIBRADO)	(R\$EQUILIBRADO)	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL					
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS.	m²	288,67	R\$	22,28	R\$	6.431,57	R\$	-	234,56	R\$	5.226,00	54,11	R\$	1.205,57	100,00%
6.14	ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	75,06	R\$	68,97	R\$	5.176,89	R\$	-	75,06	R\$	5.176,89	-	R\$	-	100,00%
7	ESQUADRIAS															
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	14,00	R\$	539,77	R\$	7.556,78	R\$	-	14,00	R\$	7.556,78	-	R\$	-	100,00%
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	2,00	R\$	579,33	R\$	1.158,66	R\$	-	2,00	R\$	1.158,66	-	R\$	-	100,00%
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	28,00	R\$	607,45	R\$	17.008,60	R\$	-	28,00	R\$	17.008,60	-	R\$	-	100,00%
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	2,00	R\$	634,92	R\$	1.269,84	R\$	-	2,00	R\$	1.269,84	-	R\$	-	100,00%
7.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO.	UN	44,00	R\$	55,60	R\$	2.446,40	R\$	-	44,00	R\$	2.446,40	-	R\$	-	100,00%
7.6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VÍDEO	m²	245,64	R\$	194,03	R\$	47.661,53	R\$	-	245,64	R\$	47.661,53	-	R\$	-	100,00%
7.7	VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	245,64	R\$	157,00	R\$	38.565,48	R\$	-	245,64	R\$	38.565,48	-	R\$	-	100,00%
7.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VÍDEO TEMPERADO, UMA FOHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, CASCARUCHINHO SEMI-OCIA E PUXADOR	UN	1,00	R\$	400,00	R\$	400,00	R\$	-	1,00	R\$	400,00	-	R\$	-	100,00%
7.9	VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	13,65	R\$	150,00	R\$	2.047,50	R\$	-	13,65	R\$	2.047,50	-	R\$	-	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
8.1	PORTA DE TUBINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO EXCETO LUMINÁRIA E LÂMPADA, AF_01/2015	UN	148,00	R\$	101,24	R\$	14.983,52	R\$	-	148,00	R\$	14.983,52	-	R\$	-	100,00%
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 19A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2015	UN	90,00	R\$	137,00	R\$	12.330,00	R\$	-	90,00	R\$	12.330,00	-	R\$	-	100,00%
8.3	TOMADA PARA TELEFONE, DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$	20,41	R\$	122,46	R\$	-	6,00	R\$	122,46	-	R\$	-	100,00%
8.4	FIO TELEFÔNICO FIO 6MM, 2 CONDUITORES TIPO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$	1,32	R\$	422,40	R\$	-	320,00	R\$	422,40	-	R\$	-	100,00%
8.5	CAIXA REI ANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 METRO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	230,00	R\$	7,08	R\$	1.628,40	R\$	-	230,00	R\$	1.628,40	-	R\$	-	100,00%
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450V/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	570,77	R\$	3,15	R\$	1.797,93	R\$	-	350,77	R\$	1.104,93	-	R\$	-	100,00%
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450V/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	340,00	R\$	4,25	R\$	1.445,00	R\$	-	340,00	R\$	1.445,00	-	R\$	-	100,00%



Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHÁ, 25, Contorno, Quemadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 18.05.2022

OBRA Nº 001/2021
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
CONTRATO: Nº 130/2020
P. ADM. Nº 038-2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020

MEDICÃO 15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUERIDO)	V. TOTAL (REQUERIDO)	EXEC. PERÍODO		PERÍODO: 10.05.2022 A 18.05.2022		ACUMULADO		SALDO		
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122015	M	120,00	R\$ 6,80	R\$ 816,00	-	-	120,00	R\$ 816,00	-	-	120,00	R\$ 816,00	100,00%
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122015	M	120,00	R\$ 10,38	R\$ 1.245,60	-	-	120,00	R\$ 1.245,60	-	-	120,00	R\$ 1.245,60	100,00%
8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122015	M	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00	-	-	300,00	R\$ 1.320,00	-	-	300,00	R\$ 1.320,00	100,00%
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122015	M	300,00	R\$ 6,02	R\$ 1.806,00	-	-	300,00	R\$ 1.806,00	-	-	300,00	R\$ 1.806,00	100,00%
8.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122015	M	280,00	R\$ 5,98	R\$ 1.674,40	-	-	280,00	R\$ 1.674,40	-	-	280,00	R\$ 1.674,40	100,00%
8.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 10,71	R\$ 214,20	-	-	20,00	R\$ 214,20	-	-	20,00	R\$ 214,20	100,00%
8.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 16,07	R\$ 241,05	-	-	15,00	R\$ 241,05	-	-	15,00	R\$ 241,05	100,00%
8.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 476,74	R\$ 953,48	1,00	R\$ 476,74	2,00	R\$ 953,48	-	-	2,00	R\$ 953,48	100,00%
8.16	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA/PALANQUINERBOCALAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	26,00	R\$ 53,54	R\$ 1.392,04	-	-	-	-	-	-	26,00	R\$ 1.392,04	0,00%
8.17	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	111,00	R\$ 51,45	R\$ 5.710,95	60,00	R\$ 3.087,00	60,00	R\$ 3.087,00	-	-	111,00	R\$ 5.710,95	54,05%
8.18	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	111,00	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47	-	-	60,00	R\$ 1.126,20	-	-	51,00	R\$ 957,27	54,05%
8.19	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOUR METÁLICO 400W	UN	8,00	R\$ 193,82	R\$ 1.550,56	-	-	-	-	-	-	8,00	R\$ 1.550,56	0,00%
8.20	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 92,22	R\$ 92,22	-	-	1,00	R\$ 92,22	-	-	1,00	R\$ 92,22	100,00%
8.21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NERBA TRIFÁSICA 50A COM PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 741,31	R\$ 741,31	-	-	1,00	R\$ 741,31	-	-	1,00	R\$ 741,31	100,00%
8.22	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UN	16,00	R\$ 41,80	R\$ 668,80	-	-	16,00	R\$ 668,80	-	-	16,00	R\$ 668,80	100,00%
8.23	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	32,00	R\$ 50,99	R\$ 1.631,68	-	-	-	-	-	-	32,00	R\$ 1.631,68	0,00%
8.24	TERMINAL, NERRO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE HIAÇCAO H = 30CM	UN	32,00	R\$ 25,47	R\$ 815,04	-	-	-	-	-	-	32,00	R\$ 815,04	0,00%
8.25	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 39,91	R\$ 12.771,20	-	-	320,00	R\$ 12.771,20	-	-	320,00	R\$ 12.771,20	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
9.1	PONTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASCOE CALUMNAMENTO EM ALVENARIA, AF 122014	UN	52,00	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00	-	-	52,00	R\$ 5.200,00	-	-	52,00	R\$ 5.200,00	100,00%
9.2	TUBO, PVC, SOLIDAREL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCEMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	M	24,00	R\$ 9,67	R\$ 232,08	-	-	24,00	R\$ 232,08	-	-	24,00	R\$ 232,08	100,00%
9.3	TUBO, PVC, SOLIDAREL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCEMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	M	58,00	R\$ 13,84	R\$ 802,72	-	-	58,00	R\$ 802,72	-	-	58,00	R\$ 802,72	100,00%
9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLIDAREL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 4,71	R\$ 56,52	-	-	12,00	R\$ 56,52	-	-	12,00	R\$ 56,52	100,00%
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLIDAREL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	14,00	R\$ 7,26	R\$ 101,64	-	-	14,00	R\$ 101,64	-	-	14,00	R\$ 101,64	100,00%
9.6	CAIXA DE REGULAÇÃO, PVC, SOLIDAREL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	24,00	R\$ 10,24	R\$ 245,76	-	-	24,00	R\$ 245,76	-	-	24,00	R\$ 245,76	100,00%



Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHÁ, 25, CONTORNO
 48.360-000 - QUEMADAS-BA


Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quêimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 18.05.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/03/2021
 CONTRATO: Nº 038/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



MEDICÃO 13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
9.7	10EJLHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 10,63	R\$ 233,86	-	-	22,00	R\$ 233,86	-	-	100,00%
9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 51,97	R\$ 207,88	-	-	4,00	R\$ 207,88	-	-	100,00%
9.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	R\$ 24,65	R\$ 345,10	-	-	14,00	R\$ 345,10	-	-	100,00%
9.10	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 58,00	R\$ 116,00	-	-	-	R\$ -	-	-	100,00%
9.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTREGADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 411,29	R\$ 411,29	-	-	-	R\$ -	-	-	100,00%
9.12	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4) 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 107,94	R\$ 107,94	-	-	-	R\$ -	-	-	100,00%
9.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 17,30	R\$ 69,20	-	-	4,00	R\$ 69,20	-	-	100,00%
9.14	SOLDADVEL, DN 40 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 24,18	R\$ 96,72	-	-	4,00	R\$ 96,72	-	-	100,00%
9.15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV	UN	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	-	-	-	R\$ -	-	-	100,00%
9.16	BOMBA REGALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00	R\$ 616,43	R\$ 616,43	-	-	-	R\$ -	-	-	100,00%
9.17	RESERVAÇÃO 2000L EM PVC	UN	4,00	R\$ 572,47	R\$ 2.289,88	-	-	4,00	R\$ 2.289,88	-	-	100,00%
9.18	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CAP 20.000L ENTERRADA	UN	1,00	R\$ 6.938,78	R\$ 6.938,78	-	-	-	R\$ -	-	-	100,00%
9.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 19,46	R\$ 311,36	-	-	16,00	R\$ 311,36	-	-	100,00%
9.20	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 6,97	R\$ 111,52	-	-	16,00	R\$ 111,52	-	-	100,00%
9.21	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	58,00	R\$ 13,00	R\$ 754,00	-	-	58,00	R\$ 754,00	-	-	100,00%
9.22	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,00	R\$ 19,81	R\$ 911,26	-	-	46,00	R\$ 911,26	-	-	100,00%
9.23	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,00	R\$ 29,52	R\$ 1.003,68	-	-	34,00	R\$ 1.003,68	-	-	100,00%
9.24	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	112,00	R\$ 38,43	R\$ 4.304,16	-	-	112,00	R\$ 4.304,16	-	-	100,00%
9.25	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	230,00	R\$ 30,18	R\$ 6.941,40	-	-	230,00	R\$ 6.941,40	-	-	100,00%
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X30X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00	R\$ 321,11	R\$ 5.137,76	-	-	16,00	R\$ 5.137,76	-	-	100,00%
9.27	CAIXA DE GORRURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 196,31	R\$ 392,62	-	-	2,00	R\$ 392,62	-	-	100,00%
9.28	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60CM, REVESTIMENTO INTERNO COM BARRA LISA CIMENTO E ÁREA DE TACO 1x1 E 2x2CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFEÇÃO	UN	9,00	R\$ 129,53	R\$ 1.165,77	-	-	9,00	R\$ 1.165,77	-	-	100,00%



Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05175575-14-0

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUÊIMADAS-BA

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quemadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.05.2022

OBRA Nº 001/2021
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
CONTRATO: Nº 130/2020
P. ADM. Nº 038-2020
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020



MEDICÃO 15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
9.29	SUINDOIRO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,80M E ESPESURA 10CM	UN	3,00	R\$ 1.646,15	R\$ 4.938,45	-	-	-	-	3,00	R\$ 4.938,45	100,00%
9.30	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1,500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-	3,00	R\$ 600,00	100,00%
9.31	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00	R\$ 11,54	R\$ 219,26	-	-	-	-	19,00	R\$ 219,26	100,00%
9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	33,00	R\$ 9,47	R\$ 312,51	-	-	-	-	33,00	R\$ 312,51	100,00%
9.33	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 51,59	R\$ 103,18	-	-	-	-	2,00	R\$ 103,18	100,00%
9.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	R\$ 44,75	R\$ 671,25	-	-	-	-	15,00	R\$ 671,25	100,00%
9.35	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	-	-	-	-	2,00	R\$ 43,86	100,00%
9.36	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	R\$ 270,55	R\$ 2.976,05	-	-	-	-	11,00	R\$ 2.976,05	100,00%
9.37	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 352,26	R\$ 1.409,04	-	-	-	-	4,00	R\$ 1.409,04	100,00%
9.38	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	R\$ 125,87	R\$ 881,09	-	-	-	-	7,00	R\$ 881,09	100,00%
9.39	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 205,67	R\$ 411,34	-	-	-	-	2,00	R\$ 411,34	100,00%
9.40	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 340,34	R\$ 1.021,02	-	-	-	-	3,00	R\$ 1.021,02	100,00%
9.41	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA 65 X 70CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,83	R\$ 325,50	R\$ 3.525,17	-	-	-	-	10,83	R\$ 3.525,17	100,00%
9.42	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 84,47	R\$ 168,94	-	-	-	-	2,00	R\$ 168,94	100,00%
9.43	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 28,06	R\$ 56,12	-	-	-	-	2,00	R\$ 56,12	100,00%
9.44	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00	R\$ 67,11	R\$ 1.006,65	-	-	-	-	15,00	R\$ 1.006,65	100,00%
10.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
10.2	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO A-50 6,32M INCLUIO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO E TUBO ZARCO	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	-	-	-	-	8,00	R\$ 440,00	100,00%
10.3	LINEZA FINAL DA OBRA	m²	1.490,42	R\$ 1,00	R\$ 1.490,42	-	-	-	-	1.490,42	R\$ 1.490,42	100,00%
	MASTRO SIMPES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUIDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 302,86	R\$ 908,58	-	-	-	-	3,00	R\$ 908,58	100,00%

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.380-000 - QUEMADAS-BA

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.05.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		PERÍODO: 10.05.2022 A 18.05.2022		SALDO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
11	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO											
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISSE METÁLICO (ORSE COD. 11489)	Nº	90,45	R\$ 450,00	R\$ 40.702,50		R\$ -		R\$ -	90,45	R\$ 40.702,50	0,00%
10.2	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm	m²	171,13	R\$ 458,82	R\$ 78.517,87		R\$ -		R\$ -	171,13	R\$ 78.517,87	0,00%
					1.762.534,54	PERÍODO=	R\$ 152.290,72	ACUMULADO=	R\$ 1.516.357,42	SALDO=	R\$ 246.177,12	86,03%

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 FABIO DA SILVA OLIVEIRA
 GERENTE

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO,
 48.360-000 - QUEIMADAS-BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M6SFN-6XADT-XNVBS-XAV5B

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/M6SFN-6XADT-XNVBS-XAV5B>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 816/2021

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIRELI		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
30/11/2021

Código de Controle da Certidão:

21123.816.20211130.S302.539

Certidão Válida até:29/05/2022





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20221911574

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27


Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/04/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:33:24 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2022.

Código de controle da certidão: **B77D.E6B2.5B8D.81A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27

Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL

Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA /
48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042902032416078584

Informação obtida em 29/04/2022 16:56:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão n°: 13361275/2022
Expedição: 29/04/2022, às 14:25:33
Validade: 26/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





FOTO157: Instalação forro e luminária



FOTO 158: Instalação forro e luminária



FOTO159: Instalação forro e luminária

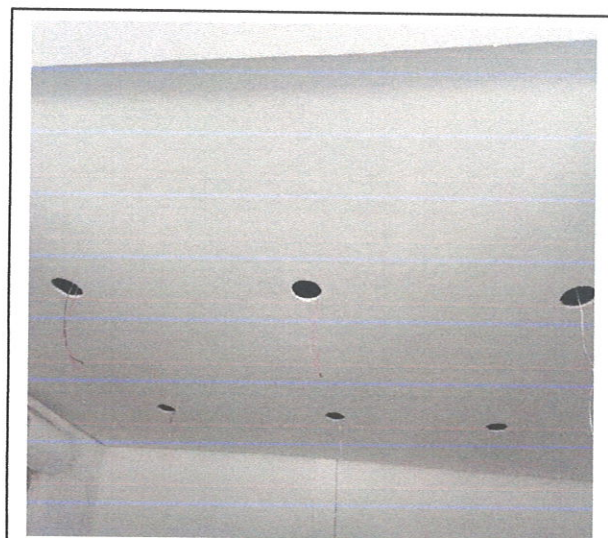


FOTO 160: Instalação forro





FOTO161: Instalação forro



FOTO 162: Instalação forro



FOTO163: Instalação quadro elétrico



FOTO 164: Estrutura metálica marquise
(Fachada)





FOTO165: Pintura grade (Fachada)



FOTO 166: Pintura grade (Fachada)



FOTO167: Pintura



FOTO 168: Pintura





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VT24Y-EQ2UB-7X3WW-U29YW

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VT24Y-EQ2UB-7X3WW-U29YW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA




INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 477
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Período:	10/05/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
---	--




RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 478
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	11/05/2022
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	5		
Ajudante Comum	5		
Serralheiro	2		
Pintor	5		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
TOTAL		22	



ASSINATURAS:	
	ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 479
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Período:	12/05/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/PM8PL-DD5JQ-CQNHY-CNLIKV>





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA




INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 480
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)

Período:	13/05/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
---	--



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 481
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 14/05/2022
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA MARQUISE (FACHADA E PARQUE)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 482
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	
DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA	
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> </div>	

Período:	15/05/2022																										
Condição do Tempo																											
Manhã																											
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável																										
Noite																											
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFETIVO DA OBRA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ARCO</th> </tr> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engenheiro Civil</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Administrativo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mestre de Obras</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Comum</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Gesseiro</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>		EFETIVO DA OBRA		ARCO		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	5	Ajudante Comum	5	Serralheiro	2	Pintor	5	Eletricista	2	Gesseiro	2	TOTAL	22
EFETIVO DA OBRA																											
ARCO																											
Função	Qtde.																										
Engenheiro Civil	1																										
Administrativo	1																										
Mestre de Obras	1																										
Pedreiro	5																										
Ajudante Comum	5																										
Serralheiro	2																										
Pintor	5																										
Eletricista	2																										
Gesseiro	2																										
TOTAL	22																										

ASSINATURAS:	
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA




INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		N°: 483
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES		Período:	16/05/2022
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA MARQUISE (FACHADA E PARQUE)		Condição do Tempo	
		Manhã <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
		Engenheiro Civil	1
		Administrativo	1
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	5		
Ajudante Comum	5		
Serralheiro	2		
Pintor	5		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
TOTAL	22		



ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 484
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 17/05/2022
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA MARQUISE (FACHADA E PARQUE)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 485
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
 CONCLUSÃO DA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA MARQUISE (FACHADA E PARQUE)

Período:	18/05/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

