

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 455 / 2022

Nº SUB-EMPENHO: 6136

Data do Sub-Empenho: 16/12/2022

TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
 Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650
 Bairro: CENTRO
 CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual: Cidade: SANTALUZ
 Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X CPF: Complemento: TERREOSALA 01
 RG: Estado: BA
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
 Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data do Empenho: 01/08/2022
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC | Nº Lic.: 002-2022RDC | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 223-2022 | 197.203,03 | 63.730,43 | 133.472,60 |
| Patrimônio: | | | | |

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO Nº223-2022. NF 202245.

| Movimentação Empenho | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 29.040,35 | 28.666,13 | 374,22 |

Data do Empenho: 01/08/2022

Data do Liquidação: 16/12/2022

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--|---------------------|-----------|
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.071 | ISS - FME FONTE 19 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.033 | INSS - FME FONTE 19 | 573,32 |
| ## Vinte e seis mil e oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos ## | | 1.261,31 |
| Valor Retido | | 1.834,63 |
| Valor Líquido | | 26.831,50 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 16/12/2022 | 202245 | U | | | 28.666,13 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 28.666,13 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/12/2022.

[Assinatura]

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula : 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/12/2022, podendo efetuar o pagamento.

[Assinatura]

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula : 6408

3014077

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM ___/___/___

Carlos Antônio da Silva Filho
 Controlador Interno
 Decreto 004/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 455 / 2022

Nº SUB-EMPENHO: 6136

Data do Sub-Empenho: 16/12/2022

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650

Bairro: CENTRO

CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual: Cidade: SANTALUZ

Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X CPF: Complemento: TERREOSALA 01

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. RG: Estado: BA

Tipo Pessoa: Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCALUZ

Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes

Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Data do Empenho: 01/08/2022

| | | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI | Nº Lic.: 002-2022RDC | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 223-2022 | 197.203,03 | 63.730,43 | 133.472,60 |
| Patrimônio: - | | | | |



HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO Nº223-2022.

| Movimentação Empenho | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 29.040,35 | 28.666,13 | 374,22 |

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|--------|----------------|-------------|
| 2022-08-01 | 16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | SRV | 1 | 28.666,13 | 28.666,13 |

Vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e treze centavos ## 28.666,13

| | |
|---|--|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/12/2022.</p> <p></p> <p>_____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/12/2022</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408</p> |
|---|--|





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Secretaria de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202245
Data da Competência: Dezembro/2022
Data e Hora da Emissão: 16/12/2022 09:45:00
Código Verificação: EFD996E86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.200.059/0001-75
Telefone: 753265227...
Nome/Razão Social: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Endereço: RUA RUA LOMANTO JÚNIOR, 6º TRAVESSA, TÉRREO SALA 01 Nº 650 BAIRRO CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA
E-mail: CONTRATOS.APICE@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 2811
Inscrição Estadual: 101702045ME
Nome Fantasia: Apice Engenharia



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Santaluz
Endereço: AVN GETÚLIO VARGAS Nº S/N PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO: CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: Não Informado

Inscrição Municipal: 1
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
60% INSUMOS R\$ 17.199,68
40% MÃO DE OBRA R\$ 11.466,45

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 16/12/2022

Assinatura

Tony Felix Andrade

Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 28.666,13

CNAE - 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| VALOR SERVIÇOS: R\$ 28.666,13 | VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00 | DESC. INCOND: R\$ 17.199,68 | BASE DE CÁLCULO: R\$ 11.466,45 | ALÍQUOTA: 5% | VALOR ISS: R\$ 0,00 | VALOR ISS RETIDO: R\$ 573,32 | DESC. COND: R\$ 0,00 |
| VALOR PIS: R\$ 0,00 | VALOR COFINS: R\$ 0,00 | VALOR IR: R\$ 0,00 | VALOR INSS: R\$ 1.261,31 | VALOR CSLL: R\$ 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.631,82 | |

DADOS COMPLEMENTARES

VALORES RETIDO NA NFSE - ISS (5%) R\$ 573,32 INSS (11%) 1.261,31 Dados bancários :Bradesco Agência: 3231 Cc: 20.000-0

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS


| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| EXIGIBILIDADE ISS Exigível | REGIME TRIBUTAÇÃO Micro Empresário e Empresa de Pequeno Port(ME EPP) | SIMPLES NACIONAL Sim (5%) | LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA | LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA | ISS Retido Sim |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 5%)
- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1674,97 (Alíquota 17,39 IBPT)




| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|----|-----|----------|----------|------------------|--------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|
| 5.2 | 1028 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 100 | 13,33 | 16,27 | 1.627,00 | 100,00 | 100 | - | R\$ 1.627,00 | R\$ 1.627,00 | R\$ - |
| 5.3 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9,45 | 11,53 | 115,30 | 10,00 | 10 | - | R\$ 115,30 | R\$ 115,30 | R\$ - |
| 5.4 | 1150 | ORSE | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm | un | 20 | 4,89 | 5,97 | 119,40 | 20,00 | 20 | - | R\$ 119,40 | R\$ 119,40 | R\$ - |
| 5.5 | | | CAIXA D'ÁGUA 15.000L | | | | | 997,23 | | | | | | |
| 5.5.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 14,55 | 17,76 | 142,08 | | | 8,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 142,08 |
| 5.5.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 68,72 | 83,91 | 419,55 | | | 5,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 419,55 |
| 5.5.3 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 178,37 | 217,80 | 435,60 | | | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 435,60 |
| 5.6 | | | ESSGOTO | | | | | 9.284,56 | | | | | | |
| 5.6.1 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 8 | 60,02 | 73,29 | 586,32 | | | | | | |
| 5.6.2 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 8 | 85,08 | 103,89 | 831,12 | 5,00 | | 3,00 | R\$ 366,45 | R\$ - | R\$ 219,87 |
| 5.6.3 | 1712 | ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros) | un | 1 | 1.826,14 | 2.229,89 | 2.229,89 | 5,00 | | 3,00 | R\$ 519,45 | R\$ - | R\$ 311,67 |
| 5.6.4 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2014 | UN | 1 | 1.329,85 | 1.623,87 | 1.623,87 | | | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.229,89 |
| 5.6.5 | 98062 | SINAPI | SUMIDURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2014 | UN | 1 | 2.060,90 | 2.516,56 | 2.516,56 | | | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.623,87 |
| 5.6.6 | 102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 60 | 16,11 | 19,67 | 1.180,20 | | | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.516,56 |
| 5.6.7 | 89657 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 25,93 | 31,66 | 316,60 | 40,00 | | 20,00 | R\$ 786,80 | R\$ - | R\$ 393,40 |
| 5.7 | | | ACESSÓRIOS | | | | | 12.735,34 | 7,00 | | 3,00 | R\$ 221,62 | R\$ - | R\$ 94,98 |
| 5.7.1 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q.D.6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 942,30 | 1.150,64 | 1.150,64 | | | | | | |
| 5.7.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020 | UN | 4 | 220,95 | 269,60 | 1.079,20 | | | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.150,64 |
| 5.7.3 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 220,95 | 269,60 | 539,60 | | | 4,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.079,20 |
| 5.7.4 | 7180 | ORSE | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx, descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e encaixe dielétrico | un | 2 | 328,85 | 401,55 | 803,10 | | | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 539,60 |
| 5.7.5 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA, TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 70,15 | 85,66 | 685,28 | | | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 803,10 |
| 5.7.6 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 418,87 | 511,48 | 1.022,96 | | | 8,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 685,28 |
| 5.7.7 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 460,95 | 562,86 | 3.940,02 | | | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.022,96 |
| | | | | | | | | | | | 7,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.940,02 |



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 1564433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

| ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------|---|----|---------|----------|----------|--|----------|-----|-----------|---------------|
| INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | 94962 | SINAPI | | | | | | | | | 11.045,49 | |
| | | | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,5 | 330,08 | 403,06 | | | | 7.237,00 | |
| 8.1.2 | 95956 | SINAPI | | | | | | | 0,50 | | | R\$ 201,53 |
| | | | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,51 | 2.165,91 | 2.644,79 | | | | 3.993,63 | R\$ - |
| 8.1.3 | 11322 | ORSE | Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm | m | 78,4 | 17,07 | 20,84 | | 1,51 | | | R\$ - |
| 8.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,36 | 443,69 | 541,78 | | | | 1.633,85 | R\$ - |
| 8.1.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 31,53 | 31,51 | 38,47 | | 31,53 | | 1.212,95 | R\$ - |
| 8.2 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | R\$ - |
| 8.2.1 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,44 | 2.165,91 | 2.644,79 | | 6,26 | | 3.808,49 | R\$ - |
| 9 | | | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | R\$ - |
| 9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2021 | m² | 533,56 | 3,94 | 4,81 | | | | 75.540,60 | R\$ - |
| 9.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALOCAR AF_05/2021 | m² | 1127,26 | 20,95 | 25,58 | | 533,00 | 183 | 28.835,31 | R\$ 880,23 |
| 9.3 | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 116,68 | 309,80 | 378,29 | | 1.030,00 | 350 | 44.138,87 | R\$ 2.487,91 |
| 10 | | | COBERTURA | | | | | | | | | R\$ - |
| 10.1 | 43 | ORSE | Retirada de calha | m | 81,44 | 10,32 | 12,60 | | | | 81.156,04 | R\$ 44.138,88 |
| 10.2 | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 25,38 | 30,99 | | 81,44 | | 1.026,14 | R\$ - |
| 10.3 | 9434 | ORSE | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm | m | 68,22 | 31,47 | 38,42 | | 40,00 | | 1.239,60 | R\$ - |
| 10.4 | 263 | ORSE | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 180 | 57,77 | 70,54 | | | | 2.621,01 | R\$ 2.621,01 |
| 10.5 | 8269 | ORSE | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | m | 154,54 | 167,26 | 204,24 | | 100,00 | | 12.697,20 | R\$ 5.643,20 |
| 10.6 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 137,33 | 21,80 | 26,61 | | | | 31.563,24 | R\$ 3.563,25 |
| | | | | | | | | | 137,33 | | 137,33 | R\$ 3.654,35 |



MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 050443393
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.048.877.8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
SANTALUZ
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 1354/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nome Apice Engenharia e Consultoria LTDA ME | | C.G.A 2811 | C.N.P.J. 13.200.059/0001-75 |
| Endereço: Rua Rua Lomanto Júnior, 6º Travessa, Térreo Sala 01, 650 Sala | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 48880000 | Município: SANTALUZ | UF: BA |

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
24/08/2022

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 20/02/2023

11523.1354.20220824.N.39.8168



Leonardo dos Santos Sousa
Superintendente do Depto. de Tributos
Portaria nº 122/2022



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/08/2022 16:19:21 que o documento de hash (SHA 256) 4f6cec2257c9bf252276d62dca4909cc3b10b0845167fa93a4a1817ba5650287 foi validado em 24/08/2022 16:16:38 através da transação blockchain 0xf9c7051df6f5ed71b595c62aeb59e35f08aa83824036f42d26a365d352361eb7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 79757)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4f6cec2257c9bf252276d62dca4909cc3b10b0845167fa93a4a1817ba5650287** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79757** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**20-02-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", cujo assunto é descrito como "**20-02-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", faz prova de que em **24/08/2022 16:16:25**, o responsável **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda (13.200.059/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/08/2022 16:17:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf9c7051df6f5ed71b595c62aeb59e35f08aa83824036f42d26a365d352361eb7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20226875989**

| | |
|--|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 101.702.045 | 13.200.059/0001-75 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 13.200.059/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:28 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2023.

Código de controle da certidão: **89D2.C7F6.771F.D982**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.200.059/0001-75
Certidão n°: 23485408/2022
Expedição: 25/07/2022, às 10:06:21
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.200.059/0001-75, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.200.059/0001-75
Razão Social: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Endereço: PRAC DO TETRA 14 / CENTRO / SANTALUZ / BA / 48880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120101111245967418

Informação obtida em 12/12/2022 09:55:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





FOTO 01 EXECUÇÃO DE ALVENARIA E CHAPISCO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA



FOTO 02 EXECUÇÃO DE ALVENARIA E CHAPISCO DAS SALAS DE AULAS


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8




13000-059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA



FOTO 03 EXECUÇÃO DE ALVENARIA E CHAPISCO DOS BANHEIROS DOS ALUNOS



FOTO 04 EXECUÇÃO DE REBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO NAS SALAS DE AULA DA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8




13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA 25 CENTRO SANTALUZ/BA



FOTO 05 EXECUÇÃO DE REBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO NAS SALAS DE AULA DA AMPLIAÇÃO



FOTO 06 EXECUÇÃO DE TELHADO DA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA E CORREDOR

Tony
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



[Signature]
000.059/0004-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R. DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA



FOTO 07 EXECUÇÃO DE REBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO NA SALA DE AULA



FOTO 08 EXECUÇÃO CHAPISCO NO CORREDOR


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
RUA GETULIO VASCONCELOS, 1000 SANTALUZ/BA

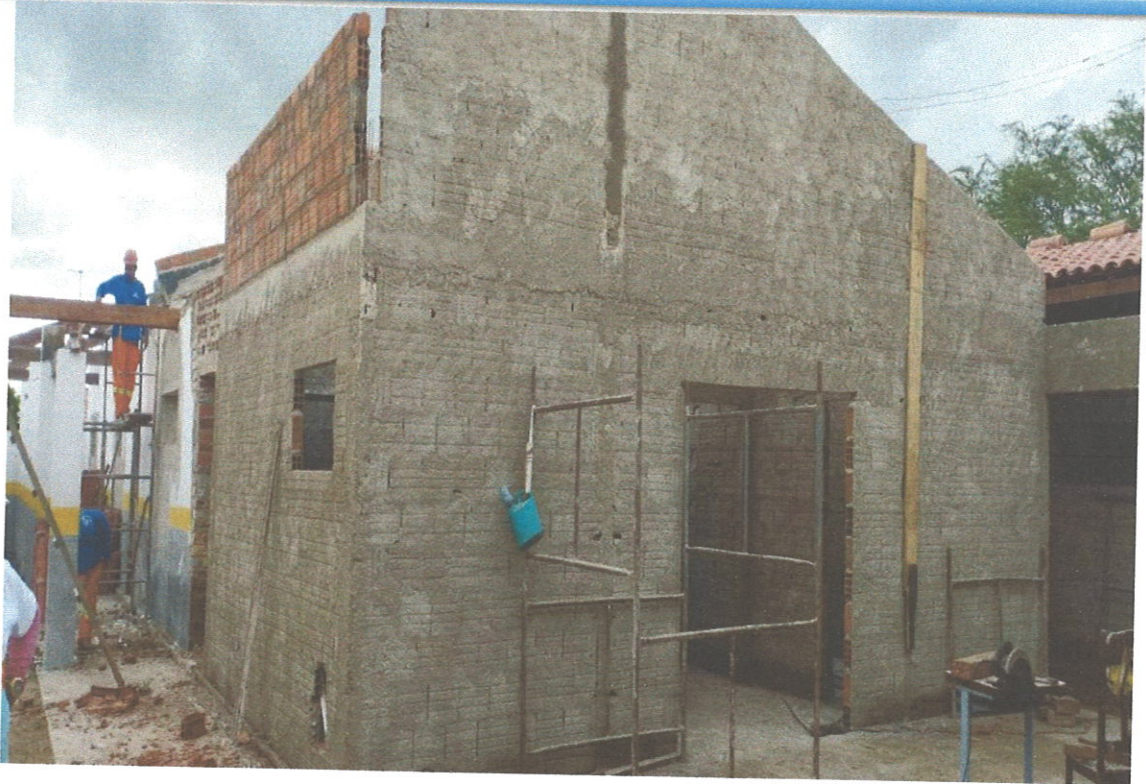


FOTO 09 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA NA COBERTURA



FOTO 10 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DA SALA MULTIMÍDIA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8




059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R. DO TETRA, 4, CENTRO SANTALUZ/BA



FOTO 11 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DA BIBLIOTECA

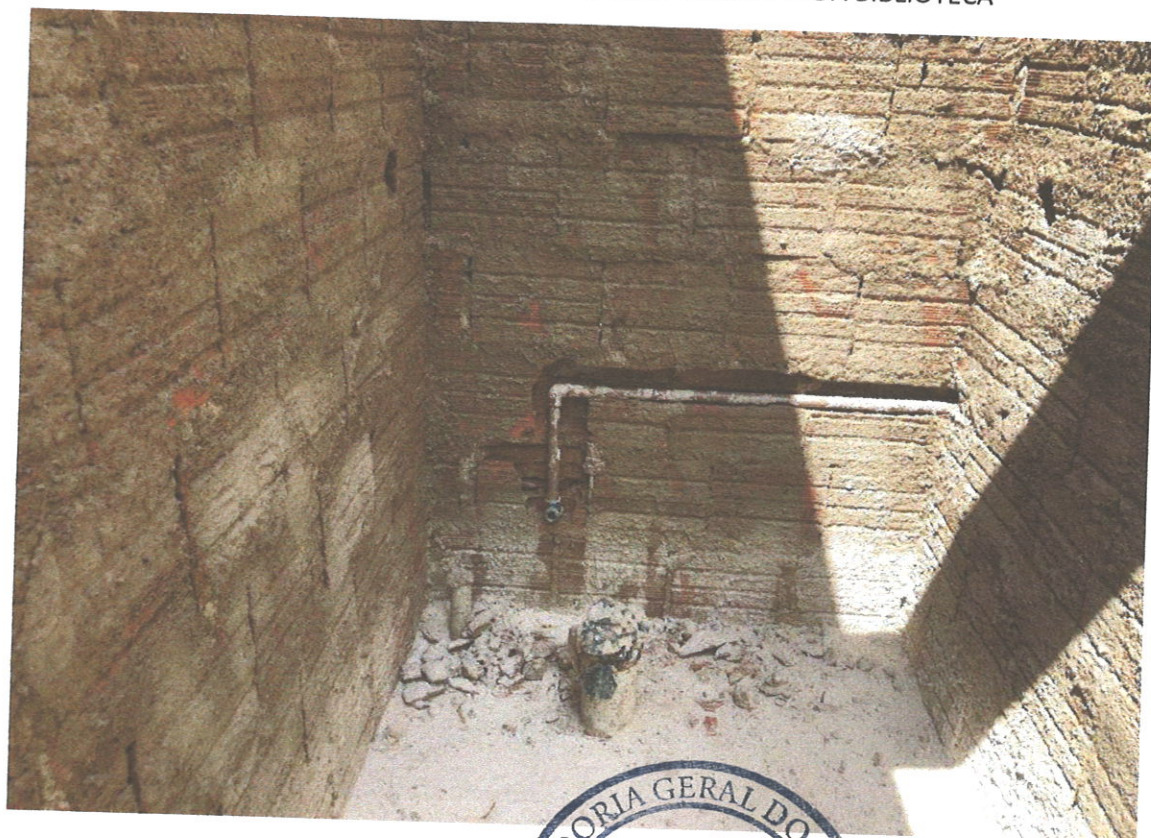


FOTO 12 EXECUÇÃO DE PONTOS DE AGUA NOS BANHEIROS

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO PÊRA, 14, CENTRO SANTALUZIBA

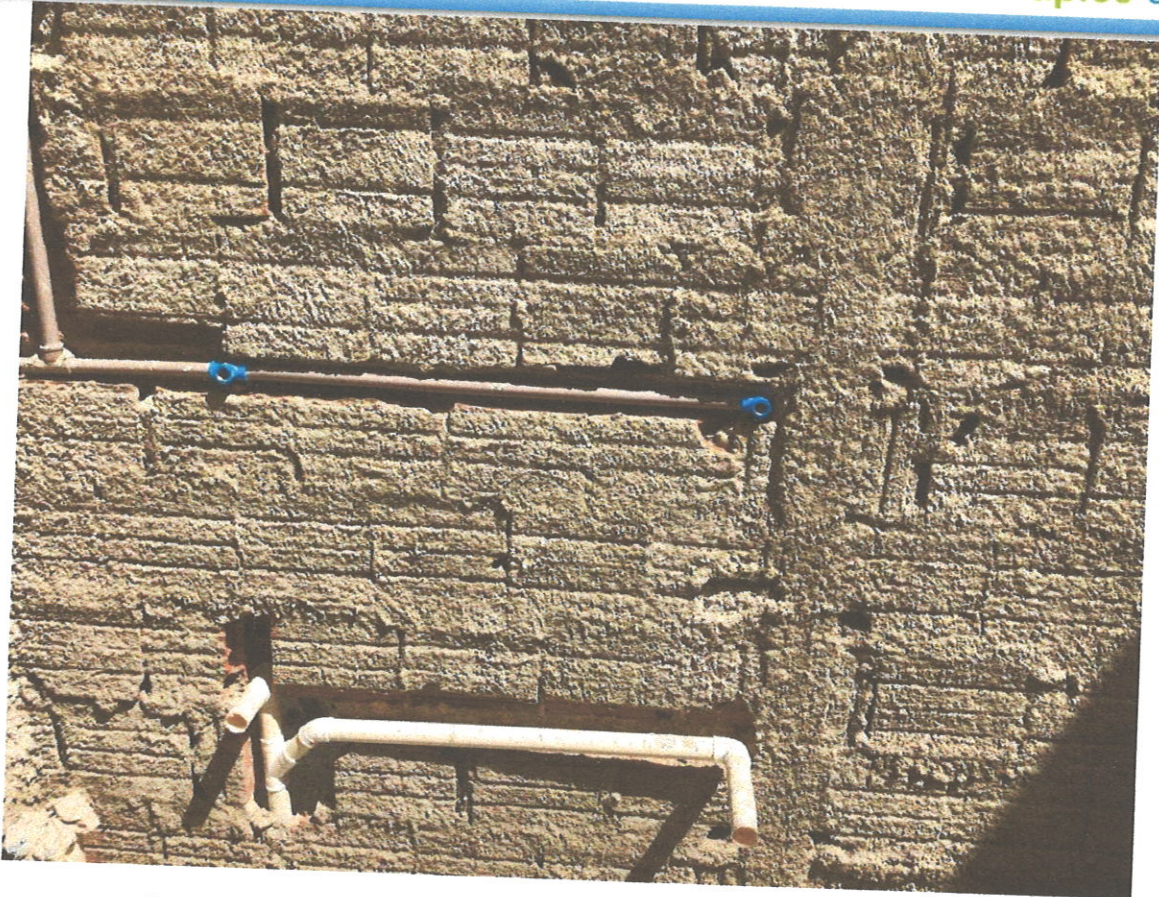


FOTO 14 EXECUÇÃO DE PONTOS DE AGUA E ESGOTO NOS BANHEIROS



FOTO 15 EXECUÇÃO DE PONTOS DE AGUA E ESGOTO NOS BANHEIROS

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 13 - CENTRO SANTALUZ/BA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
 HORA: 10:04:57
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA

| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 15.621,27 | 0,00 | 13.200.059/0001-75 | 0000 | 2100 | 515 |
| | | | 621,17 | 0,00 | 20.509,02 | 0,00 |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 10:04:57
PAG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

INSCRIÇÃO:

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO

CBO
JAM

TIAGO SIMOES ARAUJO
2.077,65

165.75674.65-9
865,69

01/07/2022 01
233,72

30/11/2022 I3
0,00

04142
0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 10:04:57
 PÁG: 0002/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | SIMPLES: 1 | RAT: 3,0 | DATA/OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| ANTONIO DE OLIVEIRA DULTRA | 1.818,00 | 727,20 | 161.13216.58-7 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 203,62 | 05142 | 0,00 |
| ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1.454,40 | 727,20 | 124.60439.22-0 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 174,53 | 05142 | 0,00 |
| CARLOS DOS SANTOS FERREIRA | 2.222,00 | 848,40 | 162.36819.57-3 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 245,64 | 05142 | 0,00 |
| CARLOS JOILSON MENDES DA SILVA | 1.818,00 | 727,20 | 129.22905.08-1 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 203,62 | 05142 | 0,00 |
| CLAUDIONOR FERREIRA DA CRUZ | 1.454,40 | 484,80 | 130.28332.06-9 | 0,00 | 02/05/2022 | 01 | | | | 155,14 | 05142 | 0,00 |
| CRISTIANO SILVA PAMPONET | 3.000,00 | 1.500,00 | 190.11693.84-4 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 360,00 | 04101 | 0,00 |
| DIOGO DE JESUS DE OLIVEIRA | 2.039,47 | 973,60 | 161.13236.89-8 | 0,00 | 01/02/2022 | 01 | | | | 241,05 | 07825 | 0,00 |
| ED CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA | 1.454,40 | 727,20 | 161.13239.44-7 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 174,53 | 05142 | 0,00 |
| EDILSON RIBEIRO SANTANA | 1.696,80 | 848,40 | 127.46172.07-2 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 203,62 | 05142 | 0,00 |
| EDIVAN CONCEICAO SANTANA | 1.454,40 | 727,20 | 124.60439.18-2 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 174,53 | 05142 | 0,00 |
| ELTON SOUSA DA SILVA | 2.104,77 | 263,10 | 203.44466.43-9 | 0,00 | 11/10/2022 | 01 | | | | 189,42 | 07152 | 0,00 |
| EVITIAO DOS SANTOS DE ALMEIDA | 2.104,77 | 263,10 | 162.63770.97-0 | 0,00 | 11/10/2022 | 01 | | | | 189,42 | 07152 | 0,00 |
| FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | 2.039,47 | 1.061,66 | 162.40151.42-5 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 248,09 | 07825 | 0,00 |
| GENIBALDO PEREIRA LIMA | 1.454,40 | 727,20 | 124.62051.04-1 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 174,53 | 05142 | 0,00 |
| GILBERTO RIBEIRO CARLOS | 1.454,40 | 363,60 | 145.89213.83-0 | 0,00 | 01/07/2022 | 01 | | | | 145,45 | 05142 | 0,00 |



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

| EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | COMP: 11/2022 | COD REC: 115 | COD GPS: 2100 | FPAS: 515 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 3,0 | INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75 | FAP: 1,00 | RAT AJUSTADO: 3,00 | CBO | |
|--|-----------------|--------------|------------------|--------------|-------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|----------|-----|
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG | DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | JAM |
| ORLANDO CARDOSO DA SILVA | 1.454,40 | 727,20 | 236.09975.43-8 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | | 05142 | |
| PAULO CESAR ANDRADE RIBEIRO | 1.454,40 | 727,20 | 165.86237.38-7 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 174,52 | 0,00 | |
| RAMALHO LIMA DA SILVA | 1.454,40 | 727,20 | 165.86260.90-7 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 174,52 | 05142 | |
| RUAN AFONSO DE OLIVEIRA | 1.242,98 | 310,75 | 165.75568.58-1 | 0,00 | 01/07/2022 | 01 | | | | 174,52 | 05142 | |
| SILVIO CONCEICAO NEPOMOCENO | 1.454,40 | 727,20 | 136.36205.27-6 | 93,68 | 21/09/2021 | 01 | | | | 124,29 | 07170 | |
| VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | 1.454,40 | 727,20 | 123.88531.86-3 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 174,53 | 05142 | |
| VALMIR DE ASSIS SILVA | 1.696,80 | 848,40 | 125.55182.42-1 | 0,00 | 04/10/2021 | 01 | | | | 174,53 | 05142 | |
| VALNEIDSON ARAUJO PEREIRA MATOS | 1.696,80 | 787,80 | 165.35752.65-9 | 0,00 | 21/09/2021 | 01 | | | | 203,62 | 05142 | |
| | | | | 0,00 | 134,53 | | | | | 198,76 | 05142 | |
| | | | | | 134,53 | | | | | 0,00 | 0,00 | |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 10:04:57
PAG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL

FPAS: 515 OUTRAS ENT:
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
JAM

ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA
2.424,00

190.10639.77-3 0,00
23/05/2012 11
266,64

02521
0,00

0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
67.369,08

27.784,92

865,69

5.508,92

7.182,93

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: EBF817UYUZ40000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 39 | 62.867,43 | 26.919,23 | 64.945,08 | 865,69 |
| 11 | 1 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 40 | 65.291,43 | 26.919,23 | 67.369,08 | 865,69 |



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: EBF817UYUZ40000-0 N° ARQUIVO: EYhz106ZMZQ0000-5
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8129000
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 CNAE: 8129000

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 62.867,43
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 26.919,23

QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS

7.182,93

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.182,93



DATA: 02/12/2022
 HORA: 10:04:57
 PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01
 CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 BAIRRO: CENTRO CNAE: 8129000
 N° DE CONTROLE: EBF817UYUZ40000-0 TELEFONE: 0071 3489 3937 CNAE: 8129000
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° ARQUIVO: EYhz106ZMZQ0000-5
 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.509,02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.508,92
 SALÁRIO FAMÍLIA: 621,17 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 1 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 10:04:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
COMPETÊNCIA: 11/2022

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
SIMPLES: 1

FPAS: 515

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

89.786,66

DEPÓSITO

7.182,93

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.182,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° ARQUIVO: EYhz106ZwZQ0000-5
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0
 LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: SANTALUZ UF: BA BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8129000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 48880-000 TELEFONE: 071-34893937 CNAE: 8129000
 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 5.242,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.242,28 |
| Contribuintes Individuais | 266,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,64 |
| Empregados/Avulsos | 13.162,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.162,15 |
| Contribuintes Individuais | 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,80 |
| RAT | 1.974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,32 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 621,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,17 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.509,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.509,02 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 20.509,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.509,02 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.200.059/0001-75

Razão Social
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22343.0132031-2

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000096371901
13º salário**

Valor Total do Documento

16.637,28

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022 | 4.230,28 | | | 4.230,28 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022 | 10.788,70 | | | 10.788,70 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022 | 1.618,30 | | | 1.618,30 |
| Totais | | 16.637,28 | | | 16.637,28 |

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/12/2022 16:52:09

85800000166 2 37280385223 8 54071622343 1 01320312061 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000166 2 37280385223 8 54071622343 1 01320312061 4



CNPJ: 13.200.059/0001-75
Número: 07.16.22343.0132031-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 16.637,28



Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.200.059/0001-75

Razão Social
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22336.9181136-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000093363082

Valor Total do Documento

20.509,02

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 4.621,11 | | | 4.621,11 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 266,64 | | | 266,64 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 13.162,15 | | | 13.162,15 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 484,80 | | | 484,80 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 1.974,32 | | | 1.974,32 |
| Totais | | 20.509,02 | | | 20.509,02 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000205 8 09020385223 6 54071622336 9 91811369003 7



CNPJ: 13.200.059/0001-75
Número: 07.16.22336.9181136-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 20.509,02



Pague com o PIX





Data da Transação: 16/12/2022 - 18h36
Nº de controle: 536.687.116.297.272.813
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85800000166 37280385223 54071622343 01320312061**
Data do Pagamento: **16/12/2022**
Número do Documento: **07.16.22343.0132031-2**
Valor Total: **R\$ 16.637,28**
Autenticação Bancária: **096.537.480**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

Autenticação

XWBULdnp I1UKbsN5 izj9CENy nnrzYnf8 NqOFFIQW KfYeXtp? bQov@5e* s@zkTAn3
JpR5cPoZ vWmZTvxT ?R5eMnvN xrZxGKTV qYtCg3hf #GXc5q8X 3r6RoJ7M OfL3rN*Q
asuvWgw@ 5bO?ko#J ?OmBwVIJ H9mxqEGg CUKRHWAH gr2WHwAH 00501622 00630063

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Data da Transação: 16/12/2022 - 18h35
Nº de controle: 536.687.116.297.272.813
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85860000205 09020385223 54071622336 91811369003**
Data do Pagamento: **16/12/2022**
Número do Documento: **07.16.22336.9181136-9**
Valor Total: **R\$ 20.509,02**
Autenticação Bancária: **096.537.040**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

Autenticação

AaRIi3kx NiDFa2V3 @4eAEJiR E5HibQEb CERxwZq4 TZQxfD?U zZGr2kxR J28TC#6s
ZW3Ik5Ap piY@3sR2 g*BALKAd Pptjeuej I3JEpF67 RAQFKckm RbAx2t6U RhrRTEGp
#39YIBtZ c9hi8A2? YqaWbmYx H5GPR7jX TYcjQkwQ bcUWLAf# 00501622 00000050

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
16/10/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 2 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 18/10/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 2 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS
- 2)
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 5) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS


 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA




CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.009.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 19/10/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 2 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS
- 2)
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 5) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS


 RESPONSÁVEL TÉCNICO



13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 19, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 20/10/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS
- 2)
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 5) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS



RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: **223/2022**
INÍCIO: **02/08/2022**
PRAZO: **4 MESES**

RESP. TÉCNICO: **MATEUS MOURA AGUIAR**
CREA-BA: **52230/D BA**
Nº DA ART: **BA20220174880**

DATA:
21/10/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS
- 2)
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 5) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 141, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
22/10/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) NÃO TRABALHOU
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**

CONTRATO: 223/2022

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR

INÍCIO: 02/08/2022

CREA-BA: 52230/D BA

ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

PRAZO: 4 MESES

Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
23/10/2022



MANHÃ X

TARDE X

NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) NÃO TRABALHOU
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
24/10/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- FINALIZANDO A ALVENARIA DOS BANHEIROS
-
-
- FINALIZOU O CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-



ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0004-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
CONTRATADA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069 677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 61

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
25/10/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)







ASSINATURAS

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 26/10/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS


 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 27/10/2022    

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | |
| TARDE | X | | | |
| NOITE | X | | | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC-DO-TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059 877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 64

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
28/10/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2) INICIO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- 3) INICIO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS



13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PO DO TETRA 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 66

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
30/10/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS





RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 31/10/2022    

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | X | | | | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO JETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 01/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433936
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 70 - CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 02/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 19 - CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
03/11/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 04/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA




Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.039 677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 72

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 05/11/2022    

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | |
| TARDE | X | | | |
| NOITE | X | | | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA





Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 73

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 06/11/2022    

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | |
| TARDE | X | | | |
| NOITE | X | | | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO-SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 07/11/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA 14, CENTRO SANTALUZ/BA
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8
CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
08/11/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- INICIO DAS VIGS AEREAS
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-



ASSINATURAS

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069 677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL (SANTALUZISTA E AMBIENTAL)
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TERRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 09/11/2022    

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | |
| TARDE | X | | | |
| NOITE | X | | | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- 2) FINALIZAÇÃO DO ESGOTO DOS BANHEIROS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) INICIO DAS VIGAS AEREAS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.019.877.8



OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 11/11/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA HIDRAULIA DOS BANHEIROS
- ARREMATES DE REBOCOS DAS JANELAS
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- INICIO DAS VIGAS AEREAS
- REQUADRO DAS JANELAS
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO, SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.099.677.8
CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 12/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X


| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL (SANTALUZ) E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 80

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 13/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 82

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 14/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2) ARREMATES DE REBOCOS DAS JANELAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)




ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO, SANTALUZ/BA

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim

CONTRATO: 223/2022

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR

INÍCIO: 02/08/2022

CREA-BA: 52230/D BA

ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

PRAZO: 4 MESES

Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 15/11/2022



MANHÃ X

TARDE X

NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2) ARREMATES DE REBOCOS DAS JANELAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 050433938
ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALISTA EM AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 17/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2) ARREMATAS DE REBOCOS DAS JANELAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS





MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 11, CENTRO SANTALUZ/BA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 18/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2) ARREMATAS DE REBOCOS DAS JANELAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 12, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 87

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 19/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2) NÃO TRABALHOU
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA




Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059 877.8
 CONTRATANTE





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 20/11/2022    

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | |
| TARDE | X | | | |
| NOITE | X | | | |


| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2) NÃO TRABALHO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITÁRIA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 21/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- 2) ARREMATES DE REBOCOS DAS JANELAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 22/11/2022    

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | |
| TARDE | X | | | |
| NOITE | X | | | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- 2) EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.009.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 23/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- 2) EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PG DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.009.677.8

CONTRATANTE



OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 24/11/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X


| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- REQUADRO DAS JANELAS
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 052433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.000-77.8
CONTRATANTE



OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
25/11/2022



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X


| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- REQUADRO DAS JANELAS
- INICIO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANTARISTA AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.208.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8
CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 26/11/2022    

| | | | |
|-------|---|--|--|
| MANHÃ | X | | |
| TARDE | X | | |
| NOITE | X | | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 4 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

1) FABRICAÇÃO DAS TESOURAS E INICIO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO DA AMPLIAÇÃO

- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____

OCORRÊNCIAS

1) SO TRABALHOU O CARPINTEIRO E SEU AJUDANTE

- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.077.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 27/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X


| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 4 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA





Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 96

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 28/11/2022    

| | | | |
|-------|--|--|---|
| MANHÃ | | | X |
| TARDE | | | X |
| NOITE | | | X |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 4 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- 2) EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5) REQUADRO DAS JANELAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) INICIO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) CHOUEU O DIA TODO CAUSANDO ATRASO NO ANDAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS PRINCIPALMENTE O TELHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS





MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14, CENTRO, SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.877.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 29/11/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 4 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- REQUADRO DAS JANELAS
- CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCCORRÊNCIAS

-
- CHOVEU O DIA TODO CAUSANDO ATRASO NO ANDAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS PRINCIPALMENTE O TELHADO
-
-
-



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL - SANEAMENTO E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.058/877.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 30/11/2022    

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| MANHÃ | | | X | |
| TARDE | | | X | |
| NOITE | | | X | |

| MÃO DE OBRA INDIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | | EQUIPAMENTOS | |
|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|
| FUNÇÃO / CARGO | QTDE | FUNÇÃO / CARGO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE |
| GERENTE DE CONTRATO | - | AJUDANTE GERAL | 4 | BETONEIRA | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 1 | COMPACTADOR | |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAMINHÃO BASCULANTE | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | PEDREIRO | 4 | CAMINHÃO MUNCK | - |
| COMPRADOR | 1 | SOLDADOR | 0 | GUINDASTE | - |
| ENCARREGADO | 1 | | | | |

TAREFAS REALIZADAS

- FINALIZOU A FABRICAÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO
- EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
-
- CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCORRÊNCIAS

- CHOVEU O DIA TODO CAUSANDO ATRASO NO ANDAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS PRINCIPALMENTE O TELHADO
-
-
-
-



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.019.877.8
 CONTRATANTE
