

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 455 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6530 Data do Sub-Empenho: 28/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTALUZ  
 Estado: BA  
 CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual:  
 CPF:  
 RG:  
 Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Pessoa: Jurídica  
 Complemento: TERREOSALA 01

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/08/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - Educação  
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
 Programa: 004 - EDUCALUZ  
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC	Nº Lic.: 002-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 223-2022	197.203,03	63.730,43	133.472,60
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO Nº223-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO 01/12/2022 A 27/12/2022. NF 202248.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
164.874,22	164.744,89	129,33

Data do Empenho: 01/08/2022 Data do Liquidação: 28/12/2022

**RETENÇÕES**


Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	3.294,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	7.248,78
## Cento e cinquenta e quatro mil e duzentos e um reais e vinte e um centavos ##		Valor Retido
		10.543,68
		Valor Líquido
		154.201,21

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	28/12/2022	202248	U			164.744,89

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	164.744,89

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/12/2022.   _____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/12/2022, podendo efetuar o pagamento.   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
---	--



3020528

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 455 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6530 Data do Sub-Empenho: 28/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**  
Nome: 29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650  
Bairro: CENTRO  
CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual:  
Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X  
Cidade: SANTALUZ  
CPF:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Tipo Pessoa: Jurídica  
Complemento: TERREOSALA 01  
Estado: BA  
RG:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/08/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 004 - EDUCALUZ  
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC Nº Lic.: 002-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 223-2022	197.203,03	63.730,43	133.472,60
Patrimônio: -			

**HISTÓRICO**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO Nº 223-2022.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
164.874,22	164.744,89	129,33

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-08-01	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	164.744,89	164.744,89



## Cento e sessenta e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos ## 164.744,89

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/12/2022.   NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/12/2022   NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
---	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Secretaria de Finanças  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202248  
Data da Competência: Dezembro/2022  
Data e Hora da Emissão: 28/12/2022 14:42:00  
Código Verificação: C5469FAA0

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Telefone: 753265227...  
Nome/Razão Social: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME  
Endereço: RUA RUA LOMANTO JÚNIOR, 6º TRAVESSA, TÉRREO SALA 01 N° 650 BAIRRO CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA  
E-mail: CONTRATOS.APICE@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 2811  
Inscrição Estadual: 101702045ME  
Nome Fantasia: Apice Engenharia



## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Telefone:  
Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Santaluz  
Endereço: AVN GETÚLIO VARGAS N° S/N PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO: CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000  
E-mail: Não Informado

Inscrição Municipal: 1  
Inscrição Estadual:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA  
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
60% INSUMOS R\$ 98.846,93  
40% MÃO DE OBRA R\$ 65.897,96

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
EM 28/12/2022 Tony Felix Andrade  
Assinatura

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 164.744,89**

CNAE - 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE  
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND. BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND.:
R\$ 164.744,89	R\$ 0,00	R\$ 98.846,93	5%	R\$ 0,00	R\$ 3.294,90	R\$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.248,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.354,28

## DADOS COMPLEMENTARES

VALORES RETIDO NA NFSE - ISS (5%) R\$ 3.294,90 INSS (11%) 7.248,78 Dados bancários :Bradesco Agência: 3231 Cc: 20.000-0

## OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Micro Empresario e Empresa de Pequeno Port(ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Sim ( 5% )	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------------	----------------

## Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 5%)  
- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9626,11 (Alíquota 17,39 IBPT)





# ápíce engenharia



Obra: Contratação de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA  
 EMPRESA: APÍCE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA


PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 ATE 27/12/2022  
 VALOR CONTRATUAL R\$ 874.209,13  
 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 164.144,89  
 SALDO CONTRATUAL R\$ 554.410,19

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	QUANTIDADE		VALORES		Total
							ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	
							SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	301,02	367,57	6,00	-	2.205,42	-	R\$ -
1.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	52,26	45,42	55,46	52,26	-	2.898,34	-	R\$ -
1.3	100938 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	522,6	3,77	4,60	522,60	-	2.403,96	-	R\$ -
1.4	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,9	7,62	9,30	39,90	-	371,07	-	R\$ -
1.5	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,58	2,92	3,56	10,58	-	37,66	-	R\$ -
1.6	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	468,41	6,27	7,65	468,41	457,83	3.583,34	3.502,40	R\$ -
1.7	13 ORSE	Demolição de concreto manual	m3	10,68	255,06	311,45	10,68	-	3.326,28	-	R\$ -
1.8	20895 ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	5	11,38	13,90	5,00	-	77,75	-	R\$ -
1.9	3262 ORSE	Remoção de lavatório	un	3	11,38	13,90	3,00	-	46,65	-	R\$ -
1.10	3 ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo colocação e nivelamento de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	228	3,82	4,67	228,00	-	1.197,00	-	R\$ -
	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	269,07	17,25	21,06	269,07	269,07	5.666,96	5.666,61	R\$ -
	12 ORSE	Demolição de forros	m2	468,24	5,29	6,46	468,24	468,24	3.025,92	3.024,83	R\$ -
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							13.421,00		
2.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	109,91	134,21	85,00	-	15,00	11.407,85	R\$ -
3		SISTEMA DE VEDAÇÃO							44.724,81		
3.1	87487 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	433,26	79,04	95,29	366,78	100	66,48	34.950,47	R\$ 9.529,00
3.2	9961 ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulado e=0,5mm	m²	105,57	65,29	79,72	8,416,04	-	105,57	-	R\$ 8.416,04
3.3	Próprio	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	200,54	44,46	54,29	10.887,31	-	200,54	-	R\$ 10.887,32
	SANTICO 103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	10,56	100,58	122,82	10,56	10,56	1.296,98	-	R\$ -
4		ESQUADRIAS							54.125,27		

MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA 1594433938  
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITÁRIA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75  
 APÍCE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.048/77.8




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
4.1	PORTAS			23.106,80				
4.1.1	90850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	731,41	893,12	1.786,24	2,00	1.786,24
4.1.2	90849 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	21	679,82	830,12	17.432,52	21,00	17.432,52
4.1.3	90848 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1	662,31	808,74	808,74	1,00	808,74
4.1.4	90848 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	662,31	808,74	1.617,48	2,00	1.617,48
4.1.5	91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,15	380,05	464,07	1.461,82	3,15	1.461,82
4.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					3.562,87		
4.2.1	91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXCLUSÃO DE ELIBRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ferrolio ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref:81098 63mm (2,12")	UN	23	123,10	150,31	3.457,13	23,00	3.457,13
4.2.2	1865 ORSE Gradil	un	2	40,37	49,30	105,54	2,00	98,60
4.3	11445 ORSE Gradil	m2	50,78	229,03	279,66	14.201,13	50,78	14.201,13
4.3.2	100745 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P	m²	101,56	18,14	22,15	2.249,55	101,56	2.249,55
4.4	JANELAS					11.005,12		
4.4.1	94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR 3 FOLHAS, COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	27,75	302,94	369,92	10.265,28	27,75	10.265,28
4.4.2	94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR 2 FOLHAS, COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,5	302,94	369,92	554,88	1,50	554,88
4.4.3	94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,5	302,94	369,92	184,96	0,50	184,96
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					27.203,35		
5.1	1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	18	105,76	129,14	2.324,52	3,00	1.937,10
5.2	1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	100	13,33	16,27	1.627,00	-	1.627,00
5.3	89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10	9,45	11,53	115,30	-	115,30
5.4	1150 ORSE Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	20	4,89	5,97	119,40	-	119,40
5.5	CAIXA D'ÁGUA 15.000L					997,23		
5.5.1	89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	8	14,55	17,76	142,08	8,00	142,08
5.5.2	94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	5	68,72	83,91	419,55	5,00	419,55
5.5.3	94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2	178,37	217,80	435,60	2,00	435,60
5.6	ESGOTO					9.284,56		
5.6.1	16719 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8	60,02	73,29	586,32	3,00	366,45
				5,00				219,87



5.6.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (uso sanitário).	pt	8	85,08	103,89	831,12	5,00		3,00	R\$	519,45	R\$	-	R\$	311,67
5.6.3	1712	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (V=3390 litros).	un	1	1.826,14	2.229,89	2.229,89			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.229,89
5.6.4	98058	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020.	UN	1	1.329,85	1.623,87	1.623,87			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.623,87
5.6.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020.	UN	1	2.060,90	2.516,56	2.516,56			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.516,56
5.6.6	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021 AF_12/2020.	M	138	16,11	20,28	2.796,64	80,00	40	58,00	R\$	1.622,40	R\$	811,20	R\$	179,44
5.6.7	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014.	UN	10	25,93	31,66	316,60			6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	903,78
5.6.8	4404	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	UND	6	123,36	150,63	903,78	7,00		3,00	R\$	221,62	R\$	-	R\$	84,96
5.7			ACESSÓRIOS					12.735,34									
5.7.1	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020.	UN	1	942,30	1.150,64	1.150,64			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.150,64
5.7.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020.	UN	4	220,95	269,80	1.079,20			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.079,20
5.7.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020.	UN	2	220,95	269,80	539,60			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	539,60
5.7.4	7180	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx, descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2	328,85	401,55	803,10			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	803,10
5.7.5	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA, TUBO MOVEL, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020.	UN	8	70,15	85,66	685,28			8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	685,28
5.7.6	100858	SINAPI	MICROTUBO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020.	UN	2	418,87	511,48	1.022,96			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.022,96
5.7.7	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA-ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020.	UN	7	441,52	539,14	3.940,02			7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.773,98
5.7.8	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO DOMINIAL, FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020.	UN	4	404,67	494,14	1.976,56			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.976,56
5.7.9	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO DOMINIAL, FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020.	UN	2	629,76	768,99	1.537,98			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.537,98
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					36.430,12									
6.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015.	M	249,84	2,24	2,73	682,06	100,00	100	149,84	R\$	273,00	R\$	273,00	R\$	409,06
6.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015.	M	2583,93	3,22	3,93	10.154,84	1.500,00	1500	1.083,93	R\$	5.895,00	R\$	5.895,00	R\$	4.259,84
6.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015.	M	114,85	5,15	6,28	721,25	50,00	50	64,85	R\$	314,00	R\$	314,00	R\$	407,26
6.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015.	M	156	11,50	14,04	2.190,24	60,00	60	96,00	R\$	842,40	R\$	842,40	R\$	1.347,84
6.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021.	M	36	20,36	24,86	894,96			36,00	R\$	-	R\$	-	R\$	894,96
6.6	8696	ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm pieletrica, tipo Aquatic ou similar.	un	4	33,05	40,35	161,40			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	161,40





6.37	13176	ORSE	Luminária sobrepore quadrada Led 24W - 6500K G - Light ou similar	un	20	81,09	99,01	1.980,20			20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.980,20
6.38	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepore) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G - Light ou similar	un	20	116,79	142,61	2.852,20			20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.852,20
6.39	9891	ORSE	Luminária plafonier, sobrepore, em alumínio, com difusor em vidro, plampada eletrônica, ref. XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	6	94,52	115,41	692,46			6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	692,46
7			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					26.898,73									
7.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_09/2017	m³	21,66	81,28	99,25	2.149,76	21,66	16,19	-	R\$	2.149,76	R\$	1.606,86	R\$	
7.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	196,1	89,90	109,78	26.355,84	196,10		-	R\$	21.527,86	R\$	-	R\$	
8			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>					11.045,49									
8.1			<b>INFRAESTRUTURA</b>					7.237,00									
8.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,5	330,08	403,06	201,53	0,50		-	R\$	201,53	R\$	-	R\$	
8.1.2	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	6,26	2.165,91	2.644,79	16.556,39	6,26	4,75	-	R\$	16.556,39	R\$	12.562,75	R\$	
8.1.3	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	78,4	17,07	20,84	1.633,85			78,40	R\$	-	R\$	-	R\$	1.633,85
8.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,36	443,69	541,78	195,04			0,36	R\$	-	R\$	-	R\$	195,04
8.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2018	m²	70,5	31,51	38,47	2.712,14	70,50	38,97	-	R\$	2.712,14	R\$	1.459,18	R\$	
8.2			<b>SUPERESTRUTURA</b>					3.808,49									
8.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	11,58	2.165,91	2.644,79	30.626,67	10,44	9	1,14	R\$	27.611,61	R\$	23.803,11	R\$	3.015,06
9			<b>REVESTIMENTOS</b>					75.540,60									
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m²	675,33	3,94	4,81	3.248,34	633,00	100	42,33	R\$	3.044,73	R\$	481,00	R\$	203,61
9.2	87547	SINAPI	ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS, AF_05/2021	m²	1269,03	20,95	25,58	32.461,79	1.130,00	100	139,03	R\$	28.905,40	R\$	2.558,00	R\$	3.556,39
9.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	116,68	309,80	378,29	44.138,87			116,68	R\$	-	R\$	-	R\$	44.138,88
10			<b>COBERTURA</b>					81.156,04									
10.1	43	ORSE	Retirada de calha	m	81,44	9,19	11,22	1.026,14	81,44		-	R\$	913,76	R\$	-	R\$	-
10.2	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	25,38	30,99	1.239,60	40,00		-	R\$	1.239,60	R\$	-	R\$	-
10.3	9434	ORSE	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	68,22	31,47	38,42	2.621,01			68,22	R\$	-	R\$	-	R\$	2.621,01
10.4	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabatana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	180	55,56	67,84	12.697,20	150,00	50	30,00	R\$	10.176,00	R\$	3.392,00	R\$	2.035,20
10.5	8269	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	154,54	167,26	204,24	31.563,24			154,54	R\$	-	R\$	-	R\$	31.563,25
10.6	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE TERREIA, COM OMO	m²	159,68	21,79	26,61	4.249,08	120,00	120	39,68	R\$	3.193,20	R\$	3.193,20	R\$	1.055,88
10.7	92541	SINAPI	TERÇA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	595,16	71,85	87,73	52.213,39	350,00	350	245,16	R\$	30.705,50	R\$	30.705,50	R\$	21.507,89

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
**CREA-BA 1504433938**  
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.009.577.8

**13.200.059/0001-75**  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO PETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA









15.4	9166	ORSE	Briquete - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1	3.299,80	4.029,38	4.029,38				1,00	R\$	-	R\$	4.029,38		
16			<b>CANTEIROS E BANCOS</b>															
16.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,47	66,04	85,08						4,47	R\$	-	R\$	371,67	
16.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,94	330,08	403,06						0,94	R\$	-	R\$	313,39	
16.3	87478	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	59,19	39,34	48,03						59,19	R\$	-	R\$	2.842,90	
16.4	87879	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	118,38	3,94	4,81						118,38	R\$	-	R\$	569,41	
16.5	87547	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	118,38	20,95	25,58						118,38	R\$	-	R\$	3.028,16	
16.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, JUMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	118,38	9,31	11,36						118,38	R\$	-	R\$	1.344,79	
16.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIAS. DEMÃO. AF_06/2014	m²	118,38	10,98	13,40						118,38	R\$	-	R\$	1.586,29	
16.8	198	ORSE	Madrilamento em massarandubaimadeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças nacionais.	m2	16,21	95,57	116,70						16,21	R\$	-	R\$	1.891,71	
16.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	32,42	17,99	21,96						32,42	R\$	-	R\$	711,94	
17			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>															
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1751,59	2,15	2,62						1.751,59	R\$	-	R\$	4.589,17	
	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 60x60cm com logomarca e moldura	UM	1		1.054,08						1,00	R\$	-	R\$	1.054,08	
18			<b>DRENAGEM</b>															
18.1	4404	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	m²	6,00	123,36	150,63				2,00		4,00	R\$	-	R\$	301,26	
18.2	89890	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	UN	6,00	14,50	17,71						4,00	R\$	-	R\$	602,52	
18.3	89710	SINAPI	SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,93	10,90						4,00	R\$	-	R\$	70,84	
18.4	C1436	SEINFR	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	M²	5,55	127,25	155,38						2,00	R\$	-	R\$	35,42	
18.5	1027	ORSE	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M	126,55	8,77	10,71						5,55	R\$	-	R\$	21,80	
18.6	2476	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	126,55	4,56	5,57						126,55	R\$	-	R\$	862,36	
18.7	90468	SINAPI	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 12" a 14"	M	126,55	4,43	5,41						126,55	R\$	-	R\$	704,88	
18.8	89406	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	126,55	12,57	15,35							126,55	R\$	-	R\$	684,64
18.9	MERCAD	COMP.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	12,91	15,77						45,00	R\$	-	R\$	690,75	
18.10	90227	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM DRENO AR CONDICIONADO	UN	15,00	57,51	70,23						15,00	R\$	-	R\$	236,55	
19			<b>JARDIM DE INVERNO E HORTA</b>															
			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	80,95		5685,12						80,95	R\$	-	R\$	5.685,12	

13.200.059/0001-75  
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TELEFONE CENTRO SANTALUZ/BA

MATEUS AGUIAR  
CREA-BA 050433938  
ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.005.677.8



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 01/12/2022      ☀️      ☁️      ☔️      ☁️

MANHÃ      X

TARDE      X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INICIO DA INSTALAÇÃO DAS TESOURAS EM CIMA DO TELHADO
- 2) EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1) CHOVEU O DIA TODO CAUSANDO ATRASO NO ANDAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS PRINCIPALMENTE DO TELHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**ASSINATURAS**

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

**13.200.059/0001-75**  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 11, DENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 05200  
 CONTRATANTE 77.8





OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 03/12/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



MATEUS MOURA AGUIAR  
CREA-BA 0504433938  
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS  
13.200.099/0001-75  
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA  
CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.080.677.8  
CONTRATANTE







OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 05/12/2022                        

MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FINALIZOU O MADEIRAMENTO DA AMPLIAÇÃO DAS SALAS
- 2) EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGAS AREAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**13.200.059/0001-75**  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 44, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
06/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DO ASSENTAMENTO DAS TESOURAS NO VAO CENTRAL DO TELHADO
- 2)
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**13.200.059/0001-75**  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 44 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 07/12/2022



MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS TESOURAS NO VAO CENTRAL DO TELHADO
- 2) INICIO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE AGUA DE DRENAGEM
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS VIGAS AEREAS
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**ASSINATURAS**

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**13.200.050/0001-75**  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 11, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE







OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 10/12/2022



MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 11, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE





OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 12/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS TESOURAS NO VAO CENTRAL DO TELHADO
- 2) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE AGUA DE DRENAGEM
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**ASSINATURAS**

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA: 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.052/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 111 CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 CONTRATANTE





OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
13/12/2022



MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS TESOURAS NO VAO CENTRAL DO TELHADO
- 2) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE AGUA DE DRENAGEM
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

## OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



## ASSINATURAS

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA: 0304433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**13.200.059/0001-75**  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14 CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 14/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE AGUA DE DRENAGEM CORREDOR
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6) FINALIZAÇÃO DA ALVENARIA DA EMPENA DO TELHADO
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.058/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

*Tony Felix Andrade*  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
15/12/2022



MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) INICIO DO CHAPISCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**ASSINATURAS**

**13.200.059/0001-75**  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE





OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
17/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA: 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 141 CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.099.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 18/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA 0504433934  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.019/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14º CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
19/12/2022



MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) FINALIZAÇÃO DO CHAPISCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO BANHEIRO
- 5)
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**ASSINATURAS**

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 050443393/6  
 ENGENHEIRO CIVIL (SANTALUZISTA E AMBIENTAL)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.057/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
20/12/2022



MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) INICIO DO REBOCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO BANHEIRO
- 5)
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**ASSINATURAS**

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL/SANTARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.050/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE





OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**

CONTRATO: 223/2022

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR

INÍCIO: 02/08/2022

CREA-BA: 52230/D BA

ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

PRAZO: 4 MESES

Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
21/12/2022



MANHÃ X

TARDE X

NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO BANHEIRO
- 5)
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR  
CREA-BA 0504433938  
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
ÁPICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA, 14, 1º ANDAR SANTALUZ, BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.015.877.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
22/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO BANHEIRO
- 5) INICIO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.050/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.009.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 23/12/2022                        

MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO BANHEIRO
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**ASSINATURAS**

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.058/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
24/12/2022



MANHÃ      X  
 TARDE      X  
 NOITE      X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA: 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.052/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 25/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



ASSINATURAS

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA: 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.079/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 26/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO BANHEIRO
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 
- 

OCORRÊNCIAS

- 
- 
- 
- 
- 



ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.819/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 27/12/2022



MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MONTAGEM DOS CAIBROS E RIPAS DO TELHADO VÃO CENTRAL
- 2) CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO CORREDOR DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DO TELHADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO BANHEIRO
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



**ASSINATURAS**

**MATEUS MOURA AGUIAR**  
 CREA-BA 0504433938  
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.057/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14 - CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 CONTRATANTE



FOTO 01 EXECUÇÃO DE TELHADO DA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA E CORREDOR



FOTO 02 EXECUÇÃO DO TELHADO DA AMPLIAÇÃO DA SALA DE BANHEIRO





FOTO 03 EXECUÇÃO DE REBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO NA SALA DE AULA



FOTO 04 EXECUÇÃO DE TELhado DO CORREDOR E SALAS DE AULA DA AMPLIAÇÃO



FOTO 05 EXECUÇÃO DE TELHADO DAS SALAS DE AULA DA AMPLIAÇÃO



FOTO 06 EXECUÇÃO DE TELHADO E CHAPISCO DAS PAREDES



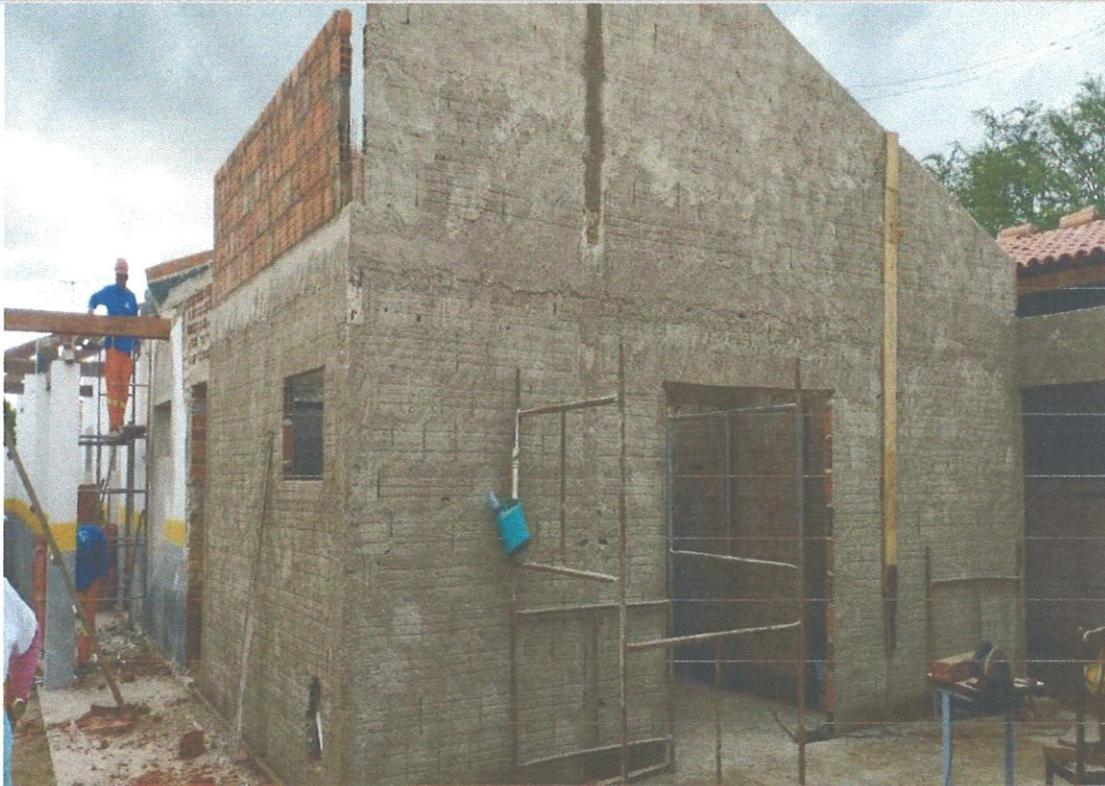


FOTO 07 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA NA COBERTURA



FOTO 08 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA SALA DE AULAS

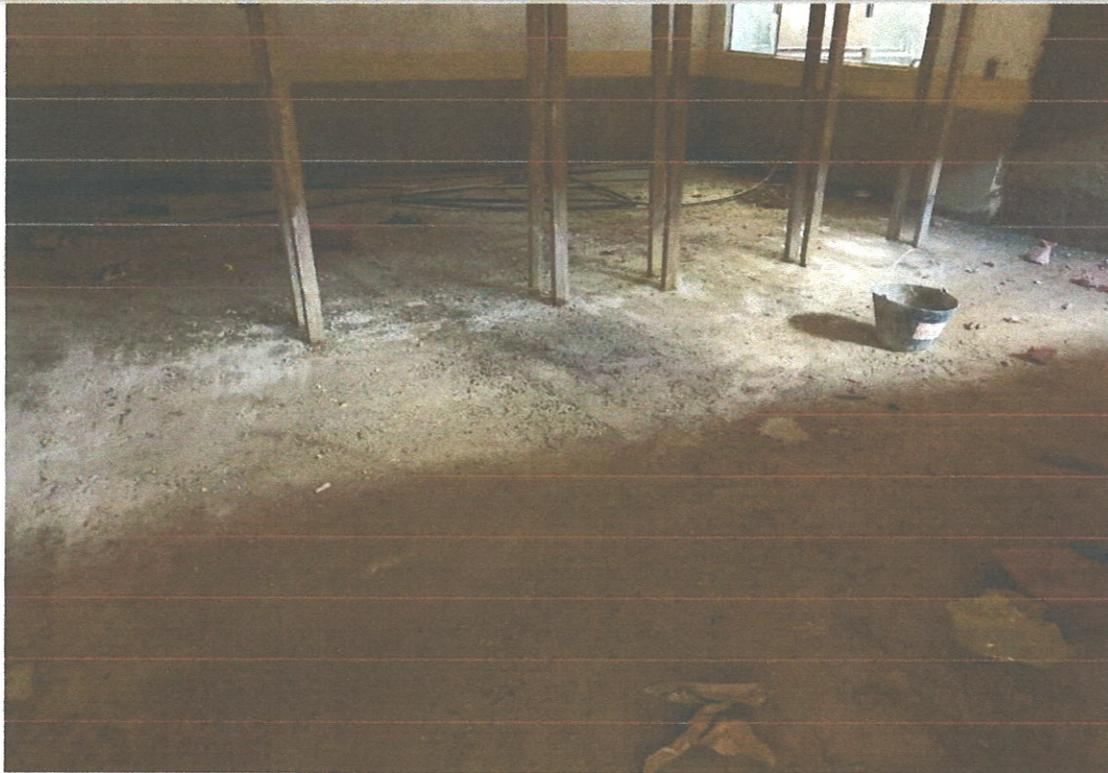


FOTO 09 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA SALAS DE AULA



FOTO 10 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO



## RELATORIO FOTOGRAFICO

ápice engenharia



FOTO 11 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO



FOTO 12 EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA E VIGAS AERIAS

13.200.739/0001-75  
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8



FOTO 13 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DA SALA MULTIMIDIA

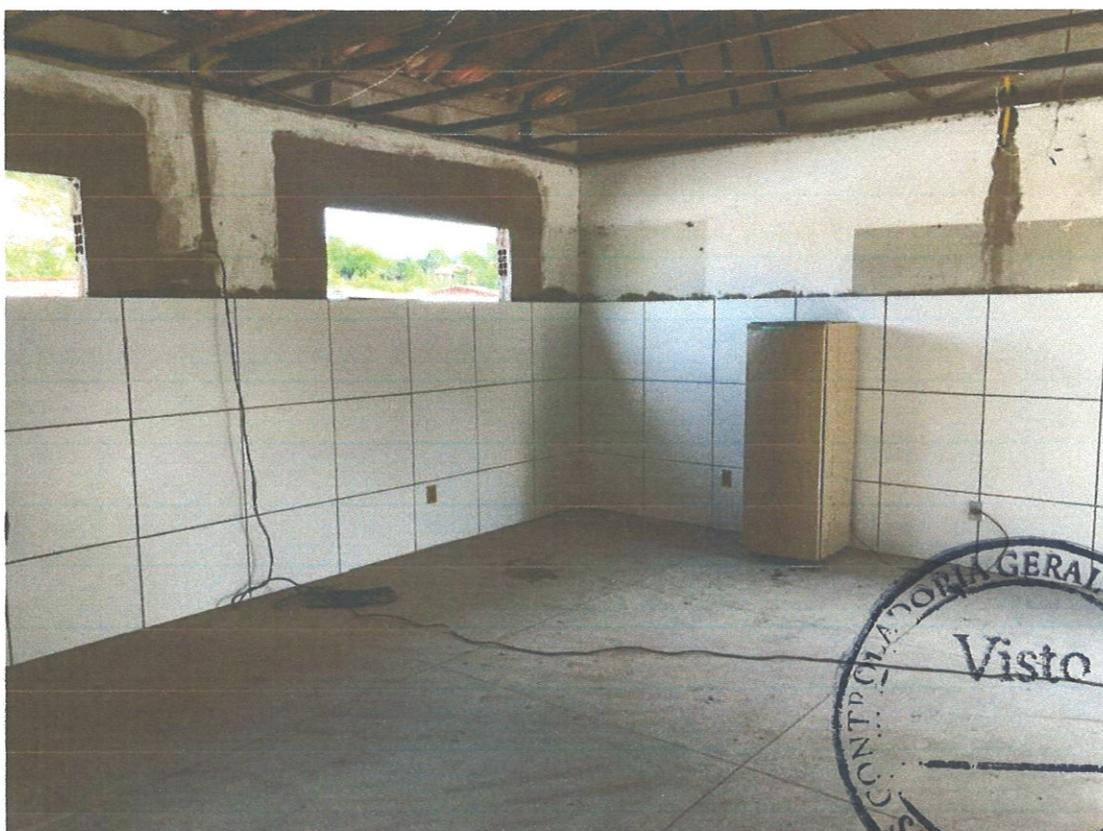


FOTO 14 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DA BIBLIOTECA



FOTO 15 EXECUÇÃO DE REBOCO NAS PAREDES DO BANHEIRO

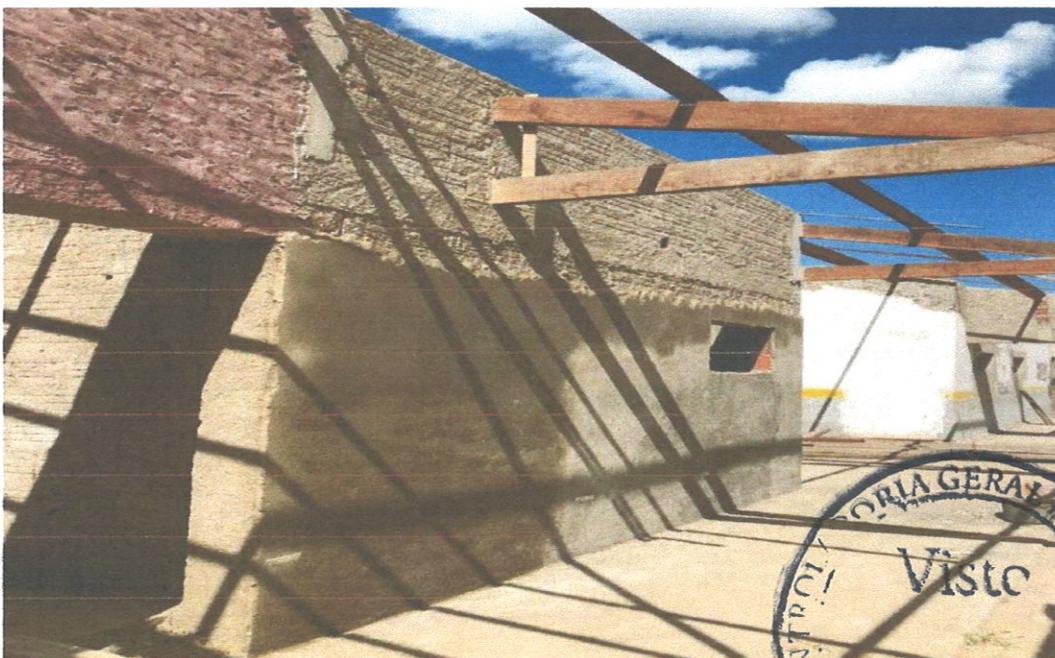


FOTO 16 INSTALAÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA



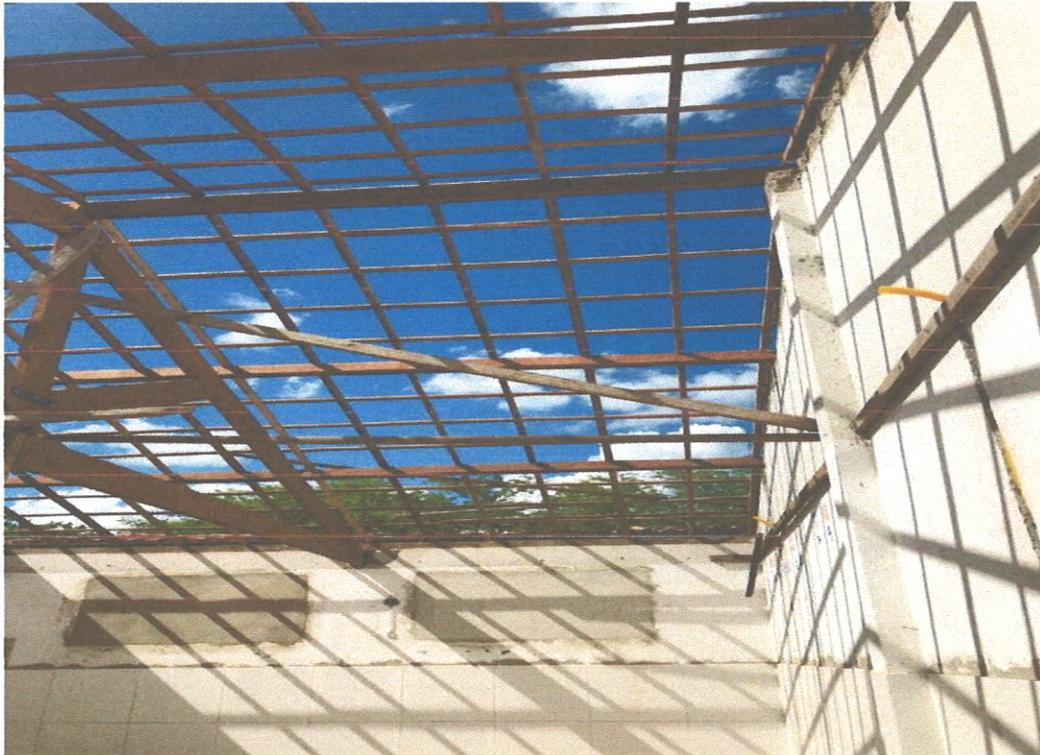


FOTO 17 MADEIRAMENTO DO TELHADO



FOTO 18 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICA





FOTO 19 MADEIRAMENTO DO DA AREA ENTRE OS BANHEIRO E A COZINHA



FOTO 20 MADEIRAMENTO DA SALA JÁ EXISTENTE



FOTO 21 EMBOÇO DO BANHEIRO



FOTO 22 EMBOÇO DOS BANHEIRO NOVOS



13.200.059/0004-75  
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA, 14, CENTRO, SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8



FOTO 23 MADEIRAMENTO DO VÃO CENTRAL



FOTO 24 EMBOÇO DO BANHEIRO



13.200.059/0001-75  
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA 14, CENTRO SANTA LUZ/BA

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

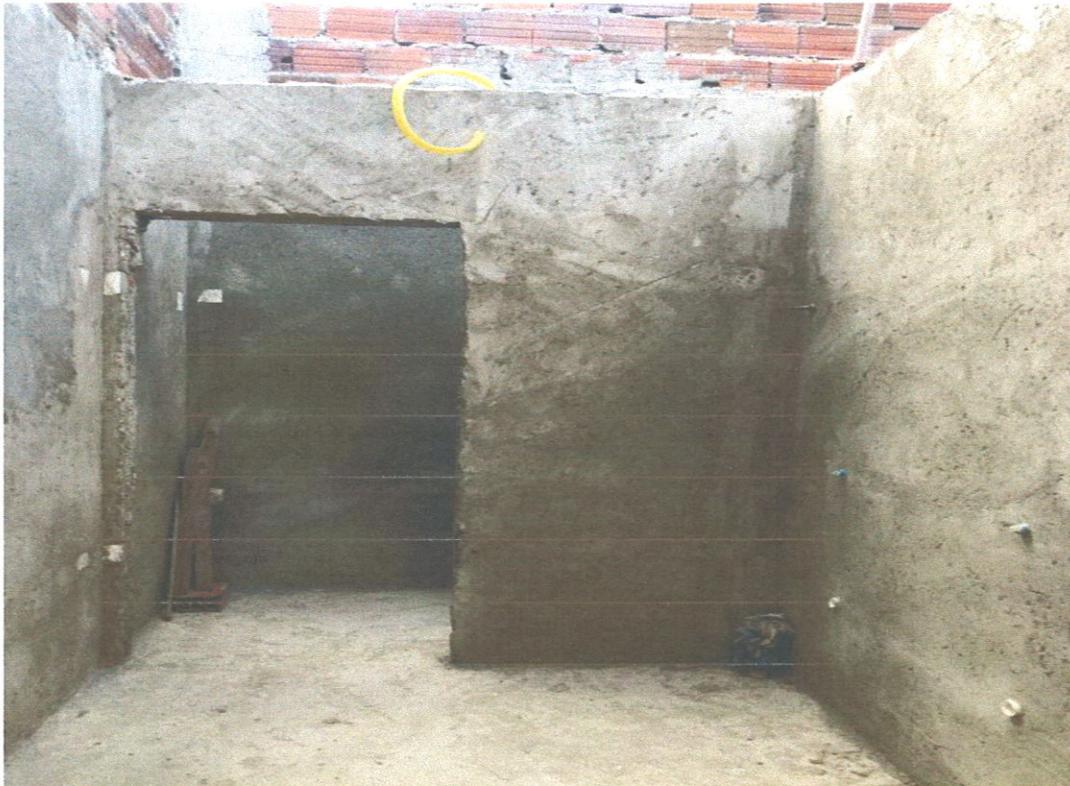


FOTO 25 PONTO DE ELETRICA



FOTO 26 REBOCO DE PAREDES



Data da Transação: 16/12/2022 - 18h34  
Nº de controle: 536.687.116.297.272.813  
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL**

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85880000256 27040328223 54072022336 88186153226**  
Data do Pagamento: **16/12/2022**  
Número do Documento: **07.20.22336.8818615-3**  
Valor Total: **R\$ 25.627,04**  
Autenticação Bancária: **096.536.610**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

**Autenticação**

ig@sByDZ S?AcJ8OD IUAc0He POpUsbs9 XtyDOXsp mYjdo678 WrEGbLai UXy8\*UU9  
UvHpv3f@ QlONs9up DCmHP?W5 YTzAkWei a9iCG8P# FbDSAaBv \*R84ZSYa wAPvQ7t9  
AmIenXtE ndFJJWTH ?L25dQln zQT0o5rC wTgf3UPK hM2X8gAq 00501622 00520062

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Data da Transação: 16/12/2022 - 18h35  
Nº de controle: 536.687.116.297.272.813  
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85860000205 09020385223 54071622336 91811369003**  
Data do Pagamento: **16/12/2022**  
Número do Documento: **07.16.22336.9181136-9**  
Valor Total: **R\$ 20.509,02**  
Autenticação Bancária: **096.537.040**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , junto à Agência 3231, da data de pagamento.

**Autenticação**

AaRIi3kx NiDFa2V3 @4eAEJiR E5HibQEb CERxwZq4 TZQxfd?U zZdr2kxR J28TC#6s  
ZW3Ik5Ap piY@3sR2 g\*BALKAd Pptjeuej I3JEpF67 RAQFKckm RbAx2t6U RhrRTFGp  
#39YIBtZ c9hi8A2? YqaWbmYx H5GPR7jX TYcjQkwQ bcUWLaf# 00501622 00000050

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Data da Transação: 16/12/2022 - 18h34  
Nº de controle: 536.687.116.297.272.813  
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL**

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85880000256 27040328223 54072022336 88186153226**  
Data do Pagamento: **16/12/2022**  
Número do Documento: **07.20.22336.8818615-3**  
Valor Total: **R\$ 25.627,04**  
Autenticação Bancária: **096.536.610**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , junto à Agência 3231, da data de pagamento.

**Autenticação**

ig@sByDZ S?AcJ8OD IUsAcOHe POpUsbs9 XtyDOXsp mYjdo678 WrEGbLAI Uxy8\*UU9  
UvHpv3f@ QlONS9up DCmHP?W5 YtZakWei a9iCG8P# FbDSaAbv \*R84ZSYa wAPvQ7t9  
AmIenXtE ndFJJWTH ?L25dQln zQTOo5rC wTgf3UPK hM2X8gAq 00501622 00520062

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>13.200.059/0001-75</b>	Razão Social <b>APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22343.0132031-2</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000096371901 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>16.637,28</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	4.230,28			4.230,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	10.788,70			10.788,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.618,30			1.618,30
	<b>Totais</b>	<b>16.637,28</b>			<b>16.637,28</b>



SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 16:52:09

85800000166 2 37280385223 8 54071622343 1 01320312061 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000166 2 37280385223 8 54071622343 1 01320312061 4



CNPJ: 13.200.059/0001-75  
 Número: 07.16.22343.0132031-2  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 16.637,28

Pague com o PIX







# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**13.200.059/0001-75**

Razão Social  
**APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Período de Apuração  
**30/11/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.01.22336.8999905-8**

Pagar este documento até  
**20/12/2022**

Observações

Valor Total do Documento  
**148,43**

**Sicalc Contribuinte - 3861 - BA**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	148,43			148,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,43</b>



SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/12/2022 10:02:11

85830000001 7 48430385223 9 54070122336 8 89999058930 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000001 7 48430385223 9 54070122336 8 89999058930 7



CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Número: 07.01.22336.8999905-8  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 148,43





## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 02/12/2022 - 11h05

Nº de controle: 133.083.368.048.025.583 | Autenticação bancária: 083.956.113

Conta de débito: Agência: 3231 | Conta: 20000-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 13.200.059/0001-75

Código de barras: 85870000071-5 82930179221-5 20767105081-8 32000590001-1

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 132000590001

CNPJ/CEI: 13.200.059/0001-75

Cod. convênio: 0179

Competência: 11/2022

Data de validade: 07/12/2022

Data de débito: 02/12/2022

Valor do pagamento: R\$ 7.182,93

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

PauGRU14 xfiF5xE 7VM?#aq4 ?Ei\*rFbH JzpXiotS DStelykL AwaWW?5 hPXjTSLc  
6v9zs#Co VwN4xvra 1tTM\*HSw 9uleNdZT CI3Uy7I2 fqyAdK1 PKe@YHHK v8ERS7@1  
f634SnXS yL?OEXXd YgpN1S#I bR8b6qWj 4ouYVsf1 4A2W5v\*N 00500222 00120082

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/11/2022 - 07h45

Nº de controle: 935.924.883.423.076.802 | Autenticação bancária: 061.445.528

Conta de débito: Agência: 3231 | Conta: 20000-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 13.200.059/0001-75

Código de barras: 85820000049-0 68210179221-5 10767005081-8 32000590001-1

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 132000590001

CNPJ/CEI: 13.200.059/0001-75

Cod. convênio: 0179

Competência: 10/2022

Data de validade: 07/11/2022

Data de débito: 04/11/2022

Valor do pagamento: R\$ 4.968,21

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular PJ.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

NPWRoQv3 jukXeL5s iVTcEGYe \*8bhdioz HNa8cFFN xz?8Q\*rH xmrQJmUm 8ow7z4eM  
e7@4erm? yw7mYU#a gQebtcoi c@tchzkM q\*FZ4VwQ mN4uwRnf 7M2IqQ?V Eys4mCIL  
yvFY6xUR oj?mA68a 8tTpx06i ybXe?hs\* 9lqs?qop n22W4P8\* 00500422 00980068

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 10:04:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34893937
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.786,66	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.200.059/0001-75	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.182,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.182,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 10:04:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34893937
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.786,66	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.200.059/0001-75	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.182,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.182,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ <b>13.200.059/0001-75</b>	Razão Social <b>APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22336.9181136-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000093363082</b>			Valor Total do Documento <b>20.509,02</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.621,11			4.621,11
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	266,64			266,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	13.162,15			13.162,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	484,80			484,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.974,32			1.974,32
<b>Totais</b>		<b>20.509,02</b>			<b>20.509,02</b>



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85860000205 8 09020385223 6 54071622336 9 91811369003 7

CNPJ: 13.200.059/0001-75

Número: 07.16.22336.9181136-9

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 20.509,02





Data da Transação: 16/12/2022 - 18h36  
Nº de controle: 536.687.116.297.272.813  
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85800000166 37280385223 54071622343 01320312061**  
Data do Pagamento: **16/12/2022**  
Número do Documento: **07.16.22343.0132031-2**  
Valor Total: **R\$ 16.637,28**  
Autenticação Bancária: **096.537.480**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , junto à Agência 3231, da data de pagamento.

#### Autenticação

XWBULdnp I1UKbsN5 izj9CENy nnrzYnf8 NqOFFIQW KFyeXtp? bQov@5e\* s@zkTAn3  
JpR5cPoZ vWmZTvxt ?R5eMnvN xrZxGKtv qYtCg3hf #GXc5q8X 3r6RoJ7M OfL3rN\*Q  
asuvWgw@ 5bO?ko#J ?OmBwVIJ H9mxqEGg CUKRHWAa gr2WHWAH 00501622 00630063

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





DATA: 02/12/2022  
 HORA: 10:04:57  
 PAG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
 COD GPS: 2100 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0  
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REMEMORANTE	RENTES	RENTES	PREV SOC	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA						
ANTONIO DE OLIVEIRA DULTRA	1.818,00	727,20	161.13216.58-7	0,00	0,00	21/09/2021	01				203,62	05142
ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.454,40	727,20	124.60439.22-0	0,00	0,00	21/09/2021	01				174,53	05142
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	2.222,00	848,40	162.36819.57-3	0,00	0,00	21/09/2021	01				245,64	05142
CARLOS JOILSON MENDES DA SILVA	1.818,00	727,20	129.22905.08-1	0,00	0,00	21/09/2021	01				203,62	05142
CLAUDIONOR FERREIRA DA CRUZ	1.454,40	484,80	130.28332.06-9	0,00	0,00	02/05/2022	01				155,14	05142
CRISTIANO SILVA PAMPONET	3.000,00	1.500,00	190.11693.84-4	0,00	0,00	21/09/2021	01				360,00	04101
DIOGO DE JESUS DE OLIVEIRA	2.039,47	973,60	161.13236.89-8	0,00	0,00	01/02/2022	01				241,05	07825
ED CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA	1.454,40	727,20	161.13239.44-7	0,00	0,00	21/09/2021	01				174,53	05142
EDISON RIBEIRO SANTANA	1.696,80	848,40	127.46172.07-2	0,00	0,00	21/09/2021	01				203,62	05142
EDIVAN CONCEICAO SANTANA	1.454,40	727,20	124.60439.18-2	0,00	0,00	21/09/2021	01				174,53	05142
ELTON SOUSA DA SILVA	2.039,47	263,10	203.44466.43-9	0,00	0,00	11/10/2022	01				189,42	07152
EVITIAO DOS SANTOS DE ALMEIDA	2.039,47	263,10	162.63770.97-0	0,00	0,00	11/10/2022	01				189,42	07152
FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES	2.039,47	263,10	162.40151.42-5	0,00	0,00	21/09/2021	01				248,09	07825
GENIBALDO FERREIRA LIMA	1.454,40	454,40	124.62051.04-1	0,00	0,00	21/09/2021	01				174,53	05142
GILBERTO RIBEIRO CARLOS	1.454,40	454,40	145.89213.83-0	0,00	0,00	01/07/2022	01				145,45	05142





DATA: 02/12/2022  
 HORA: 10:04:57  
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO:

REMEMBRAMENTO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REMEMBRAMENTO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GUSTAVO SANTANA LIMA	310,75	162.25755.02-1	0,00	93,68	01/07/2022	01				124,30	07170
1.242,98											0,00
JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA	727,20	127.34920.85-0	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00
JOARES CONCEICAO DOS SANTOS	727,20	130.64684.08-5	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00
JOILSON FRANCA CONCEICAO	727,20	190.58760.41-6	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,52	05142
1.454,40											0,00
JOILSON PEREIRA AVELINO	674,79	123.95286.44-5	0,00	297,67	02/08/2022	01				313,11	03423
3.238,99											0,00
JOVENILDO FRANCA CONCEICAO	727,20	128.83219.77-1	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00
JUDICAEL ARAUJO BARBOSA	727,20	154.45880.36-6	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00
LEANDRO SANTANA DE JESUS	727,20	164.10342.75-7	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,52	05142
1.454,40											0,00
LEISIANE LOPES DOS SANTOS SOUZA	606,00	143.55969.27-0	0,00	90,90	21/09/2021	01				145,45	04110
1.212,00											0,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA	775,68	164.10375.88-4	0,00	134,53	21/09/2021	01				197,79	05142
1.696,80											0,00
MACIEL DE PINHO SANTANA	727,20	163.58464.85-0	0,00	112,71	09/12/2021	01				174,52	05142
1.454,40											0,00
MARCELL CARVALHO SANTANA	727,20	143.59100.27-9	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00
MARCELO DE JESUS SILVA	727,20	129.04766.04-0	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00
MILTON SANTOS DA SILVA	727,20	123.66817.75-6	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00
NORMEIDE SANTOS BRANDAO	727,20	141.29381.27-6	0,00	112,71	21/09/2021	01				174,53	05142
1.454,40											0,00



DATA: 02/12/2022  
 HORA: 10:04:57  
 PÁG : 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115  
 COD GPS: 2100  
 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	RAT AJUSTADO
ORLANDO CARDOSO DA SILVA	1.454,40	727,20	236.09975.43-8	21/09/2021	01	3,0	05142
PAULO CESAR ANDRADE RIBEIRO	1.454,40	727,20	165.86237.38-7	21/09/2021	01	3,0	05142
RAMALHO LIMA DA SILVA	1.454,40	727,20	165.86260.90-7	21/09/2021	01	3,0	05142
RUAN AFONSO DE OLIVEIRA	1.454,40	727,20	165.75568.58-1	01/07/2022	01	3,0	07170
SILVIO CONCEICAO NEPOMOCENO	1.454,40	727,20	136.36205.27-6	21/09/2021	01	3,0	05142
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	1.454,40	727,20	123.88531.86-3	21/09/2021	01	3,0	05142
VALMIR DE ASSIS SILVA	1.696,80	848,40	125.55182.42-1	04/10/2021	01	3,0	05142
VALNEIDSON ARAUJO PEREIRA MATOS	1.696,80	787,80	165.35752.65-9	21/09/2021	01	3,0	05142



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA 0,00 190.10639.77-3 23/05/2012 11 02521  
2.424,00 0,00 266,64 0,00 0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 27.784,92 865,69 5.508,92 7.182,93 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP


RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° DE CONTROLE: EBF817uYUZ40000-0  
 N° ARQUIVO: EYhz106ZWZQ0000-5  
 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01  
 UF: BA CEP: 48880-000  
 BAIRRO: CENTRO  
 CNAE PREPONDERANTE 8129000  
 CNAE: 8129000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	62.867,43	26.919,23	64.945,08	865,69
11	1	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	40	65.291,43	26.919,23	67.369,08	865,69



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700000715 829301792215 207671050818 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01  
CIDADE: SANTALUZ  
UF: BA CEP: 48880-000  
BAIRRO: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 8129000  
CNAE: 8129000  
Nº DE CONTROLE: EBF817uYUZ40000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº ARQUIVO: EYhz106ZwZQ0000-5  
INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
62.867,43  
26.919,23

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.182,93	0,00	0,00	0,00	7.182,93



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EYhz106ZwzQ0000-5  
INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8129000  
CNAE: 8129000

Nº DE CONTROLE: EBF817uYUZ40000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
OUTRAS ENT: 1  
FAPAS: 515  
COD GPS: 2100  
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
COMP: 11/2022 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

UF: BA CEP: 48880-000 BAIRRO: CENTRO 8129000  
TELEFONE: 0071 3489 3937 CNAE: 8129000

UF: BA CEP: 48880-000  
TELEFONE: 0071 3489 3937  
CNAE: 8129000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.509,02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.508,92  
SALÁRIO FAMÍLIA: 621,17 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



DATA: 02/12/2022  
HORA: 10:04:57  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
COMPETÊNCIA: 11/2022  
CÓD REC: 115  
FPAS: 515  
INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	89.786,66
DEPÓSITO	7.182,93
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.182,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.







MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 10:04:57  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PÁGTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	13.200.059/0001-75	0,00	2100	515
5.508,92	15.621,27	0,00	621,17	0,00	20.509,02	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
SANTALUZ  
BA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 1354/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

<b>Nome</b> <b>Apice Engenharia e Consultoria LTDA ME</b>		<b>C.G.A</b> <b>2811</b>	<b>C.N.P.J.</b> <b>13.200.059/0001-75</b>
<b>Endereço:</b> Rua Rua Lomanto Júnior, 6º Travessa, Térreo Sala 01, 650 Sala			
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 48880000	<b>Município:</b> SANTALUZ	<b>UF:</b> BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

**Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .  
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:  
24/08/2022

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 20/02/2023

11523.1354.20220824.N.39.8168



Leonardo dos Santos Sousa  
Superintendente do Depto. de Tributos  
Portaria nº 122/2022



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/08/2022 16:19:21 que o documento de hash (SHA-256) 4f0cec2257c9bf252276d62dca4909cc3b10b0845167fa93a4a1817ba5650287 foi validado em 24/08/2022 16:16:38 através da transação blockchain 0xf9c7051df6f5ed71b595c62aeb59e35f08aa83824036f42d26a365d352361eb7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 79757)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4f6cec2257c9bf252276d62dca4909cc3b10b0845167fa93a4a1817ba5650287** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79757** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**20-02-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", cujo assunto é descrito como "**20-02-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", faz prova de que em **24/08/2022 16:16:25**, o responsável **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda (13.200.059/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/08/2022 16:17:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf9c7051df6f5ed71b595c62aeb59e35f08aa83824036f42d26a365d352361eb7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226875989

RAZÃO SOCIAL	
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
101.702.045	13.200.059/0001-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CP no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 13.200.059/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:14:28 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/04/2023.

Código de controle da certidão: **89D2.C7F6.771F.D982**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Certidão n°: 23485408/2022  
Expedição: 25/07/2022, às 10:06:21  
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.200.059/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.200.059/0001-75  
**Razão Social:** APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME  
**Endereço:** PRAC DO TETRA 14 / CENTRO / SANTALUZ / BA / 48880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/12/2022 a 18/01/2023

**Certificação Número:** 2022122001103832814156

Informação obtida em 28/12/2022 08:55:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

