



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 473 / 2023

Data do Empenho: 24/05/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650
 Bairro: CENTRO
 CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual: Cidade: SANTALUZ
 Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X CPF: RG: Estado: BA
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	002-2022RDC	174.000,00	70.080,78	103.919,22
Convênio:	Contrato: 223-2022			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO N°223-2022, NF .202321. BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 18/05/2023.

Data do Empenho: 24/05/2023

Data do Liquidação: 24/05/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 01	2.102,42
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS - FME FONTE 01	4.625,33
## Sessenta e três mil e trezentos e cinquenta e três reais e três centavos ##		Valor Retido 6.727,75
		Valor Líquido 63.353,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	23/05/2023	202321	U			70.080,78

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	70.080,78

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/05/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/05/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3183254



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 473 / 2023

Data do Empenho: 24/05/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SANTALUZ
 Estado: BA
 Complemento: TERREOSALA 01
 CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual:
 CPF:
 RG:
 Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
 Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)


Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 002-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 223-2022	174.000,00	70.080,78	103.919,22
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO Nº 223-2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	70.080,78	70.080,78


Setenta mil e oitenta reais e setenta e oito centavos ## 70.080,78

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/05/2023.



 NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula: 0598

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/05/2023



 NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Secretaria de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
202321
Data da Competência:
Maio/2023
Data e Hora da Emissão:
23/05/2023 11:31:00
Código Verificação:
A2C38DC1D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.200.059/0001-75
Telefone:
753265227...
Nome/Razão Social:
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA ME
Endereço:
RUA RUA LOMANTO JÚNIOR, 6ª TRAVESSA, TÉRREO SALA 01 Nº 650 BAIRRO CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA
E-mail:
CONTRATOS.APICE@GMAIL.COM

Inscrição Municipal:
2811
Inscrição Estadual:
101702045ME
Nome Fantasia:
Apice Engenharia



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social:
Prefeitura Municipal de Santaluz
Endereço:
AVN GETÚLIO VARGAS Nº S/N PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO: CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail:
Não Informado

Inscrição Municipal:
1
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
Período de 01/05/2023 a 18/05/2023

60% MÃO DE OBRA R\$ 42.048,47
40% INSUMOS R\$ 28.032,31

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 23/05/2023 Tony Felix Andrade
Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.059.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 70.080,78

CNAE - 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 70.080,78	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE R\$ 28.032,31	CÁLCULO: R\$ 42.048,47	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 2.102,42	DESC. COND: R\$ 0,00
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 4.625,33	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 35.320,72
------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES

VALORES RETIDO NA NFSE - ISS (5%) R\$ 2.102,42 INSS (11%) 4.625,33 Dados bancários :Bradesco Agência: 3231 Cc: 20.000-0

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Micro Empresário e Empresa de Pequeno Port(ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 6142,27 (Alíquota 17,39 IBPT)



ápice engenharia

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
 LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA
 EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA
 Número da obra 011

01/05/2023 A 18/05/2023
 PERÍODO DE MEDIÇÃO R\$ 905.785,11
 VALOR CONTRATUAL R\$ 70.080,78
 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 123.931,19
 SALDO CONTRATUAL R\$

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	BOLETIM DE MEDIÇÃO 08		VALORES				
							Total	ACUMULADO	PERÍODO	SALDO	ACUMULADO	PERÍODO	SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.645,05						
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	301,02	387,57	2.205,42	6,00		R\$ 2.205,42	R\$ -	R\$ -	
1.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	52,26	45,42	55,46	2.888,33	52,26		R\$ 2.888,34	R\$ -	R\$ -	
1.3	100938 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2020.	M3XKM	522,6	3,77	4,60	2.403,96	522,60		R\$ 2.403,96	R\$ -	R\$ -	
1.4	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	39,9	7,62	9,30	371,07	39,90		R\$ 371,07	R\$ -	R\$ -	
1.5	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	10,55	2,92	3,66	37,66	10,55		R\$ 37,66	R\$ -	R\$ -	
1.6	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	468,41	6,27	7,65	3.583,34	468,41		R\$ 3.583,34	R\$ -	R\$ -	
1.7	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	10,68	255,06	311,45	3.326,28	10,68		R\$ 3.326,29	R\$ -	R\$ -	
1.8	2095 ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	5	11,38	13,90	77,75	5,00		R\$ 69,50	R\$ -	R\$ -	
1.9	3262 ORSE	Remoção de lavatório	un	3	11,38	13,90	46,65	3,00		R\$ 41,70	R\$ -	R\$ -	
1.10	3 ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	228	3,82	4,67	1.197,00	228,00		R\$ 1.064,76	R\$ -	R\$ -	
	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajoto de concreto - Rev.01	m2	269,07	17,25	21,06	5.666,96	269,07		R\$ 5.666,96	R\$ -	R\$ -	
	12 ORSE	Demolição de forros	m2	468,24	5,29	6,46	3.025,92	468,24		R\$ 3.025,92	R\$ -	R\$ -	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.421,00						
2.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	109,91	134,21	13.421,00	95,00		R\$ 12.749,95	R\$ -	R\$ -	671,05
3		SISTEMA DE VEDAÇÃO					44.724,81						
3.1	87487 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	433,26	78,04	95,29	41.285,35	433,26	46,48	R\$ 41.285,35	R\$ 4.429,08	R\$ -	
3.2	9961 ORSE	Telhamento com folha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	105,57	65,29	79,72	8.416,04	65,00	65	R\$ 5.181,80	R\$ 5.181,80	R\$ -	3.234,24
3.3	SANTCO	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	200,54	44,46	54,29	10.887,31	200,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.887,32

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 050443393-8
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

5.1	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm.	un	18	105,76	129,14	2.324,52	18,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	100	13,33	16,27	1.627,00	100,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	9,45	11,53	115,30	10,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4	1150	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâam = 25mm	un	20	4,89	5,97	119,40	20,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.5			CAIXA D'ÁGUA 15.000L					997,23									
5.5.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8	14,55	17,76	142,08	8,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.5.2	94487	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	88,72	83,91	419,55	5,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.5.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	178,37	217,80	435,60	2,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6			ESGOTO					9.284,56									
5.6.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ratos sifonados, etc...)	un	8	60,02	73,29	586,32	8,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8	85,08	103,89	831,12	8,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6.3	1712	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (vs.3390 litros)	un	1	1.826,14	2.229,89	2.229,89	1,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6.4	98058	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL.: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	1.329,85	1.623,87	1.623,87	1,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	2.060,90	2.516,56	2.516,56	1,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6.6	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	138	16,11	20,28	2.798,64	1,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6.7	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREOS DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	25,93	31,66	316,60	10,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6.8	4404	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	UND	6	123,36	150,63	903,78	6,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7			ACESSÓRIOS					12.795,34									
5.7.1	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Ø 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	942,30	1.150,64	1.150,64	1,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	220,95	269,80	1.079,20	4,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	220,95	269,80	539,60	2,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7.4	7180	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P8, DECA ou similar, c/ex. descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2	328,95	401,55	803,10	2,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7.5	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	70,15	85,66	685,28	8,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	418,87	511,48	1.022,96	2,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-
									1,00	1		R\$	511,48	R\$	511,48	R\$	511,48

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.877.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433936
ENGENHEIRO CIVIL
ANÁLISE AMBIENTAL

5.7.7	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020.	UN	7	441,52	539,14	3.940,02	7,00	-	R\$	3.773,98	R\$	3.773,98	R\$	-
5.7.8	93396	SINAPI	BANDEIRA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR. FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	4	404,67	494,14	1.976,56	4,00	-	R\$	1.976,56	R\$	1.976,56	R\$	-
5.7.9	93441	SINAPI	BANDEIRA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 04/2020.	UN	2	629,76	766,99	1.537,98	2,00	-	R\$	1.537,98	R\$	1.537,98	R\$	-
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					36.430,12								
6.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.	M	249,84	2,24	2,73	682,06	249,84	-	R\$	682,06	R\$	-	R\$	-
6.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.	M	2583,93	3,22	3,93	10.164,84	2.583,93	-	R\$	10.164,84	R\$	-	R\$	-
6.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.	M	114,85	5,15	6,28	721,25	114,85	-	R\$	721,26	R\$	-	R\$	-
6.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.	M	156	11,50	14,04	2.190,24	156,00	-	R\$	2.190,24	R\$	-	R\$	-
6.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021.	M	36	20,36	24,86	894,96	36,00	-	R\$	894,96	R\$	-	R\$	-
6.6	8896	ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar.	un	4	33,05	40,35	161,40	4,00	-	R\$	161,40	R\$	-	R\$	-
6.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017.	UN	4	98,93	120,80	483,20	4,00	-	R\$	483,20	R\$	-	R\$	-
6.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	4	8,57	10,46	41,84	4,00	-	R\$	41,84	R\$	-	R\$	-
6.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	11	9,10	11,11	122,21	11,00	-	R\$	122,21	R\$	-	R\$	-
6.10	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	1	10,08	12,30	12,30	1,00	-	R\$	12,30	R\$	-	R\$	-
6.11	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2021.	UN	1	739,60	903,12	903,12	1,00	-	R\$	903,12	R\$	-	R\$	-
6.12	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	48,82	59,36	237,44	4,00	-	R\$	237,44	R\$	-	R\$	-
6.13	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1	79,36	96,90	96,90	1,00	-	R\$	96,90	R\$	-	R\$	-
6.14	9050	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NIEMA (Americano - linha antiga). 5KA.	un	3	96,99	118,43	360,96	3,00	-	R\$	360,96	R\$	-	R\$	-
6.15	93677	SINAPI	DISJUNTOR DR 90 A	UN	1	88,67	108,27	108,27	1,00	-	R\$	108,27	R\$	-	R\$	-
6.16	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.	M	468,81	7,22	8,81	4.130,21	468,81	-	R\$	4.130,22	R\$	-	R\$	-
6.17	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.	M	38,15	9,25	11,29	430,71	38,15	-	R\$	430,71	R\$	-	R\$	-
6.18	93003	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021.	M	79	11,95	14,59	1.162,61	79,00	-	R\$	1.162,61	R\$	-	R\$	-
6.19	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.	M	24	11,64	14,21	341,04	24,00	-	R\$	341,04	R\$	-	R\$	-

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 050433938
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

6.20	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5	6,82	8,32	41,60	5,00			R\$	41,60	R\$	-	R\$	-
6.21	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	11,12	13,57	54,28	4,00			R\$	54,28	R\$	-	R\$	-
6.22	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	4	11,47	14,00	56,00	4,00			R\$	56,00	R\$	-	R\$	-
6.23	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	4	17,38	21,22	84,88	4,00			R\$	84,88	R\$	-	R\$	-
6.24	12228	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	440,94	538,43	538,43	1,00			R\$	538,43	R\$	-	R\$	-
6.25	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	11	23,86	29,13	320,43	11,00			R\$	320,43	R\$	-	R\$	-
6.26	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	23	30,10	36,75	845,25	23,00			R\$	845,25	R\$	-	R\$	-
6.27	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1	55,12	67,30	67,30	1,00			R\$	67,30	R\$	-	R\$	-
6.28	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	49	20,07	24,50	1.200,50	49,00			R\$	1.200,50	R\$	-	R\$	-
6.29	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	8	32,57	39,77	318,16	8,00			R\$	318,16	R\$	-	R\$	-
6.30	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	10	31,35	38,28	382,80	10,00			R\$	382,80	R\$	-	R\$	-
6.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	23,23	28,36	56,72	2,00			R\$	56,72	R\$	-	R\$	-
6.32	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eleitroduto - Rev 01	un	104	12,94	15,80	1.737,84	104,00			R\$	1.643,20	R\$	-	R\$	-
6.33	9138	ORSE	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "X", com tampa	un	26	21,65	26,43	687,18	26,00			R\$	687,18	R\$	-	R\$	-
6.34	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1	566,32	691,53	691,53	1,00			R\$	691,53	R\$	691,53	R\$	-
6.35	4879	ORSE	Bocal para lâmpada incandescente	un	16	6,94	8,47	135,52	16,00			R\$	135,52	R\$	-	R\$	-
6.36	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020_P	UN	16	23,61	28,63	461,28	16,00			R\$	461,28	R\$	-	R\$	-
6.37	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	20	81,09	99,01	1.980,20	20,00			R\$	1.980,20	R\$	-	R\$	-
6.38	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	20	116,79	142,61	2.852,20	20,00			R\$	2.852,20	R\$	-	R\$	-
6.39	9891	ORSE	Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lâmpada eletrônica, ref. XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	6	94,52	115,41	692,46	6,00			R\$	692,46	R\$	-	R\$	-
7			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					26.898,73				R\$	-	R\$	6,00	R\$	692,46
7.1	56523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	m³	21,66	81,28	99,25	2.149,76	21,66			R\$	2.149,76	R\$	-	R\$	-
7.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	196,1	89,90	109,78	26.365,84	196,10			R\$	21.527,86	R\$	-	R\$	-
8			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					11.045,49				R\$	-	R\$			
8.1			INFRAESTRUTURA					7.237,00				R\$	-	R\$			

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6 - TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677-8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREATA 050443398
ENGENHEIRO CIVIL - SANEAMENTO E AMBIENTAL

8.1.1	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,5	330,08	403,06	201,63					R\$		R\$	
8.1.2	95966 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	6,26	2.165,91	2.644,79	16.556,39	0,50				201,53	R\$		R\$
8.1.3	11322 ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	78,4	17,07	20,84	1.633,95	6,26				R\$	16.556,39	R\$	
8.1.4	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,36	443,69	541,78	195,04		78,40			R\$		R\$	1.633,86
8.1.5	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	70,5	31,51	38,47	2.712,14	0,36				R\$	195,04	R\$	
8.2		SUPERESTRUTURA					3.808,49	70,50				R\$	2.712,14	R\$	
8.2.1	95966 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	11,58	2.165,91	2.644,79	30.626,67	11,58		1,14		R\$	30.626,67	R\$	3.015,06
9		REVESTIMOTOS					75.540,60					R\$		R\$	
9.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	675,33	3,94	4,81	3.248,34					R\$		R\$	
9.2	87547 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m³	1289,03	20,95	25,68	32.461,79	653,00				R\$	3.140,93	R\$	107,41
9.3	5057 ORSE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALLAS. AF_06/2014	m²	116,68	309,80	378,29	44.138,87	1.220,00				R\$	31.207,60	R\$	1.254,19
10		Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2". fornecimento e montagem										R\$		R\$	
10.1	43 ORSE	COBERTURA					81.166,04	116,68				R\$	44.138,88	R\$	
10.1		Retirada de calha	m	81,44	9,19	11,22	1.026,14					R\$		R\$	
10.2	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	25,38	30,99	1.239,60	81,44				R\$	913,76	R\$	
10.3	9434 ORSE	Rulo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	66,22	31,47	38,42	2.621,01	40,00				R\$	1.239,60	R\$	
10.4	263 ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, fibabana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	180	55,56	67,84	12.897,20	68,22				R\$	2.621,01	R\$	
10.5	8269 ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (lundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	154,54	167,26	204,24	31.563,24	180,00				R\$	12.211,20	R\$	
10.6	94195 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	159,68	21,79	26,61	4.249,08	154,54		12,54		R\$	31.563,25	R\$	2.561,17
10.7	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	595,16	71,85	87,70	52.213,39	159,68				R\$	4.249,08	R\$	
10.8	4449 ORSE	Forno de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Atalobros ou similar, instalado - Rev.06_10/2021	m2	619,68	39,58	48,33	29.949,13	595,16				R\$	52.213,39	R\$	
							619,68					R\$	29.949,13	R\$	

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, N° 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 55044339/38
 ENGENHEIRO CIVIL

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


10.9	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	m2	687,17	9,34	11,40	7.833,74	687,17	-	R\$ 7.833,74	R\$ -	R\$ -	
10.10	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	und	3	2.146,74	2.621,39	7.864,17	687,17	-	R\$ 7.833,74	R\$ -	R\$ -	
10.11	92556	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	und	4	1.247,56	1.523,39	6.093,56	3,00	-	R\$ 7.864,17	R\$ -	R\$ -	
100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	229,34	14,25	17,40	3.990,52	4,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	229,34	12,97	15,84	3.989,25	229,34	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11001	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO TIPO CANAL, COLONIAL	m2	2	1.143,85	1.396,76	2.793,52	229,34	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11		PISOS					2,00	188.830,80	2,00	2	-	-	R\$ -	
11.1		PISOS INTERNOS						120.089,28					R\$ -	
11.1.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	26,02	443,69	541,78	14.097,12	-	-	R\$ 14.097,12	R\$ -	R\$ -	
11.1.2	10170	ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	0	28,26	34,80	11.407,08	26,02	-	R\$ 14.097,12	R\$ -	R\$ -	
4786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8' MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	M2	532,86	58,82	73,08	38.940,39	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2259	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	134,01	11,32	13,82	1.852,01	532,86	-	-	R\$ 38.941,41	R\$ 1.870,61	R\$ -	
2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	393,54	9,85	12,02	4.730,35	134,01	-	-	R\$ 1.852,02	R\$ 1.852,02	R\$ -	
9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antiárida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	246,66	56,74	68,28	17.088,60	393,54	-	-	R\$ 4.730,35	R\$ 282,95	R\$ -	
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	932,33	59,83	73,05	68.106,70	246,66	-	-	R\$ 17.088,60	R\$ 3.231,60	R\$ -	
7987	ORSE	Passifina de vidro, 2,5 x 2,5 cm, cor vermelho, ref: D 4070, linha Cristal, marca Vitrocolorf ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço	m2	46,32	159,12	194,30	8.989,97	890,00	-	40	42,53	R\$ 65.014,50	R\$ 2.922,00	R\$ 3.092,21
42	ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiros/falhadetas	m²	949,5	1,73	2,11	2.003,45	46,32	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.999,98	
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,4	61,18	76,01	410,45	949,50	-	-	R\$ 2.003,45	R\$ -	R\$ 2.006,96	
							5,40	410,45	5,40	-	R\$ 410,45	R\$ -	R\$ 410,45	

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6° TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 050433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

11.2		PISOS EXTERNOS						38.741,52												
11.2.1	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	247,57	45,33	55,35		13.702,99												
11.2.2	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	189,54	45,33	55,35		10.491,03	200,00				200,00	47,57	R\$	11.070,00	R\$	11.070,00	R\$	2.633,00
11.2.3	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	3,18	68,19	83,26		264,76	189,54				189,54		R\$	10.491,04	R\$	10.491,04	R\$	-
11.2.4	98510 SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	12	48,07	58,69		704,28						3,18	R\$	-	R\$	-	R\$	264,77
11.2.5	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	7	29,32	35,80		250,80						12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	704,28
11.2.6	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	31,83	13,90	16,97		540,15						7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	250,60
11.2.7	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	23,22	451,01	550,72		12.787,71						31,83	R\$	-	R\$	-	R\$	540,16
12		PINTURA																		
12.1	2344 ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1615,79	3,32	4,06		17.304,84						23,22	R\$	-	R\$	-	R\$	12.787,72
12.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1615,79	2,33	2,84		4.588,84	1.550,00				1.550,00	65,79	R\$	6.293,00	R\$	203,00	R\$	287,11
12.3	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1615,79	9,31	11,36		18.355,37	1.550,00				1.550,00	65,79	R\$	4.402,00	R\$	142,00	R\$	186,84
12.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m³	1538,03	10,98	13,40		20.609,60	1.550,00				1.550,00	65,79	R\$	17.608,00	R\$	588,00	R\$	747,37
12.5	3733 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Deguard FS ou similar- R1	m²	290,02	13,62	16,63		4.823,03	550,00				550,00	988,03	R\$	7.370,00	R\$	670,00	R\$	13.239,60
12.6	102513 SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM Rolo. AF_05/2021	m²	77,72	36,55	44,83		3.468,64						290,02	R\$	-	R\$	-	R\$	4.823,03
12.7	100745 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	105,57	18,14	22,15		2.338,37						77,72	R\$	-	R\$	-	R\$	3.468,64
12.8	3841 ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m²	318,76	16,42	20,05		6.400,70						105,57	R\$	-	R\$	-	R\$	2.338,38
13		LETREIRO																		
13.1	12053 ORSE	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	20	49,92	60,95		4.994,77							R\$	6.391,14	R\$	6.391,14	R\$	-
13.2	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	15	79,20	96,71		1.450,65						20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.219,00
13.3	12057 ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	14	136,01	166,08		2.325,12						15,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.450,65
14		CASTELO D'ÁGUA																		
14.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																		
14.1.1	98523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	5,78	81,28	99,25		748,11							R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.1.2	93382 SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	1,06	33,73	41,19		92,81	5,78						R\$	573,67	R\$	-	R\$	-
14.1.3	5103 ORSE	Regularização Manual	m²	12,96	4,59	5,60		81,64	1,06						R\$	43,66	R\$	-	R\$	-
								12,96							R\$	72,58	R\$	-	R\$	-


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

RUA LOMANTO JUNIOR, TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 050433393
 ENGENHEIRO CIVIL SANITARISTA E AMBIENTAL

14.2	101175 SINAPI	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA	M	56	108,54	132,53	43.117,91						
14.2.	1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRAÇO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020					7.421,68					R\$	7.421,68 R\$
14.2.	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,96	330,08	403,06	5.223,65	56,00				R\$	5.223,66 R\$
14.2.	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COAAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,2	78,22	95,51	687,67	12,96				R\$	687,67 R\$
14.2.	95956 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), ECK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,71	2.185,91	2.844,79	12.456,96	7,20				R\$	12.456,96 R\$
14.2.	15	CASTELO D'AGUA 15.000 L	und	1	14.190,45	17.327,95	17.327,95	4,71				R\$	17.327,95 R\$
15.1	9165 ORSE	PARQUE INFANTIL					13.366,55	1,00				R\$	13.366,55 R\$
15.2	9483 ORSE	Briqueteo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim.:1,54x1,54x2,04m, ref: Srdipark ou similar.	Un	1	2.757,93	3.367,70	3.367,70					R\$	3.367,70 R\$
15.3	9160 ORSE	Briqueteo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Alalala Nova	un	2	1.102,49	1.346,25	2.692,50		1,00			R\$	2.692,50 R\$
15.4	9166 ORSE	Briqueteo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2", e assento em chapa galvanizada ø=1/4", serdipark ou similar.	un	1	2.682,81	3.275,97	3.275,97		2,00			R\$	3.275,97 R\$
15.4	9166 ORSE	Briqueteo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueteira plástica fransp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1	3.299,80	4.029,38	4.029,38		1,00			R\$	4.029,38 R\$
16		CANTEIROS E BANCOS					12.725,40		1,00			R\$	12.725,40 R\$
16.1	93356 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,47	68,04	83,08	371,36					R\$	371,36 R\$
16.2	94932 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,94	330,08	403,06	378,87	4,47				R\$	378,87 R\$
16.3	87478 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MF SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	59,19	39,34	48,03	2.842,89	0,94				R\$	2.842,89 R\$
16.4	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	118,38	3,94	4,81	569,40	59,19				R\$	569,41 R\$
16.5	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	118,38	20,95	25,58	3.028,16	118,38				R\$	3.028,16 R\$
16.6	88465 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	118,38	9,31	11,36	1.344,79	118,38				R\$	1.344,80 R\$
16.7	88469 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	118,38	10,98	13,40	1.586,29	118,38				R\$	1.586,29 R\$
16.8	198 ORSE	Mediramento em massa: randa/ub/madeira de lei, acabamento aparelhoado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças ordinárias.	m2	16,21	95,57	116,70	1.891,70		16,21			R\$	1.891,71 R\$

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433936
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 13.200.059/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:04:05 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2023.

Código de controle da certidão: **BA73.A8CC.0321.43FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20231980189

RAZÃO SOCIAL	
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
101.702.045	13.200.059/0001-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/03/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
SANTALUZ
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 31/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr. (*).

Nome Apice Engenharia e Consultoria LTDA ME		C.G.A. 2811	C.N.P.J. 13.200.059/0001-75
Endereço: Rua Rua Lomanto Júnior, 6º Travessa, Térreo Sala 01, 650 Sala			
Bairro: Centro	CEP: 48880000	Município: SANTALUZ	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
05/01/2023

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 04/07/2023

12247.31.20230105.N40.8168



Leonardo dos Santos Sousa
Superintendente de Depto. de Tributos
Portaria nº 1223/2023



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/01/2023 09:49:47 que o documento de hash (SHA-256) fbd5231b0fa9ff0705c7b0412842d2d8cf59234904f4f44aad901b7a46eda42d foi validado em 05/01/2023 09:46:42 através da transação blo 0x2ecbe7444cbbd6fc51925e0c6682538bca311fc321cf55f032fa011dd3a4e462 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck>



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fb5231b0faff0705c7b0412842d2d8cf59234904f4f44aad901b7a46eda42d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **104601** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**04-07-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", cujo assunto é descrito como "**04-07-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", faz prova de que em **05/01/2023 09:46:44**, o responsável **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda (13.200.059/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/01/2023 09:49:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2ecbe744cbbd6fc51925e0c6682538bca311fc321cf55f032fa011dd3a4e462**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.200.059/0001-75
Razão Social: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Endereço: PRAC DO TETRA 14 / CENTRO / SANTALUZ / BA / 48880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050201053113892361

Informação obtida em 12/05/2023 07:27:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.200.059/0001-75
Certidão n°: 4890396/2023
Expedição: 02/02/2023, às 15:13:50
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.200.059/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000513 480701792306 507676050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO DE OLIVEIRA DULTRA	1.562,40	0,00	161.13216.58-7	0,00	21/09/2021	01					05142	0,00
ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.562,40	0,00	124.60439.22-0	0,00	21/09/2021	01				124,99	05142	0,00
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	1.822,80	0,00	162.36819.57-3	0,00	21/09/2021	01				125,00	05142	0,00
CARLOS JOILSON MENDES DA SILVA	1.562,40	0,00	129.22905.08-1	0,00	21/09/2021	01				145,82	05142	0,00
CLAUDIONOR FERREIRA DA CRUZ	1.562,40	0,00	130.28332.06-9	0,00	02/05/2022	01				125,00	05142	0,00
CRISTIANO SILVA PAMPONET	3.000,00	0,00	190.11693.84-4	0,00	21/09/2021	01				125,00	05142	0,00
DIOGO DE JESUS DE OLIVEIRA	2.057,47	0,00	161.13236.89-8	0,00	01/02/2022	01				240,00	04101	0,00
ED CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA	1.562,40	0,00	161.13239.44-7	0,00	21/09/2021	01				164,59	07825	0,00
EDISON RIBEIRO SANTANA	1.822,80	0,00	127.46172.07-2	0,00	21/09/2021	01				124,99	05142	0,00
EDIVAN CONCEICAO SANTANA	1.458,24	0,00	124.60439.18-2	0,00	21/09/2021	01				145,83	05142	0,00
ELTON SOUSA DA SILVA	2.229,58	0,00	203.44466.43-9	0,00	11/10/2022	01				116,66	05142	0,00
EVITTIAO DOS SANTOS DE ALMEIDA	2.229,58	0,00	162.63770.97-0	0,00	11/10/2022	01				178,36	07152	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES	2.057,47	0,00	162.40151.42-5	0,00	21/09/2021	01				178,36	07152	0,00
GENIBALDO PEREIRA LIMA	1.562,40	0,00	124.62051.04-1	0,00	21/09/2021	01				164,59	07825	0,00
GILBERTO RIBEIRO CARLOS	1.562,40	0,00	145.89213.83-0	0,00	01/07/2022	01				125,00	05142	0,00
										124,99	05142	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000513 480701792306 507676050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA	0,00	127.34920.85-0			21/09/2021	01				05142
2.031,12		0,00			164,62				162,49	0,00
JOARES CONCEICAO DOS SANTOS	0,00	130.64684.08-5			21/09/2021	01				05142
1.900,92		0,00			152,90				152,07	0,00
JOLLSON FRANCA CONCEICAO	0,00	190.58760.41-6			21/09/2021	01				05142
1.562,40		0,00			122,43				124,99	0,00
JOLLSON PEREIRA AVELINO	0,00	123.95286.44-5			02/08/2022	01				07102
3.431,06		0,00			320,72				274,49	0,00
JOVENILDO FRANCA CONCEICAO	0,00	128.83219.77-1			21/09/2021	01				05142
1.562,40		0,00			122,43				125,00	0,00
JUDICAEL ARAUJO BARBOSA	0,00	154.45880.36-6			21/09/2021	01				05142
2.031,12		0,00			164,62				162,48	0,00
LEANDRO SANTANA DE JESUS	0,00	164.10342.75-7			21/09/2021	01				05142
1.562,40		0,00			122,43				124,99	0,00
LEISIANE LOPES DOS SANTOS SOUZA	0,00	143.55969.27-0			21/09/2021	01				04110
1.302,00		0,00			99,00				104,16	0,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA	0,00	164.10375.88-4			21/09/2021	01				05142
729,12		0,00			54,68				58,32	0,00
MACIEL DE PINHO SANTANA	0,00	163.58464.85-0			09/12/2021	01				05142
1.562,40		0,00			122,43				124,99	0,00
MARCELL CARVALHO SANTANA	0,00	143.59100.27-9			21/09/2021	01				05142
1.900,92		0,00			152,90				152,07	0,00
MARCELO DE JESUS LIMA	0,00	129.04766.04-0			21/09/2021	01				05142
1.562,40		0,00			122,43				125,00	0,00
MILTON SANTOS DA SILVA	0,00	123.66817.75-6			21/09/2021	01				05142
1.900,92		0,00			152,90				152,08	0,00
NORMEIDE SANTOS BRANDAO	0,00	141.29381.27-6			21/09/2021	01				05142
1.562,40		0,00			122,43				124,99	0,00
ORLANDO CARDOSO DA SILVA	0,00	236.09975.43-8			21/09/2021	01				05142
1.562,40		0,00			122,43				124,99	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023
 HORA: 10:56:09
 PAG: 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858300000513 480701792306 507676050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PAULO CESAR ANDRADE RIBEIRO	1.562,40	0,00	165.86237.38-7	0,00	21/09/2021	01					05142	0,00
RAMALHO LIMA DA SILVA	1.562,40	0,00	165.86260.90-7	0,00	21/09/2021	01				124,99	05142	0,00
SILVIO CONCEICAO NEPOMOCENO	1.562,40	0,00	136.36205.27-6	0,00	21/09/2021	01				124,99	0,00	0,00
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	1.562,40	0,00	123.88531.86-3	0,00	21/09/2021	01				124,99	05142	0,00
VALMIR DE ASSIS SILVA	2.499,84	0,00	125.55182.42-1	0,00	04/10/2021	01				125,00	05142	0,00
VALNEIDSON ARAUJO PEREIRA MATOS	1.822,80	0,00	165.35752.65-9	0,00	21/09/2021	01				199,99	05142	0,00
										145,87	05142	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000513 480701792306 507676050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FAP: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO:
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL 23/05/2012 11 02521
 ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA 0,00 190.10639,77-3 286,44 0,00 0,00
 2.604,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.954,96 0,00 5.480,09 5.148,07 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000513 480701792306 507676050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: I82hC8GcI5n0000-1

Nº ARQUIVO: 00U5POpuTxD0000-0
INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01

RAT: 3,0

CIDADE: SANTALUZ

BAIRRO: CENTRO

UF: BA

CEP: 48880-000

CNAE PREFONDERANTE 8129000
CNAE: 8129000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	64.350,96	0,00	64.350,96	0,00
11	1	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
TOTAIS:	37	66.954,96	0,00	66.954,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000513 480701792306 507676050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: I82hc8GoIsn0000-1 N° ARQUIVO: OOU5PopuTxD0000-0
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8129000
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 CNAE: 8129000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 64.350,96
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.148,07	0,00	0,00	0,00	5.148,07

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: I62hc8GoI5n0000-1 N° ARQUIVO: OOU5P0puTxD0000-0
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8129000
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 TELEFONE: 0071 3489 3937 CNAE: 8129000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.055,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.480,09
SALÁRIO FAMÍLIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.200.059/0001-75
Nome	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19559348609 / eSocial 51265749 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.422,03	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.356,25	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.732,33	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.510,61	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA
CPF	816.174.455-68
Telefone	9997-7059

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/05/2023 09:53:02
Nº do recibo de entrega	0000050000129616410
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.922.456/0001-05

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 13.200.059/0001-75

Dados Iniciais

Classificação Tributária 99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular 0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores Não

Endereço

Logradouro LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA Número 650
Complemento TERREOSALA 01 Bairro/Distrito CENTRO
Município Santaluz UF BA
CEP 48880000 Telefone 7532652278
Correio Eletrônico DOCUMENTACAO@CONTABILPEDREIRA.COM.BR

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA CPF 81617445568
Telefone 99977059
Correio Eletrônico -
Responsável pelo Preenchimento -
CPF -
UF - CRC -
Correio Eletrônico - Telefone -

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1082-01 Descrição CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito 04/2023
Débito Apurado 5.135,59
Deduções Salário Família: 478,56
Retenção Lei 9711/98: 4.657,03
Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1170-01 Descrição CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito 04/2023
Débito Apurado 1.608,77
Deduções Retenção Lei 9711/98: 1.608,77
Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1191-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito 04/2023
Débito Apurado 643,50
Deduções Retenção Lei 9711/98: 643,50
Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1196-01 Descrição CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito 04/2023
Débito Apurado 965,26
Deduções Retenção Lei 9711/98: 965,26
Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1176-01 Descrição CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito 04/2023
Débito Apurado 128,70
Deduções Retenção Lei 9711/98: 128,70
Saldo a Pagar 0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita 1200-01 Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito 04/2023
Débito Apurado 386,10
Deduções Retenção Lei 9711/98: 386,10
Saldo a Pagar 0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ	13.200.059/0001-75
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000129616410
Data/Hora da Transmissão	03/05/2023 09:53:02	Identificação da Apuração de Débitos	19559348609 / eSocial 51265749 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	478,56	478,56	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	34.919,48	23.032,05	11.887,43

RELATORIO FOTOGRAFICO



ápice engenharia



FOTO 01 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO



FOTO 02 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 8ª TRAVESSA, Nº 650



FOTO 03 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO



FOTO 04 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO



FOTO 05 EXECUÇÃO DE MASSA ACRILICA



FOTO 06 EXECUÇÃO DE MASSA ACRILICA

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433936
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650

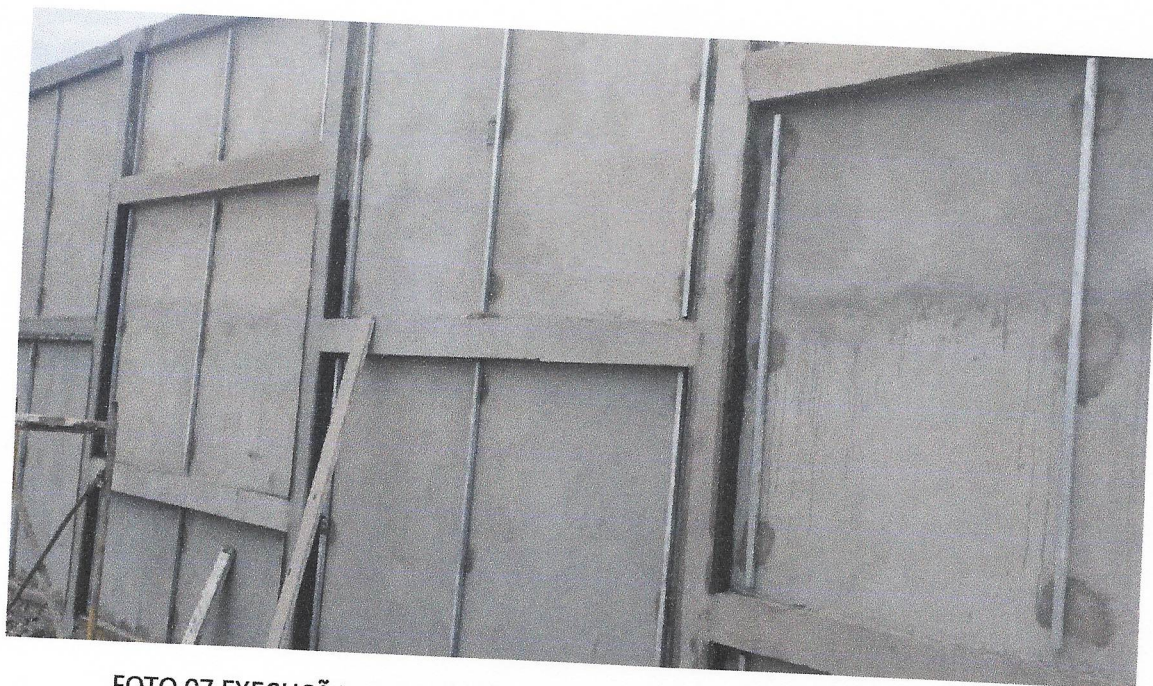


FOTO 07 EXECUÇÃO DE FIXADOR PARA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METALICAS



FOTO 08 EXECUÇÃO DE ALVENARIA E CHAPISCO DO MURO FRONTAL

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650



FOTO 09 EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO

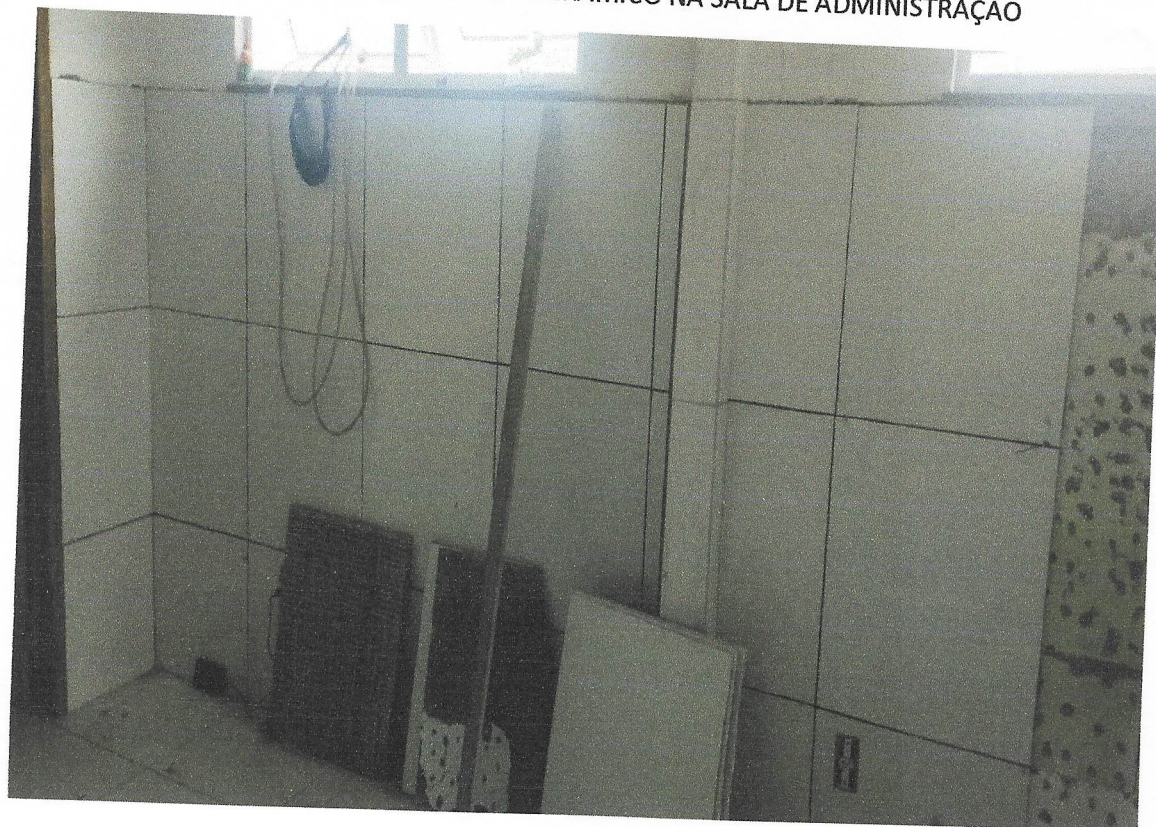



FOTO 10 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650



FOTO 11 INSTALAÇÃO DE CALHA NO TELHADO



FOTO 12 INSTALAÇÃO DE CALHA NO TELHADO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650



FOTO 13 INSTALAÇÃO DE MICTORIO



FOTO 14 INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO



FOTO 15 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE

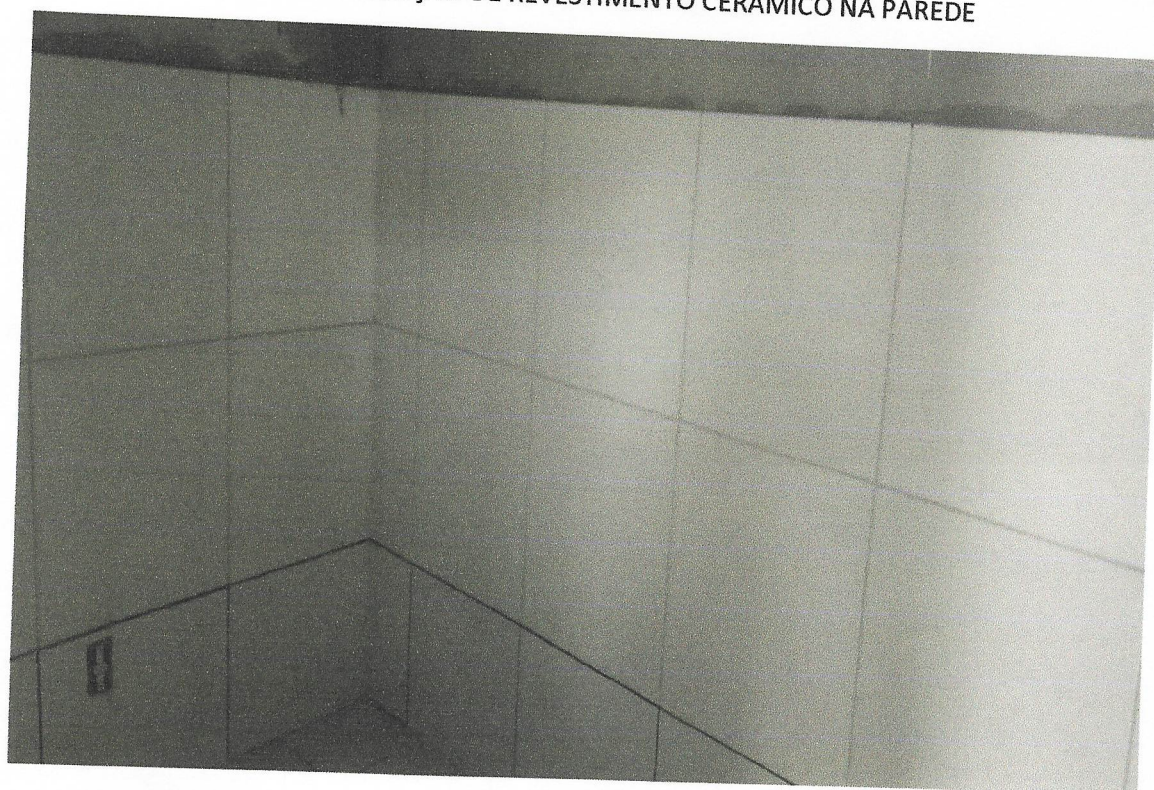


FOTO 16 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

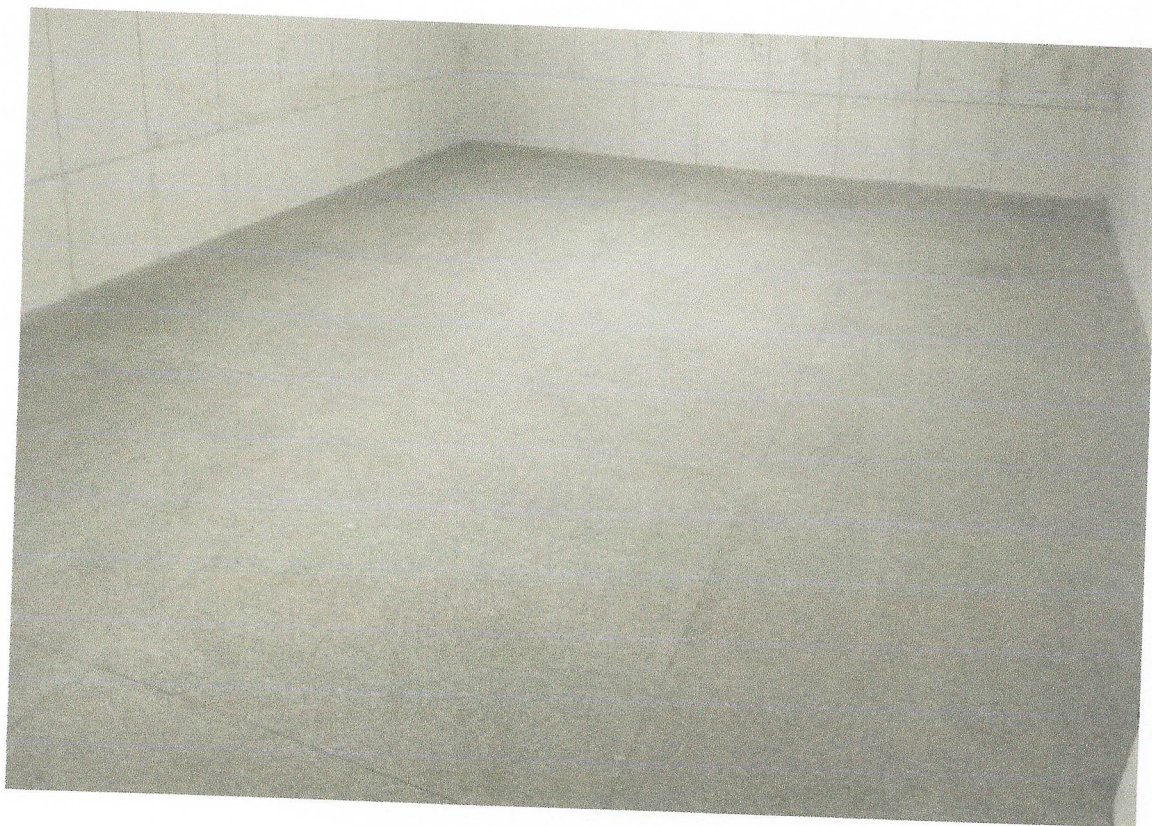


FOTO 17 EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE



FOTO 18 INSTALAÇÃO DE VIDRO DO JARDIM DE INVERNO

MATEUS NOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 9ª TRAVESSA, Nº 650



FOTO 19 EXECUÇÃO DE MASSA ACRILICA NOS BANCOS EXTERNOS



FOTO 20 INSTALAÇÃO DE TELHA DE VIDRO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.877.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650



FOTO 21 INSTALAÇÃO DE TELHA DE VIDRO



FOTO 22 INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Félix Andrade
Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650




FOTO 23 EXECUÇÃO DE PINTURA DO TELHADO



FOTO 24 EXECUÇÃO DE PINTURA DO TELHADO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

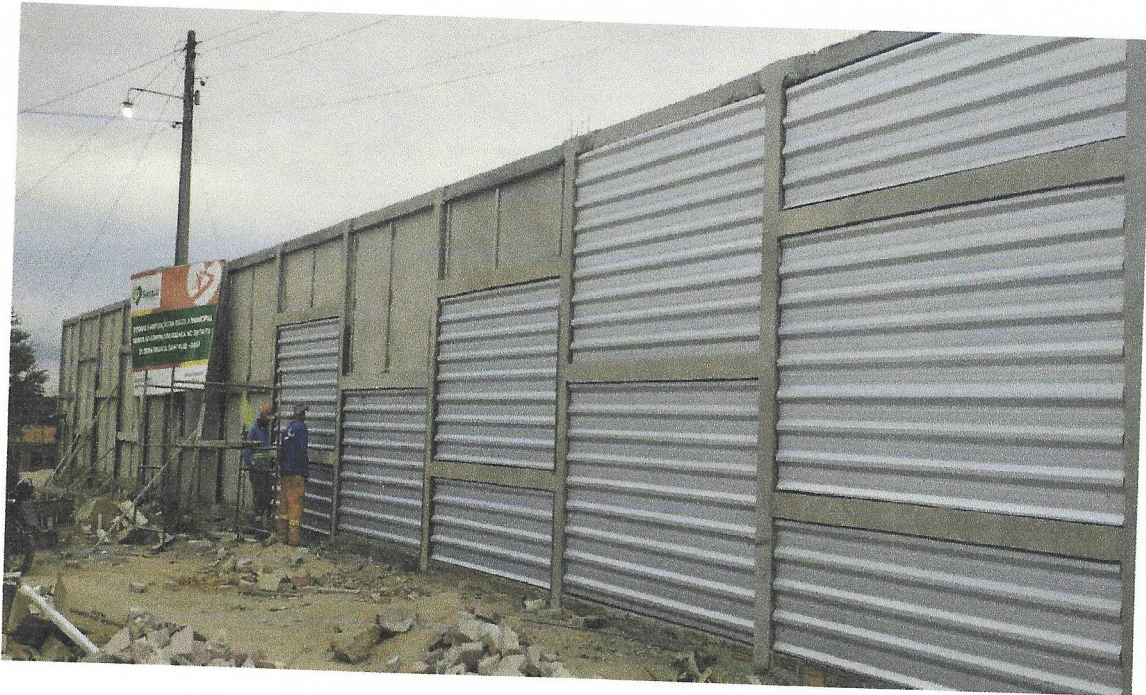


FOTO 25 INSTALAÇÃO DE TELHA METALICA NO MURO FRONTAL

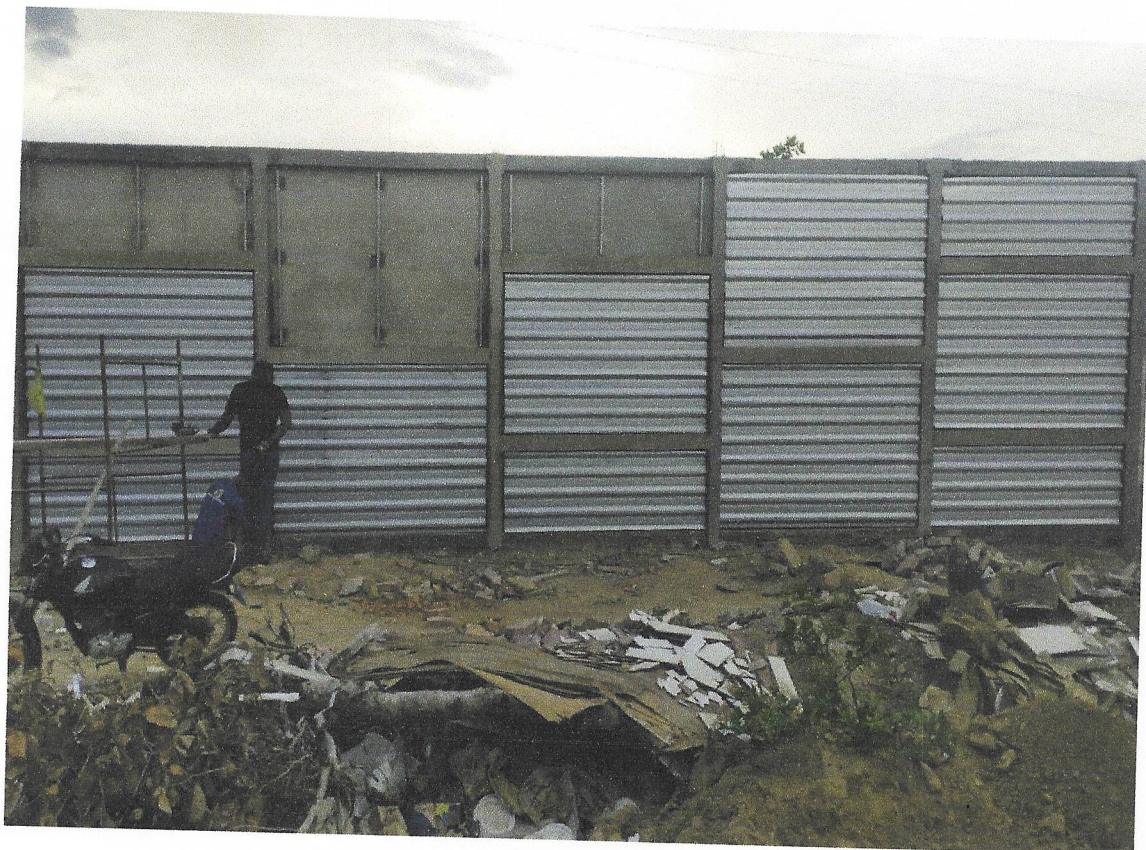


FOTO 25 INSTALAÇÃO DE TELHA METALICA NO MURO FRONTAL

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 232

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 12/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
-
- CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433936
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÀPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, S/T LAVASSESA, Nº 650

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 13/04/2023

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5) FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

<p>MATEUS MOURA AGUIAR CREA-BA 0504433938 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>ASSINATURAS 13.200.059/0001-75 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650</p> </div> <p>CONTRATADA</p>	<p>Tony Felix Andrade Engenheiro Civil CREA-BA: 052.069.677.8</p> <p>CONTRATANTE</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



OBRA:	execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim	CONTRATO:	223/2022	RESP. TÉCNICO:	MATEUS MOURA AGUIAR
ENDEREÇO:	distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA	INÍCIO:	02/08/2022	CREA-BA:	52230/D BA
		PRAZO:	4 MESES	Nº DA ART:	BA20220174880

DATA:	14/04/2023				
-------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.077.8
 CONTRATANTE



OBRA:	execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim	CONTRATO:	223/2022	RESP. TÉCNICO:	MATEUS MOURA AGUIAR
ENDEREÇO:	distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA	INÍCIO:	02/08/2022	CREA-BA:	52230/D BA
		PRAZO:	4 MESES	Nº DA ART:	BA20220174880

DATA: 15/04/2023






MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



OBRA:	execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim	CONTRATO:	223/2022	RESP. TÉCNICO:	MATEUS MOURA AGUIAR
ENDEREÇO:	distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA	INÍCIO:	02/08/2022	CREA-BA:	52230/D BA
		PRAZO:	4 MESES	Nº DA ART:	BA20220174880

DATA: 16/04/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:	17/04/2023				
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 238

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 18/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA





Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 239

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 19/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 81 TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 20/04/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 241

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 21/04/2023



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 242

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 22/04/2023



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8





CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 243

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 23/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8





CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 244

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 24/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) REINICIO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATADA

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 245

OBRA:	execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim	CONTRATO:	223/2022	RESP. TÉCNICO:	MATEUS MOURA AGUIAR
ENDEREÇO:	distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA	INÍCIO:	02/08/2022	CREA-BA:	52230/D BA
		PRAZO:	4 MESES	Nº DA ART:	BA20220174880

DATA:

25/04/2023



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) REINICIO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

(Signature)
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE





MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITÁRIA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 246

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 26/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS





MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 27/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA






Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 248

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 28/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA






Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 29/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6º TRAVESSA, Nº 650


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA





CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 250

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 30/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)


ASSINATURAS

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE





CONTRATADA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 251

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 01/05/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				


TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU (FERIADO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL SANITARISTA E AMBIENTAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 252

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 02/05/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
-
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 253

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 03/05/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS




MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 04/05/2023    

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8





CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 255

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 05/05/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5) INICIO DA INSTALAÇÃO DAS CALHAS DO TELHADO
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 06/05/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8





CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 257

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 07/05/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 258

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:

08/05/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CALHAS DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- INSTALAÇÃO DO VIDRO DO JARDIM DE INVERNO
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL (SANTARISTA E AMBIENTAL)
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 259

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 09/05/2023



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CALHAS DO TELHADO
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- INSTALAÇÃO DO VIDRO DO JARDIM DE INVERNO
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
10/05/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JÚNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.099.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 261

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 11/05/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
-
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 262

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA
 CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 12/05/2023

Sun ☀️ ☁️ ☔️ ☁️

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 263

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 13/05/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 264

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
14/05/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JÚNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.877.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 265

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 15/05/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) FINALIZAÇÃO da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6) FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8

CONTRATANTE

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 267

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 17/05/2023



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2)
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5) INICIO DA INSTALAÇÃO DA TELHA METALICA NO MURO FRONTAL
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433936
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.077.8

CONTRATANTE



OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**
 CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 18/05/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2)
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METALICAS NO MURO FRONTAL
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

 <p>MATEUS MOURA AGUIAR MATEUS MOURA AGUIAR CREA-BA 05044330/01 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL</p>	<p align="center">13.200.059/0001-75 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650</p>	 <p>Tony Felipe Andrade Engenheiro Civil CREA-BA: 052.005.077.8</p>
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CONTRATADA	CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 266

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 16/05/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2)
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) CONTINUAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- 5)
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433936
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.077.8

CONTRATANTE
