

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 128 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 77 Data do Sub-Empenho: 18/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-96 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 18/01/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia: Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	940.000,00	927.987,26	12.012,74
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO Nº 254/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO 01/01/2023 A 13/01/2023. NF 358.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	927.987,26	927.987,26	0,00



Data do Empenho: 18/01/2023 Data da Liquidação: 18/01/2023


RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM FONTE 90	13.917,81
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	27.839,62
## Oitocentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos ##		41.757,43
		Valor Retido
		Valor Líquido
		886.229,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/01/2023	358	U			927.987,26

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	927.987,26

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/01/2023.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/01/2023, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--






I.R.R.F

Nº DAM 343081	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI	INSCRIÇÃO: 30349
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES		NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo 13.917,81	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor R\$ 13.917,81
		Taxa Expediente R\$:
		Valor Total R\$: 13.917,81
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO 19/01/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023
		DATA EMISSÃO: 19/01/2023 09:02:10
		DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2023
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo	13.917,81	Valor Devido sem Desconto 13.917,81
Taxa de Expediente		Valor do Desconto: 0,00
Valor de Base Calculo:	13.917,81	Valor Devido com Desconto 13.917,81
INSTRUÇÕES: 1- REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMP ENG P/EXEC SERVIÇO CONSTR CENT ESP MEDICAS SANTALUZ - CONTRATO 254/2022 PROC ADM 166/2022 CONC.PUB. 001/2022 VALOR/NOTA 927.987,26 DEDUÇÃO 40%. EMPENHO 128/2023 MED 01/01/2023 A 13/01/2023.- COD 2.1.8.8.1.01.04.00.02.012 IRRF - PM FONTE 90.		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 13.917,81
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 13.917,81

Operador: NILO AMARO DE SOUZA BARBOSA



81730000139 . 0

17813906202 . 4

30131010100 . 3

00034308107 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000139 . 0

17813906202 . 4

30131010100 . 3

00034308107 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F


PARCELA 1/1	Nº DAM 343081	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 19/01/2023 09:02:10	DATA VENCIMENTO: 31/01/2023	INSCRIÇÃO: 30349
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$		13.917,81
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$		13.917,81



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 343080	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Calculo:	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$	
556.792,36	5,000	27.839,62		27.839,62	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 25/01/2023	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 19/01/2023 08:45:23	DATA DE VENCIMENTO: 25/01/2023	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- REFERENTE A NF 358 EMISSÃO 13/01/2023 - CONTRATO 254/2022 PROC ADM 166/2022 CONC.PUB. 001/2022 VALOR/NOTA 927.987,26 DEDUÇÃO 40%. EMPENHO 128/2023 MED 01/01/2023 A 13/01/2023. ISS - PM FONTE 90.			(-) VALOR DEVIDO - R\$	27.839,62	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	27.839,62	

Operador: NILO AMARO DE SOUZA BARBOSA



81770000278 . 2 39623906202 . 1 30125010500 . 6 00034308012 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000278 . 2 39623906202 . 1 30125010500 . 6 00034308012 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 343080	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 19/01/2023 08:45:23	DATA VENCIMENTO: 25/01/2023	INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$		27.839,62
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$		27.839,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSÉ LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CLP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 128 / 2023	Nº SUB-EMPENHO: 77	Data do Sub-Empenho: 18/01/2023	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Juridica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND CEO SAI VADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 18/01/2023
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	



Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	940.000,00	927.987,26	12.012,74
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO Nº 254/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	927.987,26	927.987,26	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2023-01-18	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	927.987,26	927.987,26

Novecentos e vinte e sete mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos

927.987,26

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/01/2023.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/01/2023
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matricula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matricula: 6428





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000358

Data e Hora de Emissão:
13/01/2023 14:10:53

Código de Verificação:
6ZY-NG83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

24.597.344/0001-98

Nome/Razão Social

MP2 CONSTRUCOES LTDA

Endereço

Ave Tancredo Neves 2639 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA

E-mail

dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal

561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ

13.807.870/0001-19

Endereço

PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA

E-mail

Inscrição Municipal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

Obra: Construção Do Centro De Especialidades Médicas Em Santaluz/BA.

Nº do contrato: 254/2022

Processo administrativo: 166/2022

Concorrência pública: Nº 001/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/01/2023 a 13/01/2023

VALOR TOTAL: R\$ 927.987,26

Valor Material 40%: R\$ 371.194,90

Base de cálculo do INSS 60%: 556.792,36 x 11% R\$: 61.247,16

Valor do ISS 5%: R\$ 27.839,62

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 16/01/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$927.987,26

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
371.194,90	556.792,36	5,00%	27.839,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
61.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,62	838.900,48

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 01/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000941424



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000358
 Data e Hora de Emissão:
13/01/2023 14:10:53
 Código de Verificação:
62Y-NG83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

CPF/CNPJ
24.597.344/0001-98
 Nome/Razão Social
MP2 CONSTRUCOES LTDA
 Endereço
Ave Tancredo Neves 2639 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
 E-mail
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal
561.323/001-97

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ
13.807.870/0001-19
 Endereço
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail

Inscrição Municipal

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA.
 Obra: Construção Do Centro De Especialidades Médicas Em Santaluz/BA.
 Nº do contrato: 054/2022
 Processo administrativo: 166/2022
 Concorrência pública: Nº 001/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/01/2023 a 13/01/2023
 VALOR TOTAL: R\$ 927.987,26
 valor Material 40%: R\$ 371.194,90
 Base de cálculo do INSS 60%: 556.792,36 x 11% R\$: 61.247,16
 Valor do ISS 5%: R\$ 27.839,62
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s).
 EM 16/01/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$927.987,26

CNAE 4299699 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
Item da Lista de Serviços 00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
371.194,90	556.792,36	5,00%	27.839,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
61.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,62	838.900,48

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.126/2006
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador
- COMPETÊNCIA: 01/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 166/2023

EMPENHO: 128 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 77 Data do Sub-Empenho: 18/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES EIRELI **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 **Complemento:** EDIF COND CEO SALVADOR SHOPING
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 24.597.344/0001-98 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 67153-3 **Agência:** 3673 **Banco:** 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 18/01/2023



Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia. Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	940.000,00	927.987,26
			12.012,76

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO Nº 254/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	927.987,26	927.987,26	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2023-01-18	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	927.987,26	927.987,26

Novecentos e vinte e sete mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos ## 927.987,26

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/01/2023.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/01/2023.
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6478



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP. 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 128 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 77 Data do Sub-Empenho: 18/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 18/01/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)



Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	940.000,00	927.987,26	12.012,74
Patrimônio: -				


HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO Nº 254/2022	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	927.987,26	927.987,26	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2023-01-18	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	927.987,26	927.987,26

Novecentos e vinte e sete mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos

927.987,26

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/01/2023.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/01/2023  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 128 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 77 Data do Sub-Empenho: 18/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 18/01/2023

Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari.	Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	940.000,00	927.987,26	12.012,74
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO Nº 254/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO 01/01/2023 A 13/01/2023. NF 358.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	927.987,26	927.987,26	0,00

Data do Empenho: 18/01/2023 Data do Liquidação: 18/01/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM FONTE 90	13.917,61
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	27.839,62

Oitocentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos



Valor Retido: 41.757,43
Valor Líquido: 886.229,83

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/01/2023	358	U			927.987,26

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	927.987,26

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/01/2023.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/01/2023, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 640
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 128 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 77 Data do Sub-Empenho: 18/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 18/01/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari.	Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	940.000,00	927.987,26	12.012,74
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO Nº 254/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO 01/01/2023 A 13/01/2023. NF 358.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
927.987,26	927.987,26	0,00

Data do Empenho: 18/01/2023 Data do Liquidação: 18/01/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM FONTE 90	13.917,61
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	27.839,62

Oitocentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos ##
Valor Retido 41.757,43
Valor Líquido 886.229,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS


NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/01/2023	358	U			927.987,26

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	927.987,26

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/01/2023. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matricula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/01/2023, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matricula: 6422
--	--





CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	
Inscrição:	24.597.344/0001-98
Razão Social:	MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME
Endereço:	AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.	
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.	
Validade:	28/12/2023
Certificação Núm.	SACUDE?
Informação obtida:	RETER 1,5 IR
A utilização deste certificado condicionada a verificação de autenticidade em aixa.gov.br	NÃO RETER INSS





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20226764067**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 42661212/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 561323/001-97
CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: |2.603.068

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total	Total	Total	Total
						Cotas	Cotas	Cotas	Cotas
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo	Numero do DOC	Programação	Situação
------	---------------	-------------	----------

Emissão autorizada à: 11:18:11 horas do dia 14/12/2022

Válida até dia 13/01/2023

Código de controle da certidão: **6B030DAE82D5646DF251110ADF330B1E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CNPJ: 24.597.344/0001-98

CGA: 561.323/001-97

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(de Nat. Empresária)

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CGA: 561.323/001-97

CNPJ: 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA
913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/03/2020

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2017916 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : E89978BAA511C3CD4AD3A833A159A665

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2538 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES,S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato:	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE		
Evento:	223 - BALANÇO PUBLICADO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

224366793

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacaodocuments.aspx>
CONTROLE: 7890034404236 CPF SOLICITANTE: 077.351.565-88 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/11/2022 PROTOCOLO: 224366793





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES,S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224366793

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 7890034404236 CPF SOLICITANTE: 077.351.565-88 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/11/2022 PROTOCOLO: 224366793





02/01/2023

006113046

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º
GRAU

CERTIDÃO Nº: 006113046**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/01/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na av tancredo neves, ed ceo salvador shopping sala 913, caminho das arvores, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº: 006113046






02/01/2023

006113034

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006113034**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/01/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping T londres, s 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº: **006113034**






**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL (RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO DE ESPECIFICAÇÃO DO ÍTENS 2 E OS ÍTENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 051891863/

CPF: 052.309.355-10

Data Início: 27/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Data Início: 10/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Data Início: 15/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução n. 218/73, do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942

CPF: 050.774.095-52

Data Início: 14/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUCOES EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUCOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
---------------------------------	----------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/12/2022 às 11:28:04 (data e hora de Brasília).





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
Nº DO CONTRATO: 254/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 166/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/07/2023 a 13/07/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
EMPRESA:	MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ:	24.597.344/0001-98
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO	R\$ 927.987,28


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	PLANT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QNTD	PREÇO TOTAL	QNTD	PREÇO TOTAL		
SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	519,57	R\$ 3.081,42	6,00	R\$ 3.081,42	0,00	0,00	100,00%	
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UM	1,00	1.250,96	R\$ 1.250,96	1,00	R\$ 1.250,96	0,00	0,00	100,00%	
1.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3 CHAVE 100A, CARGA 30kW, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UM	1,00	2.853,59	R\$ 2.853,59	1,00	R\$ 2.853,59	0,00	0,00	100,00%	
1.4	Sondagem com lâmina d'água	M	80,00	74,24	R\$ 4.454,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	4.454,40	0,00%	
	sub total				R\$ 11.640,37		R\$ 7.185,97		R\$ 7.185,97		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, PLENO COM ENCARGOS	H	440,00	134,68	R\$ 59.259,20	48,00	R\$ 6.454,64	6.454,64	52.794,56	10,91%	
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2200,00	56,43	R\$ 124.146,00	244,00	R\$ 13.768,92	13.768,92	110.377,08	11,09%	
	sub total				R\$ 183.405,20		R\$ 20.223,56		R\$ 20.223,56		
SERVIÇOS PRELIMINARES											
3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	727,87	14,21	R\$ 10.343,03	727,87	R\$ 10.343,03	10.343,03	0,00	100,00%	
3.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	482,00	94,51	R\$ 43.663,62	482,00	R\$ 43.663,62	43.663,62	0,00	100,00%	
3.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	M2	727,87	3,41	R\$ 2.482,04	727,87	R\$ 2.482,04	2.482,04	0,00	100,00%	
	sub total				R\$ 56.488,69		R\$ 56.488,69		R\$ 56.488,69		
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACIONES											
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M³	1373,20	2,92	R\$ 4.009,74	1.373,20	R\$ 4.009,74	4.009,74	0,00	100,00%	
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMASI, AF_06/2017	M³	73,42	110,49	R\$ 8.112,16	73,42	R\$ 8.112,16	8.112,16	0,00	100,00%	
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMASI, AF_06/2017	M³	20,04	144,87	R\$ 2.903,19	20,04	R\$ 2.903,19	2.903,19	0,00	100,00%	
4.4	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CARGA TIPO DE DA CACAMBA DA RETRO: 0,25 M³) / POTÊNCIA 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILCO ARENOSO, AF_05/2016	M³	821,45	105,38	R\$ 86.564,40	821,45	R\$ 86.564,40	86.564,40	0,00	100,00%	
	sub total				R\$ 101.688,52		R\$ 101.688,52		R\$ 101.688,52		
5.0	INFRAESTRUTURA										



Visto


Júlia Marjão
Engenheira Civil
CREABR 10000104

5.1	CONCRETO MAGRO PARA ASTRO, TRAÇO 1:4:5 TEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M³	9,12	446,49		R\$ 4.071,99	9,12	R\$ 4.071,99	9,12		4.071,99	0,00		100,00%
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M²	199,84	194,82		R\$ 38.932,83	199,84	R\$ 38.932,83	199,84		38.932,83	0,00		100,00%
5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M²	300,28	102,63		R\$ 30.817,74	300,28	R\$ 30.817,74	300,28		30.817,74	0,00		100,00%
5.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7, TEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M³	115,68	572,82		R\$ 66.263,82	115,68	R\$ 66.263,82	115,68		66.263,82	0,00		100,00%
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	488,00	23,99		R\$ 11.707,12	488,00	R\$ 11.707,12	488,00		11.707,12	0,00		100,00%
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	636,20	22,27		R\$ 14.168,17	636,20	R\$ 14.168,17	636,20		14.168,17	0,00		100,00%
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	107,70	20,65		R\$ 2.224,01	107,70	R\$ 2.224,01	107,70		2.224,01	0,00		100,00%
5.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	777,40	18,37		R\$ 14.280,84	777,40	R\$ 14.280,84	777,40		14.280,84	0,00		100,00%
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	2296,30	15,90		R\$ 34.197,65	2.296,30	R\$ 34.197,65	2.296,30		34.197,65	0,00		100,00%
5.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	300,40	14,82		R\$ 4.391,85	300,40	R\$ 4.391,85	300,40		4.391,85	0,00		100,00%
5.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 20 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	39,00	16,20		R\$ 631,80	39,00	R\$ 631,80	39,00		631,80	0,00		100,00%
5.7	sub total					R\$ 221.687,81		R\$ 221.687,81			R\$ 221.687,81			
IMPERMEABILIZAÇÃO														
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	M²	300,28	49,64		R\$ 14.905,90	300,28	R\$ 14.905,90	300,28		14.905,90	0,00		100,00%
	sub total					R\$ 14.905,90		R\$ 14.905,90			R\$ 14.905,90			
SUPERESTRUTURA														
6.0	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M²	826,73	152,31		R\$ 125.919,25	780,00	R\$ 118.801,80	780,00		118.801,80	7.117,45		94,35%
6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M²	436,51	209,58		R\$ 91.483,77	436,51	R\$ 91.483,77	436,51		91.483,77	0,00		100,00%
6.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCALAS, COM 2 LANCES EM " " E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_11/2020	M²	8,10	203,94		R\$ 1.551,91	0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	1.551,91		0,00%
6.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7, TEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M³	83,05	572,82		R\$ 47.572,70	64,25	R\$ 36.803,89	64,25		36.803,89	10.769,02		77,35%
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_11/2015	KG	3411,70	20,53		R\$ 70.042,20	976,80	R\$ 20.053,70	976,80		20.053,70	49.988,50		28,63%
7.0	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1500,80	22,38		R\$ 33.583,43	1.500,80		1.500,80		33.583,43	0,00		100,00%
7.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	301,90	20,65		R\$ 6.234,24	301,90		301,90		6.234,24	0,00		100,00%
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1566,50	18,28		R\$ 29.535,62	350,80		350,80		6.412,62	22.223,00		22,39%




Julia Karjão
Engenheira Civil
01.03.2000/404

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2583,80	15,33	R\$ 39.609,65	2.583,80	R\$ 39.609,65	2.583,80	39.609,65	0,00	100,00%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	105,60	14,35	R\$ 1.515,36	105,60	R\$ 1.515,36	105,60	1.515,36	0,00	100,00%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	14,60	15,87	R\$ 231,70	14,60	R\$ 231,70	14,60	231,70	0,00	100,00%
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE [ENCHIMENTO-CAPA] = 18+41 AF_11/2020	M²	345,82	215,45	R\$ 74.505,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	74.505,92	0,00%
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE [ENCHIMENTO-CAPA] = 18+31 AF_11/2020	M²	688,39	202,08	R\$ 139.096,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	139.096,08	0,00%
FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M²	88,91	68,47	R\$ 8.156,14	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	8.156,14	0,00%
sub total				R\$ 686.238,97		R\$ 354.729,96		R\$ 354.729,96		
ESTRUTURA RELEVANTÍSSIMO ENTERRADO										
FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M²	46,8	68,47	R\$ 3.204,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.204,40	0,00%
CONCRETO FCK = 25 MPa, TRACO = 1:2:3,75 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	5	572,82	R\$ 2.864,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.864,10	0,00%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	143,4	22,98	R\$ 3.209,29	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.209,29	0,00%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	204,1	20,65	R\$ 4.214,67	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.214,67	0,00%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	180,4	18,28	R\$ 3.297,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.297,71	0,00%
sub total				R\$ 18.796,17		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)										
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - TERREO										
ALVENAR A DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M²	1.194,02	103,38	R\$ 123.437,79	1.194,02	R\$ 123.437,79	1.194,02	123.437,79	0,00	100,00%
sub total				R\$ 123.437,79		R\$ 123.437,79		R\$ 123.437,79		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR										
ALVENAR A DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M²	1.117,86	103,38	R\$ 115.564,37	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	115.564,37	0,00%
sub total				R\$ 115.564,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - RECEPÇÃO										
ALVENAR A DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M²	91,95	103,38	R\$ 9.505,79	91,95	R\$ 9.505,79	91,95	9.505,79	0,00	100,00%




Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREABR 00001424

sub total											R\$ 9.505,79	R\$ 9.505,79		R\$ 9.505,79							
PLATIBANDA DA COBERTURA DO TERREO																					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021											M²	114,3	103,38		R\$ 11.816,33	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	11.816,33	0,00%
sub total														R\$ 11.816,33							
PLATIBANDA COBERTURA DO PAVIMENTO SUPERIOR																					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021											M²	123,45	103,38		R\$ 12.731,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	12.731,25	0,00%
sub total														R\$ 12.731,25							
PLATIBANDA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO																					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021											M²	37,7	103,38		R\$ 3.897,43	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.897,43	0,00%
sub total														R\$ 3.897,43							
VERGAS E CONTRAVERGAS																					
VERGA MOLDDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM VAS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016											M	110,94	54,61		R\$ 8.058,43	46,55	R\$ 2.542,10	46,55	2.542,10	3.516,34	41,90%
CONTRAVERGA MOLDDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016											M	110,94	42,52		R\$ 4.717,17	46,55	R\$ 1.979,31	46,55	1.979,31	2.737,86	41,96%
VERGA PRÉ-MOLDDADA PARA PORÇAS COM A T 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016											M	72,4	48,64		R\$ 3.536,02	45,40	R\$ 2.217,34	45,40	2.217,34	1.318,68	62,71%
sub total														R\$ 14.311,62		R\$ 6.738,74			R\$ 6.738,74		
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES																					
REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES																					
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014											M²	2651,63	5,07		R\$ 13.443,76	1.365,00	R\$ 6.920,55	1.366,00	6.920,55	6.523,21	51,48%
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014											M²	2388,00	31,69		R\$ 75.675,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	75.675,72	0,00%
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014											M²	263,62	25,69		R\$ 6.746,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.746,04	0,00%
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMA, TAJADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INFERIOR DAS PAREDES. AF_06/2014											M²	602,77	76,72		R\$ 46.244,51	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	46.244,51	0,00%
PITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020											M	93,54	105,56		R\$ 9.874,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	9.874,08	0,00%
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS PADRÃO, ISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COCA AF_09/2020											M²	590,22	222,52		R\$ 132.003,31	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	132.003,31	0,00%
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, por 2, TecnoGrês, acabamento branco, ref 55020 ou similar, aplicada com argamassa e rejunte acrílico, exceto regularização de base/reboço											M²	646,83	79,69		R\$ 51.466,19	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	51.466,19	0,00%
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elare, linha Galeria Branco Mesh per 3, aplicado com argamassa industrializada e rejunte exclusivo regularização de base ou reboço. Rev 01											M²	43,06	65,36		R\$ 2.814,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.814,40	0,00%




Júlia Araújo
Engenheira Civil

REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES											
sub total											
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BEIENEIRA 400L. AF_06/2014											
M²	1834,40	5,07		R\$ 9.390,41	900,00	R\$ 4.563,00	900,00	4.563,00	4.737,41	49,06%	
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M². ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014											
M	228,12	69,11		R\$ 15.834,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.834,48	0,00%	
Chapim de concreto pré-moldado											
M²	1718,96	95,48		R\$ 164.116,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	164.116,75	0,00%	
Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor mármore - SGA8408, aplicada com argamassa industrializada aci-, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)											
sub total											
				R\$ 236.183,94		R\$ 4.563,00		R\$ 4.563,00			
REVESTIMENTO DE PISO											
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016											
M²	693,53	35,46		R\$ 22.464,97	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	22.464,97	0,00%	
CONTABILISADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BEIENEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021											
M²	918,7	46,57		R\$ 42.789,86	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	42.789,86	0,00%	
PISO VINIL CO SEM FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO ISO. ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM CC. A. AF_09/2020											
M²	480,9	222,52		R\$ 102.559,47	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	102.559,47	0,00%	
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natura Ret. INCEPA ou similar. PE 5, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço											
M²	416,98	101,00		R\$ 42.054,38	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	42.054,38	0,00%	
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM; ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020											
M	36,5	99,14		R\$ 3.519,47	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.519,47	0,00%	
sub total											
				R\$ 213.282,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
FORRO											
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_2											
M²	918,7	44,87		R\$ 41.222,07	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	41.222,07	0,00%	
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017											
M	926,65	3,46		R\$ 3.206,21	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.206,21	0,00%	
sub total											
				R\$ 44.428,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
PINTURA											
PINTURA INTERNA											
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014											
M²	1148,96	2,95		R\$ 3.389,43	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.389,43	0,00%	
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS											
M²	1148,96	28,14		R\$ 32.331,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	32.331,73	0,00%	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014											
M	1148,96	16,98		R\$ 19.509,34	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	19.509,34	0,00%	
sub total											
				R\$ 55.230,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
PINTURA TETO											
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS											
M	918,70	28,14		R\$ 26.852,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	26.852,22	0,00%	




Júlia Variação
Engenheira Civil
CREABR 30064/RN

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	918,70	19,34	R\$ 17.767,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	17.767,66	0,00%
sub total				R\$ 43.619,68		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ESQUADRIAS				R\$ 122.344,48					
PORTAS									
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, ALZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-ENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	10	1044,35	R\$ 10.443,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	10.443,50	0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, ALZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-ENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	10	1099,02	R\$ 10.990,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	10.990,20	0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, ALZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-ENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	33	1181,22	R\$ 38.990,26	0,00	R\$ 0,00	0,00	38.990,26	0,00%
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, inclui ve puxador	M²	16,07	662,71	R\$ 10.486,06	0,00	R\$ 0,00	0,00	10.486,06	0,00%
INSTALAÇÃO DE VIDRO USO REFLEXIVO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_P	M²	100,35	480,28	R\$ 48.194,09	0,00	R\$ 0,00	0,00	48.194,09	0,00%
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	4,3	665,99	R\$ 2.863,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	2.863,76	0,00%
sub total				R\$ 121.900,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
JANELAS									
JANELA DE VIDRO LISO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021_P	M²	1	443,20	R\$ 443,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	443,20	0,00%
sub total				R\$ 443,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
COBERTURAS									
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AGULAS, INCLUSO CIMENTO AF_07/2019	M²	643,8	73,04	R\$ 47.023,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	47.023,15	0,00%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGULAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	643,8	26,49	R\$ 17.054,26	0,00	R\$ 0,00	0,00	17.054,26	0,00%
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGULAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M²	643,8	33,63	R\$ 21.650,99	0,00	R\$ 0,00	0,00	21.650,99	0,00%
COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCOADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLINDO ACESSÓRIOS	M²	1	98,71	R\$ 98,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	98,71	0,00%
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO VULNERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	266,8	72,63	R\$ 19.377,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	19.377,68	0,00%
CAIXA E V CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	92,47	123,52	R\$ 11.421,89	0,00	R\$ 0,00	0,00	11.421,89	0,00%




Júlia Araújo
Engenheira Civil
CREA-BA-33001/14

		sub total								R\$ 116.626,70	R\$ 0,00						R\$ 0,00				
		IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DOS RESERVATÓRIOS																			
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	31,25	58,62					R\$ 1.831,88	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		1.831,88	0,00%	
		sub total								R\$ 1.831,88	R\$ 0,00						R\$ 0,00				
		ESTRUTURA E ALVENARIA - QUIOSQUES																			
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCX = 25 MPa. AF_01/2017	M³	3	413,73					R\$ 12.341,19	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		12.341,19	0,00%	
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M³	256,88	103,38					R\$ 26.452,87	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		26.452,87	0,00%	
		Laje pré-fabricada unidirecional, barbaçada, para forro, enchimento em cerâmica, viga convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020	M²	89,94	202,06					R\$ 12.111,48	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		12.111,48	0,00%	
		Chapim de concreto pré-moldado	M	72,20	68,11					R\$ 4.989,74	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		4.989,74	0,00%	
		sub total								R\$ 55.895,28	R\$ 0,00						R\$ 0,00				
		COBERTURA - QUIOSQUES																			
		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M²	50,98	73,04					R\$ 3.723,58	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		3.723,58	0,00%	
		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	50,98	26,49					R\$ 1.350,46	R\$ 0,00	0,00						R\$ 0,00		1.350,46	0,00%
		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,50	91,59					R\$ 2.060,78	R\$ 0,00	0,00						R\$ 0,00		2.060,78	0,00%
		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	72,20	72,63					R\$ 5.243,89	R\$ 0,00	0,00						R\$ 0,00		5.243,89	0,00%
		Fornecimento e instalação de chaves de poliacarbonato, e=8mm em toldo/cobertera/fechamento/etc - Rev 01	M²	51,84	553,61					R\$ 28.698,14	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		28.698,14	0,00%	
		Estrutura metálica, em tubos quadrados ASTM A.36, 100x100x3mm (9,174kg/ml), pintada, p/ telhados, vãos 5,00 a 10,00m - Executada	M	196,80	245,13					R\$ 33.533,76	R\$ 0,00	0,00						R\$ 0,00		33.533,76	0,00%
		sub total								R\$ 74.611,63	R\$ 0,00						R\$ 0,00				
		PISO - QUIOSQUES																			
		JASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SÓCO OU RABERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	50,36	35,46					R\$ 1.785,77	R\$ 0,00	0,00					R\$ 0,00		1.785,77	0,00%	
		CONTAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M²	50,36	46,57					R\$ 2.345,27	R\$ 0,00	0,00						R\$ 0,00		2.345,27	0,00%
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	50,36	65,90					R\$ 3.318,72	R\$ 0,00	0,00						R\$ 0,00		3.318,72	0,00%
		sub total								R\$ 7.448,76	R\$ 0,00						R\$ 0,00				
		REVESTIMENTO PAREDE E TETO - QUIOSQUES																			




Júlia Varão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300004189

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	511,76	5,07	R\$ 2.594,62	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,62	0,00%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACHS INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF_06/2014	M²	511,76	25,69	R\$ 13.095,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,94	0,00%
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	129,92	69,40	R\$ 8.996,53	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,53	0,00%
FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	50,36	44,67	R\$ 2.259,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,65	0,00%
Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor mármore	M²	196,34	95,48	R\$ 18.746,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	18.746,54	0,00%
- SGB408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusiva emboço.(ou similar)	M²	78,18	16,98	R\$ 1.327,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,50	0,00%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF_06/2014	M²	78,18	16,98	R\$ 1.327,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,50	0,00%
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M²	50,36	3,47	R\$ 174,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	0,00%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOIS. AF_06/2014	M²	50,36	19,34	R\$ 973,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	973,96	0,00%
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M²	27,82	2,95	R\$ 82,07	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00%
ENASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS	M²	27,82	28,14	R\$ 792,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	792,65	0,00%
sub total				R\$ 48.924,42		R\$ 0,00				R\$ 0,00	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS - QUIOSQUES											
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	4	139,36	R\$ 557,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	557,44	0,00%
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	8	89,30	R\$ 706,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	0,00%
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMA) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS PASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12	172,86	R\$ 2.074,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,32	0,00%
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	532,72	R\$ 2.130,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,88	0,00%
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	268,33	R\$ 1.073,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,32	0,00%
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	982,73	R\$ 1.965,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,46	0,00%
BAUCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/20 OU 3/40, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	1077,48	R\$ 4.309,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,96	0,00%
sub total				R\$ 12.817,79		R\$ 0,00				R\$ 0,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES											




Julia Várjão
Engenheira Civil
COTAÇÃO Nº 004

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICADO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10	236,55	R\$ 2.365,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.365,50	0,00%
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICADO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_01/2016	UN	4	172,54	R\$ 690,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	690,16	0,00%
Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	UN	12	102,52	R\$ 1.230,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.230,24	0,00%
MONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICADO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_01/2016	UN	4	203,70	R\$ 814,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	814,80	0,00%
sub total				R\$ 5.090,70		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
ESQUADRIAS - QUIOSQUES										
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M²	36,60	384,72	R\$ 14.042,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	14.042,28	0,00%
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M²	10,86	384,72	R\$ 4.178,06	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.178,06	0,00%
sub total				R\$ 18.220,34		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
DIVERSOS - QUIOSQUES										
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	9	1327,23	R\$ 11.945,07	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	11.945,07	0,00%
Tempo de banco em granito cinza andorinha, e=2cm	M²	10,14	415,33	R\$ 4.211,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.211,45	0,00%
sub total				R\$ 16.156,52		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
HIOSANITÁRIO										
ESGOTO E SANITÁRIO 1 PAVIMENTO										
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM T.LIQUOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4	741,18	R\$ 2.964,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.964,94	0,00%
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com 3ª tripa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UN	25	59,09	R\$ 1.477,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.477,25	0,00%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	16,76	R\$ 33,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	33,52	0,00%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRAIADEADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	16,83	R\$ 67,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	67,32	0,00%
Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	UN	6	73,55	R\$ 441,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	441,30	0,00%
Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	5	23,83	R\$ 119,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	119,15	0,00%
Curva de 90º longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	2	21,89	R\$ 43,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	43,78	0,00%
Curva 90º curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	1	45,85	R\$ 45,85	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	45,85	0,00%
Fechamento e instalação de curva 90º curta pvc, junta elástica, conta/bolsa, Ø = 40mm	UN	35	14,49	R\$ 507,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	507,15	0,00%




Julia Varrão
Engenheira Civil
CREA-BA 300041103

	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	UN	15	28,90	R\$ 424,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	424,50	0,00%
	Joelho 90° c/vista, pvc soldável, p/ esgoto, diâm = 100 x 50mm	UN	2	46,15	R\$ 92,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	92,30	0,00%
	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	UN	33	22,21	R\$ 732,93	0,00	R\$ 0,00	0,00	732,93	0,00%
	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UN	19	53,32	R\$ 1.013,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	1.013,08	0,00%
	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	15	61,54	R\$ 923,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	923,10	0,00%
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	3	16,12	R\$ 48,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	48,36	0,00%
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	1	20,75	R\$ 20,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	20,75	0,00%
	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UN	3	24,55	R\$ 73,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	73,65	0,00%
	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM F/ ESGOTO JUNTA COM ANEL FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,3	53,24	R\$ 761,33	0,00	R\$ 0,00	0,00	761,33	0,00%
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	M	156,02	31,47	R\$ 4.909,95	0,00	R\$ 0,00	0,00	4.909,95	0,00%
	Tubo pvc rígido c/anel borradia, serie normal, p/ esgoto predial, d = 40mm	M	38,27	20,21	R\$ 773,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	773,44	0,00%
	Tubo pvc rígido c/anel borradia, serie normal, p/ esgoto predial, d = 50mm	M	28,27	26,25	R\$ 688,59	0,00	R\$ 0,00	0,00	688,59	0,00%
	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	UN	1	54,25	R\$ 54,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	54,25	0,00%
	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	21	22,59	R\$ 474,39	0,00	R\$ 0,00	0,00	474,39	0,00%
	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto pred al, diâm = 50mm	UN	4	14,03	R\$ 56,12	0,00	R\$ 0,00	0,00	56,12	0,00%
	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto pred al, diâm = 50mm	UN	21	13,33	R\$ 277,83	0,00	R\$ 0,00	0,00	277,83	0,00%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUVADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	10,76	24,02	R\$ 258,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	258,46	0,00%
	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	21	18,48	R\$ 388,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	388,08	0,00%
	sub total				R\$ 17.572,16		R\$ 0,00		R\$ 9,00	
	ESGOTO E SANITÁRIO 2º PAVIMENTO									
	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com Tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UN	1	59,09	R\$ 59,09	0,00	R\$ 0,00	0,00	59,09	0,00%
	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	UN	1	73,55	R\$ 73,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	73,55	0,00%
	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	1	17,89	R\$ 17,89	0,00	R\$ 0,00	0,00	17,89	0,00%
	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	2	21,98	R\$ 43,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	43,78	0,00%
	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100 x 50mm	UN	2	28,30	R\$ 56,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	56,60	0,00%
	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	UN	2	22,21	R\$ 44,42	0,00	R\$ 0,00	0,00	44,42	0,00%
	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UN	1	53,32	R\$ 53,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	53,32	0,00%
	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	1	61,54	R\$ 61,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	61,54	0,00%




Júlia Vaxião
 Engenheira Civil
 CREA-BA 30004-0/04

TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,21	53,24	R\$ 863,02	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	863,02	0,00%
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal p/ esgoto predial, d = 40mm	M	4,38	20,21	R\$ 89,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00%
Tubo pvc rígido c/anel borracha, ser'e normal, p/ esgoto predial, d = 50mm	M	0,43	26,25	R\$ 11,29	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00%
Té sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	UN	1	54,26	R\$ 54,26	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00%
Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	1	22,59	R\$ 22,59	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00%
Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	1	13,23	R\$ 13,23	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00%
Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	18	13,95	R\$ 251,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	251,10	0,00%
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	4	10,72	R\$ 42,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00%
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,07	58,94	R\$ 4.064,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,08	0,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	1	18,48	R\$ 18,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00%
sub total				R\$ 5.839,43		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
ESGOTO E SANITARIO 3° PAVIMENTO											
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	1	28,69	R\$ 28,69	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,00%
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,10	53,24	R\$ 165,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	165,04	0,00%
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	19	10,72	R\$ 203,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	M	59,81	15,66	R\$ 936,62	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	936,62	0,00%
sub total				R\$ 1.334,04		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
AGUA FRIA E BARILETE 1° PAVIMENTO											
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	5	26,24	R\$ 131,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	5	21,94	R\$ 109,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00%
COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PRED. 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	5	24,00	R\$ 120,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	20	9,12	R\$ 182,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	1,4	10,17	R\$ 14,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	10	5,03	R\$ 50,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	5	8,97	R\$ 44,85	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	5	6,17	R\$ 30,85	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,00%




Júlia Varginho
Engenheira Civil
CREA-BA 300041474

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	15,66		R\$ 78,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	78,30	0,00%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	19,14	10,17		R\$ 194,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	194,65	0,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	42	6,01		R\$ 252,42	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	252,42	0,00%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	49	11,01		R\$ 539,49	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	539,49	0,00%
LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	7,12		R\$ 142,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	142,40	0,00%
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,72	31,56		R\$ 3.304,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.304,96	0,00%
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	32	8,33		R\$ 266,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	266,56	0,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4	20,77		R\$ 83,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	83,08	0,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	31	19,05		R\$ 590,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	590,55	0,00%
RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	17	16,76		R\$ 284,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	284,92	0,00%
sub total					R\$ 6.420,88		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
ÁGUA FRIA E BARILETE 2º PAVIMENTO											
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6	8,97		R\$ 53,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	53,82	0,00%
JUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	6,53		R\$ 6,53	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6,53	0,00%
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,59	26,74		R\$ 229,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	229,70	0,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2	8,62		R\$ 17,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	17,24	0,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4	6,01		R\$ 24,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	24,04	0,00%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14	11,01		R\$ 154,14	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	154,14	0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2	7,46		R\$ 14,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	14,92	0,00%
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	18	5,88		R\$ 105,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	105,84	0,00%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	66,63	12,39		R\$ 822,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	822,72	0,00%
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3	10,63		R\$ 31,89	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	31,89	0,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3	19,05		R\$ 57,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	57,15	0,00%




Julia Varyão
Engenheira Civil
CREA-BA 30004/2014

AGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO									
sub total									
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2	8,97		R\$ 17,94	R\$ 0,00	0,00	17,94	0,00%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	35,48	10,17		R\$ 360,83	R\$ 0,00	0,00	360,83	0,00%
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2	8,79		R\$ 17,58	R\$ 0,00	0,00	17,58	0,00%
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1	33,57		R\$ 33,57	R\$ 0,00	0,00	33,57	0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	179,68	12,39		R\$ 2.226,24	R\$ 0,00	0,00	2.226,24	0,00%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	10,29	21,04		R\$ 216,50	R\$ 0,00	0,00	216,50	0,00%
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	12	10,63		R\$ 127,56	R\$ 0,00	0,00	127,56	0,00%
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1	17,00		R\$ 17,00	R\$ 0,00	0,00	17,00	0,00%
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	3	1934,46		R\$ 5.803,38	R\$ 0,00	0,00	5.803,38	0,00%
sub total									
APARELHOS E METAIS									
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUO, CORPO PLÁSTICO, T PO DUCHA D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	102,52		R\$ 205,04	R\$ 0,00	0,00	205,04	0,00%
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, -12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	15	532,72		R\$ 7.990,80	R\$ 0,00	0,00	7.990,80	0,00%
BARRA DE AROIO RE'A, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	9	399,44		R\$ 3.594,96	R\$ 0,00	0,00	3.594,96	0,00%
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	15	258,52		R\$ 3.882,30	R\$ 0,00	0,00	3.882,30	0,00%
BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARCEL, 1,20 OU 3/4D, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4	1077,49		R\$ 4.309,96	R\$ 0,00	0,00	4.309,96	0,00%
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4	663,28		R\$ 2.733,12	R\$ 0,00	0,00	2.733,12	0,00%
Lavatório p/ consultorios com canceleda em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,80x0,60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive fotocopia 10 cm, asentada.	UN	7	1009,34		R\$ 7.065,38	R\$ 0,00	0,00	7.065,38	0,00%




Julia Araújo
Engenheira Civil
CREA-BA 30001/194

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	801,33	R\$ 1.602,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.602,66	0,00%
sub total										
INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - TERREO										
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53	28,30	R\$ 1.499,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00%
TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47	56,20	R\$ 2.641,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.641,40	0,00%
TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	56,20	R\$ 562,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	562,00	0,00%
TOMADA 3P+ - 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	6	68,55	R\$ 411,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	411,30	0,00%
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUSTR LED 15W	UN	101	102,52	R\$ 10.354,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.354,52	0,00%
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível santionado embudo Ø 3/4", incluindo conjunto atecp/30s-220v, inc usive aterramento	PT	22	294,25	R\$ 6.473,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.473,50	0,00%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	138	17,12	R\$ 2.362,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.362,56	0,00%
sub total										
CARGOS - TERREO										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	616,96	5,12	R\$ 3.158,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.158,84	0,00%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1230	8,35	R\$ 10.270,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.270,50	0,00%
CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87	11,46	R\$ 997,02	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	997,02	0,00%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	28,91	R\$ 1.734,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.734,60	0,00%
sub total										
ELETRODUTOS - TERREO										
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,58	14,09	R\$ 22,26	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	22,26	0,00%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,7	11,01	R\$ 789,42	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	789,42	0,00%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,53	10,28	R\$ 1.444,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.444,65	0,00%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,8	13,50	R\$ 1.239,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.239,30	0,00%
sub total										
DISJUNTORES, MEDIDOR E ATERRAMENTO - TERREO										
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	89,59	R\$ 1.702,21	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.702,21	0,00%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	119,45	R\$ 119,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	119,45	0,00%



Júlia Varão
Engenheira
CREA-BA 300041/2007


DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	101,05		R\$ 202,10	0,00	R\$ 0,00	0,00		202,10	0,00%
HASTE DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	112,43		R\$ 112,43	0,00	R\$ 0,00	0,00		112,43	0,00%
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BILINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	2.885,04		R\$ 2.885,04	0,00	R\$ 0,00	0,00		2.885,04	0,00%
Quadro de distribuição de sobretensão em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1	324,64		R\$ 324,64	0,00	R\$ 0,00	0,00		324,64	0,00%
sub total					R\$ 3.345,97		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - 1 PAVIMENTO											
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21	56,20		R\$ 1.180,20	0,00	R\$ 0,00	0,00		1.180,20	0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 100A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	28,30		R\$ 396,20	0,00	R\$ 0,00	0,00		396,20	0,00%
TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	68,55		R\$ 274,20	0,00	R\$ 0,00	0,00		274,20	0,00%
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR LED 15W	UN	36	102,52		R\$ 3.690,72	0,00	R\$ 0,00	0,00		3.690,72	0,00%
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletrocabo de dnc flexível serlonado embulido Ø 3/4", incluindo conjunto atscov/30x220v, inclusive aterramento	PT	7	294,25		R\$ 2.059,75	0,00	R\$ 0,00	0,00		2.059,75	0,00%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32	17,12		R\$ 547,84	0,00	R\$ 0,00	0,00		547,84	0,00%
sub total					R\$ 8.046,39		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
CABOS - 1 PAVIMENTO											
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISO. ADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	315,2	5,12		R\$ 1.613,82	0,00	R\$ 0,00	0,00		1.613,82	0,00%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	863,2	8,35		R\$ 7.207,72	0,00	R\$ 0,00	0,00		7.207,72	0,00%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	28,91		R\$ 1.734,60	0,00	R\$ 0,00	0,00		1.734,60	0,00%
sub total					R\$ 10.556,14		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
ELETRODUTOS - 1 PAVIMENTO											
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,58	14,09		R\$ 22,26	0,00	R\$ 0,00	0,00		22,26	0,00%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23	11,91		R\$ 253,23	0,00	R\$ 0,00	0,00		253,23	0,00%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,4	10,28		R\$ 723,71	0,00	R\$ 0,00	0,00		723,71	0,00%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20	13,50		R\$ 270,00	0,00	R\$ 0,00	0,00		270,00	0,00%
sub total					R\$ 1.269,20		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
DISJUNTORES											
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	89,59		R\$ 1.702,21	0,00	R\$ 0,00	0,00		1.702,21	0,00%



Julia Karjão
Engenheira Civil
CREABR 300001014

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1	119,45		R\$ 119,45	0,00			0,00		119,45	0,00%
sub total						R\$ 1.821,56							
PRAÇA DE PÚBLICA DE LAZER						R\$ 375.721,88				R\$ 0,00			
SERVIÇOS INICIAIS													
LIMPEZA MANUA DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_05/2018		M²	1819,00	3,41		R\$ 5.520,79	0,00			0,00		5.520,79	0,00%
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019		M²	1619,90	2,92		R\$ 4.727,45	0,00			0,00		4.727,45	0,00%
sub total						R\$ 10.248,27				R\$ 0,00			
PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO						R\$ 54.219,87				R\$ 0,00			
ESTACIONAMENTO LATERAL													
EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015		M²	363,8	95,63		R\$ 34.790,19	0,00			0,00		34.790,19	0,00%
Colchão de areia		M³	54,57	146,87		R\$ 8.014,70	0,00			0,00		8.014,70	0,00%
sub total						R\$ 42.804,89				R\$ 0,00			
ESTACIONAMENTO PCD - ENTRADA PRINCIPAL													
EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015		M²	97,02	95,63		R\$ 9.279,02	0,00			0,00		9.279,02	0,00%
Colchão de areia		M³	14,55	146,87		R\$ 2.136,95	0,00			0,00		2.136,95	0,00%
sub total						R\$ 11.414,98				R\$ 0,00			
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PEDIESTES													
Calchão de areia		M³	111,05	146,87		R\$ 16.309,81	0,00			0,00		16.309,81	0,00%
Piso látex direcional e/ou aléxia, de concreto, colorido, p/de/eficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa indus/triada etc., rejuntado, exclusive regularização de base		M²	46,18	113,80		R\$ 5.162,92	0,00			0,00		5.162,92	0,00%
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015		M²	250	78,26		R\$ 19.565,00	0,00			0,00		19.565,00	0,00%
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015		M²	482,22	85,86		R\$ 41.403,41	0,00			0,00		41.403,41	0,00%
ASSENTAMENTO DE GUIA/TIPO-FIOT EM TRECHOS RETO, CONECTANDO-DA EM CONCRETO PRÉ-FABR/CADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO V/ARIQ). AF_06/2016		M	209,7	52,70		R\$ 11.051,19	0,00			0,00		11.051,19	0,00%
Guia divisória, em Meio fio pré moldado de concreto simples (C.12 x 0,30 x 1,00 m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		M	371,17	36,51		R\$ 13.551,42	0,00			0,00		13.551,42	0,00%
sub total						R\$ 107.043,65				R\$ 0,00			
PANQUE INFANTIL E ÁREA													
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3,00m (1,1/2") e barra verticals quadrada (1,1/2") a cada 12cm - Rev 01		M	43,43	484,87		R\$ 21.057,90	0,00			0,00		21.057,90	0,00%
PARQUE INFANTIL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		UN	1	36.197,40		R\$ 36.197,40	0,00			0,00		36.197,40	0,00%
Fornecimento e instalação de grama s/nética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada		M²	111,7	74,66		R\$ 8.341,76	0,00			0,00		8.341,76	0,00%


EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M²	111,7	120,20	R\$ 13.426,34	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	13.426,34	0,00%
APLICAÇÃO DE LONA P-ASTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_11/2017	M²	111,7	2,85	R\$ 318,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	318,35	0,00%
sub total				R\$ 79.341,75						
ILUMINAÇÃO										
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLIO, FLANGIADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINARIAS, COM LAMPADAS LED 200W, COMPLETO COM CABOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019	UN	19	5739,12	R\$ 109.043,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	109.043,28	0,00%
sub total				R\$ 109.043,28						
JARDIM										
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M²	173,45	14,71	R\$ 2.551,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.551,45	0,00%
Planta - Palmeira oca (cyca revoluta) h=1,50m, fornecimento e plantio	UN	3	530,57	R\$ 1.591,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.591,71	0,00%
Planta - Palmeira Areca (lati=3,00m), fornecimento e plantio	UN	3	159,29	R\$ 477,87	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	477,87	0,00%
Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	UN	15	44,87	R\$ 673,05	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	673,05	0,00%
Planta - Sibipituna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	UN	8	86,10	R\$ 688,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	688,80	0,00%
Planta - Palmeira-tabo-de-rapeira h=7,00m, fornecimento e plantio	UN	5	1552,43	R\$ 7.762,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	7.762,15	0,00%
Planta - Palmeira-tabo-de-rapeira h=7,00m, fornecimento e plantio	UN	57	36,49	R\$ 2.079,93	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.079,93	0,00%
sub total				R\$ 15.824,96						
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UN	13	303,92	R\$ 3.943,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.943,16	0,00%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	13	20,25	R\$ 263,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	263,25	0,00%
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	49	35,77	R\$ 1.752,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.752,73	0,00%
Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de Incêndio portátil" - Placa E5	UN	13	18,77	R\$ 244,01	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	244,01	0,00%
Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sent do (esquerda ou direita) e saída de emergência - Placa S2	UN	8	27,02	R\$ 216,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	216,16	0,00%
sub total				R\$ 5.419,31						
SPDA										
CORDOALHA DE COBRE N. 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	434,14	75,95	R\$ 32.972,93	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	32.972,93	0,00%
CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,27	92,69	R\$ 187,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	187,71	0,00%
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	14	112,43	R\$ 1.574,02	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.574,02	0,00%
Abracadreira metálica tipo "U" de 3/4" (25mm) com fixações, p/ tubo galvanizado	UN	285	4,24	R\$ 1.123,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00%
Terminal aéreo 3/8" x 50mm em aço 6a v, com fixação horizontal, ref. TEI 0c4 ou similar - fornecimento	UN	188	6,46	R\$ 1.214,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.214,48	0,00%
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo de 7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref. TEL-745 ou similar (SPDA)	UN	75	2,58	R\$ 193,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	193,50	0,00%



Julia Verjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 106.000.000-1

Conector split - bofi para cabo de cobre nu #50 mm ² - fornecimento e instalação	UN	8	16,29	R\$ 130,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	130,32	0,00%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46	25,99	R\$ 1.196,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.196,54	0,00%
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/arrastamento	UN	3	367,39	R\$ 1.102,17	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.102,17	0,00%
sub total				R\$ 3.694,27		R\$ 0,00				
SERVIÇOS FINAIS										
Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado, c/01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont. Elevadores ou similar	UN	1	47940,89	R\$ 47.940,89	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	47.940,89	0,00%
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	2667,55	4,04	R\$ 10.658,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.658,78	0,00%
sub total				R\$ 58.697,67		R\$ 0,00				
Total				R\$ 3.599.659,79		R\$ 927.987,26			2.671.672,53	25,78%

Julio Varjão
 Engenheiro Civil
 CREBA 3000041424





PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CONTRATO Nº 254-2022

LICITAÇÃO Nº 001-2022


EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

EXECUÇÃO DE GABARITO E MARCAÇÃO DE SAPATAS

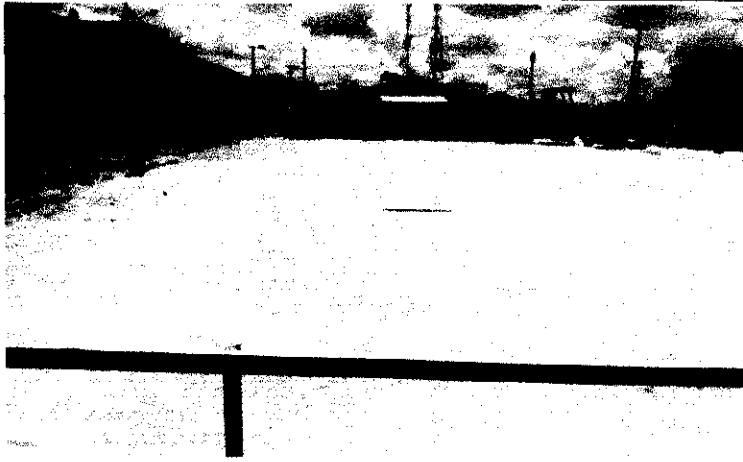

PLACA DA OBRA

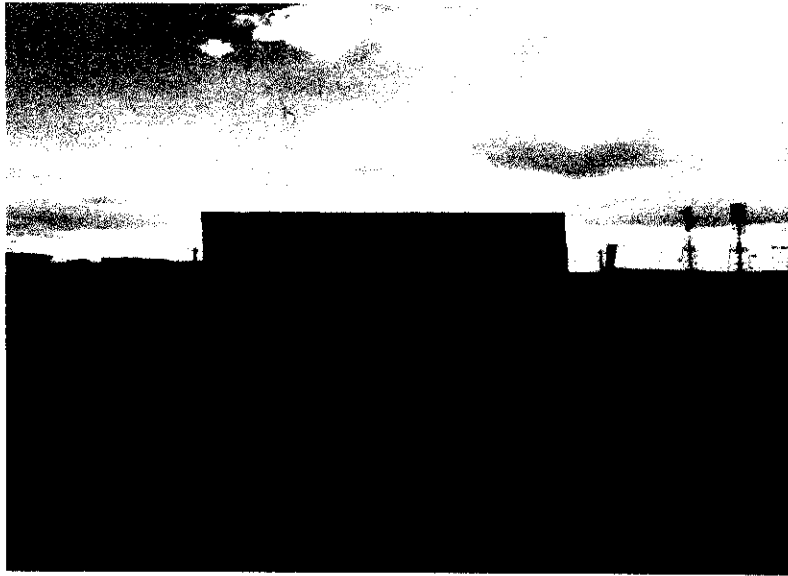

BARRACÃO DE OBRA



Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-PA. 300841/24



ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS




ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS



CHEGADA DO AÇO




CONFEÇÃO DA ARMADURA DAS SAPATAS

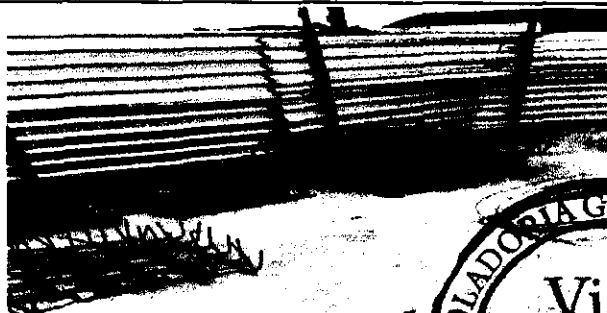


Juliana Variação
Engenheira Civil
CREA-BA 30684/1424

PREPARAÇÃO DAS SAPATAS PARA CONCRETAGEM

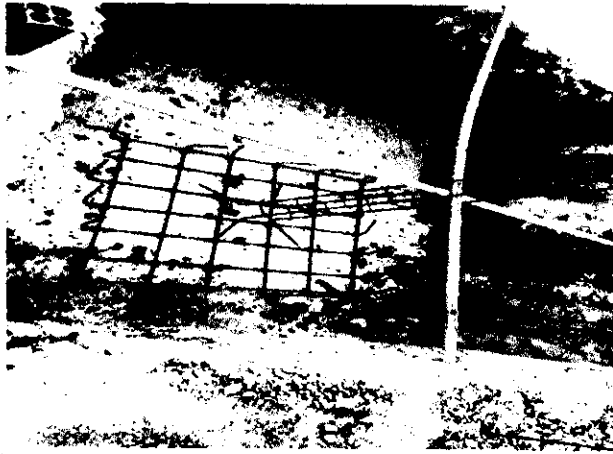

CONCRETAGEM DE SAPATAS

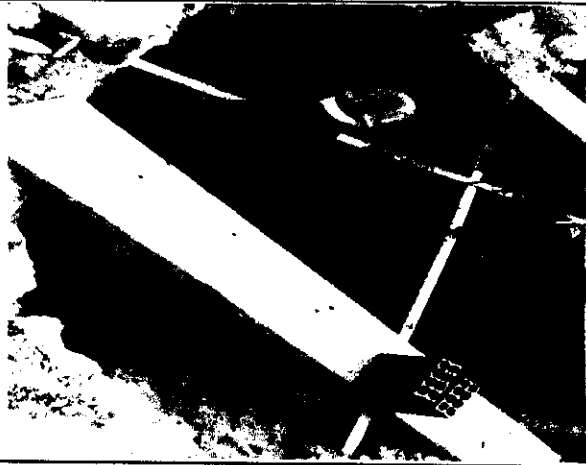

CONCRETAGEM DE SAPATAS



CONCRETAGEM DE SAPATAS




SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Visto
SANTA LUZ/BAHIA

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA-300084192


CONCRETAGEM DAS BALDRAMES



CONCRETAGEM DE SAPATAS

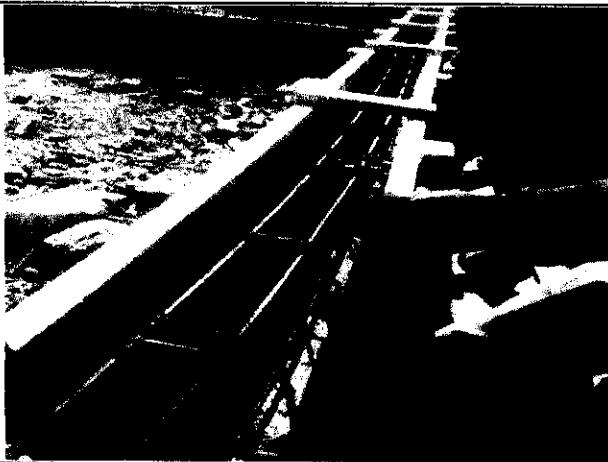

ARMADURA DAS BALDRAMES

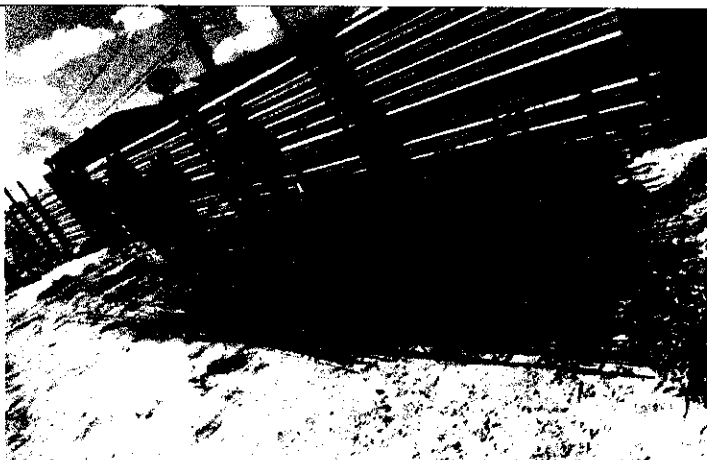

INSTALAÇÃO DOS PROTETORES



Julia Marião
Engenheira Civil
CREA-BA 00001424



IMPERMEABILIZAÇÃO DAS BALDRAMES



IMPERMEABILIZAÇÃO DAS BALDRAMES



CONCRETAGEM DE SAPATAS



Julia Marião
Engenheira Civil
CREA-BA 008811324

MONTAGEM DAS FERRAGENS PARA SAPATAS E PILARES



MONTAGEM DAS FERRAGENS PARA SAPATAS E PILARES



EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DOBRADO



Julia Vazão
Engenheira Civil
CREA-BA 100541/24

MONTAGEM DAS VIGAS BALDRAME



MONTAGEM DE FORMAS PARA VIGAS BALDRAME



DEFORMA DA VIGAS BALDRAME



Julia Vaz
Engenheira Civil
CREA-BA 000000000000000000

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME



IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME



[Handwritten mark]




Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA 35A.30004/24


LEVANTE DE ALVENARIA UTILIZANDO BLOCO CERAMICO



LEVANTE DE ALVENARIA UTILIZANDO BLOCO CERAMICO

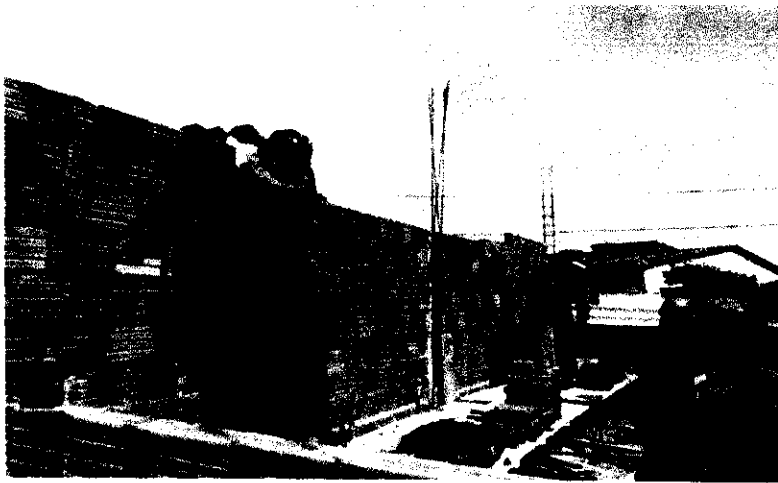


LEVANTE DE ALVENARIA E VERGA

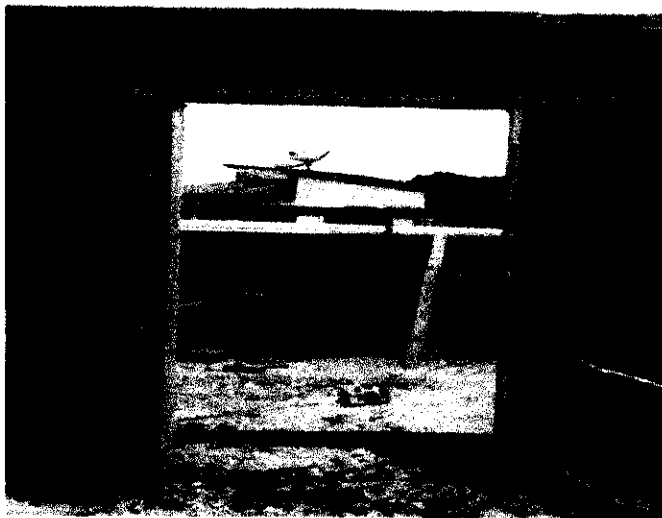

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 010541/2024

CONCRETAGEM DE PILARES

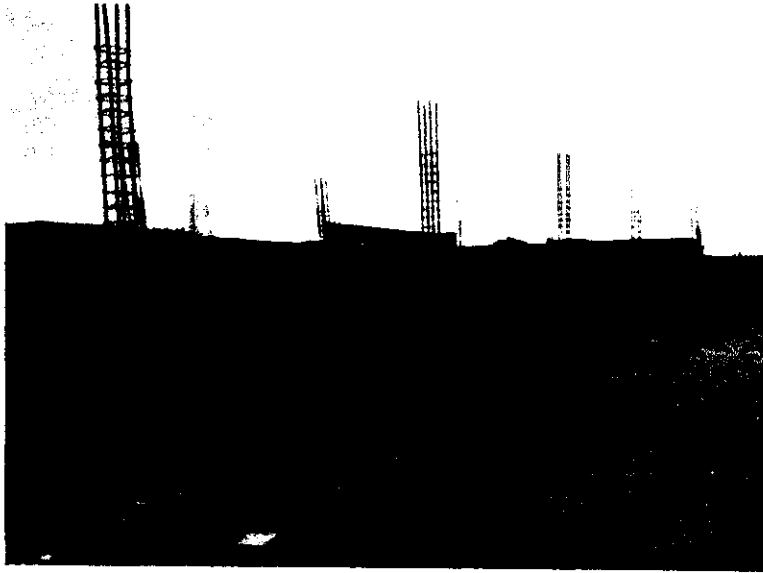

ATERRO



Julia
Engenheira Civil
CREA-BA/00041824


CONCRETAGEM DE PILARES



MONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES




EXECUÇÃO DE CHAPISCO ÁREA INTERNA

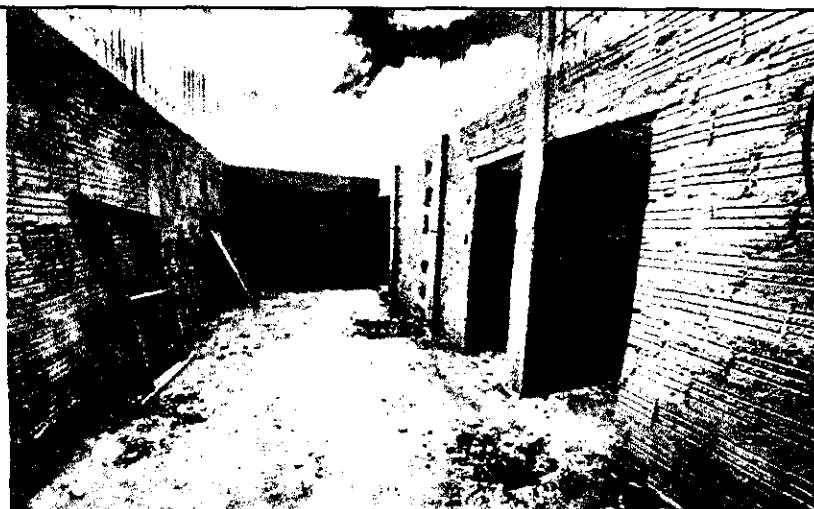


Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 000000000-1/1224


EXECUÇÃO DE CHAPISO EXTERNO

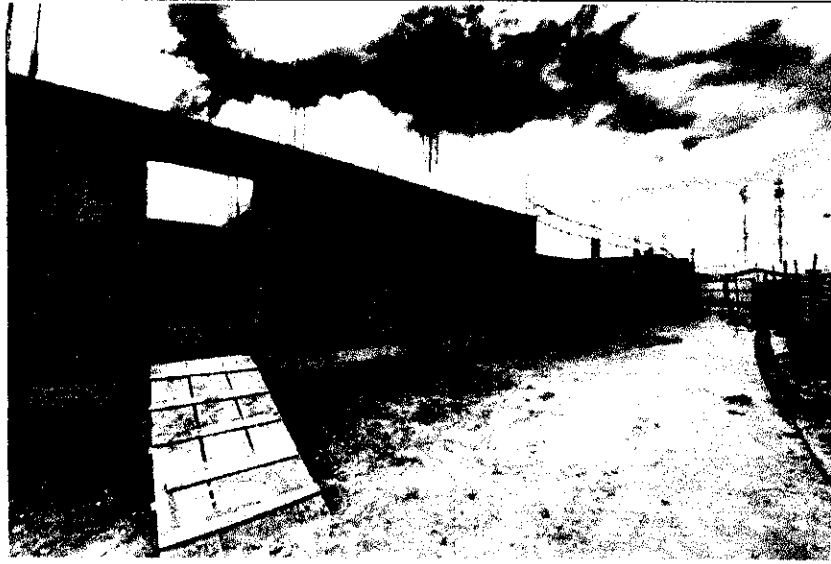

FABRICAÇÃO DE FORMAS

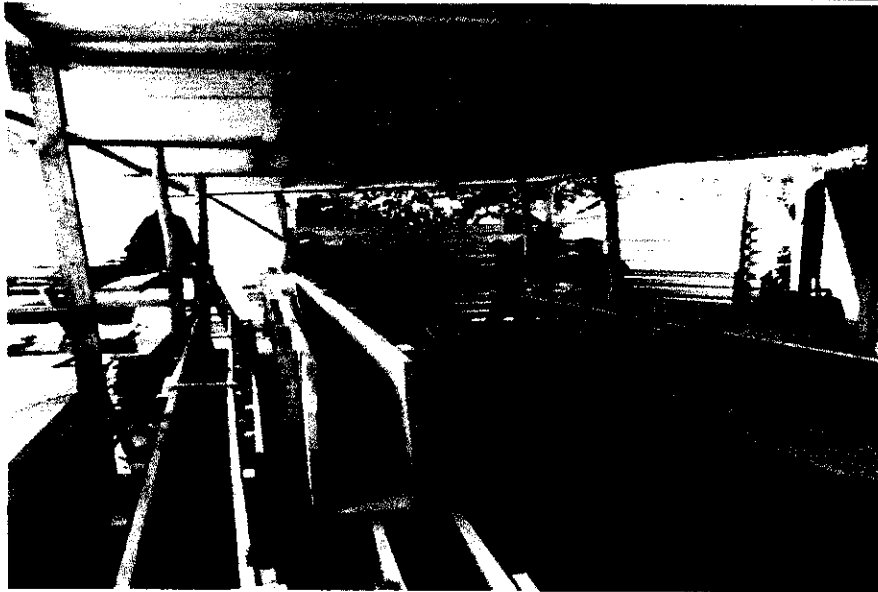


Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 110841/2014

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL						
	CONTRATO Nº 254-2022	LICITAÇÃO Nº 001-2022	RDO: 1	CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva w/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
MOBILIZAÇÃO INICIAL				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Petrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pé carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pé carregadeira						
				Caçamba						
				Petrol						
				PC 200						
				Placa Vistoria						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/09/2022				Data: 29/09/2022						

Julia Varyão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		CONTRATO N° 254-2022			LICITAÇÃO N° 001-2022		RDO: 2				
Condições Climáticas		Manhã: (1)			Tarde: (1)		Noite: ()				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2 - Chuva cf. cond. Trab.		3- Chuva cf. cond. Trab.				
MOBILIZAÇÃO INICIAL		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Cafeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de PÁ carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PÁ carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 30/09/2022		Data: 30/09/2022									


Júlia Vojão
Engenheira Civil
CREA-BA 300004 N 24



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	X	D				
MR	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ														
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS														
CONTRATO N° 254-2022		LICITAÇÃO N° 001-2022		RDO: 3											
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()															
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				EFETIVO PESSOAL											
				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux. Adm.											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
								MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Cabeleiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletroísta											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Pílea Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 01/10/2022				Data: 01/10/2022											


Júlia Verjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041824



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: _____ QTDE: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra _____ Engenheiro _____ 1 Tec. de Segurança _____ Aux Adm _____ Mestre de obra _____ Encarregado geral _____ 1 Hh DO DIA _____ MÃO DE OBRA DIRETA Topografo _____ Auxiliar de topografia _____ Pedreiro _____ 1 Ajudante Geral _____ 4 Calceiteiro _____ Carpinteiro _____ Operador de Motosserra _____ Motorista _____ Montador _____ Montador/Eletricista _____ Eletricista _____ Operador de Patrol _____ Operador de Escavadeira _____ Operador de Pá carregadeira _____ Motorista de caçamba _____ Pintor _____ Hh DO DIA _____						
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS									
CONTRATO Nº 264-2022		LICITAÇÃO Nº 961-2022		RDO: 4						
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA _____ JORNADA DE TRABALHO _____ Hh DO DIA _____ Hh ACUMULADO _____						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO _____ QTDE. _____ Veículo Leve _____ Caminhão Munck _____ Caminhão Toco _____ Escavadeira _____ Pá carregadeira _____ Caçamba _____ Patrol _____ PC 200 _____ Placa Vibratória _____						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/10/2022				Data: 02/10/2022						

Júlia Vaz
 Engenheira
 CREA-BA 30000



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 284-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 5			EFETIVO PESSOAL							
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE			
MOBILIZAÇÃO INICIAL				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/10/2022				Data: 03/10/2022							

Júlia Vanião
 Engenheira
 CREA-BA 30000414

Visto
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 264-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 6				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MOBILIZAÇÃO INICIAL				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/10/2022				Data: 04/10/2022						



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 7				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
MOBILIZAÇÃO INICIAL				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve Caminhão Munc Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA: Data: 05/10/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 05/10/2022				


Júlia Vaz
 Engenheira
 CREA-BA 300004

Visto
 CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

GERENTE DE OBRA: Data: 06/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 06/10/2022				
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Júlia Vaz
 Engenheira
 CREA-BA 300004142

Visto
 CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S	D	
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS											
CONTRATO N° 254-2022		LICITAÇÃO N° 001-2022		RDO: 9		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA				
MOBILIZAÇÃO INICIAL		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra				
								Engenheiro				1
								Téc. de Segurança				
								Aux Adm				
								Mestre de obra				
								Encarregado geral				1
								Hh DO DIA				
								MÃO DE OBRA DIRETA				
								Topografo				
								Auxiliar de topografia				
								Pedreiro				1
								Ajudante Geral				4
								Cajeteiro				
								Carpinteiro				
								Operador de Motosserra				
								Motorista				
								Montador				
								Montador/Eletricista				
								Eletricista				
								Operador de Patrol				
								Operador de Escavadeira				
								Operador de Pá carregadeira				
								Motorista de caçamba				
								Pintor				
								Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO				
								EFETIVO DO DIA				
								JORNADA DE TRABALHO				
								Hh DO DIA				
								Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS				
								TIPO		QTDE.		
								Veículo Leve				
								Caminhão Munck				
								Caminhão Toco				
								Escavadeira				
								Pá carregadeira				
								Caçamba				
								Patrol				
								PC 200				
								Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/10/2022				Data: 07/10/2022								

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 30000414-2




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 10				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
MOBILIZAÇÃO INICIAL SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 08/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 08/10/2022							

Júlia Valéria
 Engenheira
 CREA-BA 30000414


Visto

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 11				S	T	Q	Q	S	S	D	X																			
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		EFETIVO PESSOAL																								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva al cond. Trab.		3- Chuva al cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE																				
MOBILIZAÇÃO INICIAL		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA																										
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA																										
						MÃO DE OBRA DIRETA																										
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																										
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munc</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munc		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE																															
Veículo Leve																																
Caminhão Munc																																
Caminhão Toco																																
Escavadeira																																
Pá carregadeira																																
Caçamba																																
Patrol																																
PC 200																																
Placa Vibratória																																
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																														
Data: 09/10/2022		Data: 09/10/2022																														


Júlia Vaz
 Engenheira
 CREA-BA 30000




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 12		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
MOBILIZAÇÃO INICIAL SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 10/10/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 10/10/2022						


Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 13		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
MOBILIZAÇÃO INICIAL SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra			1				
		Engenheiro			1				
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral			1				
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							1
		Ajudante Geral							4
		Calçateiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE				
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 11/10/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 11/10/2022							


Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300004142



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS									
	CONTRATO Nº 254-2022	LICITAÇÃO Nº 001-2022	RDO: 14							
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.									
MOBILIZAÇÃO INICIAL				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA				QTDE		
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro					1	
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral					1	
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro					1	
				Ajudante Geral					4	
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motocarro						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pa carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/10/2022				Data: 12/10/2022						


Júlia Vaz
Engenheira Civil
CREA-BA 3080041424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Date						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 15		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
MOBILIZAÇÃO INICIAL SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 13/10/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 13/10/2022						

Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041-0/2017



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 17			EFETIVO PESSOAL							
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/10/2022				Data: 15/10/2022							

Júlia Viana
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300004142




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 18				QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/10/2022				Data: 16/10/2022						

Júlia *V. Araújo*
 Engenheira
 CREA-BA 300004/2022


Visto

CONDOMÍNIO MUNICIPAL
 SANTALUZ / BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		X							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022	RDO: 19							
Condições Climáticas		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.			EFETIVO PESSOAL					
					CATEGORIA		QTDE			
					MÃO DE OBRA INDIRETA					
MOBILIZAÇÃO INICIAL					Gerente de Obra					
					Engenheiro		1			
					Tec. de Segurança					
					Aux Adm					
					Mestre de obra					
					Encarregado geral		1			
					Hh DO DIA					
					MÃO DE OBRA DIRETA					
					Topógrafo					
					Auxiliar de topografia					
					Pedreiro		1			
					Ajudante Geral		4			
					Calceiro					
					Carpinteiro					
					Operador de Motosserra					
					Motorista					
					Montador					
					Montador/Eletricista					
					Eletricista					
					Operador de Petrol					
					Operador de Escavadeira					
					Operador de Pá carregadeira					
					Motorista de caçamba					
					Pintor					
					Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO					
					EFETIVO DO DIA					
					JORNADA DE TRABALHO					
					Hh DO DIA					
					Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS					
					TIPO		QTDE.			
					Veículo Leve					
					Caminhão Munck					
					Caminhão Toco					
					Escavadeira					
					Pá carregadeira					
					Caçamba					
					Petrol					
					PC 200					
					Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:					
Data: 17/10/2022					Data: 17/10/2022					

Júlia Araújo
 Engenheira
 CREA-BA 300084


VISTO
 CONTRATAÇÃO Nº 001-2022
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X						
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 20			EFETIVO PESSOAL							
	CATEGORIA		QTDE								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
MOBILIZAÇÃO INICIAL				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calceoleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munc Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/10/2022				Data: 18/10/2022							

Júlia Viana
 Engenheira
 CREA-BA 3000641-2


VISU

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
				B	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 901-2022 RDO: 21				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva n° cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLÓGICA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
MOBILIZAÇÃO INICIAL				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topógrafo							
				Pedreiro							1
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							4
				Operador de Motocarro							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/10/2022				Data: 19/10/2022							

Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300064



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 901-2022 RDO: 22			EFETIVO PESSOAL						
	Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE			
	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
MOBILIZAÇÃO INICIAL						Gerente de Obra				
						Engenheiro				
						Téc. de Segurança				
						Aux Adm				
						Mestre de obra				
						Encarregado geral				
						Hh DO DIA				
						MÃO DE OBRA DIRETA				
						Topógrafo				
						Auxiliar de topografia				
						Pedreiro				
						Ajudante Geral				
						Calculista				
						Carpinteiro				
						Operador de Motoerra				
						Motorista				
						Montador				
						Montador/Eletricista				
						Eletricista				
						Operador de Patrol				
						Operador de Escavadeira				
						Operador de Pá carregadeira				
						Motorista de caçamba				
						Pintor				
						Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO				
						EFETIVO DO DIA				
						JORNADA DE TRABALHO				
						Hh DO DIA				
						Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS				
						TIPO		QTDE.		
						Veículo Leve				
						Caminhão Munch				
						Caminhão Toco				
						Escavadeira				
						Pá carregadeira				
						Caçamba				
						Patrol				
						PC 290				
						Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/10/2022			Data: 20/10/2022							


Júlia Varjão
 Engenheira
 CREA-BA 30008412



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 801-2022 RDO: 23				CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
MOBILIZAÇÃO INICIAL				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				Hh DO DIA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografo									
				Pedreiro								4	
Ajudante Geral								6					
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE					
				Veículo Leve									
				Caminhão Munch									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/10/2022				Data: 21/10/2022									


Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300064123


VISADO
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 294-2022 LICITAÇÃO N° 801-2022 RDO: 24			EFETIVO PESSOAL						
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva w/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cabeleiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motoceira						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/10/2022				Data: 22/10/2022						

Júlia Verjão
 Engenheira
 CREA-BA 30000



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS							
CONTRATO N° 254-2022		LICITAÇÃO N° 061-2022		RDO: 25				
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()								
SIMBOLÓGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS								
		EFETIVO PESSOAL						
		CATEGORIA			QTDE			
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Ajudante de topógrafo Pedreiro Ajudante Geral Cabeleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeiras Operador de P4 carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira P4 carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Pteca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/10/2022		Data: 23/10/2022						




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS										
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 801-2022		RDO: 28		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Téc. de Segurança							
INSTALAÇÃO DO TAPUME				Aux Adm							
				Mestre de obra							
INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topógrafo							
				Pedreiro 4							
				Ajudante Geral 8							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 208							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/10/2022				Data: 24/10/2022							


Júlia Vasília
Engenheira Civil
CREA-BA 30000412





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
MR	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS										
CONTRATO N° 254-2022		LICITAÇÃO N° 001-2022		RDO: 27		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DO TAPUME INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografa							
				Pedreiro							4
				Ajudante Geral							6
				Cabeleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/10/2022				Data: 25/10/2022							

Júlia Vaz
Engenheira
CREA-BA 3000041-2



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 29		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE			MÃO DE OBRA INDIRETA	
LOCAÇÃO DA OBRA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 27/10/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 27/10/2022						




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 264-2022 LICITAÇÃO N° 801-2022 RDO: 30		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (3) Tarde (3) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
LOCAÇÃO DA OBRA		Gerente de Obra						
		Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
		Hh DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/10/2022		Data: 28/10/2022						

Júlia Araújo
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300004/2024

VISADO

COMISSÃO GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ - BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDQ: 31				S	T	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Petrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE
				Veículo Leve							
				Caminhão Bunk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Petrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
FISCALIZAÇÃO:				Data: 29/10/2022							

Júlia
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300.04474

Visto



CONTRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date						
MR	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL						
	CONTRATO N° 254-2022	LICITAÇÃO N° 801-2022	RDO: 52	CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas	Manhã ()	Tarde ()	Note ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1 - Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Canteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 280										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/10/2022				Data: 30/10/2022						


Júlia Vinção
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300064/424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				X						X
				S	T	Q	Q	S	S	D
MP	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS									
	CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022			RDO: 33				
Condições Climáticas		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()				
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3 - Chuva cf cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
INÍCIO DA ESCAVAÇÃO										
MÃO DE OBRA INDIRETA										
Gerente de Obra										
Engenheiro										
Téc. de Segurança										
Aux Adm										
Mestre de obra										
Encarregado geral										
Hh DO DIA										
MÃO DE OBRA DIRETA										
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Cabeleiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
RESUMO DO EFETIVO										
EFETIVO DO DIA										
JORNADA DE TRABALHO										
Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
TIPO										
QTDE										
Veículo Leve										
Caminhão Munck										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:					
Data: 31/10/2022					Data: 31/10/2022					

Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300004142



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	x					
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		S	T	Q	Q	S	S	D
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022	RDO: 34						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE		
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO		MÃO DE OBRA INDIRETA							
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra			1		
		Engenheiro						1	
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral						1	
Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro						6	
		Ajudante Geral						10	
		Calceiteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO						QTDE	
		Veículo Leve							
		Caminhão Munc							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira						1	
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/11/2022		Data: 01/11/2022							


Júlia Araújo
 Engenheira Civil
 CREA-BA 30006/1-24



 PREFEITURA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data																																										
		S	T	Q	Q	S	S	D																																				
MR	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL																																				
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS							CATEGORIA																																				
CONTRATO N° 254-2022		LICITAÇÃO N° 001-2022		RDO: 35			QTDE																																					
Condições Cênicas: Manhã (7) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA																																										
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva al cond. Trab.		3- Chuva al cond. Trab.																																						
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																										
		<table border="1"> <tr><td>Gerente de Obra</td><td></td></tr> <tr><td>Engenheiro</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tac. de Segurança</td><td></td></tr> <tr><td>Aux Adm</td><td></td></tr> <tr><td>Mestre de obra</td><td></td></tr> <tr><td>Encarregado geral</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Hh DO DIA</td></tr> </table>							Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tac. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA																							
Gerente de Obra																																												
Engenheiro	1																																											
Tac. de Segurança																																												
Aux Adm																																												
Mestre de obra																																												
Encarregado geral	1																																											
Hh DO DIA																																												
		<table border="1"> <tr><td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td></tr> <tr><td>Topografo</td><td></td></tr> <tr><td>Auxiliar de topografia</td><td></td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Geral</td><td>10</td></tr> <tr><td>Calceiro</td><td></td></tr> <tr><td>Carpinteiro</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Motosserra</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista</td><td></td></tr> <tr><td>Montador</td><td></td></tr> <tr><td>Montador/Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista de caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Pintor</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Hh DO DIA</td></tr> </table>							MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	6	Ajudante Geral	10	Calceiro		Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor		Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA																																												
Topografo																																												
Auxiliar de topografia																																												
Pedreiro	6																																											
Ajudante Geral	10																																											
Calceiro																																												
Carpinteiro																																												
Operador de Motosserra																																												
Motorista																																												
Montador																																												
Montador/Eletricista																																												
Eletricista																																												
Operador de Patrol																																												
Operador de Escavadeira																																												
Operador de Pá carregadeira																																												
Motorista de caçamba																																												
Pintor																																												
Hh DO DIA																																												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																																										
		<table border="1"> <tr><td>EFETIVO DO DIA</td><td></td></tr> <tr><td>JORNADA DE TRABALHO</td><td></td></tr> <tr><td>Hh DO DIA</td><td></td></tr> <tr><td>Hh ACUMULADO</td><td></td></tr> </table>							EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO																													
EFETIVO DO DIA																																												
JORNADA DE TRABALHO																																												
Hh DO DIA																																												
Hh ACUMULADO																																												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																																										
		<table border="1"> <tr><td colspan="2">TIPO</td><td>QTDE.</td></tr> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pieça Vibratória</td><td></td><td></td></tr> </table>							TIPO		QTDE.	Veículo Leve			Caminhão Munck			Caminhão Toco			Escavadeira		1	Pá carregadeira			Caçamba			Patrol			PC 200			Pieça Vibratória								
TIPO		QTDE.																																										
Veículo Leve																																												
Caminhão Munck																																												
Caminhão Toco																																												
Escavadeira		1																																										
Pá carregadeira																																												
Caçamba																																												
Patrol																																												
PC 200																																												
Pieça Vibratória																																												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																																										
Data: 02/11/2022		Data: 02/11/2022																																										

Júlia *[assinatura]*
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300042/2024


VISU


COMISSARIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			RDO:	37						
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()											
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.									
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
								EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pé carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/11/2022				Data: 04/11/2022							

Júlia Karjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300064742




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		S	T	Q	Q	S	S	x		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 801-2022 RDO: 39							EFETIVO PESSOAL		
	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.					CATEGORIA		QTDE
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral		Hh DO DIA	
							MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor		Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO		QTDE.	
							Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA: Data: 06/11/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 06/11/2022								


Júlia Araújo
 Engenheira CIVIL
 CREA-BA 300084142




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 40				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO INSTALAÇÕES DAS SAPATAS E CONCRETAGEM				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				Hh DO DIA			
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceoleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor				Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Muck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 07/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 07/11/2022							

Júlia Araújo
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 42			S	T	X	Q	Q	S	S	D
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA		QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA								
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO INSTALAÇÕES DAS SAPATAS E CONCRETAGEM			Gerente de Obra								
			Engenheiro		1						
			Tec. de Segurança								
			Aux Adm								
			Mestre de obra								
			Encarregado geral		1						
			Hh DO DIA								
			MÃO DE OBRA DIRETA								
			Topógrafo								
			Auxiliar de topografia								
			Pedreiro		4						
			Ajudante Geral		6						
			Calçateiro								
			Carpinteiro								
			Operador de Motosserra								
			Mototista								
			Montador								
			Montador/Eletricista								
			Eletricista								
			Operador de Patrol								
			Operador de Escavadeira								
			Operador de Pa carregadeira								
			Mototista de caçamba								
Pintor											
			Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
			EFETIVO DO DIA								
			JORNADA DE TRABALHO								
			Hh DO DIA								
			Hh ACUMULADO								
			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
			TIPO		QTDE.						
			Veículo Leve								
			Caminhão Munck								
			Caminhão Toco								
			Escavadeira								
			Pa carregadeira								
			Caçamba								
			Patrol								
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/11/2022			Data: 09/11/2022								


Júlia Vaz
 Engenheira
 CREA-BA 3000641-4

Visto
 CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 43		EFETIVO PESSOAL						
	Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ pond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO INSTALAÇÕES DAS SAPATAS E CONCRETAGEM			Gerente de Obra						
			Engenheiro						1
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral						1
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topógrafo						
			Auxiliar de topografia						
			Padreiro						4
			Ajudante Geral						
			Calceiteiro						6
			Carpinteiro						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO		QTDE				
			Veículo Leve						
			Caminhão Munch						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/11/2022			Data: 10/11/2022						

Júlia Vitorjã
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																											
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S	D																																				
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL																																											
CONTRATO N° 254-2022			LICITAÇÃO N° 001-2022	RDO: 44		CATEGORIA			QTDE																																						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA																																												
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																												
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO INSTALAÇÕES DAS SAPATAS E CONCRETAGEM			<table border="1"> <tr><td>Gerente de Obra</td><td></td></tr> <tr><td>Engenheiro</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tec. de Segurança</td><td></td></tr> <tr><td>Aux Adm</td><td></td></tr> <tr><td>Mestre de obra</td><td></td></tr> <tr><td>Encarregado geral</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Hh DO DIA</td></tr> </table>									Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA																							
Gerente de Obra																																															
Engenheiro	1																																														
Tec. de Segurança																																															
Aux Adm																																															
Mestre de obra																																															
Encarregado geral	1																																														
Hh DO DIA																																															
			<table border="1"> <tr><td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td></tr> <tr><td>Topografo</td><td></td></tr> <tr><td>Auxiliar de topografia</td><td></td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ajudante Geral</td><td>6</td></tr> <tr><td>Calceiteiro</td><td></td></tr> <tr><td>Carpinteiro</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Motosserra</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista</td><td></td></tr> <tr><td>Montador</td><td></td></tr> <tr><td>Montador/Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista de caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Pintor</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Hh DO DIA</td></tr> </table>									MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	4	Ajudante Geral	6	Calceiteiro		Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor		Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA																																															
Topografo																																															
Auxiliar de topografia																																															
Pedreiro	4																																														
Ajudante Geral	6																																														
Calceiteiro																																															
Carpinteiro																																															
Operador de Motosserra																																															
Motorista																																															
Montador																																															
Montador/Eletricista																																															
Eletricista																																															
Operador de Patrol																																															
Operador de Escavadeira																																															
Operador de Pá carregadeira																																															
Motorista de caçamba																																															
Pintor																																															
Hh DO DIA																																															
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO																																												
			<table border="1"> <tr><td>EFETIVO DO DIA</td><td></td></tr> <tr><td>JORNADA DE TRABALHO</td><td></td></tr> <tr><td>Hh DO DIA</td><td></td></tr> <tr><td>Hh ACUMULADO</td><td></td></tr> </table>									EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO																													
EFETIVO DO DIA																																															
JORNADA DE TRABALHO																																															
Hh DO DIA																																															
Hh ACUMULADO																																															
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS																																												
			<table border="1"> <tr><td colspan="2">TIPO</td><td>QTDE</td></tr> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munch</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td><td></td></tr> </table>									TIPO		QTDE	Veículo Leve			Caminhão Munch			Caminhão Toco			Escavadeira			Pá carregadeira			Caçamba			Patrol			PC 200			Placa Vibratória								
TIPO		QTDE																																													
Veículo Leve																																															
Caminhão Munch																																															
Caminhão Toco																																															
Escavadeira																																															
Pá carregadeira																																															
Caçamba																																															
Patrol																																															
PC 200																																															
Placa Vibratória																																															
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:																																												
Data: 11/11/2022			Data: 11/11/2022																																												

Júlia Varjão
 Engenheira Div.
 CREA-BA 3000841424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 48				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TPO QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 12/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 12/11/2022						


Júlia Araújo
 Engenheira Civil
 CREA-BA 30008/M4-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
MP	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS									
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022		RDO: 48		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas		Mantã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva a/ cond. Trab.		3- Chuva a/ cond. Trab.		Gerente de Obra		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Engenheiro		
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS								Tec. de Segurança		
								Aux Adm		
								Mestre de obra		
								Encarregado geral		
								Hh DO DIA		
								MÃO DE OBRA DIRETA		
								Topografo		
								Auxiliar de topografia		
								Pedreiro		
								Ajudante Geral		
								Calceiteiro		
								Carpinteiro		
								Operador de Motosserra		
								Motorista		
								Montador		
								Montador/Eletricista		
								Eletricista		
								Operador de Patrol		
								Operador de Escavadeira		
								Operador de Pá carregadeira		
								Motorista de caçamba		
								Pintor		
								Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO		
								EFETIVO DO DIA		
								JORNADA DE TRABALHO		
								Hh DO DIA		
								Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS		
								TIPO		
								Veículo Leve		
								Caminhão Munch		
								Caminhão Toco		
								Escavadeira		
								Pá carregadeira		
								Caçamba		
								Patrol		
								PC 200		
								Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/11/2022		Data: 13/11/2022								


Júlia Vasquez
 Engenheira
 CREA-BA 30008414


Visto


CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 47			EFETIVO PESSOAL							
	Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE			
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO INSTALAÇÕES DAS SAPATAS E CONCRETAGEM				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				6			
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pê carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pê carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/11/2022				Data: 14/11/2022							


Júlia Vasquez
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300064143



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	x								
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			T	Q	Q	S	S	O				
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022		RDO: 48		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA									
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO INSTALAÇÕES DAS SAPATAS E CONCRETAGEM				Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						1			
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topógrafo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro						4			
				Ajudante Geral						6			
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO						QTDE.			
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 15/11/2022				Data: 15/11/2022									



 Júlia Vasconcelos
 Engenheira Civil
 CREA-BA 30008411/2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	D	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº: 254-2022 LICITAÇÃO Nº: 901-2022 RDO: 48							
Condições Climáticas: Simbologia:		Manhã: (1) 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab.		Tarde: (1) 3- Chuva s/ cond. Trab.		Noite: ()		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
								MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor	
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA: Data: 18/11/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 18/11/2022							

Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000611424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 50				S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL	
				Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS				Gerente de Obra		1		Engenheiro		1		
				Tec. de Segurança				Aux Adm				Mestre de obra
				Encarregado geral				Hh DO DIA				
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo				Auxiliar de topografia				
				Pedreiro				Ajudante Geral		2		
				Calcetairo				Carpinteiro				
				Operador de Motosserra				Motorista				
				Montador				Montador/Eletricista				
				Eletricista				Operador de Patrol				
				Operador de Escavadeira				Operador de Pá carregadeira				
				Motorista de caçamba				Pintor				
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO				
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE				
				Veículo Leve				Caminhão Muncie				
				Caminhão Toco				Escavadeira				
				Pá carregadeira				Caçamba				
				Patrol				PC 200				
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022								

Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data							X		
	S	T	Q	Q	S	S	D		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 51

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA	QTDE
-----------	------

MÃO DE OBRA INDIRETA

CATEGORIA	QTDE
Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hr DO DIA	

MÃO DE OBRA DIRETA

CATEGORIA	QTDE
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	1
Ajudante Geral	2
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Hr DO DIA	

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES
ARMAÇÃO DAS FORMAS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	JORNADA DE TRABALHO
Hr DO DIA	
Hr ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE
Veículo Leve	
Caminhão Munch	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:
Data: 18/11/2022

FISCALIZAÇÃO:
Data: 18/11/2022

Júlia Valério
Engenheira CREA-BA 300064142



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				S	T	Q	Q	S	S	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 52				EFETIVO PESSOAL																										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE																							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																										
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																										
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munch</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munch		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve																														
Caminhão Munch																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA: Data: 19/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/11/2022																										

Júlia Vasconcelos
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300064/027

Visto
 CONSERVADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ - BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N°: 254-2022 LICITAÇÃO N°: 801-2022 RDO: 53				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 20/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 20/11/2022						



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 54				<table border="1"> <tr> <td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td> </tr> </table>							x									S	T	Q	Q	S	S	D																																						
				x																																																												
S	T	Q	Q	S	S	D																																																										
SIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL <table border="1"> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Calceiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> </table>							CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topógrafo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	1	Ajudante Geral	2	Calceiro		Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor		Hh DO DIA	
CATEGORIA	QTDE																																																															
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																
Gerente de Obra																																																																
Engenheiro	1																																																															
Tec. de Segurança																																																																
Aux Adm																																																																
Mestre de obra																																																																
Encarregado geral	1																																																															
Hh DO DIA																																																																
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																
Topógrafo																																																																
Auxiliar de topografia																																																																
Pedreiro	1																																																															
Ajudante Geral	2																																																															
Calceiro																																																																
Carpinteiro																																																																
Operador de Motosserra																																																																
Motorista																																																																
Montador																																																																
Montador/Eletricista																																																																
Eletricista																																																																
Operador de Patrol																																																																
Operador de Escavadeira																																																																
Operador de Pá carregadeira																																																																
Motorista de caçamba																																																																
Pintor																																																																
Hh DO DIA																																																																
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS																																																																
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																																																												
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																																																												
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																												
				<table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Munck</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibratória</td> <td></td> </tr> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória																																			
TIPO	QTDE.																																																															
Veículo Leve																																																																
Caminhão Munck																																																																
Caminhão Toco																																																																
Escavadeira																																																																
Pá carregadeira																																																																
Caçamba																																																																
Patrol																																																																
PC 200																																																																
Placa Vibratória																																																																
GERENTE DE OBRA: Data: 21/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/11/2022																																																												

Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424


Visto

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424


Visto

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data													
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 57				<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D
				S	T	Q	Q	S	S	D							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL													
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA													
INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS INÍCIO DA CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1													
				MÃO DE OBRA DIRETA													
CONSIDERAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor													
				RESUMO DO EFETIVO													
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO													
				EFETIVO EQUIPAMENTOS													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:													
Data: 24/11/2022				Data: 24/11/2022													


Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 264-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 58				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS INICIO DA CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		1					
				Ajudante Geral		2					
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE					
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/11/2022				Data: 25/11/2022							

Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 59				S T Q Q S S D						
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/11/2022				Data: 26/11/2022						


Júlia Verjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041-1



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 80				EFETIVO PESSOAL								
				CATEGORIA			QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
Calçateiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pa carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munc								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pa carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/11/2022				Data: 27/11/2022								

Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 82				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:				TIPO						
				Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeiras Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO: Data: 29/11/2022				Data: 29/11/2022						


Júlia Vasconcelos
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 83				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cepamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 30/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 30/11/2022						


Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 64				S	T	Q	Q	x	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheira 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
INSTALAÇÃO DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES ARMAÇÃO DAS FORMAS CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/12/2022				Data: 01/12/2022							


Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 85				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td> </tr> </table>															X	S	T	Q	Q	S	S	S	D	
												X																
S	T	Q	Q	S	S	S	D																					
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL																								
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE																								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA																								
TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																								
				Hh DO DIA																								
				MÃO DE OBRA DIRETA																								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200	
TIPO	QTDE.																											
Veículo Leve																												
Caminhão Munck																												
Caminhão Toco																												
Escavadeira																												
Pá carregadeira																												
Caçamba																												
Patrol																												
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																								
Data: 02/12/2022				Data: 02/12/2022																								


Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 67		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO				
		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Lave Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/12/2022		Data: 04/12/2022						

Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 264-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 08				<table border="1"> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td> </tr> </table>							X								S	T	Q	Q	S	S	D	
				X																						
S	T	Q	Q	S	S	D																				
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 05/12/2022				Data: 05/12/2022																						


Júlia Verjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
MP	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS									
	CONTRATO N° 254-2022	LICITAÇÃO N° 001-2022	RDO: 69	CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (3)	Tarde: (3)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Ajudar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Petrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Petrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/12/2022				Data: 06/12/2022						

Júlia Vaz
Engenheira
CREA-BA 300064142



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 70		EFETIVO PESSOAL						
	Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO			Gerente de Obra						
			Engenheiro						
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topógrafo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro						
			Ajudante Geral						
			Calceteiro						
			Carpinteiro						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO		QTDE				
			Veículo Leve						
			Caminhão Munk						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Pílea Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/12/2022			Data: 07/12/2022						

Júlia Verjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 71				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA						
TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pé carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munc						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pé carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/12/2022				Data: 08/12/2022						

Júlia Perjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000841428




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	Q	Q	X	S	S	D
MP2 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 72			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA							
TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
			Hh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO				QTDE.			
GERENTE DE OBRA:			Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/12/2022			Data: 09/12/2022							

Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300061142




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
MP2	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS										
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022		RDO: 73							
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva al cond. Trab.		3- Chuva al cond. Trab.					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							4
				Ajudante Geral							6
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022							

Júlia Vazão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000841424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
MR	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022		RDO: 74		CATEGORIA				QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
1- Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab.		FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS			Gerente de Obra					
					Engenheiro					
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral								
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topógrafo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro								
		Ajudante Geral								
		Calçateiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		REBUNDO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO				QTDE				
		Veículo Leve								
		Caminhão Muncie								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 11/12/2022		Data: 11/12/2022								

Júlia Várzea
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



MP2		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					X		Z				
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL						
		CONTRATO Nº 264-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: 75			CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES			Engenheiro						
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					Calçateiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pa carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO			QTDE.			
					Veículo Leve						
					Caminhão Munk						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 12/12/2022		Data: 12/12/2022									



Júlia V. V.

 Engenheira Civil

 CREA-BA 300084/2024


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
MP	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS											
CONTRATO Nº 264-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022		RDO: 76		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
				Engenheiro							1	
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
											Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							4	
				Ajudante Geral							6	
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
							Hh DO DIA					
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munch								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/12/2022				Data: 13/12/2022								

Júlia Vazão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000641424



MR		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS									
		CONTRATO Nº 254-2022	LICITAÇÃO Nº 001-2022	RDO: 77							
Condições Climáticas		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.									
CONCRETAGEM DOS ARRANQUES E VIGAS BALDRAMES		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			EFETIVO PESSOAL						
					MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE		
					Gerente de Obra						
					Engenheiro				1		
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral				1		
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					4						
					6						
					Calçateiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO				QTDE.		
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/12/2022				Data: 14/12/2022							

Júlia Vazão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000641424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 78				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Gerente de Obra						
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/12/2022				Data: 15/12/2022						


Júlia Viana
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424

Visto
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 SANTALUZ/BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 78				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			4			
				Ajudante Geral			6			
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 16/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 16/12/2022						

Júlia Varkão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS									
	CONTRATO Nº 254-2022	LICITAÇÃO Nº 801-2022	RDO: 80	CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva al' cond. Trab. 3- Chuva al' cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pa carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
				Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/12/2022				Data: 17/12/2022						


Júlia Karjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424



				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/12/2022				Data: 18/12/2022						

Júlia Karjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																											
				<table border="1"> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								X										S	T	Q	Q	S	S	D			
				X																											
S	T	Q	Q	S	S	D																									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 801-2022 RDO: 82				EFETIVO PESSOAL																											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE																							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																											
Hh DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Muncie</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Muncie		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE																														
Veículo Leve																															
Caminhão Muncie																															
Caminhão Toco																															
Escavadeira																															
Pá carregadeira																															
Caçamba																															
Patrol																															
PC 200																															
Placa Vibratória																															
GERENTE DE OBRA: Data: 19/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/12/2022																											


Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 081-2022 RDO: 83				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHARISCO REBOCO				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			4			
				Ajudante Geral			6			
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 20/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 20/12/2022						


Júlia Vantão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data																										
		S	T	X	Q	Q	S	S	D																			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 84		EFETIVO PESSOAL																										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE																							
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA																										
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Toc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA																										
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO		MÃO DE OBRA DIRETA																										
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
OBSERVAÇÕES		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">TIPO</th> <th style="width: 50%;">QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munch</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munch		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																											
Veículo Leve																												
Caminhão Munch																												
Caminhão Toco																												
Escavadeira																												
Pá carregadeira																												
Caçamba																												
Patrol																												
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA: Data: 21/12/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 21/12/2022																										

Júlia Vasção
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 86				S T Q Q S S D						
				Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL		
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO				Gerente de Obra				1		
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral				1		
								Hh DO DIA		
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro				4		
				Ajudante Geral				6		
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO				QTDE.		
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/12/2022				Data: 23/12/2022						


Júlia Vokjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	O
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 87		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/12/2022		Data: 24/12/2022						

Júlia Vazjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	D	X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N°: 254-2022 LICITAÇÃO N°: 001-2022 RDO: 88				EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA											
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
Ajudante Geral															
Calçeteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munch											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 25/12/2022				Data: 25/12/2022											

Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		CATEGORIA						
CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 09		QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: [] Tarde: [] Noite: []		MÃO DE OBRA INDIRETA						
1 - Tempo Bom 2 - Chuva et. cond. Trab. 3 - Chuva et. cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro						
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO		Tec. de Registro						
CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO		Aux Adm						
ATERRO DA OBRA		Mestre de obra						
CHAPISCO		Encarregado geral						
REBOCO								
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pintor						
		Ajudante Geral						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador/Eletricista						
		Eletrodista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de PA carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munch						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		PA carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Pisca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO						
Data: 26/11/2022		Data: 26/11/2022						


Júlia Marjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 90				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 27/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 27/12/2022						

Júlia Vaz
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	X	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 254-2022		LICITAÇÃO N° 001-2022		RDO: 91		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/12/2022				Data: 28/12/2022							


Júlia Vasção
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 92				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			4			
				Ajudante Geral			6			
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Petrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Petrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/12/2022				Data: 29/12/2022						


Júlia Viana
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL							
	CONTRATO Nº 264-2022	LICITAÇÃO Nº 001-2022	RDO: 93	CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				6			
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Petrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Petrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/12/2022				Data: 30/12/2022							

Júlia Vazão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000641424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 94				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td> </tr> </table>														X		S	T	Q	Q	S	S	S	D	
											X																	
S	T	Q	Q	S	S	S	D																					
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE																								
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																								
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																								
				TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória																								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																								
Data: 31/12/2022				Data: 31/12/2022																								


Júlia Votjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 96				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
Ajudante Geral											
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/01/2023				Data: 01/01/2023							


Júlia Verjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 001-2022 RDO: 96				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS ARMAÇÃO DAS FORMAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro			1				
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral			1				
Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro			4				
				Ajudante Geral			6				
				Caboesteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/01/2023				Data: 02/01/2023							


Júlia Vasção
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td></td><td></td><td>D</td> </tr> </table>								X								S	T	Q	Q	S	S	
	X																										
S	T	Q	Q	S	S			D																			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		CONTRATO Nº 254-2022			LICITAÇÃO Nº 001-2022			RDO: 97			EFETIVO PESSOAL																
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()			CATEGORIA																
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2- Chuva cf cond. Trab.			3- Chuva cf cond. Trab.			QTDE																
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											MÃO DE OBRA INDIRETA																
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO											Gerente de Obra																
CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO											Engenheiro																
ATERRO DA OBRA											Tec. de Segurança																
CHAPISCO											Aux Adm																
REBOCO											Mestre de obra																
INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS											Encarregado geral																
ARMAÇÃO DAS FORMAS											Hh DO DIA																
											MÃO DE OBRA DIRETA																
											Topógrafo																
											Auxiliar de topografia																
											Pedreiro																
											Ajudante Geral																
											Calefeteiro																
											Carpinteiro																
											Operador de Motosserra																
											Motorista																
											Montador																
											Montador/Eletricista																
											Eletricista																
											Operador de Patrol																
											Operador de Escavadeira																
											Operador de Pá carregadeira																
											Motorista de caçamba																
											Pintor																
											Hh DO DIA																
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO																
											EFETIVO DO DIA																
											JORNADA DE TRABALHO																
											Hh DO DIA																
											Hh ACUMULADO																
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS																
											TIPO																
											QTDE.																
											Veículo Leve																
											Caminhão Munck																
											Caminhão Toco																
											Escavadeira																
											Pá carregadeira																
											Caçamba																
											Patrol																
											PC 200																
											Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																							
Data: 03/01/2023				Data: 03/01/2023																							



Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3040041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
MR	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	X	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 254-2022		LICITAÇÃO N° 061-2022		RDO: 98		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS ARMAÇÃO DAS FORMAS				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 4							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/01/2023				Data: 01/01/2023							

Júlia Vazão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS										
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022		RDO: 99		EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS ARMAÇÃO DAS FORMAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				6			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/01/2023				Data: 05/01/2023							


Júlia V. V. V.
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 901-2022 RDO: #9				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SINBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al/ cond. Trab. 3- Chuva al/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS ARMAÇÃO DAS FORMAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 06/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 06/01/2023							


Júlia Vaidão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000641424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 254-2022		LICITAÇÃO Nº 001-2022		RDO: #		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro		
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS								Tec. de Segurança		
								Aux Adm		
								Mestre de obra		
								Encarregado geral		
								Hh DO DIA		
								MÃO DE OBRA DIRETA		
								Topógrafo		
								Auxiliar de topografia		
								Pedreiro		
								Ajudante Geral		
								Calceiteiro		
								Carpinteiro		
								Operador de Motosserra		
								Motorista		
								Montador		
								Montador/Eletricista		
								Eletricista		
								Operador de Petrol		
								Operador de Escavadeira		
								Operador de Pá carregadeira		
								Motorista de caçamba		
								Pintor		
								Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO		
								EFETIVO DO DIA		
								JORNADA DE TRABALHO		
								Hh DO DIA		
								Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS		
								TIPO		
								Veículo Leve		
								Caminhão Munck		
								Caminhão Toco		
								Escavadeira		
								Pá carregadeira		
								Caçamba		
								Petrol		
								PC 200		
								Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/01/2023		Data: 07/01/2023								



Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFTIVO PESSOAL CATEGORIA _____ QTDE _____ MÁO DE OBRA INDIRETA							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS										
CONTRATO Nº 254-2022 LICITAÇÃO Nº 001-2022 RDO: # _____											
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()								
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra _____ Engenheiro _____ Tec. de Segurança _____ Aux Adm _____ Mestre de obra _____ Encarregado geral _____ Hh DO DIA _____							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo _____ Auxiliar de topografia _____ Pedreiro _____ Ajudante Geral _____ Calceteiro _____ Carpinteiro _____ Operador de Motosserra _____ Motorista _____ Montador _____ Montador/Eletricista _____ Eletricista _____ Operador de Patrol _____ Operador de Escavadeira _____ Operador de PA carregadeira _____ Motorista de caçamba _____ Pintor _____ Hh DO DIA _____							
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA _____ JORNADA DE TRABALHO _____ Hh DO DIA _____ Hh ACUMULADO _____							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO _____ QTDE. _____ Veículo Leve _____ Caminhão Munch _____ Caminhão Toco _____ Escavadeira _____ Pá carregadeira _____ Caçamba _____ Patrol _____ PC 200 _____ Placa Vibratória _____							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/01/2023				Data: 08/01/2023							

Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO N° 254-2022 LICITAÇÃO N° 801-2022 RDO: #		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas		CATEGORIA			QTDE			
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA						
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS ARMAÇÃO DAS FORMAS		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/01/2023		Data: 09/01/2023						


Júlia Vazão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300004124



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
MR	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	X							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 254-2022			LICITAÇÃO Nº 001-2022			RDO: ##		EFETIVO PESSOAL				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA		QTDE							
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra									
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS ARMAÇÃO DAS FORMAS			Engenheiro		1							
			Tec. de Segurança									
			AUX Adm									
			Mestre de obra									
			Encarregado geral		1							
			Hh DO DIA									
			MÃO DE OBRA DIRETA									
			Topógrafo									
			Auxiliar de topografia									
			Pedreiro		4							
Ajudante Geral		6										
Cafeteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pa carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO									
			EFETIVO DO DIA									
			JORNADA DE TRABALHO									
			Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES			Hh ACUMULADO									
			EFETIVO EQUIPAMENTOS									
			TIPO		QTDE							
			Veículo Leve									
			Caminhão Muncie									
			Caminhão Toco									
			Escavadeira									
			Pa carregadeira									
			Caçamba									
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:									
Data: 10/01/2023			Data: 10/01/2023									

Júlia Vazão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	T	X	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		EFETIVO PESSOAL							
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO N° 294-2022	LICITAÇÃO N° 901-2022	RDO: #	NÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
ALVENARIA DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETAGEM DE PILARES DO PRIMEIRO PAVIMENTO ATERRO DA OBRA CHAPISCO REBOCO INSTALAÇÃO DAS VIGAS AÉREAS ARMAÇÃO DAS FORMAS			NÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO				QTDE			
			Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/01/2023			Data: 11/01/2023							

Júlia Vanyão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 15:25:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FyUjQSEh7IM00000.SFP é:

4432299a-d6a7-42fc-87eb-ee3b2217633d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 112022

NRA: FyUjQSEh7IM00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	32.959,51	31.903,11	1.056,40

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 22.106,30



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
Conta de débito:	1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:	858000000550 729901802215 207671180827 459734400018
--	---

CNPJ/CEI empresa:	24.597.344/0001-98
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/12/2022
Competência:	11/2022

Valor recolhido:	5.572,99
-------------------------	----------


Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/12/2022 17:30:14
Data de Débito:	07/12/2022

Código da operação:	00582303
Chave de segurança:	206HZW58PSZ1MTTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40


GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	0,00	6.075,55	24.597.344/0001-98	0079	2119	507
752,93	0,00	6.075,55	752,93	0,00	6.075,55	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 31.903,11



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPENÇENCIA: 11/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	69.662,41
DEPÓSITO	5.572,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.572,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5
 EMPRESA


EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº ARQUIVO: FVJ05EN71M000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GBS: 2119 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 INSCRIÇÃO:

EMPREGADOR: TANGRECO NEVES 2539 Nº CONTROLE: EF3XZENZJHAW000-7
 LOGADOURO: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	8.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,61	
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	20.950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,19	
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	
RAT	3.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,52	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,93	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.903,11	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55	
TOTAL A RECOLHER	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEMP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DE CORRENTES E CONSTITUÍ (EM CRÉDITO(S) PASSIVEZ.(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CERRA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXATIDÃO DO DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	43131185 / Reinf CP 17454374246 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.591,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.120,56	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.273,59	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.986,05	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatível, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2022 19:08:28
Nº do recibo de entrega	00000500000972324



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET


858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022 N° CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: GfedrHvhRXXV0000-3
 LOGRADURO BAIRRO CIDADE UF
 TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
		DEPÓSITO	5.572,99
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.723,97	DEPÓSITO	5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC	3.437,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FYJjQSEh7IM0000-0
 FPA: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022 N° CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: NAJ9dWFBz810000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
Nº ARQUIVO: FYUJQSEh71M0000-0
Nº CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	64.879,78
REM BASE CALC 13º SAL	13.348,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	41
TOTAL A RECOLHER	5.572,99



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0001/0016


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOIHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734460018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAJ AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO JAM

JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA 280,63 136.82574.27-0 26/08/2022 01 16/11/2022 J 07152
0,00 350,80 26,31 22,46 0,00




RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000550 729901802215 207671180827 459734400018

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0002/0016

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98		
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98		
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98		
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98		



RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRE CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG : 0003/0016

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GBS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

REINAN SILVA DOS SANTOS	497,19	310,75	129.68303.06-8	310,75	15/08/2022	01	12/11/2022	0,00	07170
EDIVANDO SILVA RANGEL	497,19	310,75	130.25844.05-0	310,75	15/08/2022	01	12/11/2022	0,00	07170
RICARDO VIDAL DE SOUSA	538,62	310,75	140.79814.27-1	310,75	16/08/2022	01	13/11/2022	0,00	07170
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	1.077,25	310,75	161.36301.46-7	310,75	29/08/2022	01	26/11/2022	0,00	07170
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	662,92	310,75	162.65391.50-0	310,75	25/08/2022	01	22/11/2022	0,00	07170
VITOR DE BRITO FERREIRA	290,03	310,75	165.28962.48-1	310,75	10/08/2022	01	07/11/2022	0,00	07170
WILLIAN SANTOS DA SILVA	952,95	310,75	165.67411.65-2	310,75	26/08/2022	01	23/11/2022	0,00	07170
ANTONIO JOSE SANTOS	1.377,75	449,27	170.14341.00-4	310,75	26/08/2022	01	23/11/2022	0,00	07823
BRUNO GONCALVES SANTOS	165,73	103,58	200.09563.84-3	103,58	21/09/2022	01	04/11/2022	0,00	07170
ENDERSON CONCEICAO ALVES	2.034,61	526,19	200.10987.65-1	526,19	01/09/2022	01	29/11/2022	0,00	07166
GILMAR JESUS DA SILVA	497,19	310,75	200.11587.30-4	310,75	15/08/2022	01	12/11/2022	0,00	07170
JEFERSON SILVA CORREIA SANTOS	911,52	310,75	200.12307.91-7	310,75	25/08/2022	01	22/11/2022	0,00	07170
JOARLES LACERDA DA CUNHA	561,27	526,19	200.12505.83-2	526,19	11/08/2022	01	08/11/2022	0,00	07152
VINICIUS DE JESUS	1.266,55	327,56	200.22891.21-2	327,56	01/09/2022	01	29/11/2022	0,00	07170
GILMAR SANTANA DE ASSIS	538,62	310,75	200.27686.47-1	310,75	16/08/2022	01	13/11/2022	0,00	07170



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA


858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OPERA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA	DATA DEVIDA			MOVIMENTAÇÃO		JAM
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	350,80		122.81157,24-7		15/09/2022	01			196,45	07152
2.104,77			0,00		171,24				0,00	0,00
FAUSTO DONIZETE PESSOA	350,80		127.05284,18-6		08/09/2022	01			196,45	07152
2.104,77			0,00		171,24				0,00	0,00
JEFERSON SANTOS DE JESUS	163,78		149.03088,27-4		22/09/2022	01			117,92	07170
1.310,22			0,00		99,73				0,00	0,00
JEFERSON XAVIER FALCAO	155,37		149.71075,27-1		05/10/2022	01			111,86	07170
1.242,98			0,00		93,68				0,00	0,00
JONATAS SENA DOS SANTOS	207,16		156.78852,12-8		08/09/2022	01			116,01	07170
1.242,98			0,00		93,68				0,00	0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	207,16		161.88428,27-1		13/09/2022	01			116,01	07170
1.242,98			0,00		93,68				0,00	0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	344,91		125.33459,18-8		25/08/2022	01			193,15	07823
2.069,43			0,00		168,06				0,00	0,00
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	207,16		164.62429,26-8		08/09/2022	01			116,01	07170
1.242,98			0,00		93,68				0,00	0,00
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	263,10		201.28812,31-6		22/09/2022	01			189,42	07152
2.104,77			0,00		171,24				0,00	0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	350,80		126.17799,06-0		08/09/2022	01			196,45	07152
2.104,77			0,00		171,24				0,00	0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	103,58		206.81087,27-1		16/11/2022	01			58,00	07170
621,49			0,00		46,61				0,00	0,00
MANOEL REIS DOS SANTOS	175,40		114.35968,94-2		16/11/2022	01			98,23	07152
1.052,39			0,00		78,92				0,00	0,00
MARCELO FERREIRA DA PAZ	207,16		129.64314,44-8		08/09/2022	01			116,02	07170
1.242,98			0,00		93,68				0,00	0,00
MARCIO PIRES XAVIER	350,80		165.05257,76-5		14/09/2022	01			196,44	07152
2.104,77			0,00		171,24				0,00	0,00
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	155,37		203.40989,89-5		22/09/2022	01			111,86	07152
1.242,98			0,00		93,68				0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI COD GPS: 2119 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA		940,71			165.03288.13-2		18/08/2020	01			225,77	04110
	1.881,42				0,00		151,14					0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA		155,37			166.31153.86-8		22/09/2022	01			111,86	07170
	1.242,98				0,00		93,68					0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES		163,78			124.29967.98-9		26/09/2022	01			117,93	07170
	1.310,22				0,00		99,73					0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS		207,16			200.22590.25-5		12/09/2022	01			116,01	07170
	1.242,98				0,00		93,68					0,00
VANEZIO CONCEIÇÃO FREITAS		207,16			124.19499.96-6		12/09/2022	01			116,02	07170
	1.242,98				0,00		93,68					0,00
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS		350,80			128.87251.08-4		08/09/2022	01			196,45	07152
	2.104,77				0,00		171,24					0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS		207,16			139.23081.81-1		08/09/2022	01			116,02	07170
	1.242,98				0,00		93,68					0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0008/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI										
EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI										
COMP: 11/2022										
COD REC: 150										
COD GPS: 2119										
EPAS: 507										
OUTRAS ENT: 0079										
SIMPLES: 1										
RAT: 3,0										
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98										
FAP: 1,00										
RAT AJUSTADO: 3,00										
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98										
EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI										
COMP: 11/2022										
COD REC: 150										
COD GPS: 2119										
EPAS: 507										
OUTRAS ENT: 0079										
SIMPLES: 1										
RAT: 3,0										
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98										
FAP: 1,00										
RAT AJUSTADO: 3,00										
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98										




RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: Gfedhvhhrxv0000-3
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81



EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: Gfedhvhbxv0000-3
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.723,97
 SALÁRIO FAMILIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00


COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	33 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:	0




RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC:150 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0028179
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM
 BASE CÂL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	161.09316,11-4	0,00	11/08/2022	01			0,00	07152	
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	599,81	142.27586,27-1	0,00	11/08/2022	01			0,00	07102	
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	165.87470,26-3	0,00	11/08/2022	01			0,00	07152	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.088,63 1.476,79 0,00 596,96 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: NAJ9dWFE8z810000-8
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 CIDADE: SALVADOR

N° ARQUIVO: FVUJQSEH7IM0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0028179
 CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTALS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: NAJ9dMFBz810000-8
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00


COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPs: 2119

Nº DE CONTROLE: EF3xZENUHaw0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: FyUJQSEh7IM0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR


UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	74	92.582,18	25.166,06	92.582,18	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	75	93.794,18	25.166,06	93.794,18	12.168,81



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: EF3*ZENJHAW0000-7 Nº ARQUIVO: FYUJ0SEh71M0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400


MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 57.791,15
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 11.871,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 7.088,63
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.476,79
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
5.572,99 0,00 0,00 0,00 5.572,99



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3XZENJHAW00000-7 N° ARQUIVO: FVJ05EH71M0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES TELEFONE: 0071 9878 5510 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 CEP: 41820-021 CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.320,93
 SALARIO FAMILIA: 6.075,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALARIO MATERNICIDADE: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	33 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0	0	0	0	0

