



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1072 Data do Sub-Empenho: 13/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 26/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM FUNDA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022RDC, CONTRATO Nº269-2022. BM 3. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 455.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	64.662,71	36.623,21	28.039,50

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 13/05/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.417,13
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	439,48
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.098,70
## Trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos ##		Valor Retido 3.955,31
		Valor Líquido 32.667,90

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/05/2024	455	U			36.623,21

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	36.623,21

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/05/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/05/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 20/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021  
SIAFIC.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 10/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – VARGEM FUNDA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 088/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 455 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 36.623,21 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2024 a 30/04/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO  
JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

455

Data e hora de Emissão:

09/05/2024 10:29:44

Código de Verificação:

bb97ba2f40



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 33957361000180  
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 13/05/2024	<i>[Assinatura]</i> Assinatura

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

*[Assinatura]*  
Franklin de J. Seña  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 3BM: 01/04/2024 Á 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.623,21

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 14.649,28

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 21.973,93

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$36.623,21**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>14.649,28</b>	Base de cálculo (R\$): <b>21.973,93</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.098,70</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>2.417,13</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>439,47</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>32.667,91</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 05/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfse.com.br/riachadojacuipe>





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395801		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
21.973,92	5,000	1.098,70		1.098,70		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 13/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 10:46:29	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 455 - DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.098,70		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.098,70		

Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8175000010 . 1      98703906202 . 9      40610010500 . 5      00039580112 . 9

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000010 . 1      98703906202 . 9      40610010500 . 5      00039580112 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395801	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 13/05/2024 10:46:29	DATA VENCIMENTO: 10/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.098,70
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.098,70





I.R.R.F

Nº DAM: 395809	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889						
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA					NUMERO: 133			
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA				
<b>DOCUMENTOS</b>								
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80					
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>								
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F							
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>								
Base Cálculo: 439,48	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 439,48	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 439,48			
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>								
DATA LANÇAMENTO: 13/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 11:04:40	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024				
Composição do Imposto/Lançamentos			  					
Valor do Tributo:	439,48	Vlr. Devido sem Desconto (VD):				439,48	(=) VALOR DEVIDO - R\$	439,48
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:				0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo:	439,48	Vlr. Devido com Desconto				439,48	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:								
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+ ) MULTA DE MORA - R\$					
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+ ) JUROS DE MORA - R\$					
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$					
4) NF-E Nº 455 - Data de emissão: 09/05/2024.			439,48					

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000004 . 2      39483906202 . 0      40531010100 . 2      00039580907 . 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000004 . 2      39483906202 . 0      40531010100 . 2      00039580907 . 2

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395809	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 11:04:40	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	439,48
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	439,48





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 3ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$	36.623,21
	OS: 089/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	269/2022		

PERÍODO:	01/04/2024 A 30/04/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE VARGEM FUNDA													
Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Vargem funda, município de santaluz-ba					302.839,39		36.623,21		97.972,42		204.866,97	68%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,84	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	126,82	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Redê DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00		0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15		0,00		0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		910,14		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,89	2.427,04	6	910,14	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		2.858,63		7.001,52		0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,56	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05	23,88	2.858,63	52,61	6.300,05	0,00	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		3.138,33		13.710,39		1.047,11	7%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,80	5.873,36	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33	0,95	3.138,33	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052098919-7




1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIRA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69			0,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0%
1.5.3	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12			0,00	0,00	0,00	5,30	1.047,12	100%
1.6	<b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>					<b>48.535,71</b>			<b>24.917,58</b>		<b>41.467,99</b>		<b>7.067,72</b>	<b>15%</b>
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	369,62	50,56	62,46	23.086,47								
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	614,34	4,30	5,31	3.262,15	132	8.244,72	346,63	21.650,51	22,99	1.435,96	6%	
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	614,34	25,06	30,95	19.013,82	289,7	1.538,31	578,82	3.073,53	36,52	188,61	6%	
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	469	15.134,55	541,00	16.743,95	73,34	2.269,87	12%	
1.7	<b>COBERTURA</b>					<b>54.865,01</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>54.865,01</b>	<b>100%</b>
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	98,8	246,29	304,26	30.000,04			0,00	0,00	0,00	98,60	30.000,04	100%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	98,8	60,72	75,01	7.395,99			0,00	0,00	0,00	98,60	7.395,99	100%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	202,86	250,81	2.756,71			0,00	0,00	0,00	11,00	2.756,71	100%
1.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7	71,20	87,96	615,72			0,00	0,00	0,00	7,00	615,72	100%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08			0,00	0,00	0,00	4,00	228,08	100%
1.7.6	Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92			0,00	0,00	0,00	91,37	9.518,92	100%
1.7.7	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60			0,00	0,00	0,00	29,74	1.520,60	100%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.289,92	2.828,96	2.828,96			0,00	0,00	0,00	1,00	2.828,96	100%
1.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>8.693,13</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8.693,13</b>	<b>100%</b>
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	510,83	631,07	631,07			0,00	0,00	0,00	1,00	631,07	100%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	138,27	170,81	170,81			0,00	0,00	0,00	1,00	170,81	100%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20			0,00	0,00	0,00	4,00	56,20	100%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66			0,00	0,00	0,00	3,00	48,66	100%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22			0,00	0,00	0,00	1,00	16,22	100%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19			0,00	0,00	0,00	366,90	1.871,19	100%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16			0,00	0,00	0,00	112,00	580,16	100%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48			0,00	0,00	0,00	51,00	432,48	100%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	98,91	7,43	8,96	798,67			0,00	0,00	0,00	98,91	798,67	100%
1.8.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55			0,00	0,00	0,00	5,00	227,55	100%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48			0,00	0,00	0,00	4,00	115,48	100%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32			0,00	0,00	0,00	2,00	124,32	100%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56			0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50			0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44			0,00	0,00	0,00	4,00	192,44	100%
1.8.15	Luminária sobrep quadrada Led 24W*, 8500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60			0,00	0,00	0,00	20,00	2.419,61	100%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v Classe II	un	2	77,95	96,29	192,58			0,00	0,00	0,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64			0,00	0,00	0,00	1,00	259,64	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



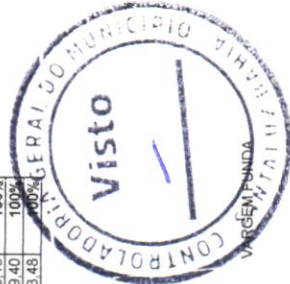

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA 05188855-7

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1.9	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				6.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,24	100%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1	289,72	289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	289,72	100%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	4,00	312,40	1.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,52	100%
1.9.2	TUBO PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	97,45	27,82	2.691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,56	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	17	9,03	189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	189,55	100%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1%) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	2	39,88	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	100%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	2	90,11	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	222,84	100%
1.9.7	TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	100%
1.10	<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>				15.280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,44	100%
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	3.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,48	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,51	570,12	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	965,67	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigas duplas para piso, interior 38cm, h=12cm, enclenchimento em bloco cerâmico h=6cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10,24	192,95	2.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,90	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.296,33	7.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,19	100%
1.11	<b>ESGOTO</b>				6.642,59	1.275,49	1.275,49	0,00	0,00	5.367,10	81%
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,49	81%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	77%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	67%
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,94	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	883,44	0%
1.11.7	FILTRO AMERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES), AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	900,10	100%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,92	100%
1.12	<b>INSTALAÇÕES METAS E ACESSÓRIOS</b>				10.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,53	100%
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	4	269,57	1.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,08	100%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	86,13	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	100%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	481,23	100%
1.12.4	Pis de cozinha com bancada em aço inox dn1 140x0,80, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1	876,18	1.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,43	100%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4	108,56	541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	541,40	100%
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	8	158,04	1.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,84	100%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_01/2021	UN	2	249,39	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	616,18	100%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	20	91,04	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,40	100%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	723,48	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 05188855-7



1.17	<b>PINTURA</b>						17.865,52		0,00		0,00		17.865,52	100%
1.17.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29		2.075,80		0,00	0,00	0,00	483,87	2.075,80	100%
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18		6.861,27		0,00	0,00	0,00	483,87	6.861,27	100%
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87		8.646,75		0,00	0,00	0,00	483,87	8.646,75	100%
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39		281,70		0,00	0,00	0,00	11,55	281,70	100%
1.18	<b>PAISAGISMO</b>						862,23		0,00	0,00	0,00		862,23	100%
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,57	84,72	104,66		59,65		0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	100%
1.18.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13		552,78		0,00	0,00	0,00			
1.18.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90		49,80		0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
1.19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						2.506,63		0,00	0,00	0,00		2.506,63	100%
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71		349,37		0,00	0,00	0,00	128,92	349,37	100%
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,80 x 0,80 m	un	1	1.746,21	2.157,26		2.157,26		0,00	0,00	0,00	1,00	2.157,26	100%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA  
302.839,39

TOTAL DO PERÍODO  
36.623,21

TOTAL ACUMULADO  
97.972,42

SALDO  
204.866,97

Franklin de S. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão N°: 00000019

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

EMITIDA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 23/06/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: gLgPFXm7

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241733768**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>33.957.361/0001-80</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

