



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 819 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3039 Data do Sub-Empenho: 05/09/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 78377-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data do Empenho: 05/09/2023
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 015-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	308.898,51	58.142,04	250.756,47
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, NFS-e.36.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	58.142,04	58.142,04	0,00

Data do Empenho: 05/09/2023 Data do Liquidação: 05/09/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	3.837,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.744,26
## Cinquenta e dois mil e quinhentos e sessenta reais e quarenta e um centavos ##		5.581,63
		Valor Retido
		Valor Líquido
		52.560,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/08/2023	36	UNIC			58.142,04

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	58.142,04

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/09/2023.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/09/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p> <p style="text-align: right;">3240086</p>
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 05/09/2023

Carlos Antônio da Silva Filho

Controlador Interno
Decreto 004/2021

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000036

Data e Hora de Emissão:
29/08/2023 20:08:26

Código de Verificação:
LEEL-TQSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

23.694.541/0001-62

Nome/Razão Social:

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Endereço:

Ala Salvador 001057, ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP:

41020-790 - BA

Inscrição Municipal:

547.986/001-66



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ:

13.807.870/0001-19

Endereço:

PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Comuns de Engenharia, Continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santaluz.

Nº DA OBRA: 080/2023- BM 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/08/2023 a 28/08/2023

VALOR TOTAL: 58.142,04

VL MÃO DE OBRA 60%: 34.885,22

VALOR DE MATERIAL 40%: 23.256,82

BC DE INSS 60%: 34.885,22 x 11%: 3.837,37

BC DE ISS 60%: 34.885,22 x 5,00%: 1.744,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$58.142,04

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
23.256,82	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
3.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,26	52.560,41

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 05/09/23

Assinatura

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 362871	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 34.885,21	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.744,26	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.744,26	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 30/09/2023	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 06/09/2023 09:13:41	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 036 - DATA DE EMISSÃO: 29/08/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.744,26	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.744,26	



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8174000017 . 7

44263906202 . 9

30930010500 . 9

00036287112 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000017 . 7

44263906202 . 9

30930010500 . 9

00036287112 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 362871	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 06/09/2023 09:13:41	DATA VENCIMENTO: 30/09/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.744,26
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.744,26



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME
Endereço: AL SALVADOR 1057 S/1303 SHOP BUSINES / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/08/2023 a 08/09/2023

Certificação Número: 2023081018385141961217

Informação obtida em 24/08/2023 15:00:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:13 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **CBB2.E4F8.C2E4.C595**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Endereço: ALAMEDA SALVADOR Nº 001057 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820790 - EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINESS
TORRE EUROPA SALA 1303

Número da Certidão: 230766

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:14:28 horas do dia 01/08/2023.
Válida até dia 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **0876.375B.5E67.8762.A244.9214.D303.2E2F**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234388530

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.


Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/08/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão n°: 38427000/2023

Expedição: 01/08/2023, às 10:21:05

Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00221381E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Endereço: EDF SALVADOR SHOPPING BUSINESS, TORRE EUROPA SALA 1303

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



Salvador, terça-feira, 1 de agosto de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA - LIMEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
Nº DO CONTRATO: 135-2023
Nº DA OBRA: 089/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	03/08/2023 a 28/08/2023
OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTÍNUOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGEM DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA:	GLOBAL MATERIAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
CNPJ:	23.894.541/0001-82
MEDIÇÃO 01:	R\$ 88.142,04

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BOI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MES		1.349,57	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M		32,75	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	146,34	163,35	23.904,64	146,34	R\$ 23.904,63	146,34	23.904,63	R\$ 0,01	0%
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3	3,74	269,26	1.007,03	3,74	R\$ 1.007,03	3,74	1.007,03	R\$ 0,00	0%
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		162,42	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		46,29	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		45,48	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		18,53	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	146,34	11,95	1.748,76	146,34	R\$ 1.748,76	146,34	1.748,76	R\$ 0,00	0%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		4,62	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 1				26.660,43		26.660,42		26.660,42	0,01	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	1.321,28	1,60	2.114,05	1.321,28	R\$ 2.114,04	1.321,28	2.114,04	R\$ 0,01	0%
			Sub-total 2				2.114,05		2.114,04		2.114,04	0,01	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3		94,13	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTÉ PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3		7,51	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	198,19	112,56	22.308,27	198,19	R\$ 5.424,26	198,19	5.424,26	R\$ 16.884,01	76%
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		23,96	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XXM		0,83	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
3.6	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3		41,04	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 3				22.308,27		5.424,26		5.424,26	16.884,01	
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		72,90	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK - 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		100,19	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		65,54	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO 1-4 (1-5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		526,79	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
4.5	103322	SINAPI	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		4.096,48	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 4					0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		31,95	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 5					0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
6			MEIO FIO										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	124,67	51,39	6.406,79	124,67	R\$ 6.406,79	124,67	6.406,79	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	21,67	56,38	1.221,75	21,67	R\$ 1.221,75	21,67	1.221,75	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	378,27	43,13	16.314,79	378,27	R\$ 16.314,78	378,27	16.314,78	R\$ 0,01	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 110 MM (4") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	132,33	71,51	9.462,92	132,33	R\$ 9.462,92	132,33	9.462,92	R\$ 0,00	0%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X,30X,3 M. AF_12/2020	UND	10,00	213,96	2.139,60	10,00	R\$ 2.139,60	10,00	2.139,60	R\$ 2.139,60	100%
			Sub-total 6				35.545,85		23.943,32		23.943,32	11.602,53	100%
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO										

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	25,90	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,85	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 25MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,03	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,64	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	11,80	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,71	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,01	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	22,38	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,44	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,91	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	14,88	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.47	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	26,40	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.48	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	17,96	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,32	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,49	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	72,79	-	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
Sub-total 9								0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
9	PARQUE INFANTIL												
9.1	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	1,00	6.738,46	6.738,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.738,46	100%
9.2	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.999,72	2.999,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.999,72	100%
9.3	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.332,78	2.332,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.332,78	100%
9.4	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.196,74	2.196,74	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.196,74	100%
9.5	CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	52,43	356,48	18.690,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18.690,25	100%
9.6	CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2 X 2,1/2"	UNID	1,00	524,82	524,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 524,82	100%
Sub-total 10								0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 33.482,77	100%
10	PERGOLADO												
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PC	4,00	598,00	2.392,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.392,00	100%
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PC	5,00	283,47	1.417,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.417,35	100%
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PC	11,00	83,16	914,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 914,76	100%
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (refobra Sergipepec)	M	14,42	37,49	540,61	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 540,61	100%
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (refobra Sergipepec)	M	42,90	18,78	805,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 805,66	100%
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FÚNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	44,79	20,64	924,47	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 924,47	100%
Sub-total 11								0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.994,84	100%
11	ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO												
11.1	11115	ORSE	Forneimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	-	76,52	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
11.2	9603	ORSE	Forneimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	-	170,00	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	-	231,71	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
Sub-total 12								0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
12	PAISAGISMO												
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, forneimento e plantio	M2	133,95	24,32	3.257,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.257,66	100%
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	164,74	118,92	19.590,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 19.590,88	100%
12.3	CPU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LXCH)	UNID	4,00	441,43	1.765,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.765,72	100%
12.4	CPU PRÓPRIA	Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50M)	UNID	10,00	1.032,05	10.320,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.320,50	100%
12.5	CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (forneimento e plantio)	UND	5,00	1.262,12	6.310,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.310,60	100%
Sub-total 13								0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 41.245,36	100%
13	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA												
13.1	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	1	1.101,55	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
13.2	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H=1,30)M	UNID	1,00	1.232,24	1.232,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.232,24	100%
13.3	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID	1,00	1.703,51	1.703,51	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.703,51	100%
13.4	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	1,00	2.786,87	2.786,87	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.786,87	100%
13.5	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	1,00	2.821,81	2.821,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.821,81	100%
13.6	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	1,00	2.727,51	2.727,51	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.727,51	100%
13.7	CPU PRÓPRIA	Forneimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID	1,00	7.213,70	7.213,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.213,70	100%
Sub-total 14								0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 18.485,64	100%
14	QUADRA POLIESPORTIVA												
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLIOLADA E=10CM	M2	30,74	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	2,87	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	35,48	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	84,23	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.5	97214	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	0,51	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2017	M2	42,10	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	280,74	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.8	10059	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	6.466,86	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	8.176,76	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	388,45	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND	886,43	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	12,48	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1	16,20	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	175,38	21,45	3.761,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.761,90	100%	
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	4,82	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 15							3.761,90				R\$ 0,00	0%	
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	1,00	48,05	48,05	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 48,05	100%	
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	-	58,94	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	9,83	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM², 1KV/90°C	M	444,66	27,75	12.339,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM², 1KV/90°C	M	-	55,13	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 12.339,32	100%	
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	-	339,06	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	10,00	65,86	658,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	1,00	26,33	26,33	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 658,60	100%	
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30W; SÍMUL. SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INI, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%. V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W, GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	20,00	705,73	14.114,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 26,33	100%	
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID	-	115,37	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 14.114,60	100%	
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	-	28,43	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	-	4,87	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID	1,00	2.796,75	2.796,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	85,13	85,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.796,75	100%	
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCAUPTO TRATADO, H=6M, DUAS PÉTALAS	UNID	10,00	2.123,77	21.237,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 85,13	100%	
Sub-total 16							51.306,48				R\$ 21.237,70	100%	
16			LIMPEZA E EXPURGO										
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.321,28	4,76	6.289,29	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	-	57,86	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 6.289,29	100%	
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	-	123,08	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,86	16,67	831,17	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	1.495,80	0,83	1.241,51	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 831,17	100%	
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO x0096 - RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	-	24,27	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.241,51	100%	
Sub-total 17							8.361,97				R\$ 0,00	0%	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	120,65	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
17.2	90776	SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	40,53	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	30,71	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 18							-				R\$ 0,00	0%	
TOTAL GERAL							388.254,69		58.142,04		58.142,04	330.112,65	85%

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA – Limeira, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 01 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

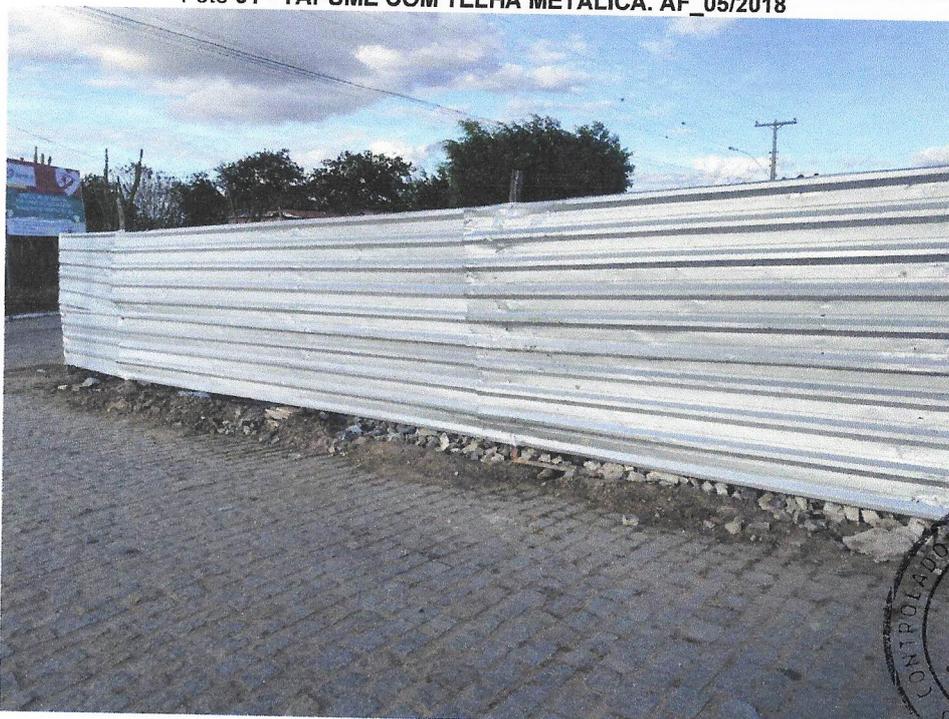


Foto 02 – TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 03- TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018



Foto 04 – TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 05- Demolição de concreto manualmente

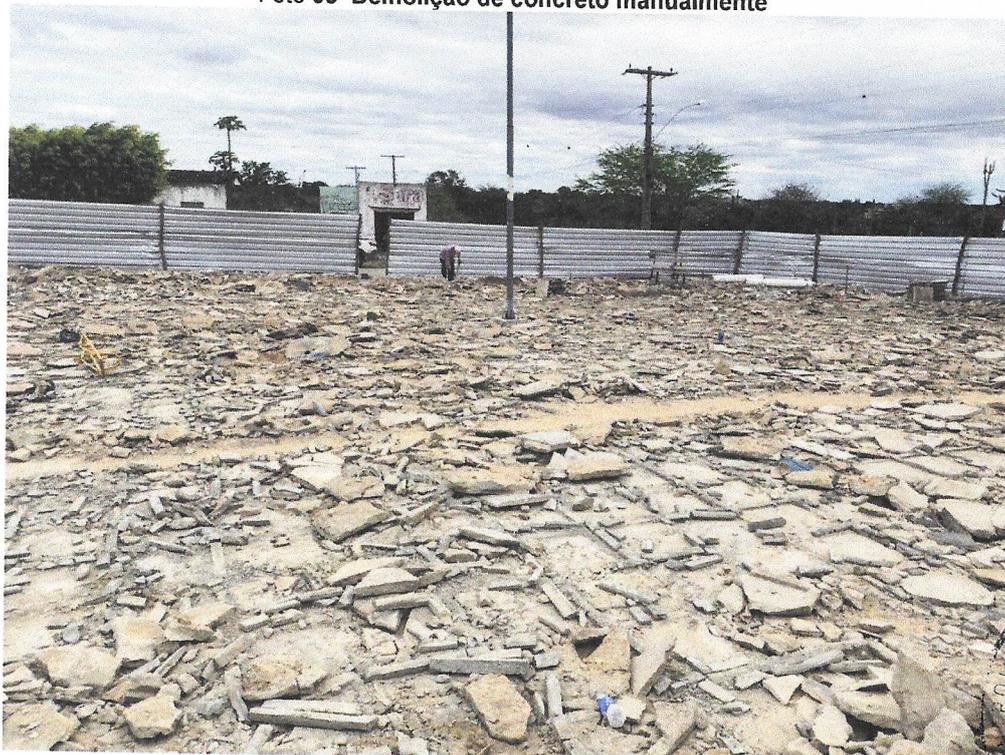


Foto 06- Demolição de concreto manualmente

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 07- RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA



Foto 08 - RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira

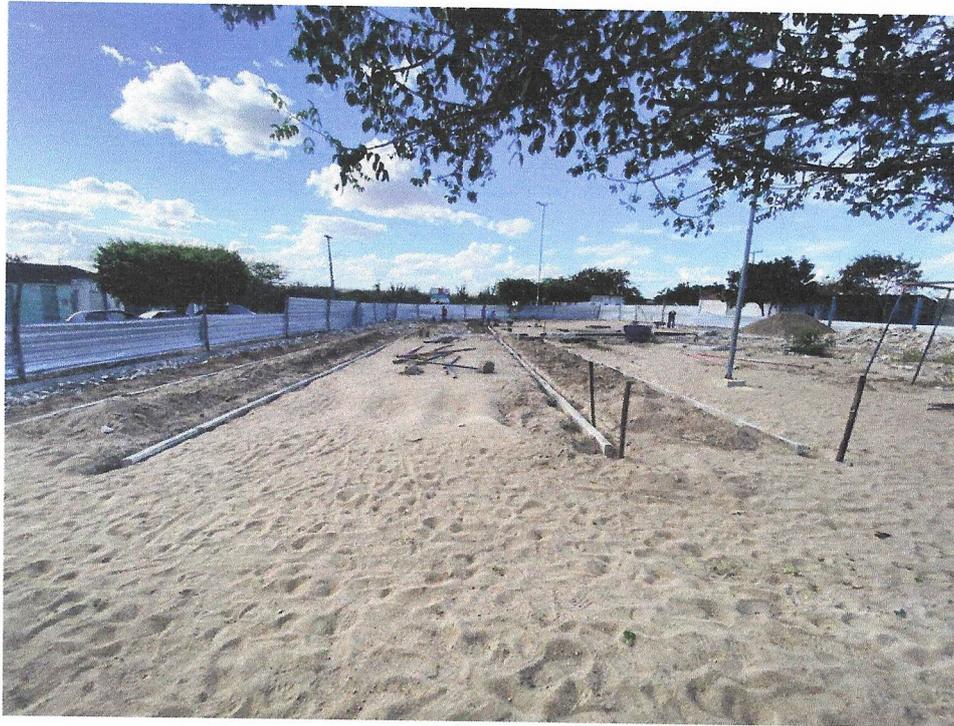


Foto 09 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO

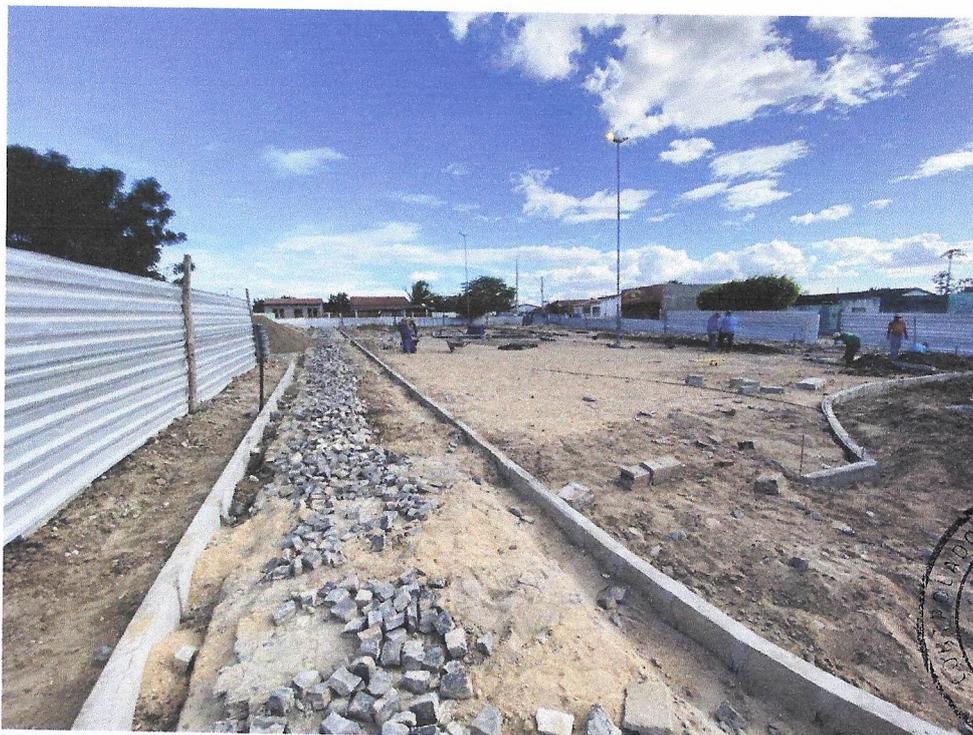


Foto 10 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 11 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P



Foto 12 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Irino de Matos Santos
Engenheiro Civil
REA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 13 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

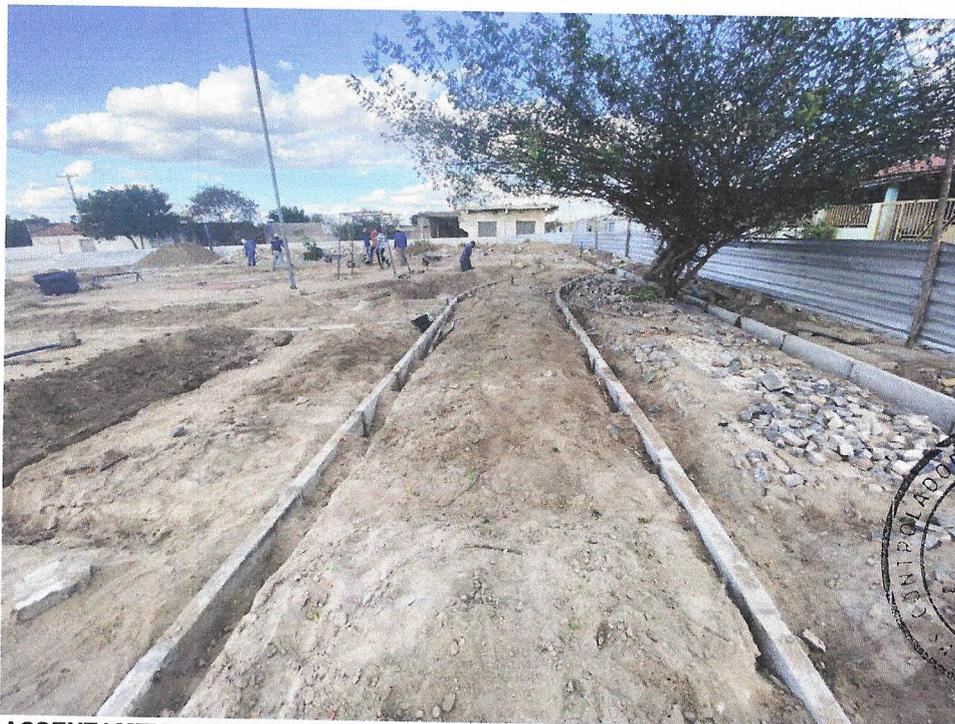


Foto 14 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutenção LTDA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/08/2023 20:11:33.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DXrVDoJsOYo00000.SFP é:

c185792a-a91b-4007-abc0-afc191f7a03c

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 07/2023

NRA: DXrVDoJsOYo00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	21035119677 / eSocial 55485500 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 420,32	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.013,16	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.433,48	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irreatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/08/2023 19:17:42
Nº do recibo de entrega	0000050000154826930
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	23.694.541/0001-62



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	07/2023	Número do Recibo	50000154826930
Data/Hora da Transmissão	10/08/2023 19:17:42	Identificação da Apuração de Débitos	21035119677 / eSocial 55485500 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída		
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000152389058		
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo		
Ausência de Fatos Geradores	Não		

Endereço

Logradouro	SALVADOR	Número	001057
Complemento	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINESS	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	Salvador	UF	BA
CEP	41820790	Telefone	7133795599
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-		
UF	-		
Correio Eletrônico	-		
		CRC	-
		Telefone	-

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	200,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 200,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	220,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 220,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	533,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 533,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	400,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 400,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	79,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,97		
Saldo a Pagar	0,00		



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
SIMPLES: 1



	FGTS - 8%
QTD DE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	2.665,96
DEPÓSITO	213,27
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	213,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 02/08/2023
 HORA: 10:09:30
 PÁG: 002/003



COMPETÊNCIA: 07/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	REMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO			TOTAL	
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA	GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA	0,00	23.694,541/0001-62	0,00	0000	2100	507
423,56	1.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,72	0,00

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - CNPJ 23.694.541/0001-62
 Período de Apuração: 07/2023
 Categoria: Geral



DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
Total Apurado Empresa 23.694.541/0001-62		1.433,48	1.433,48	0,00	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		420,32	420,32	0,00	
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2023	200,32	200,32	0,00	
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2023	220,00	220,00	0,00	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		1.013,16	1.013,16	0,00	
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2023	533,19	533,19	0,00	
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2023	400,00	400,00	0,00	
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2023	79,97	79,97	0,00	



Créditos Vinculáveis

Disponível Vinculado

Resumo da Situação

Retenção Lei
9.711/98:

4.401,40

1.433,48

Total de débitos
apuradosTotal de créditos
vinculados


Saldo a pagar



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000020 132701802302 807679180824 36944700015

DATA: 02/08/2023
HORA: 20:09:30
PÁG : 001/002



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: DXRVD0JS0Y00000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 07/2023 N° CONTROLE: JCC7yc3pXZA0000-1
TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: DUHLR6DRJL00000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 CEP 41820790 UF BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.665,96
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.665,96
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 213,27
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.665,96
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 423,56
VAL DEVIDO PREV SOC 1.436,72

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.665,96
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 213,27
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00


TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000020 132701802302 807679180824 369454100045

DATA: 02/08/2022
HORA: 20:59:30
PÁG : 0002 0002



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: DX*VDOJ50Y000000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 07/2023 N° CONTROLE: JCC7Yc3pXZa00000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 4.665,96	REM SEM 13° SALÁRIO 2.665,96
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 423,56	DEPÓSITO 213,27
VAL DEVIDO PREV SOC 1.436,72	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3	TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL A RECOLHER 213,27

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GF1P - SEF1P 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEF1P
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 132701802302 807679180824 369454100015



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RÁT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 COMP: 07/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 1.00 RÁT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

EMPRESA	RECEITA	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	2.000,00	129.37258.04-4	0,00	01/05/2023	11			0,00	01414	
									0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 423,56 213,27 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 132701802302 807679180824 369454100015



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 07/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAR: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: DUHLR6DRJL00000-3 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNPJ PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNPJ: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.665,96	0,00	2.665,96	0,00
11	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	3	4.665,96	0,00	4.665,96	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

DATA: 02/08/2023
 HORA: 12:09:30
 PÁG.: 084/0007



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 COMP: 07/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: DUHLR6DRJL00000-3
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.436.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 423.56
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	R2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0								

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000020 132701802302 807679180824 369454100015

DATA: 23/08/2023
HORA: 20:09:30
PÁG: 005/19997



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENÇÃO LTDA N° DE CONTROLE: JCC7yc3pXXa00000-1 N° ARQUIVO: DXrVDOJSOY00000-0
COMP: 07/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: UFM: BA CEP: 41820-790 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	2	2.665,96	0,00	2.665,96	0,00
11	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	3	4.665,96	0,00	4.665,96	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600000020 132701802302 807679180824 369454100015

DATA: 23/08/2023
HORA: 20:09:30
PÁG: 0005/0007



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 07/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JCC7yc3pXZA00000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1

RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: DXrVDOJSOYc00000-0
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 2.665,96
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/08/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
213,27	0,00	0,00	0,00	213,27

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2023
HORA: 09:05:30
PÁG: 0907/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENÇÃO LTDA N° DE CONTROLE: JCC7yc3pXza00000-1
COMP: 07/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DXrVDOJSOY00000-0
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.436.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 423.56
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0								



Prefeitura Municipal de Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Cadastro

Emissão 01/06/2023

Page 1 of 2

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 547.986/001-66
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Nome Fantasia: GRUPO GLOBAL

Inscrição Estadual:

CNPJ: 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Alameda Salvador

Número: 001057

Edifício:

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORE

Complemento: ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA,S:130

CEP: 41.820.790

Telefone: 7133795599

Fax:

Correio Eletrônico: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM

Referência: AO LADO DO SALVADOR SHOPPING

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2045660

Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 18/11/2015

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	20/07/2020
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	20/07/2020
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	20/07/2020
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	20/07/2020
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	20/07/2020
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	20/07/2020
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	20/07/2020
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	20/07/2020
Obras de montagem industrial	4292-8/02	20/07/2020
Obras de terraplenagem	4313-4/00	20/07/2020
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	20/07/2020
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	20/07/2020
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	20/07/2020
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	4399-1/02	20/07/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	20/07/2020
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	20/07/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	20/07/2020
Coleta de resíduos perigosos	3812-2/00	10/06/2022
Atividades paisagísticas	8130-3/00	10/06/2022
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	10/06/2022





Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 547.986/001-66
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Nome Fantasia: GRUPO GLOBAL Inscrição Estadual:

CNPJ: 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Alameda Salvador Número: 001057
Edifício: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORE
Complemento: ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA;S:130 CEP: 41.820.790
Telefone: 7133795599 Fax:
Correio Eletrônico: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM
Referência: AO LADO DO SALVADOR SHOPPING

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2045660 Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 18/11/2015

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	10/06/2022
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	10/06/2022

OBSERVAÇÕES





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

NOME FANTASIA: GRUPO GLOBAL

CNPJ: 23.694.541/0001-62

CGA: 547.986/001-66

ENDEREÇO: Alameda Salvador, 001057 - ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE
EUROPA,S:1303 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção, de edifícios	4120-4/00	20/07/2020
Construção, de rodovias e ferrovias	4211-1/01	20/07/2020
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	20/07/2020
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	20/07/2020
Construção, de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	20/07/2020
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	20/07/2020
Construção, de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	20/07/2020
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	20/07/2020
Obras de montagem industrial	4292-8/02	20/07/2020
Obras de terraplenagem	4313-4/00	20/07/2020
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	20/07/2020
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	20/07/2020
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	20/07/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 18/11/2015

DATA DE IMPRESSÃO: 01/06/2023

CÓDIGO DE CONTROLE: 6A5B0A98E7922EC4A1314B891C663DFA

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 1		CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva p/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
RETIRADA DE MEIO-FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA		Gerente de obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Caleteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO				
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/09/2023		Data: 03/09/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAGAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ,		S	T	Q	Q	X	S	D
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 2				
Condições Climáticas:	Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()			
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL						
RETIRADA DE MEIO-FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO		CATEGORIA		QTDE				
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente da obra		1				
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar da topografia						
		Pedreiro		1				
		Ajudante Geral		6				
		Calceoleiro		1				
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Múnck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/09/2023		Data: 04/09/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 3		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
		Gerente da Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA:						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA:						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA: Hh ACUMULADO						
		OBSERVAÇÕES						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Gaminhão Munch Gaminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/08/2023		Data: 05/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		\$	T	Q	Q	S	S	X
CONTRATO N° 195-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 4		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE			
SEM SERVIÇO SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral		MAO DE OBRA INDIRETA				
		Hh DO DIA		MAO DE OBRA DIRETA				
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Plataforma Vibratória		QTDE				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/08/2023		Data: 06/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 5		CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva p/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1						
RETIRADA DE MEIO-FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
Pedreiro 1								
Ajudante Geral 6								
Calceteiro 1								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de cagaamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE.						
GERENTE DE OBRA:		Veículo Leve						
Data: 07/08/2023		Caminhão Munck						
FISCALIZAÇÃO:		Caminhão Toco						
Data: 07/08/2023		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Cagaamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	T	Q	Q	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 193-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 6		CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva p/ cond. Trab.		QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA DE MEIO-FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS		Gerente de obra						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 1						
		Ajudante Geral 6						
		Calceteiro 1						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
OBSERVAÇÕES		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		Pc 200						
		Placa Vibratória						
		GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				
Data: 08/08/2023		Data: 08/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 7		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente da obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA DE MEIO-FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS		Hh DO DIA:						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar da topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA:						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA: Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/08/2023		Data: 09/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	T	Q	X	S	S	D
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ,		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 8		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA						
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS		MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 5 Calçateiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
OBSERVAÇÕES		Hh DO DIA						
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE.						
GERENTE DE OBRA:		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
Data: 10/08/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 10/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 9		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva p/ cond. Trab.		Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS		Hh DO DIA:						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES:		Topógrafo Auxiliar de topografia 1 Pedreiro 6 Calceiteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA:						
OBSERVAÇÕES:		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Plataforma Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/08/2023		Data: 11/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		\$	T	Q	Q	S	S	X
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 11				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Merck Caminhão Teco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/08/2023		Data: 13/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S	K	T	Q	Q	S	S	D
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 12		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva pf cond. Trab.		Gerente da Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm. Mestre da obra Encarregado geral 1							
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo Auxiliar da topografia 1 Pedreiro 5 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 14/08/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 14/08/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023				S T Q Q S S D						
				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 13		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE NISO-PIO ASSENTAMENTO DE NISO-PIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PÁ carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO E O DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 15/08/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 15/08/2023						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MúncK Caminhão Toco Escavadeira PÁ carregadeira Caçamba Patrol PG 200 Placa Vibratória						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREÇO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 14				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceiteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Mánck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/08/2023				Data: 16/08/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUAÇÃO DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 15				S	T	Q	Q	S	S	D		
				EFETIVO PESSOAL							QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA ASSENTAMENTO DE MINI GUIA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO				Gerente de Obra								
				Engenheiro							1	
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							1	
				Ajudante Geral							6	
				Calceiteiro							1	
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Múck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PG 280								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 17/08/2023				Data: 17/08/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 17				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (17)				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO FABRICAÇÃO DE MINI-GUIA				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia 1						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral 2						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão MúncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PG 200						
				Placa Vibratória						
				QTDE.						
GERENTE DE OBRA: Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/08/2023				Data: 19/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 18				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva q/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
FC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/08/2023				Data: 20/08/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUAÇÃO DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREÇO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 19			X							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA							
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA ASSENTAMENTO DE MINI GUIA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO RETIRADA DE ENTULHO			Gerente de Obra							
			Engenheiro 1							
			Téc. de Segurança							
			Aux Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral 1							
			Hh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro 1							
			Ajudante Geral 6							
			Calceteiro 1							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor							
			Serralheiro							
			Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO			QTDE.				
			Veículo Leve							
			Caminhão Múnck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/08/2023			Data: 21/08/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUAÇÃO DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREÇO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 20				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (20) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA ASSENTAMENTO DE MINI GUIA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO RETIRADA DE ENTULHO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro 1 Carpinteiro Operador de Mototerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/08/2023				Data: 22/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUAÇÃO DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 21				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA ASSENTAMENTO DE MINI GUIA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO RETIRADA DE ENTULHO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Padreiro						
				1						
				Ajudante Geral						
				6						
				Calcetelro						
				1						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Múnck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/08/2023				Data: 23/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 22		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		Engenheiro				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tac. de Segurança		1				
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE TABO-FIO LOCAÇÃO DE TODA OBRA FABRICAÇÃO DE MINI GUIA ASSENTAMENTO DE MINI GUIA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO RETIRADA DE ENTULHO		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		1				
		Ajudante Geral		6				
		Calceteiro		1				
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Múnck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/08/2023		Data: 24/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 24				EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra											
SEM SERVIÇO				Engenheiro											
				Téc. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
								MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topografo							
Auxiliar de topografia															
Pedreiro															
Ajudante Geral															
Calçateiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador/Elétrico															
Eltricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pa carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Manck											
				Caminhão Toço											
				Escavadeira											
				Pa carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/08/2023				Data: 25/08/2023											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051688958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 25						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA: MAO DE OBRA INDIRETA QTDE:						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Lave Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/08/2023				Data: 27/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutencao LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023				X S T Q Q S S D						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 26						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO FABRICAÇÃO DE MINI GUIA ASSENTAMENTO DE MINI GUIA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 6						
				Calceiteiro 1						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Múnick						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 700										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/08/2023				Data: 28/08/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE SANTALUZ** e a Empresa **EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO - CNPJ Nº 23.694.541/0001-62**

LANÇADO NO SIGA

CONTRATO Nº 135/2023

Pelo presente contrato de prestação de serviços na **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTALUZ**, Estado da Bahia, que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo CEP: 48.880-000, inscrito no CNPJ sob nº 13.807.870/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Arismário Barbosa Junior, doravante designado simplesmente de **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa **GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Alameda Salvador, nº 001057, Ed. Salvador Shopping Busines, Torre Europa, Sala 1303, Caminho das Árvores, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.694.541/0001-62, neste ato representada por, **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**, portador do RG 1308849877 e CPF 039.200.175-60, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestação de serviço, devidamente autorizado mediante **Pregão Eletrônico Edital nº 015/2022 e Processo Administrativo 149/2022**, Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa especializada, para os Serviços Comuns de Engenharia, Continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Canteiros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santaluz conforme planilha, especificações, recomendações técnicas e detalhes construtivos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal de Santaluz, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 03/07/2023 e encerramento em 02/07/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:


2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;


2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

EMPENHADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br




- 2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- 2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1. O valor da contratação é de R\$ 7.165.695,38 (sete milhões cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
- 3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida aprovação, de acordo com o art. 5º, § 3º, da lei 8.666/93.
 - 3.4.1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Fatura/Nota Fiscal cujo valor não ultrapasse o limite de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais).
- 3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Santaluz, inscrita no CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19, sediada na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, neste Município.
 - 3.5.1 - A Fatura / Nota Fiscal deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.
- 3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a título de antecipação do valor contratado mesmo que a requerimento do interessado.
- 3.7 - Na execução desse contrato, as despesas relativas a pessoal representam um total de 50% (cinquenta por cento), sendo 50% (cinquenta por cento) restantes relativos a gastos com insumos, impostos e diversos.
- 3.8 - Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:
 - 3.8.1 - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuição para os Programas de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
 - 3.8.2 - Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e,
 - 3.8.3 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação pertinente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 1.007
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1754 / 1700 / 1706

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

5.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

6. CLÁUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



- b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas
- d) efetuar o pagamento pela prestação de serviço do objeto do presente Contrato de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
- e) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação financeira, aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento.
- f) não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA;
- g) fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para com o FGTS.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha discriminativa;
- b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.
- c) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- d) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.
- e) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual de maneira correta, preferencialmente mediante transferência bancária na conta de titularidade do trabalhador;
- f) Instruir todos os seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas;
- g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- h) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrente de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta e não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso do parágrafo primeiro artigo 57 da Lei Federal Nº 8.666/93.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que

8.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

(Handwritten signature)

Página 4 de 6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



- 8.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 8.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 8.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou
- 8.1.5 cometer fraude fiscal.
- 8.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a CONTRATADA multa de até 2% (dois por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da Legislação específica;
- 8.3 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, conforme Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.
- 8.4 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento das multas aplicadas.
- 8.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.

9. CLÁUSULA NONA PRIMEIRA - RESCISÃO



- 9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
 - 9.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
 - 9.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
 - 9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 9.4.3. Indenizações e multas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

- 10.1. É vedado à CONTRATADA:
 - 10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
 - 10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES

- 11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, Decreto Federal 10.024 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.


13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz como único e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.


Santaluz - BA, 29 de junho de 2023.



MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
CONTRATANTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SANTALUZ - BA.
LUIZ SANTOS SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
CNPJ Nº 23.694.541/0001-62
REPRESENTANTE LEGAL: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
RG 1308849877 e CPF 039.200.175-60
CONTRATADA

