



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 154-2022

EMPENHO: 86 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 85 Data do Sub-Empenho: 25/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 25/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 003-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 106-2023	150.000,00	149.283,74	716,26
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME TOMADA DE PREÇO 003-2022, CONTRATO 106-2023. NFS-e.Nº 395, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 22/01/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
149.283,74	149.283,74	0,00

Data do Empenho: 25/01/2024

Data do Liquidação: 25/01/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708	9.852,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	1.791,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	4.478,51
## Cento e trinta e três mil e cento e sessenta e um reais e dez centavos ##		Valor Retido 16.122,64
		Valor Líquido 133.161,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	23/01/2024	395	U			149.283,74

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	149.283,74

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/01/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/01/2024, podendo efetuar o pagamento.

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22

3419594

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM / /

Carlos Antonio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO CNPJ: 14.043.269/0001-60 e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638</p>	<p>Número da nota: 395 Data e hora de Emissão: 23/01/2024 13:36:18 Código de Verificação: 2d88ffa8ae</p>
	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180 Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119 Inscrição Municipal: 00000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 23,01,24	Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. CONTRATO 106/2023.

PERÍODO 11BM: 01/01/2024 Á 22/01/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.283,74

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 59.713,50

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 89.570,24

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$149.283,74

CNAE:

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor total das deduções (R\$): 59.713,50	Base de cálculo (R\$): 89.570,24	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 4.478,51	Credito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor líquido (R\$):
9.852,73	0,00	0,00	1.791,40	0,00	0,00	133.161,10

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 01/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 23/01/24

Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



OBRA:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS	
LOCAL:	SANTALUZ - BA	CONTRATO N° 106-2023

MEDIÇÃO:	N° 11
VALOR DA MEDIÇÃO:	149.283,74

PERÍODO:	01/01/2024 À 22/01/2024
SERVIÇO:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO FIO E PINTURA DE GUIA DAS RUAS DE SANTALUZ-BA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
									Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1			ADMINISTRAÇÃO OBRA					279.437,40	28.226,00		142.547,56		136.889,84	49%	
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	84,06	106,63	211.127,40	200,00	21.326,00	1012,00	107.909,56	968,00	103.217,84	49%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	27,20	34,50	58.310,00	200,00	6.900,00	1004,00	34.638,00	976,00	33.672,00	49%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					186.231,56	0,00		0,00		186.231,56	100%	
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	15	367,38	466,02	6.990,30		0,00	0,00	0,00	15,00	6.990,30	100%
2.2	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	30	404,98	513,72	15.411,60		0,00	0,00	0,00	30,00	15.411,60	100%
2.3	5152	ORSE	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	202	13,27	16,83	3.399,66		0,00	0,00	0,00	202,00	3.399,66	100%
2.4	11874	ORSE	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo 1"½" 2", reuso 25 vezes	und	200	9,56	12,13	2.426,00		0,00	0,00	0,00	200,00	2.426,00	100%
2.5	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	13200	9,44	11,87	158.004,00		0,00	0,00	0,00	13200,00	158.004,00	100%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					170.132,82	0,00		0,00		170.132,82	100%	
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m³	299,84	2,37	3,01	802,82		0,00	0,00	0,00	299,84	802,82	100%
3.2	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1500	41,19	52,25	78.375,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	78.375,00	100%
3.3	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1500	47,75	60,57	90.855,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	90.855,00	100%
4			REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO					2.089.625,73	121.057,74		800.238,66		1.289.387,07	62%	
4.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	20498,5	69,41	88,05	1.804.892,93	1374,88	121.057,74		8579,20	11919,31	1.049.494,81	58%
4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3200	66,00	86,26	276.032,00		0,00	519,83	44.840,54	2680,17	231.191,46	84%
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.	M	160	42,87	54,38	8.700,80		0,00	0,00	0,00	160,00	8.700,80	100%
5			TRANSPORTES					266.739,89	0,00		0,00		266.739,89	100%	
5.1	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	M3XKM	61092,9	0,68	0,89	52.539,89		0,00	0,00	0,00	61092,90	52.539,89	100%
5.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
5.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
6			OUTROS SERVIÇOS					58.458,51	0,00		0,00		58.458,51	100%	
6.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8571	1,43	1,81	15.513,51		0,00	0,00	0,00	8571,00	15.513,51	100%
6.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	30000	0,40	0,51	15.300,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	15.300,00	100%
6.3	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	1500	14,53	18,43	27.845,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	27.845,00	100%

Total Geral	3.050.625,91	149.283,74	942.786,22	2.107.839,69
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 22 DE JANEIRO DE 2024

ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:0387688250
8

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 13:11:19 -03'00'


ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL - ENG. CIVIL - CREA/BA N° 051888554-2
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270145SP/BA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



memorial de calculo medidas da medição 11	largura	comprimento	total M²	Data
4ª Travessa Manoel Costa Homem	3,70	55,80	206,46	16/01/2024
Rua José Francisco dos Santos (trecho I)	3,00	54,00	162,00	16/01/2024
Rua José de Oliveira Mota (trecho I)	3,10	5,60	17,36	16/01/2024
Rua José de Oliveira Mota (trecho II)	3,10	2,70	8,37	16/01/2024
Rua Maria de Nazaré	1,90	15,70	29,83	16/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho I)	2,60	12,20	31,72	16/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho II)	1,50	25,50	38,25	16/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho III)	2,40	38,80	93,12	16/01/2024
Rua Neolina Santos Cunha	4,20	10,20	42,84	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho I)	2,30	5,20	11,96	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho II)	2,50	16,10	40,25	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho III)	2,90	17,50	50,75	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho IV)	3,30	21,30	70,29	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho V)	7,00	6,30	44,10	16/01/2024
Rua J.J. Seabra (trecho I)	2,50	23,40	58,50	16/01/2024
Rua J.J. Seabra (trecho II)	2,90	18,45	53,51	16/01/2024
Rua José Francisco dos Santos (trecho II)	2,50	19,70	49,25	22/01/2024
Rua José Francisco dos Santos (trecho III)	2,00	7,00	14,00	22/01/2024
Rua Pedro Sabino Lopes	2,30	33,80	77,74	22/01/2024
Av. Nova Esperança	3,40	4,30	14,62	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho I)	4,00	9,00	36,00	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho II)	3,00	19,10	57,30	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho III)	4,70	2,50	11,75	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho IV)	3,80	15,50	58,90	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho V)	2,00	15,20	30,40	22/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho IV)	2,70	24,30	65,61	22/01/2024
		TOTAL:	1.374,88	

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 22 DE JANEIRO DE 2024

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 13:11:54 -03'00'Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL - ENG.º CIVIL-CREA/BA Nº 05188854-2
CPF: 038.768.825-08
RG: 1399827014SSP/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Certidão N°: 00000018

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 11/12/2023 09:07:26 horário de Brasília

EMITIDA EM: 13/12/2023 17:38:32 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 10/03/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: nXB5b9Uk

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20240189258**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA

700006.5134/23-9 - Inicial/AG PAGTO OU DEF

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 09/01/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.957.361/0001-80
Certidão nº: 2233392/2024
Expedição: 09/01/2024, às 15:42:45
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2023 a 26/01/2024

Certificação Número: 2023122803043024496316

Informação obtida em 08/01/2024 11:16:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000198675654
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 21:35:41	Identificação da Apuração de Débitos	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CONSELHEIRO ELIEL MARTINS	Número	131
Complemento	CASA TERREO	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7591895303
Correio Eletrônico	ASCN.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CPF	03876882508
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO		
CPF	03876882508	CRC	-
UF	-	Telefone	7133220908
Correio Eletrônico	ascn.engenharia@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	55,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	22,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	33,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	33,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.29338/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	445,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	74,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	29,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,76		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	44,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	17,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	44,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	595,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 595,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	33,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	266,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	33,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.73495/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	266,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	33,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,99		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	266,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 266,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	89,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 89,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	35,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	53,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	21,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,37		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	53,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	712,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 712,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	396,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 396,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	990,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 990,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	217,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 217,80		
Saldo a Pagar	0,00		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198675654
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 21:35:41	Identificação da Apuração de Débitos	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	990,68	990,68	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2023	217,80	217,80	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	712,51	712,51	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2023	396,00	396,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	53,43	53,43	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	21,37	21,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	53,43	53,43	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	35,62	35,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	7,12	7,12	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	89,06	89,06	0,00

Obra: 90.011.25370/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	595,39	595,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	44,65	44,65	0,00

Obra: 90.011.25370/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS


Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	17,86	17,86	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	44,65	44,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	29,76	29,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	5,95	5,95	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	74,42	74,42	0,00

Obra: 90.015.74165/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	19,99	19,99	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	266,59	266,59	0,00

Obra: 90.015.74165/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	7,99	7,99	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	19,99	19,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	13,32	13,32	0,00



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,66	2,66	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	33,32	33,32	0,00

Obra: 90.014.24417/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	266,59	266,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	19,99	19,99	0,00

Obra: 90.014.24417/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	7,99	7,99	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	19,99	19,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	13,32	13,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,66	2,66	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	33,32	33,32	0,00

Obra: 90.015.73495/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	19,99	19,99	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	266,59	266,59	0,00

Obra: 90.015.73495/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	7,99	7,99	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	19,99	19,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	13,32	13,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,66	2,66	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	33,32	33,32	0,00

Obra: 90.015.29338/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	445,91	445,91	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	33,44	33,44	0,00

Obra: 90.015.29338/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS


Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	13,37	13,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	33,44	33,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	22,29	22,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	4,45	4,45	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	55,73	55,73	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198675654
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 21:35:41	Identificação da Apuração de Débitos	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	48.274,94	5.089,91	43.185,03



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	33.957.361/0001-80
Nome	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	62618625 / Reinf CP 23860367368 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.208,48	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.141,07	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 740,36	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.089,91	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2024 21:35:41
Nº do recibo de entrega	0000050000198675654





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2024 - 10:37:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASCN CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0075) 91895303
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.363,04	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.957.361/0001-80	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.309,04	14-ENCARGOS 72,51	15-TOTAL A RECOLHER 1.381,55
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2024

858500000134 815501802400 119684183835 395736100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2024 - 10:37:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASCN CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0075) 91895303
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.363,04	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.957.361/0001-80	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.309,04	14-ENCARGOS 72,51	15-TOTAL A RECOLHER 1.381,55
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2024

858500000134 815501802400 119684183835 395736100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372216562813611
22/01/2024 17:00:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.20
0684X00684 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASCN CONSTRUTORA EIRELI
AGENCIA: 0684-X CONTA: 37.725-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000013-4 81550180240-0
11968418383-5 39573610001-1
Data do pagamento 18/01/2024
CNPJ/CRT/CPF 33957361/0001-80
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 19/01/2024
VALOR DEPOSITO 1.381,55
Valor Total 1.381,55
=====

DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC5.502.CBE.0A6.C26

Transação efetuada com sucesso por: JF454334 MARIA GILDIANE SENA DE OLIVEIRA.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0001/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLERISTON DE SANTANA CORDEIRO			164.67843,76-3	16/10/2023	01			07823
		278,70	0,00				200,67	0,00
JULIANNE APARECIDA CARNEIRO LIMA			162.72637,87-0	28/03/2023	01			04110
		499,87	0,00				146,63	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0002/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEFÓSITO	CBO JAM
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	1.980,00	0,00	160.13826.58-8 0,00	01/01/2023 217,80	11		0,00	02142 0,00

TOTÁIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.542,56

778,57

0,00

502,06

347,30

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0003/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: OziVCvgijti0000-3
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.562,56	778,57	3.562,56	0,00
11	1	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAIS:	3	5.542,56	778,57	5.542,56	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: OziVCvgijti0000-3

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.924.06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	502.06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0005/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900112537073

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FELIPE CARNEIRO DE SOUZA		212.87429.87-6	18/07/2023	01			07170
1.332,98	277,71	0,00	101,78			128,85	0,00
VINICIUS SILVA BISPO		166.40487.31-5	13/09/2022	01			07170
1.644,01	666,49	0,00	129,78			184,84	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.976,99

944,20

0,00

231,56

313,69

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: IkJOUZpweq00000-1
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.976,99	944,20	2.976,99	0,00
TOTAIS:	2	2.976,99	944,20	2.976,99	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0007/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: IkjOUZpweq00000-1
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900112537073

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.088.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 231.56
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 22:22:20.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo 00aE91YoPiy00005.SFP é:

a06e1d1b-11d1-47a4-a419-dc3cdd9460f2

Transmissor: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:35080947000134

Inscrição do Transmissor: 35080947000134

Responsável: PROSPECTA CONTABILIDADE E CONS

Inscrição do Responsável: 05892825574

Competência: 12/2023

NRA: 00aE91YoPiy00005

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MURILO LIMA OLIVEIRA

Telefone: 007199103540



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 22:20:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507


SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	16.363,04
DEPÓSITO	1.309,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.309,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° CONTROLE: Duw111B4Scc0000-7 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA	CEP: 44640-000	TELEFONE: 0075-91895303	CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.003,64	0,00	0,00	0,00	1.003,64
Contribuintes Individuais	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.553,58	0,00	0,00	0,00	2.553,58
Contribuintes Individuais	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
RAT	382,99	0,00	0,00	0,00	382,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.554,01	0,00	0,00	0,00	4.554,01
OUTRAS ENTIDADES	740,52	0,00	0,00	0,00	740,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	740,52	0,00	0,00	0,00	740,52
TOTAL A RECOLHER	5.294,53	0,00	0,00	0,00	5.294,53

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0008/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900142441777

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	1.332,98	666,49	206.46382.63-7 0,00	14/07/2022	01		159,95	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.332,98 666,49 0,00 101,78 159,95 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0009/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900142441777

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	666,49	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	666,49	1.332,98	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0010/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE PINDOBAC N° DE CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900142441777
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 485.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 101.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00


COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0011/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900152933878

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ENOCK JOSE PEREIRA NETO	2.229,58	650,30	207.37890.91-0 0,00	12/06/2023 182,48	01		230,39	07153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.229,58

650,30

0,00

182,48

230,39

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0012/0022


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900152933878

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.229,58	650,30	2.229,58	0,00
TOTAIS:	1	2.229,58	650,30	2.229,58	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0013/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA N° DE CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0
N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900152933878

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	824.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	182.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00


COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0014/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157349571

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCAS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA CORDEI	1.332,98	222,17	228.11313.38-8 0,00	26/08/2023	01		124,41	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.332,98


222,17

0,00

101,78

124,41

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0015/0022


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157349571
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	222,17	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	222,17	1.332,98	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0016/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO N° DE CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157349571

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 485.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 101.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
 HORA: 22:20:00
 PÁG: 0017/0022

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
 TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900157416579

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EDVAN GONZAGA SANTOS	1.332,98	333,24	161.55042.10-2	0,00	10/07/2023	01				133,30	07170
					101,78						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.332,98 333,24 0,00 101,78 133,30 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0018/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA N° DE CONTROLE: BDmon0jcNe00000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000

N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157416579
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,98	333,24	1.332,98	0,00
TOTAIS:	1	1.332,98	333,24	1.332,98	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0019/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA Nº DE CONTROLE: BDmon0jcNe00000-0
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900157416579

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	485.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	101.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00


COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0020/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE

UF: BA

CEP: 44640-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	12.768,07	3.594,97	12.768,07	0,00
11	1	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAIS:	9	14.748,07	3.594,97	14.748,07	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0021/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA	Nº DE CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7	Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000		CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	12.768,07
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.594,97
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.309,04	0,00	0,00	0,00	1.309,04



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 22:20:00
PÁG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: Duw11lB4Scc0000-7 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: RIACHAO DO JACUIPE UF: BA CEP: 44640-000 TELEFONE: 0075 9189 5303 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.294.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.221.44
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00


COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7

TOMADOR/OBRA : ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° CONTROLE: OziVCvgijti0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CENTRO RIACHAO DO JACUIPE 44640000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.542,56	REM SEM 13° SALÁRIO	3.562,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	778,57
		DEPÓSITO	347,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.542,56	REM SEM 13° SALÁRIO	3.562,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	778,57
CONTR SEGURADOS DEVIDA	502,06	DEPÓSITO	347,30
VAL DEVIDO PREV SOC	1.924,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7


TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900112537073 N° CONTROLE: IkjOUZpweq00000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99	REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	944,20
		DEPÓSITO	313,69
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99	REM SEM 13° SALÁRIO	2.976,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	944,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	231,56	DEPÓSITO	313,69
VAL DEVIDO PREV SOC	1.088,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7


TOMADOR/OBRA : PRACA DISTRITO DE VARZEA GRANDE INSCRIÇÃO: 900142441777 N° CONTROLE: MQGMRvBv1FC0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
VARZEA GRANDE POVOADO PINDOBACU 44770000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	666,49
		DEPÓSITO	159,95
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	666,49
CONTR SEGURADOS DEVIDA	101,78	DEPÓSITO	159,95
VAL DEVIDO PREV SOC	485,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: Duw111B4Scc0000-7


TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LAGOA REDONDA INSCRIÇÃO: 900152933878 N° CONTROLE: CR21uYOiy0m0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
LAGOA REDONDA DISTRITO LAGOA ITAPICURU 48475000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	650,30
		DEPÓSITO	230,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58	REM SEM 13° SALÁRIO	2.229,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	650,30
CONTR SEGURADOS DEVIDA	182,48	DEPÓSITO	230,39
VAL DEVIDO PREV SOC	824,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: Duw1I1B4Scc0000-7


TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MONTE SANTO INSCRIÇÃO: 900157349571 N° CONTROLE: F2T1nIzJfEm0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
POVOADO MARIA LIMA POVOADO MONTE SANTO 48800000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	222,17
		DEPÓSITO	124,41
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	222,17
CONTR SEGURADOS DEVIDA	101,78	DEPÓSITO	124,41
VAL DEVIDO PREV SOC	485,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80 N° ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: Duw111B4Scc0000-7


TOMADOR/OBRA : CNO CICLOVIA MUNICIPIO DE ANDORINHA INSCRIÇÃO: 900157416579 N° CONTROLE: BDmon0jcNe00000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TRECHO ENTRE SEDE DE ANDORINHA CENTRO ANDORINHA 48990000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	333,24
		DEPÓSITO	133,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.332,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	333,24
CONTR SEGURADOS DEVIDA	101,78	DEPÓSITO	133,30
VAL DEVIDO PREV SOC	485,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000135 090401802405 107684180832 395736100011

EMPRESA: ASCN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.957.361/0001-80

Nº ARQUIVO: 00aE91YoPiy0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 150

COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.748,07
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.221,44
VAL DEVIDO PREV SOC	5.294,53
TOTAL TRABALHADORES	9

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	12.768,07
REM 13º SALÁRIO	3.594,97
DEPÓSITO	1.309,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8

TOTAL A RECOLHER 1.309,04



RELATÓRIO FOTOGRAFICO XI

**OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAV
EM PARALELEPÍEDO, MEIO FIO E PINTURA DE GUIA DAS RUAS DE
SANTALUZ-BA**

CONTRATO: Nº 106-2023

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:038768825
08

Assinado de forma
digital por ANTONIO
SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23
14:20:17 -03'00'




RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNE 097417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO: 03876882
508

Assinado de forma
digital por ANTONIO
SOARES CORDEIRO
NETO: 03876882508
Dados: 2024.01.23
14:22:31 -03'00'



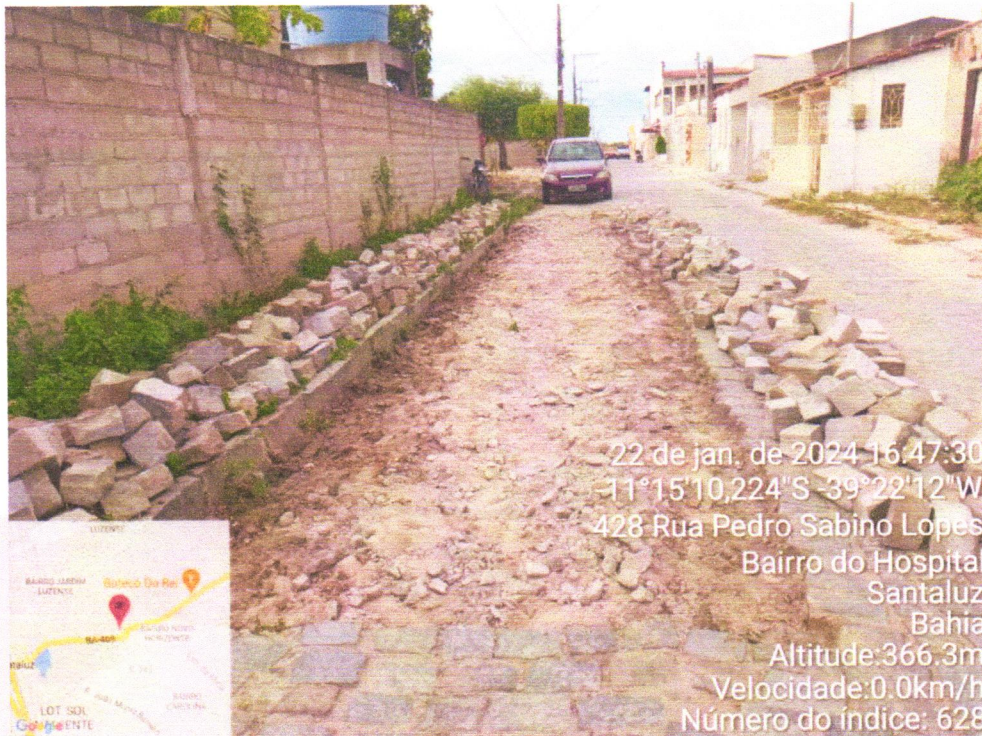

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO: 03876882
508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO: 03876882508
Dados: 2024.01.23 14:22:39 -03'00'



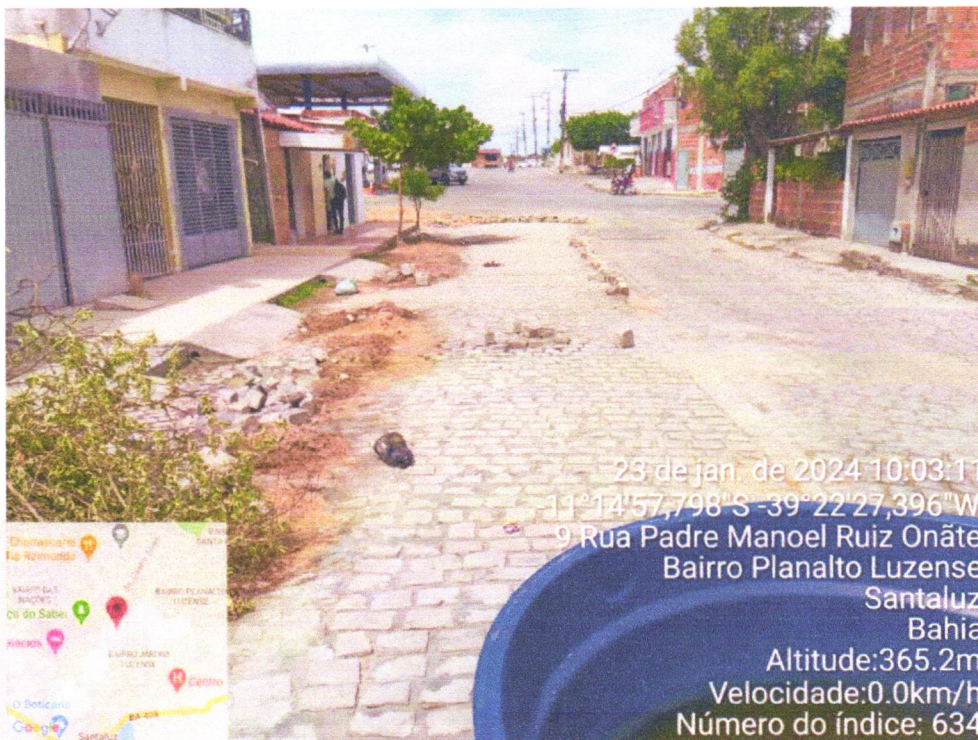


RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA


**ANTONIO
SOARES
CORDEIRO**
NETO:0387688
2508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 14:22:48 -03'00'





19 de jan. de 2024 08:21:33
-11°14'55,41"S -39°22'25,704"W
35 Rua José Salvador Araújo
Bairro Planalto Luzense
Santaluz
Bahia
Altitude:354.8m
Velocidade:6.8km/h
Número do índice: 624



23 de jan. de 2024 09:47:46
-11°14'55,314"S -39°22'26,436"W
35 Rua José Salvador Araújo
Bairro Planalto Luzense
Santaluz
Bahia
Altitude:353.9m
Velocidade:0.6km/h
Número do índice: 629

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3


ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:0387688
2508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 14:23:12 -03'00'

Avenida conselheiro Eliel Martins, nº131, casa térreo, centro – Riachão do Jacuípe-Ba – Cep: 44640-000
Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303 – E-mail: ascn.engenharia@gmail.com



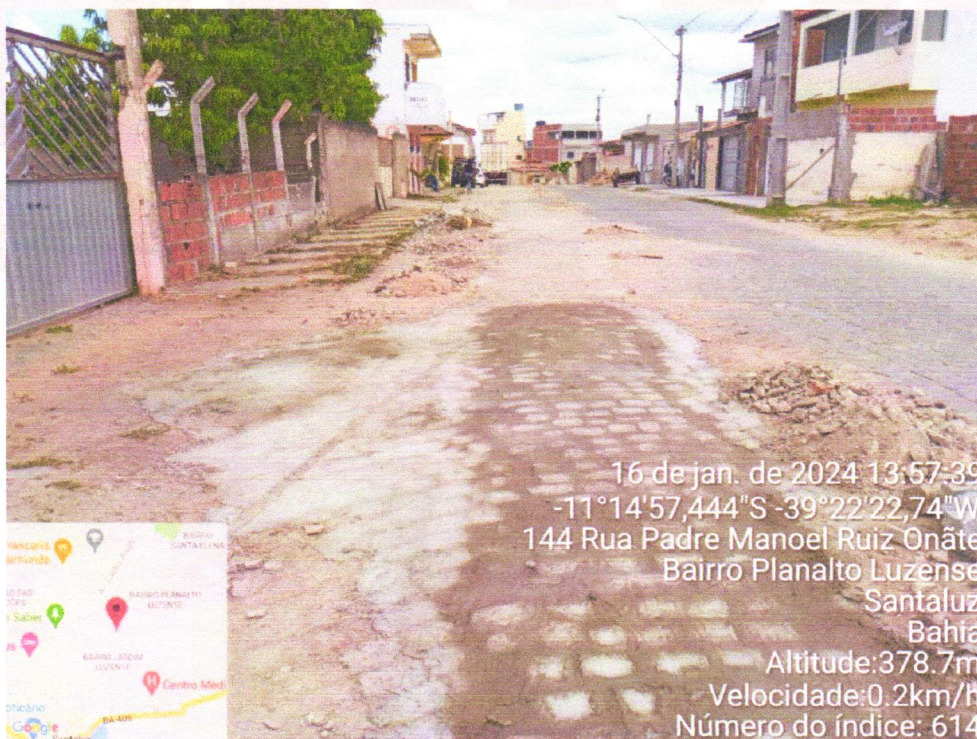

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508
8
Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 14:23:22 -03'00"






RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:0387688
2508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 14:23:31 -03'00'



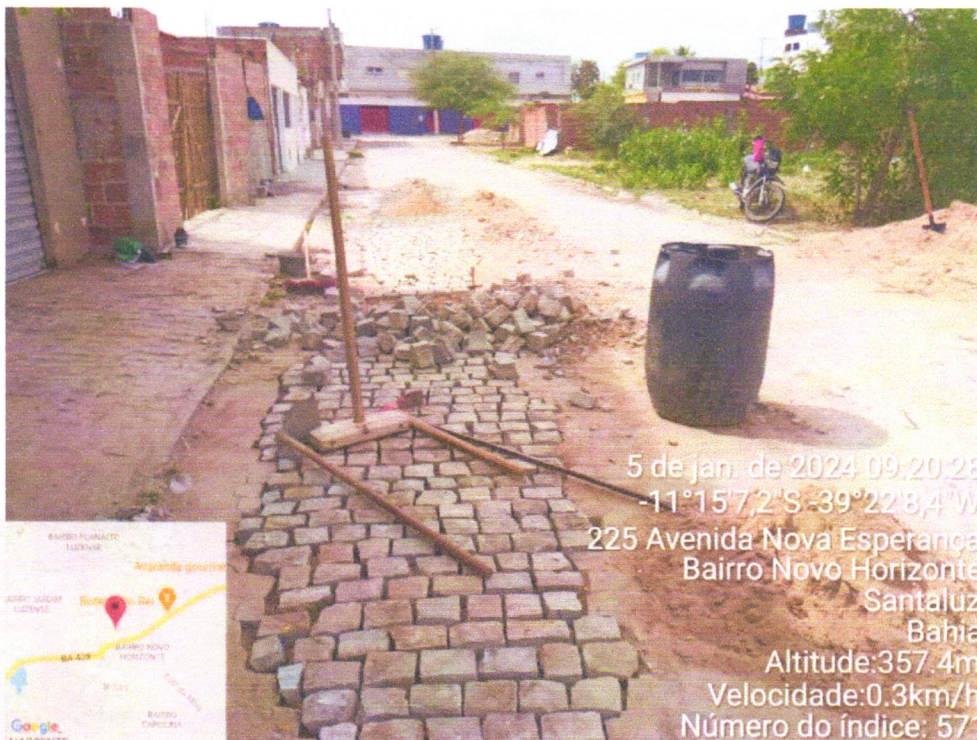

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882
508

Assinado de forma
digital por ANTONIO
SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23
14:23:40 -03'00'

Avenida conselheiro Eliel Martins, nº131, casa térreo, centro – Riachão do Jacuípe-Ba – Cep: 44640-000
Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303 – E-mail: ascn.engenharia@gmail.com






RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:0387688
2508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 14:23:51 -03'00"



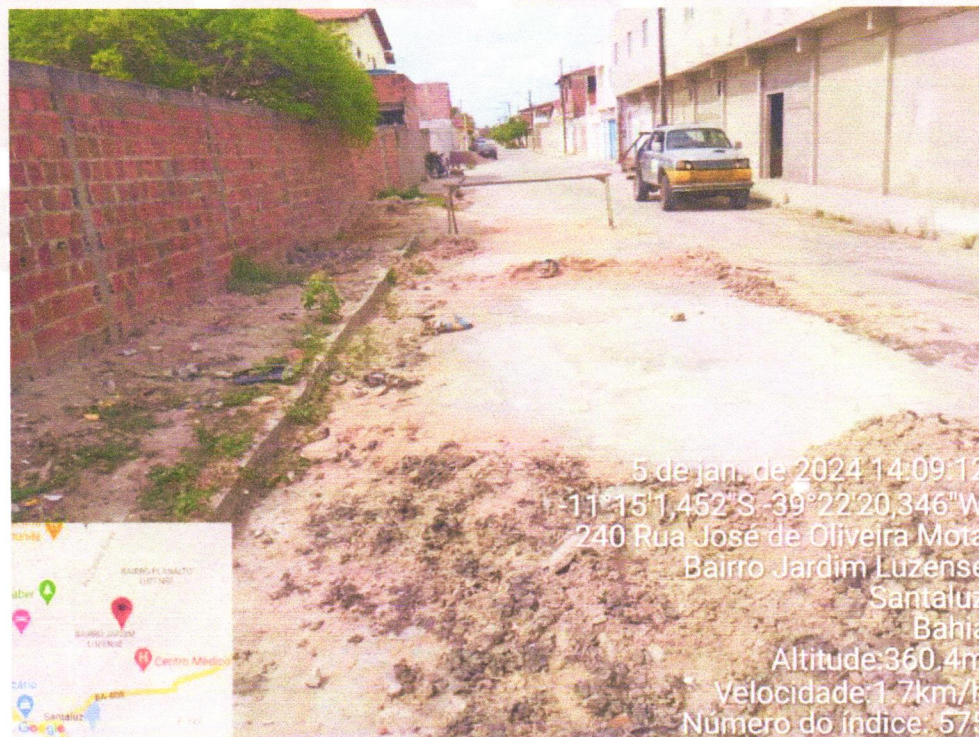

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO: 0387688
2508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO: 03876882508
Dados: 2024.01.23 14:23:59 -03'00'



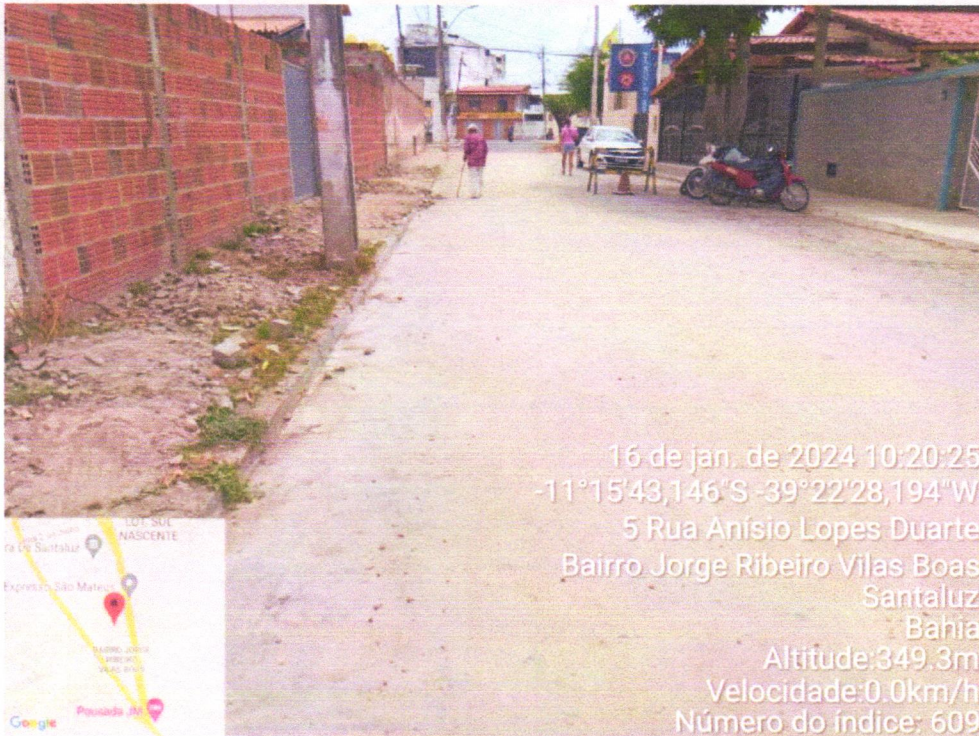

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO: 0387688
2508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO: 03876882508
Dados: 2024.01.23 14:24:08 -03'00'





16 de jan. de 2024 10:20:44
-11°15'42,996"S -39°22'27,648"W
5 Rua Anísio Lopes Duarte
Bairro Jorge Ribeiro Vilas Boas
Santaluz
Bahia
Altitude: 349.4m
Velocidade: 3.5km/h
Número do índice: 610



16 de jan. de 2024 09:55:32
-11°14'46,182"S -39°22'39,528"W
882 Rua J. J. Seabra
Bairro São Pedro
Santaluz
Bahia
Altitude: 360.5m
Velocidade: 0.0km/h
Número do índice: 607

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO: 038768
82508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO: 03876882508. Dados: 2024.01.23 14:24:18 -03'00'

Avenida conselheiro Eliel Martins, nº131, casa térreo, centro – Riachão do Jacuípe-Ba – Cep: 44640-000
Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303 – E-mail: ascn.engenharia@gmail.com






RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:0387688
2508

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 14:24:27 -03'00'



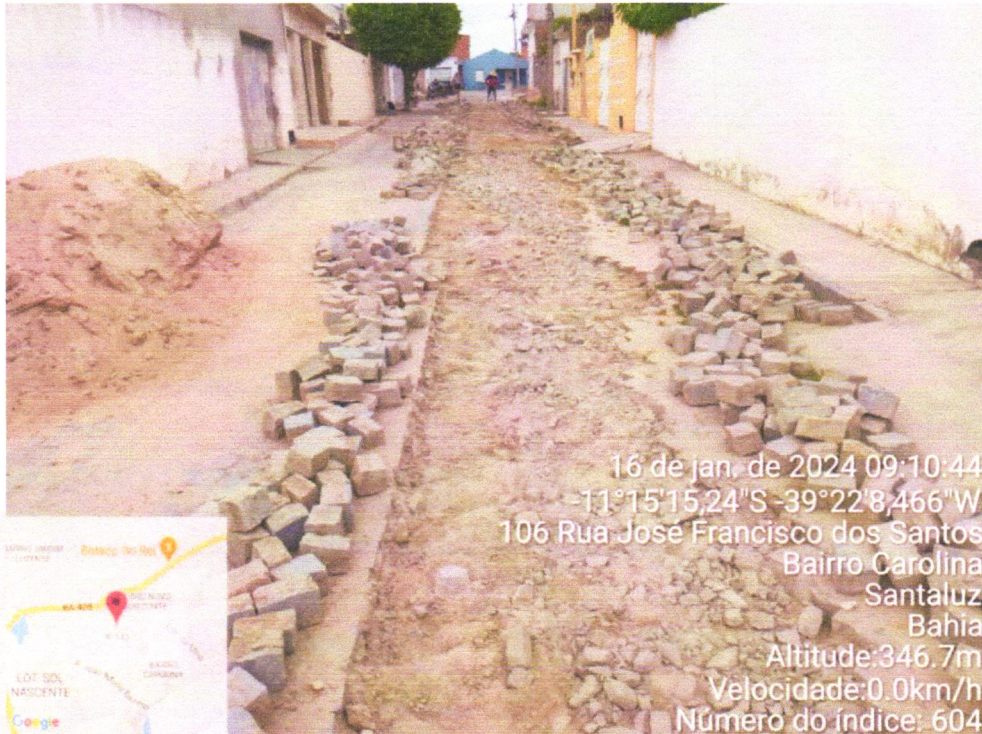


RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:038768
82508

Assinado de forma
digital por
ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23
14:24:35 -03'00'



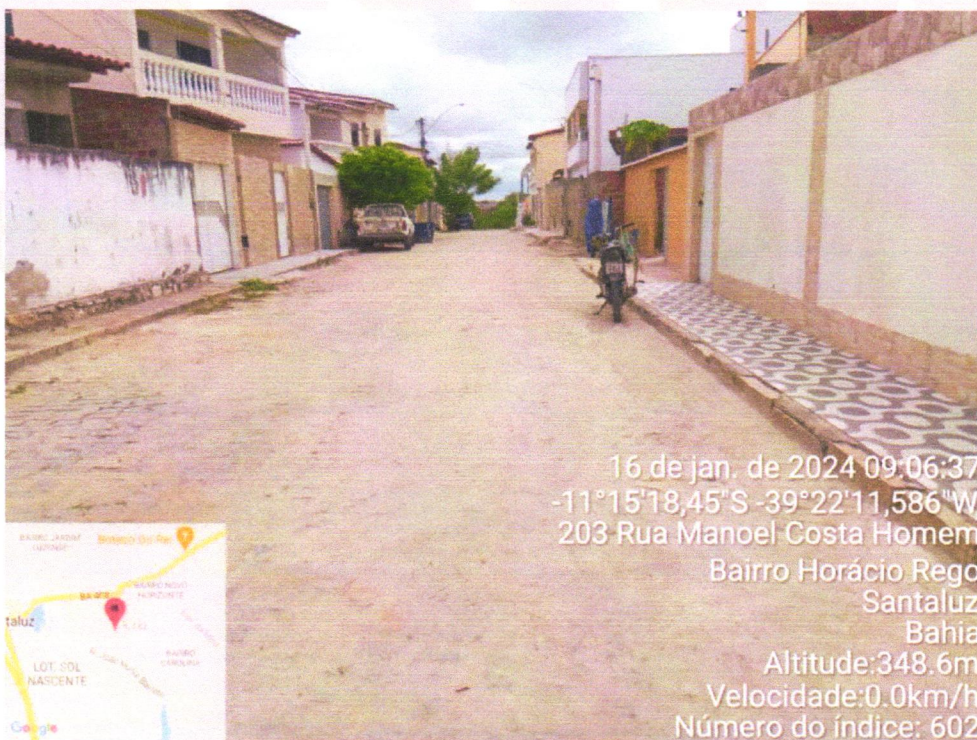


RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:038768825
08

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 14:24:44 -03'00'



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO	ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023	TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
PRAZO(DIAS): 360	TEMPO DECORRIDO(DIAS): 218	SALDO DE PRAZO: 142
Nº DA ART: BA20230416475	ENDEREÇO: SANTALUZ - BA	
DATA: 15/12/2023	DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (x) S ()	

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã				
Tarde				
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
<i>Evaldo Almeida Moraes</i> Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA + 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 16/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 219
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (x)

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 141

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA + 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 220 SALDO DE PRAZO: 140
Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DATA: 17/12/2023 DIA DA SEMANA: D(x)S()T()Q()S()S()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA - 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 221 SALDO DE PRAZO: 139
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 18/12/2023 DIA DA SEMANA: D () S (x) T () Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 222 SALDO DE PRAZO: 138
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 19/12/2023 DIA DA SEMANA: D () S () T (x) Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 20/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 223
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (x) Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 137



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 21/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 224
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (x) S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 136

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 22/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 225
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (x) S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 135

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA-05188854-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 218 SALDO DE PRAZO: 142
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 23/12/2023 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (x) S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã				
Tarde				
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA + 051888554-2







DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 219 SALDO DE PRAZO: 141
Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DATA: 24/12/2023 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (x)

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 93746BA

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2







DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 220 SALDO DE PRAZO: 140
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 25/12/2023 DIA DA SEMANA: D(x)S()T()Q()Q()S()S()



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3







DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 221 SALDO DE PRAZO: 139
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 26/12/2023 DIA DA SEMANA: D () S (x) T () Q () Q () S () S ()



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO	ÍNICIO DA OBRA:	15/04/2023	TÉRMINO DA OBRA:	15/04/2024
PRAZO(DIAS):	360	TEMPO DECORRIDO(DIAS):	222	SALDO DE PRAZO:	138
Nº DA ART:	BA20230416475	ENDEREÇO:	SANTALUZ - BA		
DATA:	27/12/2023	DIA DA SEMANA:	D () S () T (x) Q () Q () S () S ()		

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
<p><i>Evaldo Almeida Moraes</i> Engenheiro Civil RNP 051417303-3</p>	<p>ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A</p>	<p><i>Antonio Soares Cordeiro Neto</i> Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2</p>



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 28/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 223
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (x) Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 137



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 29/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 224
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (x) S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 136

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 30/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 225
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (x) S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 135

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
<p><i>Evaldo Almeida Moraes</i> Engenheiro Civil RNP 051417303-3</p>	<p>ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA</p>	<p><i>Antonio Soares Cordeiro Neto</i> Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2</p>



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 31/12/2023

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 234
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D(x)S()T()Q()Q()S()S()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 126

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 05188854-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 01/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 235
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S (x) T () Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 125

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã				
Tarde				
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 93746BA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 02/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 236
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S () T (x) Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 124

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2






DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 237 SALDO DE PRAZO: 123
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 03/01/2024 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (x) Q () S () S ()



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 04/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 238
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (x) Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 122

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
Eivaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP.051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 05/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 239
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (x) S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 121

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã				
Tarde				
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 06/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 240
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () S () S (x)

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 120

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 07/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 241
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D(x)S()T()Q()Q()S()S()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 119

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
<i>Evaldo Almeida Moraes</i> Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	<i>Antonio Soares Cordeiro Neto</i> Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 242 SALDO DE PRAZO: 118
Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DATA: 08/01/2024 DIA DA SEMANA: D () S (x) T () Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
<i>Evaldo Almeida Moraes</i> Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	<i>Antonio Soares Cordeiro Neto</i> Engenheiro Civil CREA - 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 09/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 243
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T (x) Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 117

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 0514117303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 10/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 244
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (x) Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 116

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 93746BA

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 11/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 245
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (x) S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 115

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA + 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO INÍCIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 246 SALDO DE PRAZO: 114
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 12/01/2024 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (x) S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã				
Tarde				
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 247 SALDO DE PRAZO: 113
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 13/01/2024 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (x)

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 14/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 248
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D(x)S()T()Q()Q()S()S()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 112



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 15/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 249
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S (x) T () Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 111



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 16/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 250
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T (x) Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 110



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RMP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS







Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 17/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 251
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (x) Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 109



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA 05188554-2







DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 252 SALDO DE PRAZO: 108
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 18/01/2024 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (x) S () S ()



TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA + 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 253 SALDO DE PRAZO: 107
Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DATA: 19/01/2024 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () S (x) S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023 TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 254 SALDO DE PRAZO: 106
 Nº DA ART: BA20230416475 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 20/01/2024 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (x)

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã				
Tarde				
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 0514117303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA20230416475
DATA: 21/01/2024
ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 255
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D(x)S()T()Q()S()S()
TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
SALDO DE PRAZO: 105

TURNO/TEMPO				
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	NÃO TRABALHOU
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 93746BA	 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA20230416475
 DATA: 22/01/2024

ÍNICIO DA OBRA: 15/04/2023
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 256
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S (x) T () Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 15/04/2024
 SALDO DE PRAZO: 104

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	CALCETEIRO	2
3.	AJUDANTE	3
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.		
5.		

RESPONSÁVEL:		
 Antonio Soares Cordeiro Neto Engenheiro Civil CREA+ 051888554-2	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA 937468A	 Evaldo Almeida Moraes Engenheiro Civil RNP 051417303-3

