



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 121 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 522 Data do Sub-Empenho: 26/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5476 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 26/04/2024
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 004 - EDUCALUZ	
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 13/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129-2023	2.384.554,99	110.188,35	2.274.366,64
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LICITAÇÃO 013-2022PE. CONTRATO 129-2023. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 À 24/04/2024, REFERENTE A QUADRA COBERTA DO CENOS. OBRA Nº 078/2023. NFS-e 482.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	110.188,35	110.188,35	0,00

Data do Empenho: 26/04/2024 Data do Liquidação: 26/04/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540	7.272,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.322,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	3.305,65
## Noventa e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais e um centavo ##		11.900,34
		Valor Líquido
		98.288,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/04/2024	482	U			110.188,35

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	110.188,35

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/04/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/04/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 02/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 121 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 522 Data do Sub-Empenho: 26/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5476 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/04/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 13/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129-2023	2.490.728,74	110.188,35	2.380.540,39
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LICITAÇÃO 013-2022PE. CONTRATO 129-2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
110.188,35	110.188,35	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	110.188,35	110.188,35

Cento e dez mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos

110.188,35

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 26/04/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/04/2024

MARLI NUNES LIMA
 Secretária de Educação
 CPF: 930.248.435-15

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

Visto

3525000



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000482
 Data e Hora de Emissão:
25/04/2024 10:54:36
 Código de Verificação:
A6EN-Y4BA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.697.344/0001-98
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
661.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
 Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

OBRA DE REFORMA DA QUADRA COBERTA DO CENOS
 OBRA Nº 078/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 Nº DO CONTRATO: 129/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 24/04/2024
 VALOR TOTAL R\$ R\$ 110.188,35
 VALOR DO MATERIAL 40% R\$ 44.075,34. BASE DE CÁLCULO DO INSS 60%: 66.113,01 X 11% R\$ 7.272,43
 VALOR DO ISS 5%: R\$ 3.305,65
 RETENÇÃO IR - ALÍQUOTA (1,2%) VALOR RETIDO R\$ 1.322,26
 DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$110.188,35

CNAE:

4299699 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
44.075,34	66.113,01	5,00%	3.305,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
7.272,43	0,00	0,00	1.322,26	0,00	3.305,65	98.288,01

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 04/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **25/04/24** *Evaldo Moraes*
 Assinatura



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395437	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 66.113,01	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.305,65	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.305,65
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 26/04/2024 10:26:56	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 482 - DATA DE EMISSÃO: 25/04/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.305,65
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.305,65

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000033 . 2 05653906202 . 8 40531010500 . 3 00039543712 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO




8176000033 . 2 05653906202 . 8 40531010500 . 3 00039543712 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 395437	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 26/04/2024 10:26:56	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024	INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.305,65	
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.305,65	





I.R.R.F

Nº DAM: 395436	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 1.322,26	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.322,26	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.322,26
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 26/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 26/04/2024 10:24:25	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.322,26
Valor do Tributo: 1.322,26	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.322,26		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Calculo: 1.322,26	Vir. Devido com Desconto: 1.322,26		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+) JUROS DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.322,26
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;				
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.				
4) NF-e Nº 482 - Data de emissão: 25/04/2024.				



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8171000013 . 9 22263906202 . 5 40731010100 . 8 00039543607 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000013 . 9 22263906202 . 5 40731010100 . 8 00039543607 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395436	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 26/04/2024 10:24:25	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.322,26
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.322,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 25/04/2024

A EMPRESA:


MP2 CONSTRUÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO:

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2539. ED. CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING. CAMINHO DAS ÁRVORES. CEP 41820-021. SALVADOR/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
Serviços comuns de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, sem regime de dedicação exclusiva, no município de Santaluz/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 013/2022
Contrato: 129/2023 Processo administrativo: 146/2022 Nº da obra: 078/2023
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 482 VALOR DA NOTA: R\$ 110.188,35 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 24/04/2024
DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.
CONTA: AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO
Recurso FUNDEB

Atenciosamente,


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3
Fiscal de Obra





OBRA DE REFORMA DA QUADRA COBERTA DO CENOS

Nº DA OBRA: 078/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 129/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 a 24/04/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 110.188,35

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	ALAMBRADO										
1.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	243,3	304,72	R\$ 74.137,87	243,30	R\$ 74.137,87	243,30	R\$ 74.137,87	0,00	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 74.137,86						
2.0	PISO										
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	742,23	4,61	R\$ 3.419,08	742,23	R\$ 3.419,08	742,23	R\$ 3.419,08	0,00	3,10%
2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	M²	269,8	17,26	R\$ 4.657,83	269,80	R\$ 4.657,83	269,80	R\$ 4.657,83	0,00	4,23%
2.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor cinza)	M²	58,56	17,26	R\$ 1.010,98	58,56	R\$ 1.010,98	58,56	R\$ 1.010,98	0,00	0,92%
2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	M²	155,12	17,26	R\$ 2.677,99	155,12	R\$ 2.677,99	155,12	R\$ 2.677,99	0,00	2,43%
2.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	M²	32,5	17,26	R\$ 561,08	32,50	R\$ 561,08	32,50	R\$ 561,08	0,00	0,51%
	SUBTOTAL				R\$ 12.326,94						
3.0	PINTURA										
3.1	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	301,28	15,08	R\$ 4.543,63	301,28	R\$ 4.543,63	301,28	R\$ 4.543,63	0,00	4,12%
	SUBTOTAL				R\$ 4.543,63						
4.0	COBERTURA										
4.1	TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM	M²	487,37	39,21	R\$ 19.109,39	487,37	R\$ 19.109,39	487,37	R\$ 19.109,39	0,00	17,34%
	SUBTOTAL				R\$ 19.109,38						
5.0	SERVIÇOS FINAIS										
5.1	Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/sgoto e aguas pluviais, d=75mm	M	1,5	47,03	R\$ 70,54	1,50	R\$ 70,54	1,50	R\$ 70,54	0,00	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 70,54						
	TOTAL GERAL				R\$ 110.188,35		R\$ 110.188,35		R\$ 110.188,35		



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP: 051417303-3



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 974448

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:58:45 horas do dia 03/04/2024.

Válida até dia 02/07/2024.

Código de controle da certidão: **FBDC.AF3D.4B00.BC89.FD09.D3DA.F89F.771A**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241448833**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 19:38:11 do dia 09/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2024.

Código de controle da certidão: **113E.4F15.5319.B2D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 7401798/2024

Expedição: 01/02/2024, às 09:46:20

Validade: 30/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032901350877728700

Informação obtida em 03/04/2024 10:04:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00422073E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 03/04/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR, TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP 41820021

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 3 de abril de 2024



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	70299317 / Reinf CP 25269606036 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.357,03	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 50.522,17	R\$ 38.577,70
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 12.150,95	R\$ 12.150,95
IRRF	R\$ 739,69	R\$ 739,69
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.769,84	R\$ 51.468,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/04/2024 08:13:26
Nº do recibo de entrega	0000050000220823080



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220823080
Data/Hora da Transmissão	08/04/2024 08:13:26	Identificação da Apuração de Débitos	70299317 / Reinf CP 25269606036 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	217,37		
Saldo a Pagar	217,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	86,95		
Saldo a Pagar	86,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	130,42		
Saldo a Pagar	130,42		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,39		
Saldo a Pagar	17,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	52,17		
Saldo a Pagar	52,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	296,33		
Saldo a Pagar	296,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.739,03		
Saldo a Pagar	1.739,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.020,12		
Saldo a Pagar	5.020,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.008,04		
Saldo a Pagar	2.008,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.012,07		
Saldo a Pagar	3.012,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	401,60		
Saldo a Pagar	401,60		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.204,82		
Saldo a Pagar	1.204,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.843,43		
Saldo a Pagar	6.843,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	40.160,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.944,47		
Saldo a Pagar	28.216,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Saldo a Pagar	1.482,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	16.541,71		
Deduções	Salário Família: 1.052,61 Retenção Lei 9711/98: 15.489,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	739,69		
Saldo a Pagar	739,69		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220823080
Data/Hora da Transmissão	08/04/2024 08:13:26	Identificação da Apuração de Débitos	70299317 / Reinf CP 25269606036 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	217,37		
Saldo a Pagar	217,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	86,95		
Saldo a Pagar	86,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	130,42		
Saldo a Pagar	130,42		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,39		
Saldo a Pagar	17,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	52,17		
Saldo a Pagar	52,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	296,33		
Saldo a Pagar	296,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.739,03		
Saldo a Pagar	1.739,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.020,12		
Saldo a Pagar	5.020,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.008,04		
Saldo a Pagar	2.008,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.012,07		
Saldo a Pagar	3.012,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	401,60		
Saldo a Pagar	401,60		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.204,82		
Saldo a Pagar	1.204,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.843,43		
Saldo a Pagar	6.843,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	40.160,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.944,47		
Saldo a Pagar	28.216,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Saldo a Pagar	1.482,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	16.541,71		
Deduções	Salário Família: 1.052,61 Retenção Lei 9711/98: 15.489,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	739,69		
Saldo a Pagar	739,69		



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/04/2024

Número de Controle: 37.19.91.49.22

Número da Declaração: 37199.14922.170424.1.3.15-0773

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 00126.05812.260124.1.3.15-9919

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 12/2022

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 25.853,38

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	29.677,09

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES

CPF: 904.030.025-91

Telefone: (19)3471-0670

Celular:

Correio Eletrônico: lista-dp@visualassessoria.com.br

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/04/2024 às 18:55:22
66268917

Versão: 8.20

37.19.91.49.22

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



CNPJ 24.597.344/0001-98	Razão Social MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24109.8565460-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222053763			Valor Total do Documento 21.791,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	21,82			21,82
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.843,43			6.843,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.020,12			5.020,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	401,60			401,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.008,04			2.008,04
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.012,07			3.012,07
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.204,82			1.204,82
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	739,69			739,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.739,03			1.739,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.016.27652/75				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	296,33			296,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

18/04/2024 08:59:59

85820000217 4 91250385241 5 10071624109 5 85654604918 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000217 4 91250385241 5 10071624109 5 85654604918 0



CNPJ: 24.597.344/0001-98
Número: 07.16.24109.8565460-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 21.791,25

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	217,37			217,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	17,39			17,39
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	86,95			86,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	130,42			130,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	52,17			52,17
	Totais	21.791,25			21.791,25



CPF/CNPJ do Empregador
24.597.344

Nome/Razão Social do Empregador
MP2 CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124042305134569-5

Tag
24597344 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

23/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

15.747,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	99	14.926,26	0,00	0,00	820,91	15.747,17
Total Geral:		14.926,26	0,00	0,00	820,91	15.747,17

Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 08:23:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/ocbv/5d1691a31c4347b48a1665080aeddf94520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63044A74

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/ocbv/5d1691a31c4347b48a1665080aeddf94



Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 23/04/2024 - 09h03

Nº de controle: 329.638.606.097.154.964

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**

Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **23/04/2024**

Valor: **R\$ 15.747,17**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 15.747,17**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 15.747,17**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202404231202I3231A4xsc8**

Descrição:

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 24.597.344/0001-98			Tomador: 90.004.55801/71											
03/2024			ELISEU PEREIRA COSTA	71	613.253.925-53	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador								90.004.55801/71	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Estabelecimento							24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total da Guia									190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	063	090.198.535-03	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024			RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	88	054.455.675-59	101	19/04/2024	Mensal	3.431,06	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48
03/2024			REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	061	079.315.675-01	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
Total do Tomador								90.007.05281/79	7.890,22	631,20	0,00	0,00	0,00	631,20
Total do Estabelecimento								24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total da Guia									190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADAILTON DO CARMO SANTOS	240	059.224.325-75	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	248	906.029.785-72	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	151	431.938.975-15	101	19/04/2024	Mensal	2.435,64	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2024		ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	23	089.936.775-12	101	19/04/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2024		ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	154	792.961.575-87	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		AMAURI DOS SANTOS BARBOZA	183	045.146.935-61	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ANDRE LUIZ ALVES REIS	267	041.573.257-37	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	192	046.699.345-54	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		AUGUSTO CESAR SANTANA BISPO	214	069.052.335-10	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		BERNARDO SILVA BRITTO	232	065.634.245-54	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		BRAZ DIAS DOS SANTOS	224	501.122.875-49	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	126	576.963.495-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		CASSIANO DOS SANTOS BATISTA	273	552.198.705-30	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		COSME SANTOS MARQUES	212	459.294.325-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	149	019.088.445-23	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		EDILSON SANTOS	142	011.668.265-54	101	19/04/2024	Mensal	3.431,06	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48
03/2024		EDSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR	208	833.611.385-15	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ELTON SANTOS DA CONCEICAO	204	850.811.245-91	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ERIK SANTOS CHAVES	296	068.545.015-55	101	19/04/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2024		ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	146	860.528.565-64	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ERNADES DA COSTA	268	081.040.375-79	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		EVANDRO BRAS LEAL	264	885.438.895-53	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FABRICIO FERREIRA NEVES	269	100.035.275-73	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	195	056.883.065-21	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	187	040.084.945-37	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		GABRIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO	242	116.043.775-00	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GEAN PEREIRA DOS SANTOS	277	105.143.455-60	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GENIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA	237	037.335.855-50	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GILBERTO DE JESUS SILVA	226	389.383.028-65	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		GILEAN ALMEIDA SANTOS	190	023.722.555-76	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		GIVANILDO CARVALHO SILVA	233	069.490.165-22	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		HELEN CAILANE SANTOS GOES	278	104.717.955-50	101	19/04/2024	Mensal	1.720,70	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65
03/2024		HERBERT SOARES SANTANA	254	077.026.145-01	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ISAIAS COSTA DOS SANTOS	223	017.544.545-18	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ISAIAS OLIVEIRA	189	619.175.085-49	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		IVAN LUIZ DE SOUZA MATOS	193	906.749.955-20	101	19/04/2024	Mensal	3.049,82	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
03/2024		IVANILDO SANTOS DE JESUS	246	101.107.365-08	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JAIR RODRIGUES PIMENTEL VIEIRA	231	088.400.645-17	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA	276	060.723.775-99	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		JOANDERSON DE MORAIS SILVA	197	862.032.175-73	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOANDRESSON FRANCA DOS SANTOS	217	068.237.675-29	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JONATHAS SILVA SANTOS	256	096.705.855-46	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA CEZAR	271	606.796.545-34	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOSE CICERO DE LIMA E SILVA JUNIOR	211	046.869.155-38	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOSE CRUZ DE OLIVEIRA	249	665.305.715-15	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS	239	058.965.185-44	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOSE MARTINS DE CARVALHO	179	379.422.045-53	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	174	043.467.815-51	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOSE QUIRINO DOS SANTOS CRUZ	260	006.052.355-70	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		JOSE RALFE SILVA SANTOS	265	034.797.105-90	101	19/04/2024	Mensal	1.603,01	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24
03/2024		JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	173	042.817.365-90	101	19/04/2024	Mensal	2.080,94	166,47	0,00	0,00	0,00	166,47
03/2024		JOSIAS DA SILVA SANTOS	227	095.668.545-52	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JULIO DA CONCEICAO	205	898.536.015-91	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		LEONARDO MATOS LIMA	279	098.819.595-00	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUCAS DA SILVA DIAS	194	038.392.235-63	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUCIVAN DE LIMA BARRETO	270	081.161.195-75	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO	202	029.835.435-79	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	141	968.062.655-53	101	19/04/2024	Mensal	2.824,14	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
03/2024		LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIV	238	030.927.645-44	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		LUIZ GONZAGA DE JESUS	230	038.148.615-07	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	168	124.161.289-73	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MAICON CARVALHO DOS SANTOS	229	075.211.995-88	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MANOEL REIS DOS ANJOS	169	860.220.245-87	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		MARCELO FERREIRA DA PAZ	138	807.970.755-34	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		MARCIO PIRES XAVIER	150	055.034.795-05	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		MARCONE LIMA SANTOS	228	071.093.685-05	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARCOS JOSE DE SANTANA	216	019.576.815-94	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	24	077.351.565-88	101	19/04/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2024		MISAEI DA SILVA PEREIRA	258	927.755.435-53	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		NEI PIMENTA LEAL	186	215.802.865-34	101	19/04/2024	Mensal	3.431,06	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48
03/2024		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	235	095.569.215-67	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		PAULO DOS SANTOS NUNES	166	668.578.645-00	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	191	062.238.685-96	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		RAFAEL DA SILVA	181	854.440.905-97	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		RAIMUNDO DE FRANCA ALMEIDA	222	148.756.068-00	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	266	031.809.825-35	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	274	783.375.425-00	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		REINAN DE JESUS SANTOS	175	081.916.125-00	101	19/04/2024	Mensal	1.788,54	143,08	0,00	0,00	0,00	143,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		RODRIGO DE JESUS SANTOS	263	024.292.085-39	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ROMARIO DE JESUS SANTOS	261	052.183.325-69	101	19/04/2024	Mensal	1.590,27	127,22	0,00	0,00	0,00	127,22
03/2024		RONALDO JESUS DA SILVA	244	045.773.135-45	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		SILVIO SOUZA DE SANTANA	221	041.344.825-85	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	145	858.597.495-89	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VAGNER DA SILVA SANTOS	275	029.700.165-59	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VALBER DE SOUZA SILVA	220	062.478.685-45	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		VALCI SILVA BRITTO	234	069.279.385-24	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VANEZIO CONCEICAO FREITAS	144	512.920.505-78	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	196	029.911.495-31	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		WELINGTON DE FREITAS SILVA DE JESUS	198	034.371.775-16	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	139	087.985.945-83	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	252	490.827.438-09	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
Total do Tomador							Sem Tomador	172.016,16	13.760,98	0,00	0,00	0,00	13.760,98
Total do Estabelecimento							24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total da Guia								190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento: 90.016.27652/75			Tomador: Sem Tomador												
03/2024			DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS	257	644.275.525-87	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024			DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	247	861.346.355-02	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024			ELSON SILVA DE CARVALHO	251	029.178.985-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024			JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO	245	052.382.845-43	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024			LUCIANO SANTANA BARRETO	259	022.903.725-95	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
Total do Tomador								Sem Tomador	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	695,60	
Total do Estabelecimento								90.016.27652/75	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	695,60	
Total da Guia									190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	95	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	5	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total da Guia			190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,74

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.681/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.819/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperativa que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aléti não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	24.597.344/0001-98	95	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14
03/2024	90.016.27652/75	5	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total da Guia			190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	95	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	5	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total da Guia			190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.004.55801/71

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador	90.004.55801/71	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96

Tomador: 90.007.05281/79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	3	7.890,22	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20
Total do Tomador	90.007.05281/79	7.890,22	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	96	180.711,32	14.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,58
Total do Tomador	Sem Tomador	180.711,32	14.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,58
Total da Guia		190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE SANTALUZ** e a Empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP** - CNPJ Nº 24.597.344/0001-98

LANÇADO NO SIGA

CONTRATO Nº 129/2023

Pelo presente contrato de prestação de serviços na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**, Estado da Bahia, que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo CEP: 48.880-000, inscrito no CNPJ sob nº 13.807.870/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**, inscrito no CPF nº 016.549.665-76, portador da Carteira de Identidade nº 1148395733 SSP/BA, doravante designado simplesmente de **CONTRATANTE**, acompanhado do Secretário de Infraestrutura o Sr. **LUIZ SANTOS SILVA**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 167.382.335-15, e do outro lado, a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 2539, Cond. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, SL. 913, Caminho das Árvores, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 24.597.344/0001-98, neste ato representada por, **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**, portadora do RG nº 1492808237 e CPF nº 045.314.075-04, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestação de serviço, devidamente autorizado mediante **Pregão Eletrônico Edital nº 013/2022 e Processo Administrativo nº 146/2022**, Tipo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO


1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, sem regime de dedicação exclusiva, na forma estabelecida no Termo de Referência, e nas planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI e na tabela ORSE -Orçamento de Obras de Sergipe (Brasil), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2023.06.21
16:41:06 -03'00'

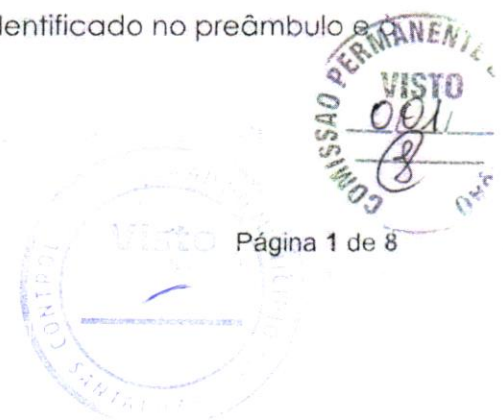



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



(PLANILHA)

Item	Descrição	Tabela (Serviços e Insumos) SINAPI DE Referência	Tabela (Serviços e Insumos) ORSE DE Referência	Percentual de Desconto sobre a Tabela SINAPI/ORSE		
1	Prestação dos serviços com fornecimento de insumos previstos e descritos nas Tabela SINAPI e ORSE	BAHIA	SERGIPE	17%		
	ÓRGÃO				CIDADE	R\$ ESTIMADO PARA 12 MESES
	Município				Santaluz	R\$ 7.043.664,23

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 21/06/2023. e encerramento em 20/06/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.




3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor da contratação é de **R\$ 7.043.654,23 (sete milhões, quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04521
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04521407504
Dados: 2023.06.21
16:41:19 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida aprovação, de acordo com o art. 5º, § 3º, da lei 8.666/93.

3.4.1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Fatura/Nota Fiscal cujo valor não ultrapasse o limite de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais).

3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Santaluz, inscrita no CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19, sediada na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, neste Município.

3.5.1 - A Fatura / Nota Fiscal deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a título de antecipação do valor contratado mesmo que a requerimento do interessado.

3.7 - Na execução desse contrato, as despesas relativas a pessoal representam um total de 50% (cinquenta por cento), sendo 50% (cinquenta por cento) restantes relativos a gastos com insumos, impostos e diversos.

3.8 - Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

3.8.1 - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuição para os Programas de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), na forma da Instrução Normativa RFB nº1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

3.8.2 - Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e,

3.8.3 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação pertinente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação

UNIDADE: 701

PROJETO ATIVIDADE: 1.002

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por CAMILLA CRUZ BARRETO COSTA
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
07504
RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2023.06.21 16:41:31 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500/ 1540/ 1541/ 1542/ 1569/ 1570

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação

UNIDADE: 701

PROJETO ATIVIDADE: 1.001

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500/ 1540/ 1541/ 1542/ 1569/ 1570

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Infraestrutura

UNIDADE: 1201

PROJETO ATIVIDADE: 1.007

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500/ 1754/ 1700/ 1706

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.


5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2023.06.21
16:41:44 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:


- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- efetuar o pagamento pela prestação de serviço do objeto do presente Contrato de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
- na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação financeira, aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento.
- não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA;
- fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para com o FGTS.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha discriminativa;
- manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA.04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2023.06.21
16:41:55 -03'00'





- c) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- d) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.
- e) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual de maneira correta, preferencialmente mediante transferência bancária na conta de titularidade do trabalhador;
- f) Instruir todos os seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas;
- g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- h) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrente de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta e não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no incisos do parágrafo primeiro, do artigo 57 da Lei Federal Nº 8.666/93.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

8.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

8.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

8.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

8.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou

8.1.5 cometer fraude fiscal.

8.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a CONTRATADA multa de até 2% (dois por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da Legislação específica;

8.3 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, conforme Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



8.4 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento das multas aplicadas.

8.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.

9. CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

9.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

9.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.4.3. Indenizações e multas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES

10.1. É vedado à CONTRATADA:

10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.


11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma
CRUZ BARRETO digital por CAMILLA
COSTA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314 FERREIRA:04531407504
07504 Dados: 2023.06.21
16:42:17 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, Decreto Federal 10.024 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz/BA como único e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santaluz - BA, 21 de junho de 2023.

MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

Arismário Barbosa Junior

CONTRATANTE

LUIZ SANTOS SILVA

CPF: 167.382.335-15

SECRETÁRIO MUNICIPAL

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2023.06.21 16:42:37 -03'00'


EMPRESA: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP** - CNPJ Nº 24.597.344/0001-98

REPRESENTANTE LEGAL: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**

RG 1492808237 e CPF 045.314.075-04

CONTRATADA



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
		x						S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 1		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO		Gerente de Obra					1						
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral					1						
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topógrafo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro					1						
		Ajudante Geral					2						
		Calceteiro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor					1						
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA					6						
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veículo Lave											
		Caminhão Muncok											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 1/4/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 1/4/2024											

1/4/2024




Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				x						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE				CATEGORIA						
CONTRATO N° 129/2023				LICITAÇÃO N° 129/2023		RDO: 2				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.				Aux Adm						
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 3						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA 8						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncok						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 2/4/2024				Data: 2/4/2024						




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 3				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA			8			
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 3/4/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 3/4/2024						




[Handwritten signature]

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNR 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	x	Q	S	S
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 4					EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA QTDE	
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA					Gerente de Obra	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1					Hh DO DIA	
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3					Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					EFETIVO DO DIA 8 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA: Data: 4/4/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 4/4/2024						




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 5							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO				Gerente de Obra				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				2			
				Calcetairo							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor				3			
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				8			
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 5/4/2024				Data: 5/4/2024							




[Handwritten signature]


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNR 051417303-3


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 129/2023		LICITAÇÃO N° 129/2023		RDO: 6		CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
SEM EXPEDIENTE						Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
													Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Calceiteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
							Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA					0			
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO					QTDE.			
						Veiculo Leve								
						Caminhão MuncK								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
Placa Vibratória														
Data: 6/4/2024		Data: 6/4/2024												



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 7		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
						Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA				0						
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veiculo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 7/4/2024		Data: 7/4/2024										


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 081417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		x				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHORIDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 8		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra					1					
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)		Tec. de Segurança										
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor cinza)		Aux Adm										
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)		Mestre de obra										
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros		Encarregado geral					1					
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro					1					
		Ajudante Geral					2					
		Calçateiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor					3					
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA					8					
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veiculo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 8/4/2024		Data: 8/4/2024										




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RMP 051417303-3

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHORIDADE CONTRATO Nº 129/2023 LICITAÇÃO Nº 129/2023 RDO: 9				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor cinza) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							1
Engenheiro							1				
Tec. de Segurança											
Aux Adm											
Mestre de obra											
Encarregado geral							1				
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
Auxiliar de topografia											
Pedreiro							1				
Ajudante Geral							2				
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor							3				
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							8
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA: Data: 9/4/2024				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
FISCALIZAÇÃO: Data: 9/4/2024											



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 BNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 10						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor cinza) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Celosteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 8 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 10/4/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 10/4/2024						




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 11				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor cinza) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor cinza)				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA 8 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/4/2024				Data: 11/4/2024						




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP-051417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 12		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor cinza) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 6 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 12/4/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 12/4/2024										




[Handwritten signature]

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO Nº 128/2023 LICITAÇÃO Nº 129/2023 RDO: 13						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoeira Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA 0 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/4/2024				Data: 13/4/2024						




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	S	D	X		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 129/2023 LICITAÇÃO Nº 129/2023 RDO: 14		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA										
SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 0 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 14/4/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 14/4/2024										



[Handwritten signature]

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				x								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO Nº 129/2023 LICITAÇÃO Nº 129/2023 RDO: 16								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA				QTDE
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 76mm PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA 8 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 15/4/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 15/4/2024								





 Evaldo Almpida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP-051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO Nº 129/2023 LICITAÇÃO Nº 129/2023 RDO: 16				<table border="1"> <tr> <td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td> </tr> </table>							x								S	T	Q	Q	S	S	D	
				x																						
S	T	Q	Q	S	S	D																				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL																						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE																				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta				MÃO DE OBRA INDIRETA																						
				Gerente de Obra																						
				Engenheiro		1																				
				Tec. de Segurança																						
				Aux Adm																						
				Mestre de obra																						
				Encarregado geral		1																				
				Hh DO DIA																						
				MÃO DE OBRA DIRETA																						
				Topógrafo																						
				Auxiliar de topografia																						
				Pedreiro																						
				Ajudante Geral																						
				Calcetairo																						
				Carpinteiro																						
				Operador de Motosserra																						
				Motorista																						
				Montador																						
				Montador/Eletricista																						
				Eletricista																						
				Operador de Patrol																						
				Operador de Escavadeira																						
				Operador de Pá carregadeira																						
				Motorista de caçamba																						
				Pintor																						
				3																						
				Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																						
				EFETIVO DO DIA		8																				
				JORNADA DE TRABALHO																						
				Hh DO DIA																						
				Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																						
				TIPO		QTDE.																				
				Veículo Leve																						
				Caminhão Munck																						
				Caminhão Toco																						
				Escavadeira																						
				Pá carregadeira																						
				Caçamba																						
				Patrol																						
				PC 200																						
				Placa Vibratória																						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 16/4/2024				Data: 16/4/2024																						





 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0511417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		S	T	Q	Q	S	S	D	x				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE		CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 17					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()							CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA						
Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/sgoto e águas pluviais, d= 75mm PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta							Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
CONSIDERAÇÕES							MÃO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES							Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1						
							RESUMO DO EFETIVO						
							EFETIVO DO DIA 6 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 17/4/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 17/4/2024											






 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 050417303-3


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO Nº 129/2023 LICITAÇÃO Nº 129/2023 RDO: 18				S	T	Q	x	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro			1			
Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/sgoto e aguas pluviais, d= 75mm				Tec. de Segurança						
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				Aux Adm						
TELA DE NYLON, FIO 36-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM				Mestre de obra						
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			1			
				Ajudante Geral			2			
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor			3			
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA			8			
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/4/2024				Data: 18/4/2024						




Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE				S T Q Q S S D						
				CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 19				EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/sgoto e aguas pluviais, d= 75mm PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta				Gerente de Obra						
				Engenheiro				1		
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral				1		
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro				1		
				Ajudante Geral				2		
				Calceiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor				3		
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA				8		
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO				QTDE.		
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/4/2024				Data: 19/4/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 129/2023		LICITAÇÃO N° 128/2023		RDO: 20		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SEM EXPEDIENTE						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceiteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA			0			
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO			QTDE.			
						Veículo Lave						
						Caminhão MuncK						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 20/4/2024		Data: 20/4/2024										




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO Nº 128/2023 LICITAÇÃO Nº 128/2023 RDO: 21		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE						
BIMBIOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
		Gerente de Obra										
		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro										
		Ajudante Geral										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
OBSERVAÇÕES		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
GERENTE DE OBRA:		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 0										
		JORNADA DE TRABALHO										
FISCALIZAÇÃO:		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
GERENTE DE OBRA: Data: 21/4/2024		TIPO										
		QTDE.										
		Veículo Leve										
		Caminhão Muncck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
FISCALIZAÇÃO: Data: 21/4/2024		Patrol										
		PC 200										
Placa Vibratória												

[Handwritten signature]




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				x									
				S	T	Q	Q	S	S	D			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 128/2023 RDO: 22								EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Téc. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro								1	
				Ajudante Geral								2	
				Calcetairo									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor								3	
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA								8	
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTDE.	
				Veiculo Leve									
				Caminhão Muncik									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 22/4/2024				Data: 22/4/2024									


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO Nº 129/2023 LICITAÇÃO Nº 129/2023 RDO: 23				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 76mm PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro			1			
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			1			
				Ajudante Geral			2			
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor			3			
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA			8			
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Muncok						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/4/2024				Data: 23/4/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	S	S	D				
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA CENTRO DA MELHOR IDADE CONTRATO N° 129/2023 LICITAÇÃO N° 129/2023 RDO: 24							EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()											CATEGORIA		QTDE
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											MÃO DE OBRA INDIRETA		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/sgoto e águas pluviais, d= 78mm PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TELA DE NYLON, FIO 36-36 (3,6MM) MALHA 10X10 CM Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta											Gerente de Obra		
											Engenheiro		1
											Tec. de Segurança		
											Aux Adm		
											Mestre de obra		
											Encarregado geral		1
											Hh DO DIA		
											MÃO DE OBRA DIRETA		
											Topografo		
											Auxiliar de topografia		
											Pedreiro		1
											Ajudante Geral		2
											Calceiteiro		
											Carpinteiro		
											Operador de Motosserra		
											Motorista		
											Montador		
											Montador/Eletricista		
											Eletricista		
											Operador de Patrol		
											Operador de Escavadeira		
											Operador de Pá carregadeira		
											Motorista de caçamba		
											Pintor		3
											Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO		
											EFETIVO DO DIA		8
											JORNADA DE TRABALHO		
											Hh DO DIA		
											Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS		
											TIPO		QTDE.
											Veículo Leve		
											Caminhão Munck		
											Caminhão Toco		
											Escavadeira		
											Pá carregadeira		
											Caçamba		
											Patrol		
											PC 200		
											Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 24/4/2024				Data: 24/4/2024									

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – REFORMA DA QUADRA DO CENOS, NO BAIRRO NILTON OLIVEIRA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
24/04/2024	Santaluz	Reforma da Quadra do Colégio CENOS



Foto 01 – REMOÇÃO DE ALAMBRADO FRONTAL



Foto 02 – REMOÇÃO DE ALAMBRADO LATERAL



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
24/04/2024	Santaluz	Reforma da Quadra do Colégio CENOS

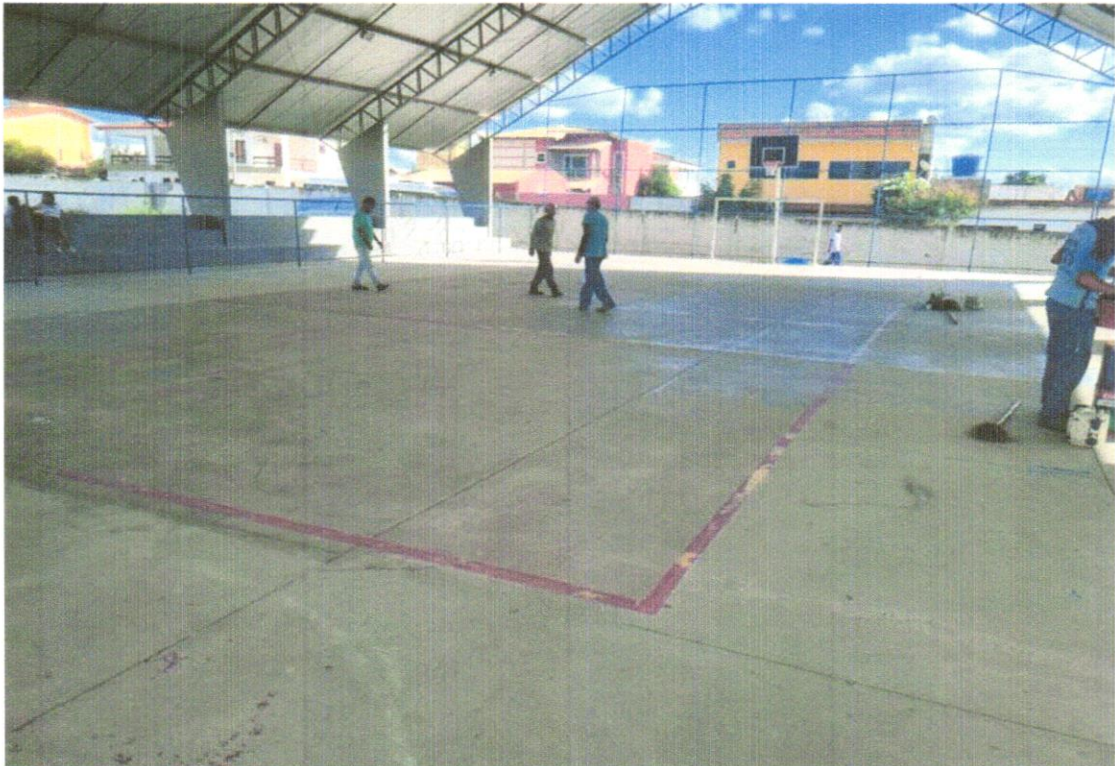


Foto 03 – DEMARCAÇÃO PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA


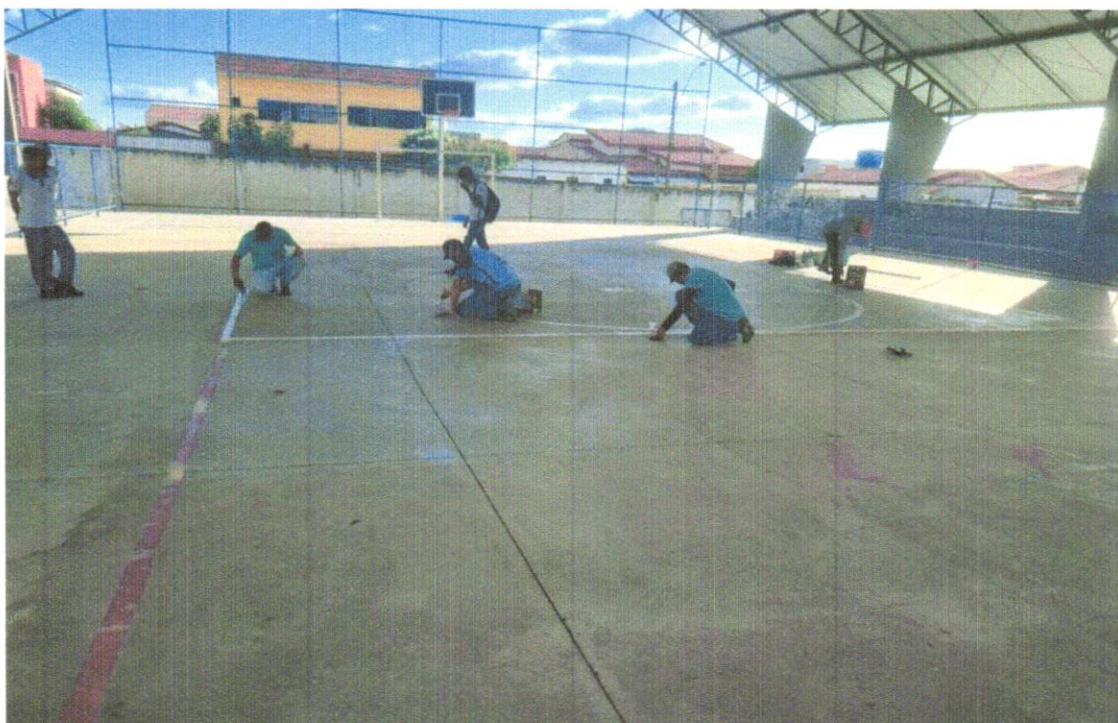


Foto 04 – DEMARCAÇÃO PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
24/04/2024	Santaluz	Reforma da Quadra do Colégio CENOS



Foto 05 – DEMARCAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA



Foto 06 – PINTURA DO PISO E ARQUIBANCADA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
24/04/2024	Santaluz	Reforma da Quadra do Colégio CENOS



Foto 07 – PINTURA DO PISO DA QUADRA



Foto 08 – INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO FUNDO

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP-051417303-3

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
24/04/2024	Santaluz	Reforma da Quadra do Colégio CENOS



Foto 09 – INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO FRONTAL



Foto 10 – INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO LATERAL

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
24/04/2024	Santaluz	Reforma da Quadra do Colégio CENOS



Foto 11 – INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO LATERAL



Foto 12 – INSTALAÇÃO DA REDE DE NYLON



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3
