



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 501 / 2023

Data do Empenho: 09/05/2023

PROCESSO ADM: 132-2022

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR		Nome: 4956 - CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: R DAVID CRUZ,		Bairro: BOMBINHA		Complemento:	
CNPJ: 27.652.801/0001-98		Insc. Estadual:		Cidade: ARACI	
Conta Corrente: 15697-3		Agência: 5094		CPF:	
				RG:	
				Estado: BA	
				Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	628.000,00	600.071,41	27.928,59
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, TOMADA DE PREÇO Nº002-2022, CONTRATO Nº 168-2022, NFS-e.Nº487.

Data do Empenho: 09/05/2023

Data do Liquidação: 09/05/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01C	ISS - PM FONTE 24	18.002,14
2.1.8.8.3.01.02.00.00.12C	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 24	39.604,71
## Quinhentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos ##		57.606,85
		Valor Retido
		Valor Líquido
		542.464,56

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/05/2023	487	UN			600.071,41

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		Valor R\$
Código	Descrição	
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	600.071,41

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3178778



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 132-2022

EMPENHO: 501 / 2023

Data do Empenho: 09/05/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

**FORNECEDOR**

Nome: 4956 - CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: R DAVID CRUZ, BOMBINHA

Bairro: BOMBINHA

CNPJ: 27.652.801/0001-98

Conta Corrente: 15697-3

Insc. Estadual: Agência: 5094

Cidade: ARACI

CPF: Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Complemento:

RG:

Tipo Pessoa: Jurídica

Estado: BA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 002-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	628.000,00	600.071,41	27.928,59
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA, TOMADA DE PREÇO Nº002-2022, CONTRATO Nº 168-2022.


Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	600.071,41	600.071,41

## Seiscentos mil e setenta e um reais e quarenta e um centavos ##

600.071,41

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 09/05/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2023



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422



NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Diretor Contábil  
 Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI  
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
487

Número do Lote  
-

Data e Hora da Emissão  
02/05/2023 às 10:19:41

Código de Verificação  
3488 - 5527 - 3327

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário 00535929  
Razão Social CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Logradouro DAVID CRUZ  
Bairro BOMBINHA  
Município ARACI  
Inscrição Estadual  
Inscrição Municipal 00535929  
CNPJ/CPF 27.652.801/0001-98  
Número 138  
Cep 48.760-000  
UF BA

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
Logradouro AVENIDA AV.GETÚLIO VARGAS  
Bairro CENTRO  
Município SANTALUZ  
Inscrição Estadual  
CNPJ/CPF 13.807.870/0001-19  
Número S/N  
Cep 48.880-000  
UF BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
340	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE À 02ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SANTALUZ (BA). CONFORME CONTRATO Nº 168/2022.	240028,5600	1,0000	0,0000	240028,5600

Valor Total dos Serviços R\$ 240.028,56

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
752	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À 02ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SANTALUZ (BA). CONFORME CONTRATO Nº 168/2022.	360042,8500	1,0000	360042,8500

Valor Total dos Materiais R\$ 360.042,85

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONTRATO Nº 168/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132-2022. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2022. SEGUINDO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

MÃO DE OBRA 40%: R\$ 240.028,56  
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 60%: R\$ 360.042,85  
INSS 4,5% 10.801,28

DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGÊNCIA Nº 5094 - CONTA CORRENTE Nº 15697-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(e)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(e)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

02/05/23

Assinatura

Júlia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000041424

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R\$ 600.071,41

Operação Com lançamentos de materiais  
Optante pelo Simples? Sim  
Atividade 4120400 - Construção de edifícios  
Deduz Materiais? Sim  
Local do Serviço Fora do Município  
Responsável pelo Pagamento do imposto Contratante, tomador do serviço  
Situação da Nota Simples Nacional

Valor Total das Deduções R\$ 360.042,85	Base de Cálculo R\$ 240.028,56	Aliquota % 2,00	Valor do ISS R\$ 4.800,57	Valor Total Retido R\$ 15.601,85
--	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------------

RETENÇÕES

PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 10.801,28	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	-----------------------	------------------	--------------------	----------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota R\$ 584.469,56

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Recebi(emos) do Prestador: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 27.652.801/0001-98  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 487 - emitida em: 02/05/2023 às 10:19:41 com o código de verificação: 3488 - 5527 - 3327

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 360974		CONTRIBUINTE 30176 - CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: DAVID CRUZ				NÚMERO: 138		
COMPLEMENTO:			BAIRRO: BOMBINHA	MUNICÍPIO: ARACI	UF: BA	
C.N.P.J. / CPF: 27.652.801/0001-98		DOCUMENTOS		R.G.:	ORGÃO	
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 600.071,41	Alíquota (%): 3,000	Valor R\$: 18.002,14	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 18.002,14		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/05/2023	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 11/05/2023 04:21:17	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 487 - DATA DE EMISSÃO: 02/05/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	18.002,14		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	18.002,14		

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000180 . 1    02143906202 . 3    30531010500 . 5    00036097412 . 5

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

VIA CONTRIBUINTE



8176000180 . 1    02143906202 . 3    30531010500 . 5    00036097412 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 360974	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 11/05/2023 04:21:17	DATA VENCIMENTO: 31/05/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	18.002,14
CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	18.002,14



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 27.652.801/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 22:11:05 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **A2EB.6CA2.09A1.788B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232013445

RAZÃO SOCIAL	
<b>CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>140.263.815 - BAIXADO</b>	<b>27.652.801/0001-98</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI  
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
SETOR DE TRIBUTOS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA**

Nº de Controle:10459 / 2023

**Contribuinte:** CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 27.652.801/0001-98  
**Zoneamento:** 535929  
**Endereço:** RUA DAVID CRUZ,138 - BOMBINHA 48.760-000 ARACI.

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

**Emissão:** 01/04/2023 às 12:46:13  
**Validade:** 31/05/2023



**Observações:**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.  
Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Código de Autenticidade: 2306 - 7747 - 5038**



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.652.801/0001-98  
**Razão**  
**Social:** CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Endereço:** RUA DAVID CRUZ RUA DAVID CRUZ / BOMBINHA / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2023 a 19/05/2023

**Certificação Número:** 2023042004064114414615

Informação obtida em 02/05/2023 10:24:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.652.801/0001-98  
Certidão n°: 130194/2023  
Expedição: 02/01/2023, às 16:15:41  
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.652.801/0001-98, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/05/2023 11:04:56.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo L1pa7fm0pnV00006.SFP é:

557dc3d2-79ba-4440-ab46-911ab951a896

Transmissor: DENILSON CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI:11459018000172

Inscrição do Transmissor: 11459018000172

Responsável: DENILSON CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 00242774520

Competência: 04/2023

NRA: L1pa7fm0pnV00006

Base de Processamento: Serrinha / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: DENILSON OLIVEIRA DE

Telefone: 007532610252

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 03/05/2023  
 HORA: 11:03:26  
 PÁG : 0001/0009

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO  
 8583300000076 950701802301 507676180824 765280100018

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	COMP: 04/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: 16.444.804/0001-10	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO								DEPÓSITO						
NOME TRABALHADOR								ADMISSÃO						
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA						
MARCO JOAO DA SILVA	3.635,36	0,00	126.01003.17-2	0,00	03/07/2018	01						290,83	07102	0,00
					345,24									

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 3.635,36

0,00  
 345,24  
 290,83

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2023  
HORA: 11:03:26  
PÁG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000076 950701802301 507676180824 765280100018

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO  
LOGRADOURO: RUA DAVID CRUZ 138  
CIDADE: AFACI

Nº ARQUIVO: L1pa7fm0prv0000-6  
INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 16.444.804/0001-10

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
Nº DE CONTROLE: PqtXXCPS9Z00000-8

UF: BA CEP: 48760-000  
BAIRRO: BOMBINHA  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.635,36	0,00	3.635,36	0,00
TOTAIS:	1	3.635,36	0,00	3.635,36	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO  
LOGRADOURO: RUA DAVID CRUZ 138  
CIDADE: ARACI

Nº ARQUIVO: Lipa7fm0pnV0000-6  
INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 16.444.804/0001-10  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
Nº DE CONTROLE: PqtXXCP59Z00000-8

UF: BA CEP: 48760-000 TELEFONE: 0075 9984 9722  
BAIRRO: BOMBINHA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 345.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 345.24  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 10/2018 PERÍODO FINAL:  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 874.03

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 874.03 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
0.00

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS:  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE:

25 ANOS:  
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	S3 :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	X1 :	0	Y :	0	Y1 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2023  
 HORA: 11:03:26  
 PÁG: 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000076 950701802301 507676180824 765280100018

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003

TOMADOR/OBRA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EDNALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	201.04373.47-9	0,00	0,00	01/09/2022	01						
JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA	1.372,00	0,00	162.83096.00-0	0,00	0,00	03/11/2021	01			120,00		07823	0,00
JURANDI AUGUSTO LOPES DE ARAUJO	3.431,06	0,00	126.21862.06-5	0,00	0,00	01/08/2019	01			109,76		07823	0,00
						320,72				274,48		07102	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 6.303,06

0,00

0,00

542,84

504,24

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2023  
HORA: 11:03:26  
PÁG : 0005/0009

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000076 950701802301 507676180824 765280100018

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003

TOMADOR/OBRA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

LOGRADOURO: RUA DAVID CRUZ 138

CIDADE: ARACI

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: L1pa7fm0pnV0000-6

INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

BAIRRO: BOMBINHA

UF: BA

CEP: 48760-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.303,06	0,00	6.303,06	0,00
TOTALS:	3	6.303,06	0,00	6.303,06	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA  
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA  
 LOGRADOURO: RUA DAVID CRUZ 138  
 CIDADE: ARACI

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 N° DE CONTROLE: NWSUBGI01SH0000-5  
 UF: BA CEP: 48760-000 BAIRRO: BOMBINHA  
 TELEFONE: 0075 9984 9722 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: L1pa7fm0pnV0000-6  
 INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

-331.19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:  
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 0.00 COM PRODUÇÃO PF:  
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
 874.03 VALOR A COMPENSAR:  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00  
 VALOR SOLICITADO:  
 -874.03 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
 607.61

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0.00  
 20 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000076 950701802301 507676180824 765280100018

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: A0c6d0ZJvMX0000-3 N° ARQUIVO: L1pa7fm0prnV0000-6  
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA DAVID CRUZ 138 CEP: 48760-000 BAIRRO: BOMBINHA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: ARACI UF: BA REMUNERAÇÃO 13° REMUNERAÇÃO SEM 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	9.938,42	0,00	9.938,42	0,00
TOTALS:	4	9.938,42	0,00	9.938,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2023  
HORA: 11:03:26  
PÁG: 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000076 950701802301 507676180824 765280100018

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A0c6d0ZJvMX0000-3  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: L1pa7fm0pnV0000-6  
INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DAVID CRUZ 138  
CIDADE: ARACI

RAT: 0.0

UF: BA CEP: 48760-000  
BAIRRO: BOMBINHA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%  
9.938,42  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

795,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

795,07

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 03/05/2023  
 HORA: 11:03:26  
 PÁG : 0009/0009

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA  
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A0c6d0zJvMX0000-3  
 SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: L1pa7fm0pnV0000-6  
 INSCRIÇÃO: 27.652.801/0001-98  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DAVID CRUZ 138  
 CIDADE: ARACI

RAT: 0.0

UF: BA CEP: 48760-000 BAIRO: BOMBINHA  
 TELEFONE: 0075 9984 9722  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
 SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE: 14.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 888.08  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 COMPENSAÇÃO 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 874.03 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 874.03 VALOR A COMPENSAR: 0.00

PERÍODO FINAL: 874.03 VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 874.03 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 607.61

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y :	0



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**21.763.372/0001-40**

Razão Social  
**RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Abril/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.16.23123.3527573-0**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000129799163**

Valor Total do Documento

**5.156,77**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.801,17			3.801,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	330,00			330,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.011.21009/71	891,83			891,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.011.21009/71	133,77			133,77
<b>Totais</b>		<b>5.156,77</b>			<b>5.156,77</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 13:48:55

85830000051 3 56770385231 3 39071623123 3 35275730140 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000051 3 56770385231 3 39071623123 3 35275730140 3



CNPJ: 21.763.372/0001-40  
Número: 07.16.23123.3527573-0  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 5.156,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.04  
4171804171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RIBEIRO A E E LTDA ME  
AGENCIA: 4171-8 CONTA: 10.495-7  
EFETUADO POR: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIB

\*\*\*\*\*  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000051-3 56770385231-3  
39071623123-3 35275730140-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 03/05/2023

Numero do Documento 07.16.23123.3527573-0

Valor Total 5.156,77

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 050304

AUTENTICACAO SISBB:

9.2D8.39F.BA8.B31.44E

MINISTERIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	27.652.801/0001-98
Nome	CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	51267763 / Reinf CP 19563928880 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 874,03	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 874,03	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
CPF	069.656.835-70
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/05/2023 10:48:36
Nº do recibo de entrega	0000050000129680269

MINISTERIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	27.652.801/0001-98
----------------------	-------------------------------------	------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DAVID CRUZ	Número	138
Complemento	-	Bairro/Distrito	BOMBINHA
Município	Araci	UF	BA
CEP	48760000	Telefone	7599369615
Correio Eletrônico	PREMIUM.EMPREENDIMENTOS98@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO	CPF	06965683570
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO		
CPF	06965683570	CRC	-
UF	-	Telefone	75998497222
Correio Eletrônico	PREMIUM.EMPREENDIMENTOS98@GMAIL.COM		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	874,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 874,03		
Saldo a Pagar	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ  
LOCAL: SANTA LUZ - BAHIA

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.

N.º DA MEDIÇÃO: 02

TOMADA DE PREÇO: Nº 002/2022

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 08/09/2022 A 02/05/2023

02/05/2023

DATA DA MEDIÇÃO:

CONTRATO N.º 168/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.746.178,11

VALOR DA MEDIÇÃO: 600.871,41

INÍCIO DA OBRA: 22/06/2022

VALOR ACUMULADO: 17.113,06

VALOR ACUMULADO: 548.344,81

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	% EXECUTADO
			QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	MED. ANTERIOR	MED. PERÍODO	MED. ACUMULADA		
<b>01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - SEDE</b>				<b>17.466.178,11</b>			<b>600.871,41</b>	<b>797.833,60</b>	<b>54,81</b>
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
01.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	481,70	2.890,20	-	-	-	2.890,20	-
01.01.02	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	m²	19,36	1.043,25	20.218,19	-	-	-	20.218,19	-
01.01.03	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE PRESSÃO AF_ 04/2019	m²	6.658,78	1,78	11.852,63	-	-	-	11.852,63	-
01.01.04	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,07	32,56	7.816,68	-	-	-	7.816,68	-
01.01.05	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	113,66	8.183,52	-	-	-	8.183,52	-
	<b>SUB TOTAL ITEM 01.01</b>				<b>50.981,22</b>				<b>50.981,22</b>	
<b>01.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO</b>									
01.02.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_ 11/2019	m²	6.686,78	2,57	17.113,06	-	-	-	17.113,06	-
01.02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR -RODOVIA PAVIMENTADA	lkm	3.000,36	1,52	4.560,58	-	-	-	4.560,58	-
01.02.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	m³	332,94	1.450,91	483.065,98	-	-	-	483.065,98	-
01.02.04	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMICA DE 6 6 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA	lkm	125,451,42	1,06	132.878,51	-	-	-	132.878,51	-
	<b>SUB TOTAL ITEM 01.02</b>				<b>637.716,13</b>				<b>637.716,13</b>	
<b>01.03</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									
01.03.01	PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_ 05/2021	M	2.674,17	4,84	12.942,98	-	-	-	12.942,98	-
01.03.02	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DENÍMOS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - R1	m²	89,25	23,80	2.124,15	-	-	-	2.124,15	-
01.03.03	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UND.	17,00	117,50	1.997,50	-	-	-	1.997,50	-
	<b>SUB TOTAL ITEM 01.03</b>				<b>17.064,63</b>				<b>17.064,63</b>	
<b>02.01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - DISTRITO DO PEREIRA</b>									
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
02.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	481,70	2.890,20	6,00	2.890,20	2.890,20	2.890,20	100,00
02.01.02	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	m²	14,52	1.043,25	15.147,99	-	-	-	15.147,99	-
02.01.03	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE PRESSÃO AF_ 04/2019	m²	9.451,41	1,78	16.823,51	9.451,41	7.732,70	9.090,81	16.823,51	100,00
02.01.04	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,08	32,56	7.817,00	240,08	3.592,67	4.224,33	7.817,00	100,00
02.01.05	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	113,66	8.183,52	72,00	3.761,01	4.422,51	8.183,52	100,00
	<b>SUB TOTAL ITEM 02.01</b>				<b>50.882,22</b>		<b>17.976,58</b>	<b>17.737,65</b>	<b>35.714,23</b>	<b>70,22</b>
<b>02.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO</b>									
02.02.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_ 11/2019	m²	9.451,41	2,57	24.290,12	9.451,41	11.164,62	13.125,50	24.290,12	100,00
02.02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR -RODOVIA PAVIMENTADA	lkm	5.696,36	1,52	8.658,47	5.696,36	3.979,74	2.741,99	6.121,73	77,63
02.02.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	m³	472,57	1.450,91	685.656,54	472,57	315.152,16	370.504,38	685.656,54	100,00



# PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

EMPRESA: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	N.º DA MEDIÇÃO: 02	TOMADA DE PREÇO: Nº 010/2022
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 08/09/2022 A 02/05/2023	DATA DA MEDIÇÃO: 02/05/2023	CONTRATO N.º 169/2022
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.746.178,11	VALOR DA MEDIÇÃO: 600.071,41	INÍCIO DA OBRA: 22/06/2022
	VALOR ACUMULADO: 948.344,51	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	% EXECUTADO		
			QUANT.	VALOR UNIT.	MED. ANTERIOR	MED. PERÍODO	MED. ANTERIOR	MED. PERÍODO			MED. ACUMULADA	
02.02.04	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 m³ - ROBOVIA PAVIMENTADA	km	238,175,62	1,06	252.466,05	184.869,71	184.869,71	-	195.961,89	58.440,50	77,62	
			SUB TOTAL ITEM 02.02		971.071,18			330.296,52	582.333,76	912.830,28	58.440,50	93,98

01.03 SINALIZAÇÃO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	% EXECUTADO	
			QUANT.	VALOR UNIT.	MED. ANTERIOR	MED. PERÍODO	MED. ANTERIOR	MED. PERÍODO			
01.03.01	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA, AF. 05/2021	M	3.282,84	4,84	15.743,75	-	-	-	-	15.743,75	-
01.03.02	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMAGOS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - R1	m²	17,10	23,80	406,98	-	-	-	-	406,98	-
01.03.03	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UNID.	20,00	117,50	2.350,00	-	-	-	-	2.350,00	-
			SUB TOTAL ITEM 01.03		18.500,73					18.500,73	

TOTAL GERAL:				1.746.178,11	FISCALIZAÇÃO - COMISSÃO		348.273,10	600.071,41	948.344,51	797.833,60	54,31
EMPRESA RESP. PELA EXECUÇÃO: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI											
				FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ							

  
 Antônio Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 0519474588

  
 Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
 Sócio Administrador

  
 Jiliana Araújo  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 300041424



# PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

## DECLARAÇÃO DE DESENOREÇÃO DA FOLHA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, nº 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia. Declara que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, A empresa faz parte da **DESONERAÇÃO DE FOLHA**, conforme - As atividades enquadradas no regime de recolhimento da desoneração da folha de pagamento tem retenção de **4,5% de INSS** sobre os serviços prestados, mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, de acordo com o artigo 7º, § 6º, c/c o artigo 8º, § 5º, ambos da Lei nº 12.546/2011.

Araci/BA, 02 de MAIO de 2023.

**CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 069.656.835-70

RG 15.160.413-48



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.652.801/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUPREMIUM EM PREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PREMIUM CONSTRUTORA E EM PREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DAVID CRUZ	NÚMERO 138	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO BOM BINHA	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
-------------------	------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PREMIUM.EMPREENDIMENTOS98@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 9936-9615
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/05/2023 às 10:23:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.652.801/0001-98</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>03/05/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUPREMIUM EM PREENDIMENTOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DAVID CRUZ</b>	NÚMERO <b>138</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>48.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOMBINHA</b>	MUNICÍPIO <b>ARACI</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PREMIUM.EMPREENDIMENTOS98@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(75) 9936-9615</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/05/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/05/2023** às **10:23:24** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 02**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO	CONVÊNIO Nº
02/05/2023	SANTA LUZ/BA	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ	6.036.00/2021

Foto 1



Foto 2



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Júlia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000841824

Foto 3



Foto 4



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586


  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Júlia Karjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 300041124

Foto 5



Foto 6

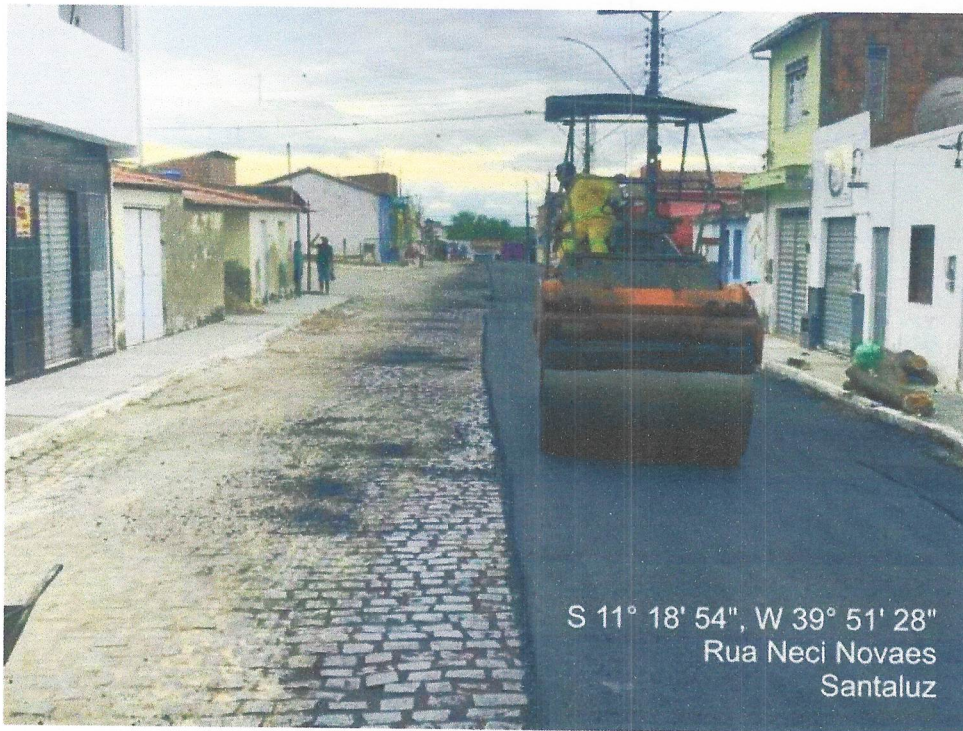

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Socio Administrador

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586


  
Júlia Vainão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 30004-1/024





**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Foto 7

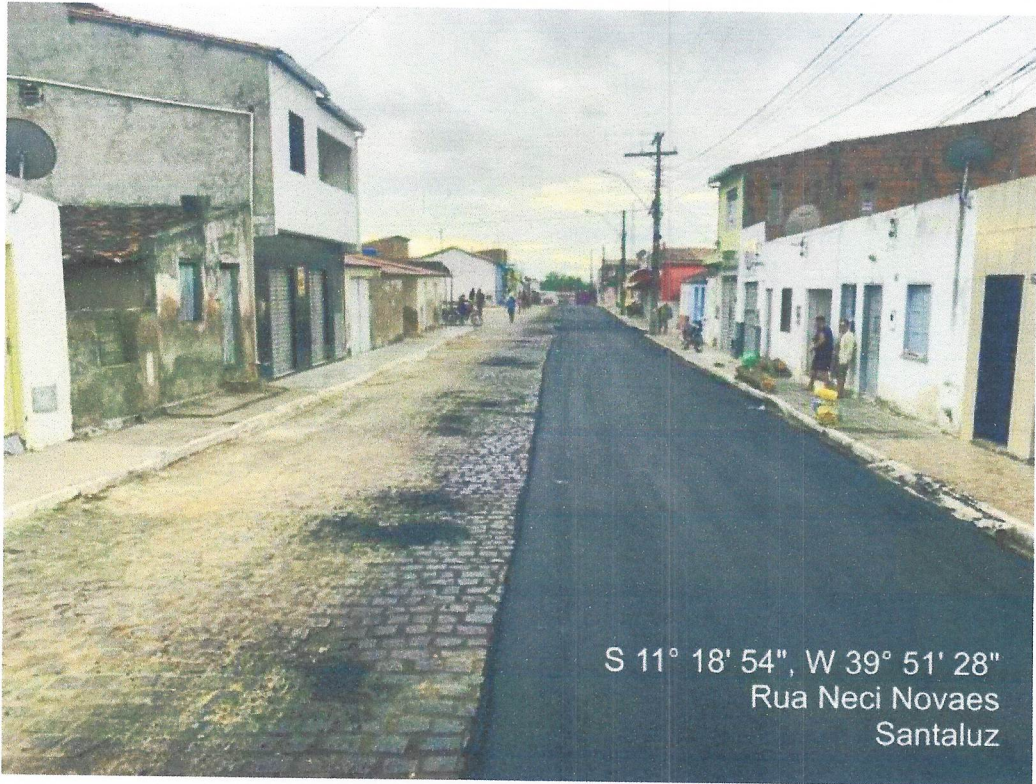

S 11° 18' 54", W 39° 51' 28"  
Rua Neci Novaes  
Santaluz

Foto 8



S 11° 18' 54", W 39° 51' 28"  
Rua Neci Novaes  
Santaluz

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Júlia Karjão  
Engenheira Civil  
CREA N° 0000000011024

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA N° 0519474586


  
 Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
 Sócio Administrador

  
 Júlia Varjão  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 100041104

Foto 13



Foto 14

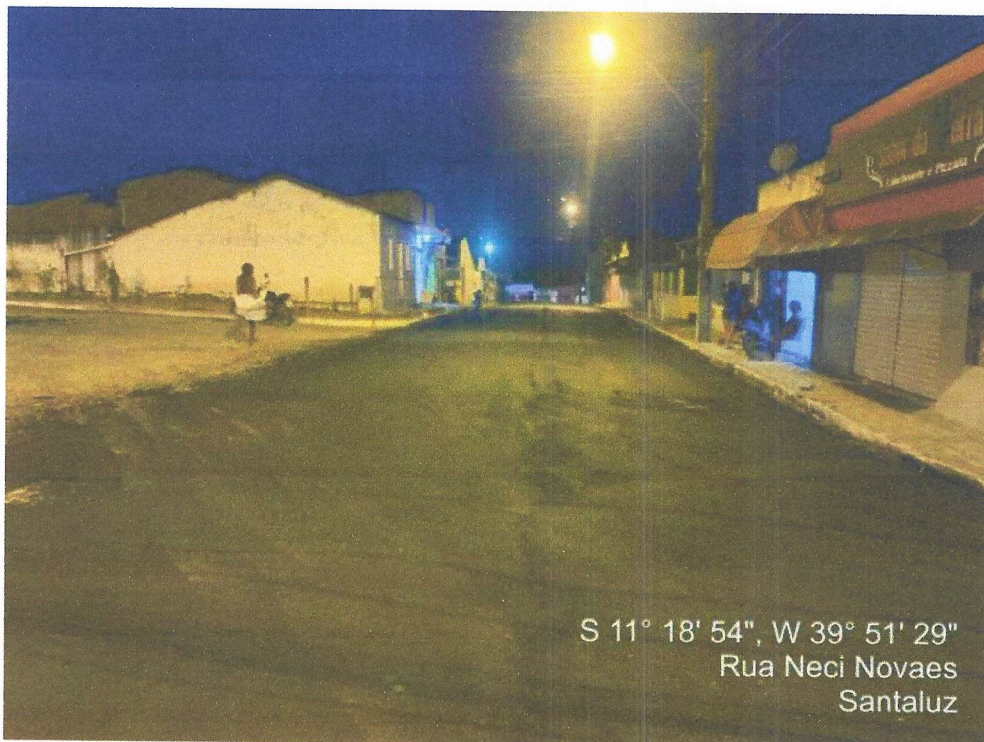

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREANº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Socio Administrador

  
Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA Nº 300041124

Foto 15



Foto 16



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Júlia Varião  
Engenheira Civil  
CREA Nº 3000841424

Foto 17



Foto 18



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Socio Administrador

  
Júlia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 201941424



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Foto 19



Foto 20



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

  
Pedro Henrique Santos de Carvalho  
Socio Administrador

  
Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BN 30067534

Foto 21



Foto 22



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Varião  
Engenheira Civil  
CREA-BA Nº 0519474586



Foto 23



Foto 24



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Socio Administrador

  
Júlia Varião  
Engenheira Civil  
CREA-BA 300000004

Foto 25



Foto 26



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Varião  
Engenheira Civil  
CREA-BA 30004424

Foto 27



Foto 28



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Variação  
Engenheira Civil  
CREA-BA 2008/1424



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Foto 29



Foto 30



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Socio Administrador

  
Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 330641424




**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Foto 31



Foto 32

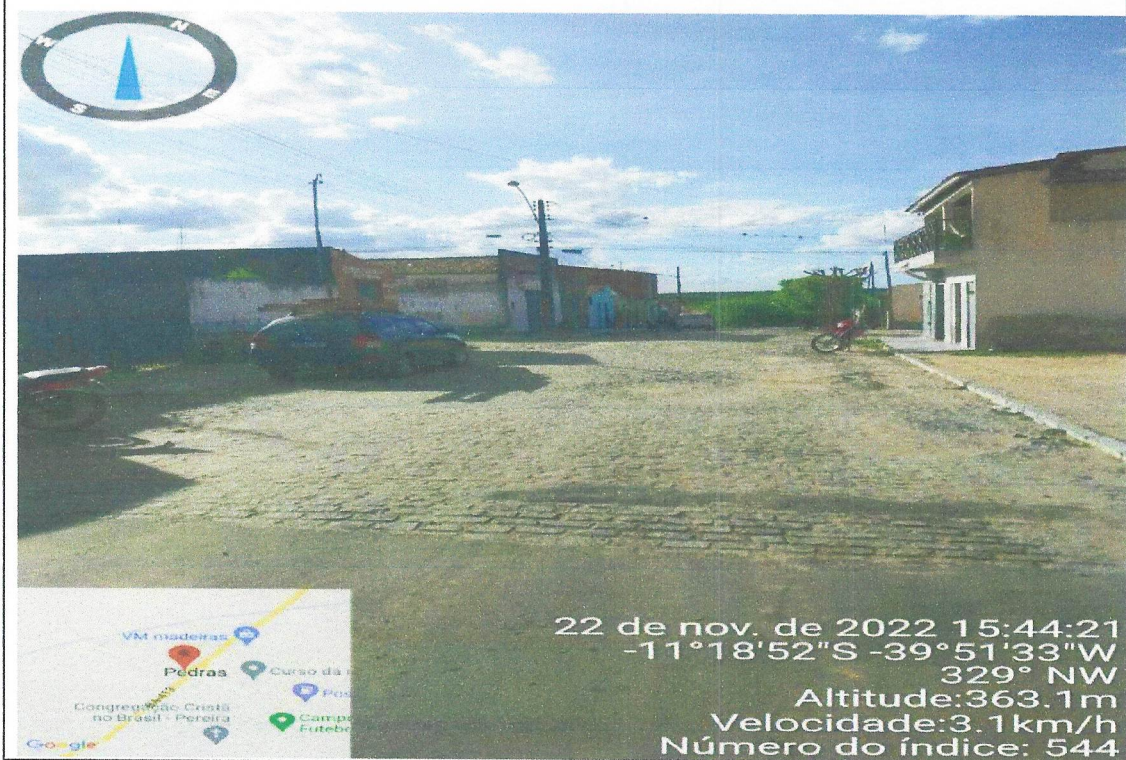

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Santos de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Varião  
Engenheira Civil  
CREA-BA 30004/2024

Foto 33



Foto 34



  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 0519474586

  
 Pedro Henrique Santos de Carvalho  
 Sócio Administrador

  
 Julia Vando  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 390641-1/24



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Foto 35



Foto 36



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Socio Administrador

  
Júlia Vazão  
Engenheira Civil  
CREA BA 30004/1124



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Foto 37



Foto 38



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Santos de Carvalho  
Socio Administrador

  
Julia Vaz  
Engenheira Civil  
CREA-BA 110094124





**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Foto 39



Foto 40



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Varição  
Engenheira Civil  
CREA-BA 30004/1424

Foto 41



22 de nov. de 2022 15:39:36  
 -11°18'55"S -39°51'35"W  
 237° SW  
 Altitude:370.4m  
 Velocidade:0.0km/h  
 Número do índice: 536

Foto 42



22 de nov. de 2022 15:47:06  
 -11°18'50"S -39°51'31"W  
 251° W  
 Altitude:361.6m  
 Velocidade:0.0km/h  
 Número do índice: 556

  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 0519474586

  
 Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
 Sócio Administrador

  
 Julia Marjão  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 5000841424

Foto 43



Foto 44



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Socio Administrador

  
Julia Araújo  
Engenheira Civil  
CREA-BA 3000941424

Foto 43



Foto 44



  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 0519474586


  
 Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
 Sócio Administrador

  
 Júlia Varjão  
 Engenheira Civil  
 CREA-BR 5000841424

Foto 45



Foto 46

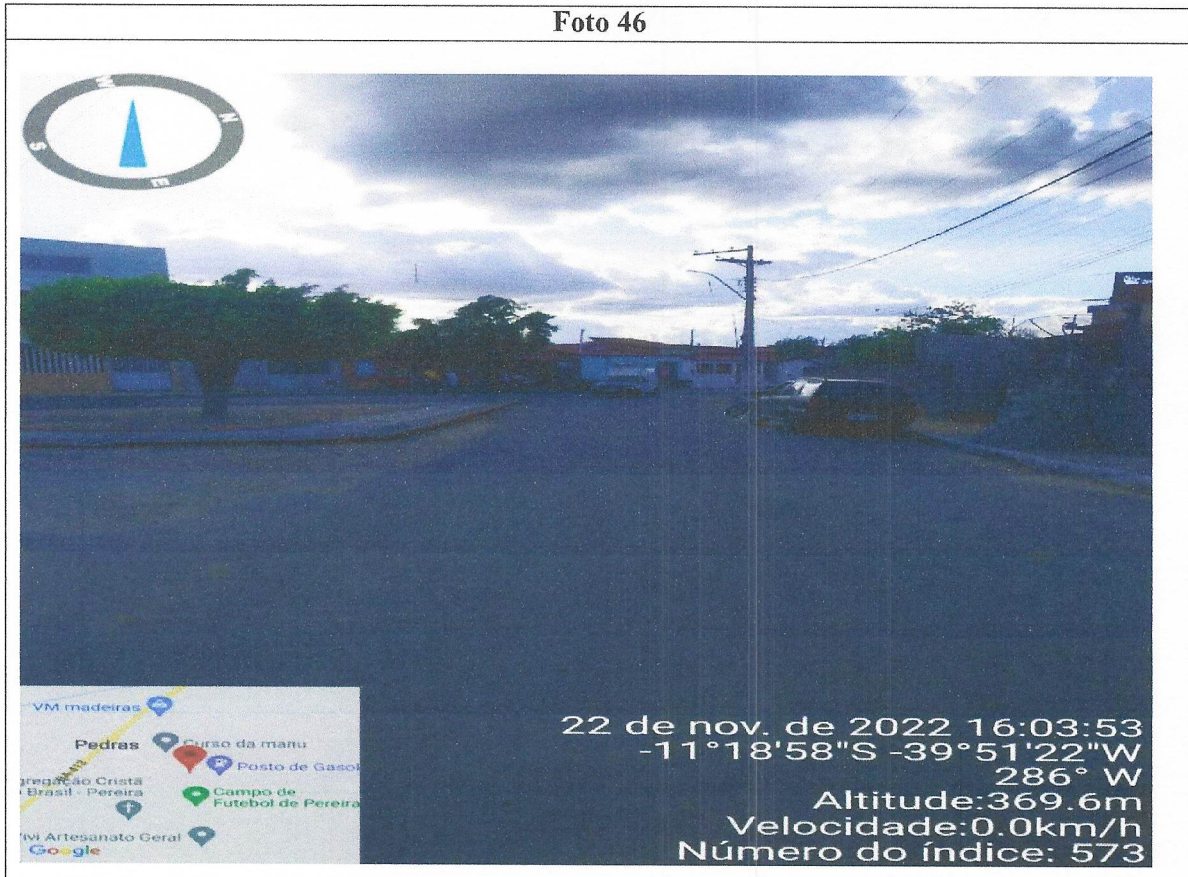

  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA N° 0519474586

  
 Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
 Sócio Administrador

*Júlia Varjão*  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 300841424



Foto 47



22 de nov. de 2022 15:39:48  
-11°18'55"S -39°51'35"W  
55° NE  
Altitude:370.4m  
Velocidade:0.0km/h  
Número do índice: 537

Foto 48



22 de nov. de 2022 16:03:22  
-11°18'59"S -39°51'22"W  
332° NW  
Altitude:370.2m  
Velocidade:0.0km/h  
Número do índice: 572

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Júlia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 30064/2014

Foto 49



Foto 50



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREAN° 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

*Júlia Varjão*  
Engenheira Civil  
CREA-BA 300861424

Foto 51



Foto 52



  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 0519474586

  
 Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
 Sócio Administrador

*Júlia Varjão*  
 Engenheira Civil  
 CREA-BR 1250041124



Foto 53



Foto 54



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Júlia Varição  
Engenheira Civil  
CREA-BA 30004/2024



Foto 55



22 de nov. de 2022 15:45:22  
-11°18'51"S -39°51'32"W  
251° W  
Altitude:367.6m  
Velocidade:0.0km/h  
Número do índice: 549

Foto 56



22 de nov. de 2022 15:43:50  
-11°18'52"S -39°51'33"W  
68° E  
Altitude:373.6m  
Velocidade:3.7km/h  
Número do índice: 543

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586


  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BR 3000841124

Foto 57



Foto 58

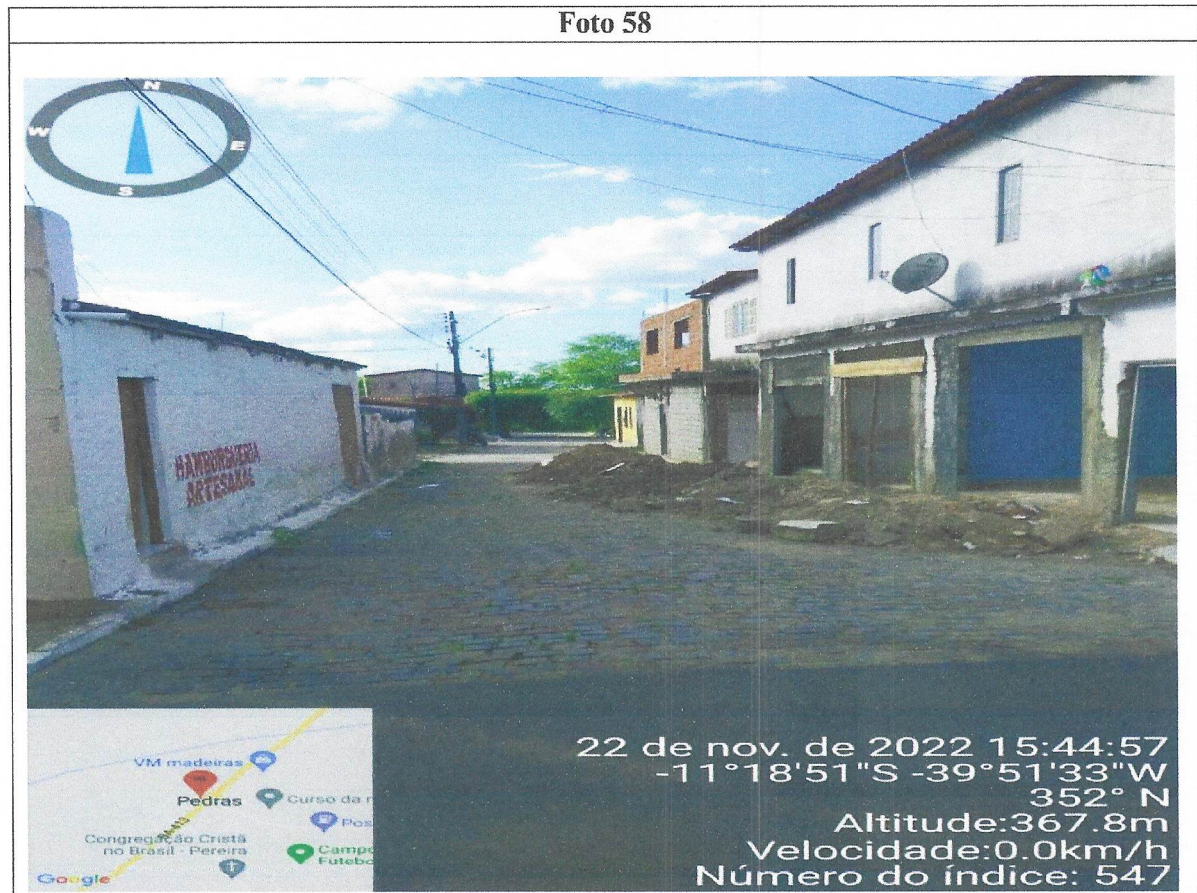

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Varião  
Engenheira Civil  
CREA-BA 1590041424

Foto 59



Foto 60



  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 0519474586

  
 Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
 Sócio Administrador

  
 Julia Varjão  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 506841424

Foto 61



Foto 62



  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 0519474586

  
 Pedro Henrique Dias de Carvalho  
 Sócio Administrador

*Julia Vazão*  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 386.004/1424

Foto 63



Foto 64



  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586


  
Pedro Henrique Damtas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Júlia Varião  
Engenheira Civil  
CREA-BR 12090841024

Foto 65



Foto 66

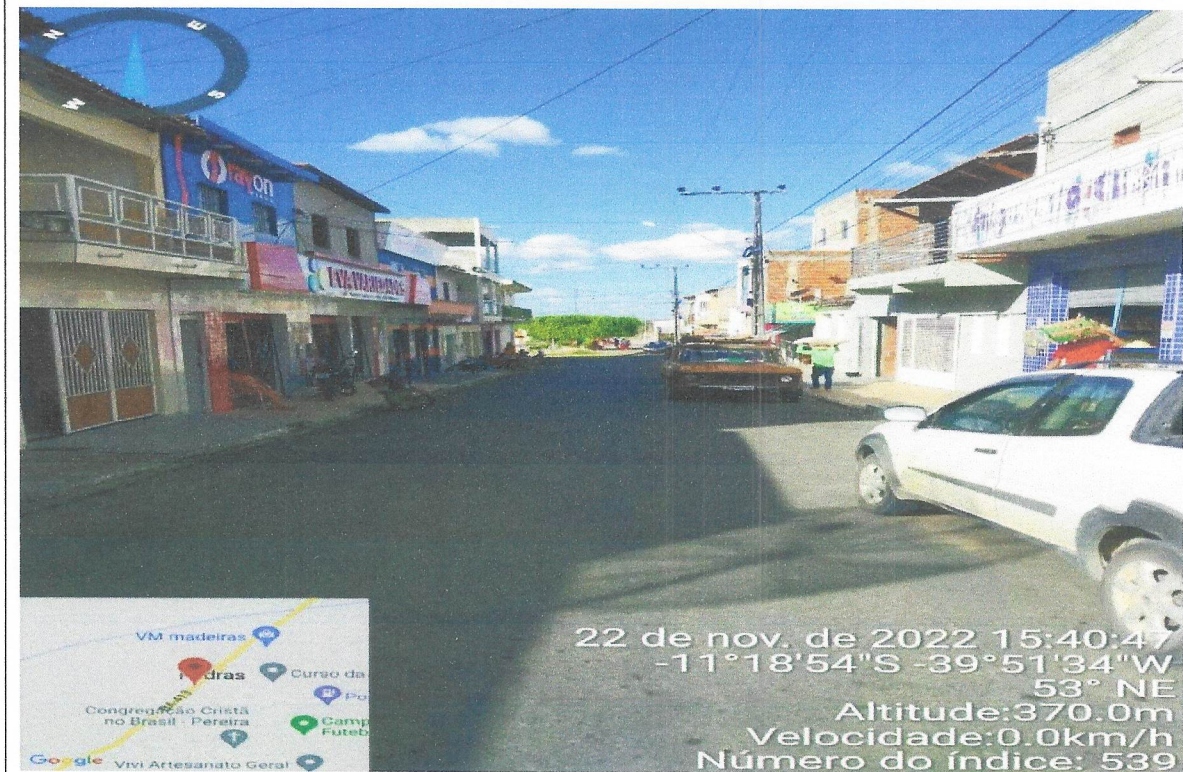

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

  
Julia Varjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 100041124

Foto 67



  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS PREMIUM  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador


  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

  
Júlia Karjão  
Engenheira Civil  
CREA-BA 7000841424






**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 09/09/22
CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli		FOLHA N° : 01/22	
		PRAZO	
FISCAL:		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação, Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ</u>		
Engenheiro 01			
Encarregado 01			
Op.			
Acabadora 01			
Rolista 01			
Imprimador 01			
Motorista 10			
Rasteleiro 04			
Servente 08			
TOTAL	27	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	09/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 10/09/22	<b>FOLHA N° :</b> 02/22
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>PRAZO</b>		
<b>FISCAL:</b>		<b>DECORRIDO</b>	<b>RESTANTE</b>	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL	
<b>PESSOAL DE OBRA</b>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ</u>			
Engenheiro 01				
Encarregado 01				
Op.				
Acabadora 01				
Rolista 01				
Imprimador 01				
Motorista 10				
Rasteleiro 04				
Servente 08				
<b>TOTAL</b> 27	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>				
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>				
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>	
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil	10/09/ 2022	

CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 11/09/22

FOLHA Nº : 03/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação.  
Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil

DATA

11/09/2022

CREA Nº 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 12/09/22

FOLHA N° : 04/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície. Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

DATA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

12/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 13/09/22

FOLHA N° : 05/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO


DATA

/ /

CONTRATADA

DATA

13/09/ 2022

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil

CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 14/09/22

FOLHA N° : 06/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação, Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

DATA

14/09/ 2022



**PREMIUM**  
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 15/09/22

FOLHA Nº : 07/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação.  
Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

DATA

15/09/ 2022

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 16/09/22

FOLHA N° : 08/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação.  
Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

DATA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

16/09/ 2022





**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

**LOCAL:** Santaluz - Bahia

**DATA:** 17/09/22

**FOLHA N°:** 09/22

**CONTRATADA:** Construpremium Empreendimentos Eireli

**PRAZO**

DECORRIDO

RESTANTE

**FISCAL:**

**TEMPO**

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

**PESSOAL DE OBRA**

Engenheiro 01  
 Encarregado 01  
 Op.  
 Acabadora 01  
 Rolista 01  
 Imprimador 01  
 Motorista 10  
 Rasteleiro 04  
 Servente 08

TOTAL

**SERVIÇOS INICIADOS:**

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

~~SERVIÇOS CONCLUÍDOS:~~

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

**FISCALIZAÇÃO**

**DATA**

**CONTRATADA**

**DATA**

/ /

*Andressa Santos de Oliveira*  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil

17/09/2022

CREA Nº 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 18/09/22

FOLHA N°: 10/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação.  
Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /


CONTRATADA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

DATA


18/09/2022



DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 19/09/22
CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli		FOLHA Nº : 11/22	
		PRAZO	
FISCAL:		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b>	<u>Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação.</u> <u>Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ</u>	
Engenheiro 01			
Encarregado 01			
Op.			
Acabadora 01			
Rolista 01			
Imprimador 01			
Motorista 10			
Rasteleiro 04			
Servente 08			
TOTAL	27	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	DATA	<b>CONTRATADA</b>	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	19/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 20/09/22
CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli		FOLHA N° : 12/22	
FISCAL:		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ</u>		
Engenheiro 01			
Encarregado 01			
Op.			
Acabadora 01			
Rolista 01			
Imprimador 01			
Motorista 10			
Rasteleiro 04			
Servente 08			
TOTAL	27	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	DATA	<b>CONTRATADA</b>	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	20/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 21/09/22 FOLHA N° : 13/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação, Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO


DATA

/ /

CONTRATADA

DATA

21/09/ 2022

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 22/09/22

FOLHA N° : 14/22

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

DATA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

22/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 23/09/22 FOLHA Nº : 15/22

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

DATA

23/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 24/09/22 FOLHA N° : 16/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil

DATA

24/09/ 2022

CREA N° 0519474586





**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 25/09/22

FOLHA N° : 17/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação.  
Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

DATA

25/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 26/09/22

FOLHA N° : 18/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

DATA

26/09/ 2022

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 27/09/22

FOLHA Nº : 19/22

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação, Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

DATA

27/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 28/09/22 FOLHA Nº : 20/22

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação.  
Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

DATA

28/09/ 2022



**PREMIUM**  
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 29/09/22 FOLHA N° : 21/22

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

REstante

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil

DATA

29/09/ 2022

CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 30/09/22

FOLHA N° : 22/22

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro	01
Encarregado	01
Op.	
Acabadora	01
Rolista	01
Imprimador	01
Motorista	10
Rasteleiro	04
Servente	08

TOTAL 27

#### SERVIÇOS INICIADOS:

Execução da limpeza da superfície, Pintura de ligação. Transporte do CBUQ e espalhamento do CBUQ

#### ~~SERVIÇOS CONCLUÍDOS:~~

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

/ /

CONTRATADA

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil


DATA

30/09/ 2022

CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREHEITADORA

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 04/10/2022
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 04/31	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro 01 Encarregado 01 Op. Acabadora 01 Rolista 01 Imprimador 01 Motorista 10 Rasteleiro 04 Servente 08  TOTAL 27		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	
		<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL	
<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> Não houve serviço prestado.			
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	04/10/2022



PREMIUM

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 05/10/2022 FOLHA N° : 05/31

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli PRAZO DECORRIDO RESTANTE

FISCAL: TEMPO OPERÁVEL NÃO OPERÁVEL

Table with personnel list: Engenheiro 01, Encarregado 01, Op., Acabadora 01, Rolista 01, Imprimador 01, Motorista 10, Rasteleiro 04, Servente 08, TOTAL 27

SERVIÇOS INICIADOS: Não houve serviço prestado. SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRENCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO DATA CONTRATADA DATA

Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586

05/10/2022





**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

**DIÁRIO DE OBRA**

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 06/10/2022	<b>FOLHA N°:</b> 06/31
--	--------------------------------	-------------------------	------------------------

<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreendimentos Eireli	<b>PRAZO</b>	
	DECORRIDO	RESTANTE

<b>FISCAL:</b>	<b>TEMPO</b> <input type="checkbox"/> OPERÁVEL <input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
----------------	---

PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS: <u>Não houve serviço prestado.</u>
Engenheiro <u>01</u>	
Encarregado <u>01</u>	
Op.	
Acabadora <u>01</u>	
Rolista <u>01</u>	
Imprimador <u>01</u>	
Motorista <u>10</u>	
Rasteleiro <u>04</u>	
Servente <u>08</u>	
<b>TOTAL</b> <u>27</u>	
	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b> 06/10/2022
---------------------	--------------------	-------------------	---------------------------

  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA N° 0519474586



PREMIUM  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 07/10/2022
CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli		FOLHA Nº : 07/31	
FISCAL:		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
PESSOAL DE OBRA		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
Engenheiro	01	SERVIÇOS INICIADOS: <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Encarregado	01		
Op.			
Acabadora	01		
Rolista	01		
Imprimador	01		
Motorista	10		
Rasteleiro	04		
Servente	08		
TOTAL	27	SERVIÇOS CONCLUÍDOS: _____	
OGORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	07/10/2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

**DIÁRIO DE OBRA**

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 08/10/2022	<b>FOLHA N°:</b> 08/31
--	--------------------------------	-------------------------	------------------------

<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli	<b>PRAZO</b>	
	DECORRIDO	RESTANTE

<b>FISCAL:</b>	<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
----------------	-----------------------------------	---------------------------------------

PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:
Engenheiro 01	<u>Não houve serviço prestado.</u>
Encarregado 01	
Op.	
Acabadora 01	
Rolista 01	
Imprimador 01	
Motorista 10	
Rasteleiro 04	
Servente 08	
<b>TOTAL</b> 27	
	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	08/10/2022



PREMIUM

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 09/10/2022
		<b>FOLHA N°:</b> 09/31	
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>PRAZO</b>	
		<b>DECORRIDO</b>	<b>RESTANTE</b>
<b>FISCAL:</b>		<b>TEMPO</b>	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>		
Engenheiro 01			
Encarregado 01			
Op.			
Acabadora 01			
Rolista 01			
Imprimador 01			
Motorista 10			
Rasteleiro 04			
Servente 08			
<b>TOTAL</b> 27	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>		
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	09/10/2022



DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 10/10/2022	<b>FOLHA N°:</b> 10/31
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreendimentos Eireli		PRAZO	
<b>FISCAL:</b>		DECORRIDO	RESTANTE
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	TEMPO <input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro    01 _____ Encarregado   01 _____ Op. _____ Acabadora     01 _____ Rolista        01 _____ Imprimador    01 _____ Motorista      10 _____ Rasteleiro     04 _____ Servente       08 _____  <b>TOTAL</b> 27    _____	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>OCORRÊNCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	DATA  / /	<b>CONTRATADA</b>	DATA  10/10/2022

  
 Andressa Santos de Oliveira  
 Engenheira Civil  
 CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
ENGENHARIA

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.      **LOCAL:** Santaluz - Bahia      **DATA:** 11/10/2022      **FOLHA N°:** 11/31

**CONTRATADA:** Construpremium Empreedimentos Eireli      **PRAZO**  
**DECORRIDO**      **RESTANTE**

**FISCAL:**       **OPERÁVEL**       **NÃO OPERÁVEL**

PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS INICIADOS: <u>Não houve serviço prestado.</u>
Engenheiro	01	
Encarregado	01	
Op.		
Acabadora	01	
Rolista	01	
Imprimador	01	
Motorista	10	
Rasteleiro	04	
Servente	08	
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FISCALIZAÇÃO**      **DATA**      **CONTRATADA**      **DATA**

   / /                               11/10/2022

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586



PREMIUM

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 12/10/2022 FOLHA N° : 12/31

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli PRAZO DECORRIDO RESTANTE

FISCAL: TEMPO OPERÁVEL NÃO OPERÁVEL

Table with personnel list: Engenheiro 01, Encarregado 01, Op., Acabadora 01, Rolista 01, Imprimador 01, Motorista 10, Rasteleiro 04, Servente 08, TOTAL 27

SERVIÇOS INICIADOS: Não houve serviço prestado. SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRENCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO DATA CONTRATADA DATA

Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 13/10/2022
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreendimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 13/31	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Engenheiro	<u>01</u>		
Encarregado	<u>01</u>		
Op.			
Acabadora	<u>01</u>		
Rolista	<u>01</u>		
Imprimador	<u>01</u>		
Motorista	<u>10</u>		
Rasteleiro	<u>04</u>		
Servente	<u>08</u>		
<b>TOTAL</b>	<u>27</u>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	13/10/2022





PREMIUM

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 14/10/2022 FOLHA N° : 14/31

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO	
DECORRIDO	RESTANTE

FISCAL:

TEMPO	
<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL

PESSOAL DE OBRA

Engenheiro	01
Encarregado	01
Op.	
Acabadora	01
Rolista	01
Imprimador	01
Motorista	10
Rasteleiro	04
Servente	08
TOTAL	27

SERVIÇOS INICIADOS: Não houve serviço prestado.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS: \_\_\_\_\_

OCORRENCIAS DIÁRIAS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	14/10/2022



PREMIUM

### DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.				<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 15/10/2022	<b>FOLHA N°:</b> 15/31
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli			<b>PRAZO</b>			
			DECORRIDO	RESTANTE		
<b>FISCAL:</b>			<input type="checkbox"/> OPERÁVEL		TEMPO <input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL	

<p><b>PESSOAL DE OBRA</b></p> <p>Engenheiro <u>01</u></p> <p>Encarregado <u>01</u></p> <p>Op. _____</p> <p>Acabadora <u>01</u></p> <p>Rolista <u>01</u></p> <p>Imprimador <u>01</u></p> <p>Motorista <u>10</u></p> <p>Rasteleiro <u>04</u></p> <p>Servente <u>08</u></p> <p>TOTAL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span></p>	<p><b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	--

<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	

<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	

<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	15/10/2022




PREMIUM

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 16/10/2022
CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli		FOLHA N° : 16/31	
FISCAL:		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro 01 Encarregado 01 Op. Acabadora 01 Rolista 01 Imprimador 01 Motorista 10 Rasteleiro 04 Servente 08  TOTAL 27		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> Não houve serviço prestado.    <b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	16/10/2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 17/10/2022
CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli		PRAZO	
		DECORRIDO	REstante
FISCAL:		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro <u>01</u> Encarregado <u>01</u> Op. Acabadora <u>01</u> Rolista <u>01</u> Imprimador <u>01</u> Motorista <u>10</u> Rasteleiro <u>04</u> Servente <u>08</u>  TOTAL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>           <b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____		
<del>OCORRENCIAS DIÁRIAS</del> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<del>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</del> _____ _____ _____ _____ _____ _____			
FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	17/10/2022



PREMIUM

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 18/10/2022 FOLHA N° : 18/31

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

SERVIÇOS INICIADOS: Não houve serviço prestado.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA


/ /

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

18/10/2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 19/10/2022
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 19/31	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro 01 Encarregado 01 Op. Acabadora 01 Rolista 01 Imprimador 01 Motorista 10 Rasteleiro 04 Servente 08  TOTAL 27		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	
		<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL	
<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> Não houve serviço prestado.			
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	19/10/2022



**DIÁRIO DE OBRA**

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 20/10/2022	<b>FOLHA N° :</b> 20/31
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		PRAZO DECORRIDO      RESTANTE	
<b>FISCAL:</b>		TEMPO <input type="checkbox"/> OPERÁVEL <input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL	

PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS: <u>Não houve serviço prestado.</u>
Engenheiro 01 _____	_____
Encarregado 01 _____	_____
Op. _____	_____
Acabadora 01 _____	_____
Rolista 01 _____	_____
Imprimador 01 _____	_____
Motorista 10 _____	_____
Rasteleiro 04 _____	_____
Servente 08 _____	_____
 TOTAL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">27</span>	_____
	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---


---

---

<b>FISCALIZAÇÃO</b>	DATA	<b>CONTRATADA</b>	DATA
	/ /	 <b>Andressa Santos de Oliveira</b> Engenheira Civil CREA N° 0519474586	20/10/2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 21/10/2022
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 21/31	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		<input type="checkbox"/> DECORRIDO	<input type="checkbox"/> RESTANTE
		<b>TEMPO</b>	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Engenheiro	<u>01</u>		
Encarregado	<u>01</u>		
Op.			
Acabadora	<u>01</u>		
Rolista	<u>01</u>		
Imprimador	<u>01</u>		
Motorista	<u>10</u>		
Rasteleiro	<u>04</u>		
Servente	<u>08</u>		
<b>TOTAL</b>	<u>27</u>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	21/10/2022










**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 24/10/2022
CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli		PRAZO	
		DECORRIDO	REstante
FISCAL:		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro <u>01</u> Encarregado <u>01</u> Op. Acabadora <u>01</u> Rolista <u>01</u> Imprimador <u>01</u> Motorista <u>10</u> Rasteleiro <u>04</u> Servente <u>08</u>  TOTAL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>           <b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	24/10/2022




**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 25/10/2022
		<b>FOLHA N° :</b> 25/31	
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
<b>FISCAL:</b>		<b>TEMPO</b>	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>		
Engenheiro 01			
Encarregado 01			
Op.			
Acabadora 01			
Rolista 01			
Imprimador 01			
Motorista 10			
Rasteleiro 04			
Servente 08			
<b>TOTAL</b> 27	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>		
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	25/10/2022





DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 27/10/2022
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 27/31	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Engenheiro	01		
Encarregado	01		
Op.			
Acabadora	01		
Rolista	01		
Imprimador	01		
Motorista	10		
Rasteleiro	04		
Servente	08		
<b>TOTAL</b>	<u>27</u>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREAN° 0519474586	27/10/2022





DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LOCAL: Santaluz - Bahia DATA: 29/10/2022 FOLHA N° : 29/31

CONTRATADA: Construpremium Empreendimentos Eireli PRAZO DECORRIDO RESTANTE

FISCAL: TEMPO OPERÁVEL NÃO OPERÁVEL

Table with columns for PESSOAL DE OBRA (listing roles like Engenheiro, Encarregado, Op., Acabadora, Rolista, Imprimador, Motorista, Rasteleiro, Servente) and SERVIÇOS INICIADOS/CONCLUÍDOS. Includes a TOTAL row with the value 27.

OCORRENCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO DATA CONTRATADA DATA

Handwritten signature of Andressa Santos de Oliveira, Engenheira Civil, CREA N° 0519474586

29/10/2022





**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

**DIÁRIO DE OBRA**

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 30/10/2022	<b>FOLHA N°:</b> 30/31
--	--------------------------------	-------------------------	------------------------

<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreendimentos Eireli	<b>PRAZO</b>	
	DECORRIDO	RESTANTE

<b>FISCAL:</b>	<b>TEMPO</b>	
	<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL

PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:	
Engenheiro 01	<u>Não houve serviço prestado.</u>	
Encarregado 01		
Op.		
Acabadora 01		
Rolista 01		
Imprimador 01		
Motorista 10		
Rasteleiro 04		
Servente 08		
<b>TOTAL</b> 27		
		SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	30/10/2022



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. **LOCAL:** Santaluz - Bahia **DATA:** 31/10/2022 **FOLHA N°:** 31/31

**CONTRATADA:** Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

**FISCAL:**

OPERÁVEL

TEMPO

NÃO OPERÁVEL

**PESSOAL DE OBRA**

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

**SERVIÇOS INICIADOS:** Não houve serviço prestado.

**SERVIÇOS CONCLUÍDOS:**

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

/ /

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

31/10/2022





**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 02/11/22
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 02/30	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>		
Engenheiro 01			
Encarregado 01			
Op.			
Acabadora 01			
Rolista 01			
Imprimador 01			
Motorista 10			
Rasteleiro 04			
Servente 08			
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>SERVIÇOS CONCLUIDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	02/11/22



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. **LOCAL:** Santaluz - Bahia **DATA:** 03/11/22 **FOLHA N°:** 03/30

**CONTRATADA:** Construpremium Empreendimentos Eireli

PRAZO	
DECORRIDO	RESTANTE

**FISCAL:**

TEMPO	
<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL

PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:
Engenheiro 01	<u>Não houve serviço prestado.</u>
Encarregado 01	
Op.	
Acabadora 01	
Rolista 01	
Imprimador 01	
Motorista 10	
Rasteleiro 04	
Servente 08	
<b>TOTAL</b> 27	
	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	03/11/22



DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 04/11/22
CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL:		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro    01 Encarregado   01 Op. Acabadora    01 Rolista        01 Imprimador   01 Motorista     10 Rasteleiro    04 Servente      08  TOTAL        27	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>		
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____			
FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	04/11/22



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 05/11/22
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 05/30	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Engenheiro	01		
Encarregado	01		
Op.			
Acabadora	01		
Rolista	01		
Imprimador	01		
Motorista	10		
Rasteleiro	04		
Servente	08		
<b>TOTAL</b>	<u>27</u>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	05/11/22




DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 06/11/22
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N° :</b> 06/30	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
		<b>TEMPO</b>	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Engenheiro	<u>01</u>		
Encarregado	<u>01</u>		
Op.			
Acabadora	<u>01</u>		
Rolista	<u>01</u>		
Imprimador	<u>01</u>		
Motorista	<u>10</u>		
Rasteleiro	<u>04</u>		
Servente	<u>08</u>		
TOTAL	<u>27</u>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	06/11/22





### DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 07/11/22	<b>FOLHA Nº :</b> 07/30
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>PRAZO</b> DECORRIDO      RESTANTE		
<b>FISCAL:</b>				
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro    01 _____ Encarregado    01 _____ Op. Acabadora    01 _____ Rolista        01 _____ Imprimador    01 _____ Motorista      10 _____ Rasteleiro     04 _____ Servente        08 _____  TOTAL           27		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>		
		<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
<b>-OCORRENCIAS DIÁRIAS</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____				
<b>-OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____				
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b>  Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	<b>DATA</b> 07/11/22	



PREMIUM

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 08/11/22

FOLHA Nº : 08/30

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

OPERÁVEL

TEMPO

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

SERVIÇOS INICIADOS: Não houve serviço prestado.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA


/ /

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

08/11/22




**PREMIUM**  
CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 09/11/22	<b>FOLHA N° :</b> 09/30
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
<b>FISCAL:</b>		TEMPO	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>		
Engenheiro 01			
Encarregado 01			
Op.			
Acabadora 01			
Rolista 01			
Imprimador 01			
Motorista 10			
Rasteleiro 04			
Servente 08			
<b>TOTAL</b> 27	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>		
<b>-OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>-OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	09/11/22



DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 10/11/22
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA Nº:</b> 10/30	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro 01 Encarregado 01 Op. Acabadora 01 Rolista 01 Imprimador 01 Motorista 10 Rasteleiro 04 Servente 08  TOTAL 27		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	
		<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL	
<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>			
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	10/11/22



DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 11/11/22
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA N°:</b> 11/30	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
		<b>TEMPO</b>	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Engenheiro	01		
Encarregado	01		
Op.			
Acabadora	01		
Rolista	01		
Imprimador	01		
Motorista	10		
Rasteleiro	04		
Servente	08		
<b>TOTAL</b>	<u>27</u>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b>	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	11/11/22



**PREMIUM**  
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

**LOCAL:** Santaluz - Bahia

**DATA:** 12/11/22

**FOLHA N°:** 12/30

**CONTRATADA:** Construpremium Empreedimentos Eireli

**PRAZO**

DECORRIDO

RESTANTE

**FISCAL:**

OPERÁVEL

**TEMPO**

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro	01
Encarregado	01
Op.	
Acabadora	01
Rolista	01
Imprimador	01
Motorista	10
Rasteleiro	04
Servente	08

**TOTAL** | 27 |

**SERVIÇOS INICIADOS:** Não houve serviço prestado.

~~SERVIÇOS CONCLUIDOS:~~ \_\_\_\_\_

#### ~~OCORRENCIAS DIÁRIAS~~

#### ~~OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES~~

FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA


/ /

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

12/11/22



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.		<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 13/11/22
<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli		<b>FOLHA Nº :</b> 13/30	
<b>FISCAL:</b>		<b>PRAZO</b>	
		DECORRIDO	RESTANTE
		<b>TEMPO</b>	
		<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>	
Engenheiro	<u>01</u>		
Encarregado	<u>01</u>		
Op.			
Acabadora	<u>01</u>		
Rolista	<u>01</u>		
Imprimador	<u>01</u>		
Motorista	<u>10</u>		
Rasteleiro	<u>04</u>		
Servente	<u>08</u>		
<b>TOTAL</b>	<u>27</u>	<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____	
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA Nº 0519474586	13/11/22



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. **LOCAL:** Santaluz - Bahia **DATA:** 14/11/22 **FOLHA N°:** 14/30

**CONTRATADA:** Construpremium Empreendimentos Eireli

**PRAZO**

DECORRIDO

RESTANTE

**FISCAL:**

**TEMPO**

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

**PESSOAL DE OBRA**

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

**TOTAL** 27

**SERVIÇOS INICIADOS:** Não houve serviço prestado.

**SERVIÇOS CONCLUÍDOS:**

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

**FISCALIZAÇÃO**

**DATA**

/ /

**CONTRATADA**

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

**DATA**

14/11/22













**PREMIUM**  
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	DATA: 19/11/22	FOLHA N° : 19/30
--	--------------------------------	----------------	------------------

**CONTRATADA:** Construpremium Empreedimentos Eireli

**PRAZO**

DECORRIDO	RESTANTE
-----------	----------

**FISCAL:**

**TEMPO**

OPERÁVEL      NÃO OPERÁVEL

**PESSOAL DE OBRA**

Engenheiro	01
Encarregado	01
Op.	
Acabadora	01
Rolista	01
Imprimador	01
Motorista	10
Rasteleiro	04
Servente	08

TOTAL     27

**SERVIÇOS INICIADOS:** Não houve serviço prestado.

**SERVIÇOS CONCLUÍDOS:** \_\_\_\_\_

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

<b>FISCALIZAÇÃO</b>	DATA	<b>CONTRATADA</b>	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	19/11/22



PREMIUM

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 20/11/22

FOLHA Nº : 20/30

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

TEMPO

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

SERVIÇOS INICIADOS: Não houve serviço prestado.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

OCORRENCIAS DIÁRIAS

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

/ /

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

20/11/22



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	<b>LOCAL:</b> Santaluz - Bahia	<b>DATA:</b> 21/11/22	<b>FOLHA N°:</b> 21/30
--	--------------------------------	-----------------------	------------------------

<b>CONTRATADA:</b> Construpremium Empreedimentos Eireli	<b>PRAZO</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">DECORRIDO</td> <td style="width:50%;">RESTANTE</td> </tr> </table>	DECORRIDO	RESTANTE
DECORRIDO	RESTANTE		

<b>FISCAL:</b>	<b>TEMPO</b> <input type="checkbox"/> OPERÁVEL <input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL
----------------	---

<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro    01 Encarregado   01 Op. Acabadora     01 Rolista        01 Imprimador    01 Motorista      10 Rasteleiro     04 Servente       08  TOTAL        27	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>            <b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	---

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>FISCALIZAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>DATA</b>
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	21/11/22

















**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. **LOCAL:** Santaluz - Bahia **DATA:** 28/11/22 **FOLHA N°:** 28/30

**CONTRATADA:** Construpremium Empreedimentos Eireli

**PRAZO**

DECORRIDO

RESTANTE

**FISCAL:**

OPERÁVEL

**TEMPO**

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

**SERVIÇOS INICIADOS:** Não houve serviço prestado.

**SERVIÇOS CONCLUÍDOS:**

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

/ /

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

28/11/22



**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

**DIÁRIO DE OBRA**

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

**LOCAL:** Santaluz - Bahia

**DATA:** 29/11/22

**FOLHA N°:** 29/30

**CONTRATADA:** Construpremium Empreendimentos Eireli

**PRAZO**

DECORRIDO

RESTANTE

**FISCAL:**

**TEMPO**

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

**PESSOAL DE OBRA**

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

**TOTAL** 27

**SERVIÇOS INICIADOS:** Não houve serviço prestado.

**SERVIÇOS CONCLUÍDOS:** \_\_\_\_\_

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

**FISCALIZAÇÃO**

**DATA**

/ /

**CONTRATADA**

**DATA**

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

29/11/22



PREMIUM

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.	LOCAL: Santaluz - Bahia	DATA: 30/11/22	FOLHA N° : 30/30
---	-------------------------	----------------	------------------

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli	PRAZO	
	DECORRIDO	RESTANTE

FISCAL:	TEMPO	
	<input type="checkbox"/> OPERÁVEL	<input type="checkbox"/> NÃO OPERÁVEL

<b>PESSOAL DE OBRA</b> Engenheiro <u>01</u> Encarregado <u>01</u> Op. Acabadora <u>01</u> Rolista <u>01</u> Imprimador <u>01</u> Motorista <u>10</u> Rasteleiro <u>04</u> Servente <u>08</u>  TOTAL <u>27</u>	<b>SERVIÇOS INICIADOS:</b> <u>Não houve serviço prestado.</u>  <b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS:</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	--

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FISCALIZAÇÃO	DATA	CONTRATADA	DATA
	/ /	 Andressa Santos de Oliveira Engenheira Civil CREA N° 0519474586	30/11/22













**PREMIUM**

### DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

**LOCAL:** Santaluz - Bahia

**DATA:** 05/12/22

**FOLHA N°:** 05/31

**CONTRATADA:** Construpremium Empreedimentos Eireli

**PRAZO**

DECORRIDO

RESTANTE

**FISCAL:**

**TEMPO**

OPERÁVEL

NÃO OPERÁVEL

**PESSOAL DE OBRA**

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

**TOTAL** 27

**SERVIÇOS INICIADOS:** Não houve serviço prestado.

**SERVIÇOS CONCLUÍDOS:**

**OCORRENCIAS DIÁRIAS**

**OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

**FISCALIZAÇÃO**

**DATA**

**CONTRATADA**

**DATA**

/ /

  
Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA N° 0519474586

05/12/22



PREMIUM

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA SEDE E DISTRITO DO PEREIRA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

LOCAL: Santaluz - Bahia

DATA: 06/12/22

FOLHA Nº : 06/31

CONTRATADA: Construpremium Empreedimentos Eireli

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

FISCAL:

OPERÁVEL

TEMPO

NÃO OPERÁVEL

#### PESSOAL DE OBRA

Engenheiro 01  
Encarregado 01  
Op.  
Acabadora 01  
Rolista 01  
Imprimador 01  
Motorista 10  
Rasteleiro 04  
Servente 08

TOTAL 27

SERVIÇOS INICIADOS: Não houve serviço prestado.

SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

#### OCORRENCIAS DIÁRIAS

#### OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

DATA

CONTRATADA

DATA

/ /

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586

06/12/22
